



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 2 de 591</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Elaboración – Revisión – Aprobación |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión                            | Elaborado por:                                                                                                                                                                                                                                                                       | Revisado por                                                                                        | Aprobado por:                                                                                              |
|                                     | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nombre                                                                                              | Nombre                                                                                                     |
| 1                                   | Darío Martínez<br>Iván Rojas<br>William Rodríguez<br>Sandra Lugo<br>Jefferson Bonilla<br>Jaime Toloza<br>Miguel Romero<br>Claudia Merchán<br>Mauricio Gómez<br>Luis Serrano<br>Juliana Fajury,<br>Cesar Alba<br>Erika Prado/Germán<br>Peña<br>Yedizareth Guerrero<br>Catalina Triana | Marco Charria<br> | Wilson Fabián Pérez<br> |
|                                     | <b>Equipo de Trabajo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Subdirector Técnico y Operativo</b>                                                              | <b>Director</b>                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 3 de 591</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| INFORMES PRESENTADOS Y APROBADOS POR LA ENTIDAD |                      |                     |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Informes presentados                            | No. Radicado ANI     | Fecha de aprobación |  |
| Enero de 2023                                   | 20233060225651       | 29/06/2023          |  |
| Febrero de 2023                                 | 20233060243461       | 13/07/2023          |  |
| Marzo de 2023                                   | 20233060254641       | 24/07/2023          |  |
| Abril de 2023                                   | 20233060317431       | 8/09/2023           |  |
| Mayo de 2023                                    | 20233060343501       | 25/09/2023          |  |
| Junio de 2023                                   | 20233060390361       | 30/10/2023          |  |
| Julio de 2023                                   | 20233060390521       | 01/11/2023          |  |
| Agosto de 2023                                  | 20233060420761       | 29/11/2023          |  |
| Septiembre de 2023                              | 20233060434501       | 1/12/2023           |  |
| Octubre de 2023                                 | 20243060053471       | 14/02/2024          |  |
| Noviembre de 2023                               | 20243060056931       | 17/02/2024          |  |
| Diciembre de 2023                               | 20243060092531       | 18/03/2024          |  |
| Enero de 2024                                   | 20243060098741       | 21/03/2024          |  |
| Febrero de 2024                                 | 20243060151311       | 09/05/2024          |  |
| Marzo de 2024                                   | 20243060166051       | 21/05/2024          |  |
| Abril de 2024                                   | 20243050239511       | 16/07/2024          |  |
| Mayo de 2024                                    | 20243050239521       | 16/07/2024          |  |
| Junio de 2024                                   | 20243050288011       | 16/08/2024          |  |
| Julio de 2024                                   | 20243060344051       | 25/09/2024          |  |
| Agosto de 2024                                  | 20243060387491       | 01/11/2024          |  |
| Septiembre de 2024                              | 20244091414882       | 27/11/2024          |  |
| Octubre de 2024                                 | 20243060451921       | 11/12/2024          |  |
| Noviembre de 2024                               | 20253060032801       | 30/01/2025          |  |
| Diciembre de 2024                               | 20253060064671       | 25/02/2025          |  |
| Enero de 2025                                   | Pendiente Aprobación |                     |  |
| Febrero de 2025                                 | Pendiente Aprobación |                     |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                               |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 4 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## TABLA DE CONTENIDO

|       |                                                                                          |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN.....                                                                        | 23 |
| 2     | CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....                                                          | 25 |
| 2.1   | GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....                                                | 26 |
| 2.2   | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....      | 26 |
| 2.3   | ACTAS CONTRATO INTERVENTORÍA.....                                                        | 27 |
| 3     | CONTRATO DE CONCESIÓN.....                                                               | 28 |
| 3.1   | GENERALIDADES .....                                                                      | 28 |
| 3.2   | DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDADES FUNCIONALES.....                                            | 29 |
| 3.3   | ETAPAS DEL CONTRATO .....                                                                | 30 |
| 3.4   | ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.....                                                    | 31 |
| 3.4.1 | Suscripción del Contrato de Concesión.....                                               | 32 |
| 3.4.2 | Inicio Contrato de Concesión .....                                                       | 33 |
| 3.4.3 | Modificaciones al Contrato de Concesión.....                                             | 33 |
| 3.4.4 | Estado de Pólizas Vigentes.....                                                          | 37 |
| 4     | INFORMACIÓN DEL PROYECTO VIAL .....                                                      | 38 |
| 4.1   | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .....                                                          | 38 |
| 4.1.1 | Esquema de Abscisado del Proyecto .....                                                  | 39 |
| 4.2   | DESCRIPCIÓN ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO .....                                 | 40 |
| 4.3   | DESCRIPCION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO ..... | 41 |
| 4.3.1 | Unidades Funcionales .....                                                               | 42 |
| 4.4   | ETAPA ACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.....                                              | 49 |
| 5     | ÁREA TÉCNICA.....                                                                        | 51 |
| 5.1   | GENERALIDADES.....                                                                       | 51 |
| 5.2   | TÉCNICA .....                                                                            | 51 |
| 5.2.1 | Gestión Estudios y Diseños Fase III .....                                                | 51 |
| 5.3   | ACTIVIDADES TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO .....                                            | 54 |
| 5.3.1 | Seguimiento fallos por invierno en vía Patios - La Calera UF3A.....                      | 54 |
| 5.3.2 | INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 1.....                       | 61 |
| 5.3.3 | INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 2.....                       | 61 |
| 5.3.4 | INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 3.....                       | 61 |
| 5.3.5 | INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UF 4 Y UF 5 .....                             | 62 |
| 5.3.6 | PUNTOS DE INTERÉS O "PUNTOS CRÍTICOS" EN UF4 Y UF5: .....                                | 63 |
| 5.3.7 | Reuniones técnicas realizadas y aspectos técnicos relevantes de mantenimiento:...        | 68 |
| 5.4   | PLAN DE OBRAS .....                                                                      | 68 |
| 5.4.1 | AVANCE PARTICULAR POR UNIDAD FUNCIONAL .....                                             | 69 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                               |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 5 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|               |                                                                |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5.5</b>    | <b>ESTADO DE PENDIENTES</b>                                    | <b>74</b>  |
| <b>5.5.1</b>  | <b>Pendientes Técnicos UF1 a diciembre 20 de 2024:</b>         | <b>74</b>  |
| <b>5.5.2</b>  | <b>Pendientes Técnicos UF2 a diciembre 20 de 2024:</b>         | <b>74</b>  |
| <b>5.5.3</b>  | <b>Pendientes Técnicos UF3 a diciembre 20 de 2024:</b>         | <b>74</b>  |
| <b>5.5.4</b>  | <b>Unidades Funcionales 4 y 5:</b>                             | <b>83</b>  |
| <b>5.6</b>    | <b>ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA AREA TECNICA</b>            | <b>84</b>  |
| <b>5.7</b>    | <b>REQUERIMIENTOS E INFORMES SOLICITADOS AL CONCESIONARIO</b>  | <b>84</b>  |
| <b>5.8</b>    | <b>CONCLUSIONES TÉCNICAS</b>                                   | <b>85</b>  |
| <b>6</b>      | <b>ÁREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                          | <b>86</b>  |
| <b>6.1</b>    | <b>ANÁLISIS DE EVENTOS</b>                                     | <b>86</b>  |
| <b>6.2</b>    | <b>VALLAS INFORMATIVAS</b>                                     | <b>86</b>  |
| <b>6.3</b>    | <b>ESTADO DEL CLIMA</b>                                        | <b>87</b>  |
| <b>6.4</b>    | <b>MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO</b>                     | <b>87</b>  |
| <b>6.5</b>    | <b>MEDICION DE INDICADORES EN LA ETAPA DE REVERSION</b>        | <b>92</b>  |
| <b>6.6</b>    | <b>PLANES DE MANEJO DE TRANSITO ACTIVOS</b>                    | <b>93</b>  |
| <b>6.7</b>    | <b>VEHICULOS EN OPERACIÓN PARA EL PRESENTE PERIODO</b>         | <b>94</b>  |
| <b>6.8</b>    | <b>TRAFICO Y TPD MENSUAL POR UNIDADES FUNCIONALES</b>          | <b>95</b>  |
| <b>6.9</b>    | <b>ASPECTOS OPERATIVOS</b>                                     | <b>96</b>  |
| <b>6.10</b>   | <b>ANÁLISIS DE EVENTOS</b>                                     | <b>97</b>  |
| <b>6.10.1</b> | <b>INCIDENTES</b>                                              | <b>97</b>  |
| <b>6.10.2</b> | <b>ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD</b>                              | <b>98</b>  |
| <b>6.10.3</b> | <b>ANÁLISIS DE HIPÓTESIS DE CAUSA</b>                          | <b>104</b> |
| <b>6.10.4</b> | <b>ANÁLISIS DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES</b>       | <b>110</b> |
| <b>6.10.5</b> | <b>VÍCTIMAS FATALES EN TCA</b>                                 | <b>110</b> |
| <b>6.11</b>   | <b>ACCIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA VÍA</b>             | <b>110</b> |
| <b>6.12</b>   | <b>CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CONCESIÓN</b>              | <b>111</b> |
| <b>6.13</b>   | <b>PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNIDADES ALEDAÑAS</b>               | <b>112</b> |
| <b>6.14</b>   | <b>CONVENIO DITRA</b>                                          | <b>118</b> |
| <b>6.15</b>   | <b>ÁREAS DE PREVENCIÓN</b>                                     | <b>119</b> |
| <b>6.16</b>   | <b>OPERATIVOS DE CONTROL</b>                                   | <b>120</b> |
| <b>6.17</b>   | <b>OPERATIVOS DE SENSIBILIZACIÓN EN VÍA</b>                    | <b>126</b> |
| <b>6.18</b>   | <b>OPERATIVOS DE REGULACIÓN</b>                                | <b>126</b> |
| <b>6.19</b>   | <b>MEDICIÓN DE INDICADORES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO</b> | <b>127</b> |
| <b>6.19.1</b> | <b>Informe de Indicadores marzo de 2025</b>                    | <b>127</b> |
| <b>6.19.2</b> | <b>INDICADORES EVALUADOS EN LA UF1</b>                         | <b>128</b> |
| <b>6.19.3</b> | <b>INDICADORES EVALUADOS EN LA UF2</b>                         | <b>142</b> |
| <b>6.19.4</b> | <b>INDICADORES EVALUADOS EN LA UF3</b>                         | <b>153</b> |
| <b>6.19.5</b> | <b>Reporte mensual de indicadores</b>                          | <b>166</b> |
| <b>7</b>      | <b>AUDITORIA DE PEAJES</b>                                     | <b>175</b> |
| <b>7.1</b>    | <b>PRELIMINARES</b>                                            | <b>175</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                               |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 6 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|              |                                                                                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7.2</b>   | <b>METODOLOGÍA DE AUDITORIA.....</b>                                                        | <b>175</b> |
| <b>7.3</b>   | <b>ESTACIONES DE PEAJE. ....</b>                                                            | <b>176</b> |
| <b>7.4</b>   | <b>TARIFAS.....</b>                                                                         | <b>177</b> |
| <b>7.5</b>   | <b>ARQUEOS EN CABINAS DE RECAUDO. ....</b>                                                  | <b>180</b> |
| <b>7.6</b>   | <b>TRÁFICO Y RECAUDO.....</b>                                                               | <b>181</b> |
| <b>7.7</b>   | <b>SEGUIMIENTO AL TRAFICO HISTORICO. ....</b>                                               | <b>182</b> |
| <b>7.8</b>   | <b>CONFIABILIDAD DEL SISTEMA. ....</b>                                                      | <b>190</b> |
| <b>7.9</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DE TRÁFICO. ....</b>                                 | <b>190</b> |
| <b>7.10</b>  | <b>INFORME DE AFORO 7 X 24.....</b>                                                         | <b>190</b> |
| <b>7.11</b>  | <b>SEGUIMIENTO AL SISTEMA IP/REV. ....</b>                                                  | <b>194</b> |
| <b>7.12</b>  | <b>ESTACIONES DE PESAJE.....</b>                                                            | <b>195</b> |
| <b>7.13</b>  | <b>HALLAZGOS. ....</b>                                                                      | <b>197</b> |
| <b>7.14</b>  | <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AUDITORÍA. ....</b>                                       | <b>197</b> |
| <b>8</b>     | <b>GESTIÓN DE REDES .....</b>                                                               | <b>198</b> |
| <b>8.1</b>   | <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONCESIÓN PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. ....</b> | <b>198</b> |
| <b>8.1.1</b> | <b>Unidad Funcional 1A (Sector Salitre – Guasca).....</b>                                   | <b>198</b> |
| <b>8.1.2</b> | <b>Unidad Funcional 1B (Cuatro Esquinas – Guatavita – Sesquilé).....</b>                    | <b>198</b> |
| <b>8.1.3</b> | <b>Unidad Funcional 2A (Sector Sopo – Salitre) .....</b>                                    | <b>198</b> |
| <b>8.1.4</b> | <b>Unidad Funcional 2B (Sector Salitre – La Calera).....</b>                                | <b>199</b> |
| <b>8.1.5</b> | <b>Unidad Funcional 3A (Sector La Calera – Patios).....</b>                                 | <b>199</b> |
| <b>8.1.6</b> | <b>Unidad Funcional 3B (Limite Bogotá – Choachí) .....</b>                                  | <b>199</b> |
| <b>8.1.7</b> | <b>Unidad Funcional 4 (Sector La Calera – Choachí).....</b>                                 | <b>199</b> |
| <b>8.1.8</b> | <b>Unidad Funcional 5 (Sector Choachí - Cáqueza).....</b>                                   | <b>200</b> |
| <b>8.2</b>   | <b>INVENTARIO DE REDES .....</b>                                                            | <b>200</b> |
| <b>8.2.1</b> | <b>Actualización de Inventario de Redes No. 1 .....</b>                                     | <b>200</b> |
| <b>8.2.2</b> | <b>Actualización de Inventario de Redes No. 2 .....</b>                                     | <b>200</b> |
| <b>8.2.3</b> | <b>Actualización de Inventario de Redes No. 3 .....</b>                                     | <b>201</b> |
| <b>8.3</b>   | <b>PLAN PARA EL TRASLADO Y/O MANEJO DE REDES .....</b>                                      | <b>201</b> |
| <b>8.3.1</b> | <b>Plan Para el Traslado y/o Manejo de Redes (Revisión 3) .....</b>                         | <b>201</b> |
| <b>8.3.2</b> | <b>Plan Para el Traslado y/o Manejo De Redes, Actualización No. 2 .....</b>                 | <b>201</b> |
| <b>8.4</b>   | <b>SUBCUENTA DE REDES.....</b>                                                              | <b>202</b> |
| <b>8.5</b>   | <b>PAGOS GENERADOS SUBCUENTA DE REDES .....</b>                                             | <b>202</b> |
| <b>8.5.1</b> | <b>Histórico de Pagos Generados con cargo a la Subcuenta de Redes .....</b>                 | <b>202</b> |
| <b>8.5.2</b> | <b>Estudios y Diseños de Redes Húmedas.....</b>                                             | <b>203</b> |
| <b>8.5.3</b> | <b>Estudios y Diseños de Redes Secas.....</b>                                               | <b>203</b> |
| <b>8.5.4</b> | <b>Cortes de Obra Redes Eléctricas Operador CODENSA .....</b>                               | <b>206</b> |
| <b>8.5.5</b> | <b>Cortes de Obra Redes de Alumbrado Operador Municipio de La Calera .....</b>              | <b>209</b> |
| <b>8.5.6</b> | <b>Cortes de Obra Redes de Acueducto y Alcantarillado .....</b>                             | <b>210</b> |
| <b>8.6</b>   | <b>CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES .....</b>                                               | <b>217</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                               |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 7 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|               |                                                                                                     |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9</b>      | <b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                            | <b>218</b> |
| 9.1           | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO DEL PAGA.                                  | 218        |
| 9.1.1         | Informe trimestral #35 - 38                                                                         | 219        |
| 9.1.2         | IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PAGA.                        | 219        |
| 9.1.3         | ESTADO ACTUALIZACIÓN DE LOS PAGA                                                                    | 226        |
| 9.1.4         | CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL – 1                                                               | 227        |
| 9.1.5         | CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL – 2                                                               | 227        |
| 9.1.6         | CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL – 3                                                               | 227        |
| 9.2           | COMUNICACIONES AUTORIDADES AMBIENTALES.                                                             | 228        |
| 9.3           | PERMISOS AMBIENTALES.                                                                               | 229        |
| 9.3.1         | LICENCIA AMBIENTAL VARIANTE CHOACHÍ UNIDAD FUNCIONAL 5                                              | 232        |
| 9.3.2         | TRÁMITES CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES                                                            | 233        |
| 9.3.3         | SEGUIMIENTO INFORMES DE LEVANTAMIENTO DE VEDA                                                       | 264        |
| 9.4           | OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ADELANTADA POR LA INTERVENTORÍA                           | 268        |
| 9.4.1         | PROCESOS SANCIONATORIOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROYECTO                                          | 268        |
| 9.4.2         | EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD                                                                | 275        |
| 9.4.3         | SEGUIMIENTO ATROPELLAMIENTO DE FAUNA.                                                               | 282        |
| 9.4.4         | SEGUIMIENTO POR MEDIO DE REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO                                             | 283        |
| 9.5           | RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AMBIENTAL TRAMITADA EN EL PERIODO                                    | 283        |
| 9.6           | COSTOS ASOCIADOS A LA SUBCUENTA AMBIENTAL                                                           | 284        |
| 9.7           | CONCLUSIONES                                                                                        | 287        |
| <b>9.8</b>    | <b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>                                                              | <b>288</b> |
| <b>9.8.1</b>  | <b>OBJETIVO</b>                                                                                     | <b>288</b> |
| <b>9.8.2</b>  | <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>                                                                        | <b>288</b> |
| <b>9.8.3</b>  | <b>PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE 2025</b>                                               | <b>288</b> |
| <b>9.8.4</b>  | <b>ACTIVIDADES Y RECORRIDO RUTINARIO DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DEL INFORME</b>                | <b>288</b> |
| <b>9.8.5</b>  | <b>REGISTRO FOTOGRÁFICO HSE.</b>                                                                    | <b>291</b> |
| <b>9.8.6</b>  | <b>MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR COVID-19</b>       | <b>292</b> |
| <b>9.8.7</b>  | <b>LISTADO DE RADICADOS HSE</b>                                                                     | <b>293</b> |
| <b>9.8.8</b>  | <b>HALLAZGOS</b>                                                                                    | <b>297</b> |
| <b>9.8.9</b>  | <b>CAPACITACIONES, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE SEGURIDAD, INDUCCIONES Y CHARLAS DURANTE EL MES.</b> | <b>297</b> |
| <b>9.8.10</b> | <b>CANTIDAD DE TRABAJADORES EN LA CONCESIÓN.</b>                                                    | <b>299</b> |
| <b>9.8.11</b> | <b>INFRACCIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>                                                         | <b>299</b> |
| <b>9.8.12</b> | <b>INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN EL MES.</b>                                                     | <b>301</b> |
| <b>9.9</b>    | <b>CONCLUSIONES</b>                                                                                 | <b>302</b> |
| <b>10</b>     | <b>GESTIÓN SOCIAL</b>                                                                               | <b>304</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 8 de 591</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|        |                                                                                                             |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.1   | OBJETIVO GENERAL – ETAPA DE REVERSION.....                                                                  | 306 |
| 10.2   | OBJETIVO ESPECÍFICOS .....                                                                                  | 306 |
| 10.3   | PERSONAL A CARGO DE LA GESTION SOCIAL.....                                                                  | 307 |
| 10.3.1 | PERSONAL SOCIAL DEL CONCESIONARIO PERIMETRAL ORIENTE DE BOGOTA. S.A.S                                       | 307 |
| 10.3.2 | PERSONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA .....                                                                      | 307 |
| 10.4   | CAPITULO NO. 1 .....                                                                                        | 308 |
| 10.4.1 | SEGUIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DURANTE LA ETAPA DE REVERSION.....                                         | 308 |
| 10.4.2 | SISTEMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.....                                                                  | 308 |
| 10.4.3 | MANIFESTACIONES DE LA COMUNIDAD (PQRS) .....                                                                | 309 |
| 10.4.4 | MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO .....                                                                         | 313 |
| 10.4.5 | DERECHOS DE PETICIÓN INTERPUESTOS POR LA COMUNIDAD .....                                                    | 314 |
| 10.4.6 | MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO .....                                                                         | 314 |
| 10.4.7 | CAPACITACIONES CON COMUNIDAD ALEDAÑA.....                                                                   | 322 |
| 10.4.8 | PERTURBACIONES.....                                                                                         | 324 |
| 10.5   | CAPITULO NO. 2 .....                                                                                        | 324 |
| 10.5.1 | TRAZABILIDAD PGSC VIGENCIA 2024 – ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                        | 324 |
| 10.5.2 | PROGRAMA ATENCIÓN AL USUARIO.....                                                                           | 324 |
| 10.5.3 | PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL .....                                             | 327 |
| 10.5.4 | PERTURBACIONES.....                                                                                         | 328 |
| 10.5.5 | PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL -PREDIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .....                        | 329 |
| 10.5.6 | COMITES DE SEGUIMIENTO SOCIAL .....                                                                         | 329 |
| 10.5.7 | INFORMES .....                                                                                              | 330 |
| 10.6   | CONCLUSIONES.....                                                                                           | 333 |
| 11     | GESTIÓN PREDIAL.....                                                                                        | 334 |
| 11.1   | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA.....                                                                       | 334 |
| 11.2   | GENERALIDADES.....                                                                                          | 334 |
| 11.3   | AVANCE Y ESTADO DE LA GESTION PREDIAL .....                                                                 | 334 |
| 11.3.1 | UNIDAD FUNCIONAL 1.....                                                                                     | 335 |
| 11.3.2 | UNIDAD FUNCIONAL 2 .....                                                                                    | 336 |
| 11.3.3 | UNIDAD FUNCIONAL 3 .....                                                                                    | 339 |
| 11.3.4 | Expropiaciones Unidad Funcional 3.....                                                                      | 341 |
| 11.4   | PREDIOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEVUELTOS POR LA INTERVENTORIA.....                                    | 342 |
| 11.5   | INDICADORES DE LA GESTION PREDIAL .....                                                                     | 342 |
| 11.6   | SEGUIMIENTO A PREDIOS ESPECIALES (BALDIOS).....                                                             | 343 |
| 11.7   | COMITÉ PREDIAL .....                                                                                        | 343 |
| 11.8   | CASO ESPECIAL DE OFERTAS FORMALES DE COMPRA INSCRITAS EN FOLIO DE MATRICULA EN PREDIOS DE LAS UF 4 Y 5..... | 346 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                               |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 9 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|               |                                                                                      |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>11.9</b>   | <b>SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL- REPORTE DE FIDUCIA.....</b>                        | <b>347</b> |
| <b>11.10</b>  | <b>PAGOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA SUBCUENTA PREDIAL.....</b> | <b>349</b> |
| <b>11.11</b>  | <b>HALLAZGOS .....</b>                                                               | <b>350</b> |
| <b>11.12</b>  | <b>COMUNICADOS Y ACTAS DE COMITÉ.....</b>                                            | <b>351</b> |
| <b>11.13</b>  | <b>AVANCE EN EL SISTEMA OLYMPUS O EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR LA ANI</b>             | <b>356</b> |
| <b>11.14</b>  | <b>PLAZOS DE CURA, EVENTOS EXIMENTES, TRIBUNALES, FUERZA MAYOR PREDIAL.....</b>      | <b>357</b> |
| <b>12</b>     | <b>GESTIÓN FINANCIERA FEBRERO – MARZO 2025 .....</b>                                 | <b>361</b> |
| <b>12.1</b>   | <b>CONTRATO DE FIDUCIA.....</b>                                                      | <b>361</b> |
| <b>12.2</b>   | <b>ESTADO DE CUMPLIMIENTO CONCESIONARIO.....</b>                                     | <b>361</b> |
| <b>12.2.1</b> | <b>APORTES EQUITY .....</b>                                                          | <b>361</b> |
| <b>12.2.2</b> | <b>FONDEOS.....</b>                                                                  | <b>362</b> |
| <b>12.3</b>   | <b>APORTES ANI .....</b>                                                             | <b>371</b> |
| <b>12.4</b>   | <b>TARIFAS DE PEAJE .....</b>                                                        | <b>371</b> |
| <b>12.5</b>   | <b>SALDOS DE LAS SUBCUENTAS.....</b>                                                 | <b>373</b> |
| <b>12.6</b>   | <b>RENDIMIENTOS GENERADOS .....</b>                                                  | <b>374</b> |
| <b>12.7</b>   | <b>DETALLE DE SUBCUENTAS DEL FIDEICOMISO .....</b>                                   | <b>375</b> |
| <b>12.8</b>   | <b>ENDEUDAMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS .....</b>                                     | <b>385</b> |
| <b>12.9</b>   | <b>CIERRE FINANCIERO .....</b>                                                       | <b>386</b> |
| <b>12.10</b>  | <b>ESTADOS FINANCIEROS.....</b>                                                      | <b>386</b> |
| <b>12.11</b>  | <b>INDICADORES FINANCIEROS .....</b>                                                 | <b>388</b> |
| <b>12.12</b>  | <b>COMITÉ FIDUCIARIO .....</b>                                                       | <b>389</b> |
| <b>12.13</b>  | <b>TRÁFICO Y RECAUDO .....</b>                                                       | <b>392</b> |
| <b>12.14</b>  | <b>RECAUDO Y VPIP .....</b>                                                          | <b>392</b> |
| <b>12.15</b>  | <b>RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO.....</b>                                            | <b>395</b> |
| <b>12.16</b>  | <b>RETRIBUCIÓN DEL DIFERENCIAL DE RECAUDO (DR8).....</b>                             | <b>401</b> |
| <b>12.17</b>  | <b>LAUDO TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO .....</b>                                          | <b>403</b> |
| <b>12.18</b>  | <b>AUDITORIA AL PATRIMONIO AUTONOMO .....</b>                                        | <b>403</b> |
| <b>12.19</b>  | <b>GESTIONES DE LA INTERVENTORIA .....</b>                                           | <b>405</b> |
| <b>12.20</b>  | <b>RECOMENDACIONES Y PUNTOS RELEVANTES .....</b>                                     | <b>405</b> |
| <b>12.21</b>  | <b>CONCLUSIÓN.....</b>                                                               | <b>407</b> |
| <b>12.22</b>  | <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>                                                             | <b>407</b> |
| <b>13</b>     | <b>GESTIÓN JURÍDICA .....</b>                                                        | <b>408</b> |
| <b>13.1</b>   | <b>FUNCIONES GENERALES .....</b>                                                     | <b>408</b> |
| <b>13.2</b>   | <b>PÓLIZAS VIGENTES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2025 .....</b>                        | <b>411</b> |
| <b>13.3</b>   | <b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES.....</b>                                             | <b>412</b> |
| <b>13.4</b>   | <b>EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.....</b>                                     | <b>413</b> |
| <b>13.5</b>   | <b>PROCESOS SANCIONATORIOS.....</b>                                                  | <b>417</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 10 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|         |                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.6    | INTERVENCIONES DEL AMIGABLE COMPONEDOR:.....                                                                                                                                                      | 484 |
| 13.7    | LAUDO ARBITRAL TRIBUNAL INTERNACIONAL.....                                                                                                                                                        | 489 |
| 13.8    | CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025                                                                                                                           | 495 |
| 13.9    | OTRAS ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA:.....                                                                                                                                                       | 496 |
| 13.10   | CONCLUSIONES DEL ÁREA JURÍDICA.....                                                                                                                                                               | 498 |
| 13.11   | MARCO LEGAL DE REFERENCIA:.....                                                                                                                                                                   | 499 |
| 13.12   | SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA ANI AL CONCESIONARIO DESDE MAYO DE 2023 A MARZO DE 2025.....                                                                         | 500 |
| 14      | <b>GESTIÓN DE CALIDAD</b> .....                                                                                                                                                                   | 501 |
| 14.1    | <b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD</b> .....                                                                                                                                                       | 501 |
| 14.2    | <b>COMUNICACIÓN</b> .....                                                                                                                                                                         | 502 |
| 14.3    | <b>EQUIPOS DE MEDICIÓN INTERVENTORÍA</b> .....                                                                                                                                                    | 503 |
| 14.4    | <b>CAPACITACIONES RELACIONADAS AL SGC</b> .....                                                                                                                                                   | 503 |
| 14.5    | <b>CONCLUSIÓN</b> .....                                                                                                                                                                           | 503 |
| 15      | <b>GESTIÓN DE RIESGOS - ETAPA REVERSIÓN DEL –CONTRATO DE CONCESIÓN 002 DE 2014 - SEGÚN LAUDO ARBITRAJE NO. 01-20-0015-3123</b> .....                                                              | 505 |
| 15.1    | <b>CONTEXTO Y ANÁLISIS DE RIESGOS</b> .....                                                                                                                                                       | 506 |
| 15.1.1  | DEMORAS EN LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL.....                                                                                                      | 506 |
| 15.1.2  | SOBRECOSTOS POR ADQUISICIÓN (INCLUYENDO EXPROPIACIÓN) Y COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS.....                                                                                                       | 509 |
| 15.1.3  | DEMORAS EN LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS.....                                                                                                                                        | 512 |
| 15.1.4  | SOBRECOSTOS POR COMPENSACIONES SOCIO AMBIENTALES.....                                                                                                                                             | 512 |
| 15.1.5  | OBRAS SOLICITADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, POSTERIORES A LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA(S)/PERMISO(S) AMBIENTALE(S), POR RAZONES NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO.....                             | 513 |
| 15.1.6  | EFFECTOS DESFAVORABLES POR DECISIONES DE LA ENTIDAD FRENTE AL MOVIMIENTO O REUBICACIÓN DE CASSETAS DE PEAJE EXISTENTES, PREVISTAS EN LA ESTRUCTURACIÓN.....                                       | 514 |
| 15.1.7  | EFFECTOS DESFAVORABLES POR DECISIONES DE LA ENTIDAD FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE UBICACIÓN DE CASSETAS DE PEAJE NUEVAS, PREVISTAS EN LA ESTRUCTURACIÓN (NO INSTALACIÓN DE CASSETAS DE PEAJE)..... | 515 |
| 15.1.8  | INVASIÓN DEL CORREDOR DEL PROYECTO.....                                                                                                                                                           | 517 |
| 15.1.9  | SOBRECOSTOS POR INTERFERENCIA DE REDES.....                                                                                                                                                       | 517 |
| 15.1.10 | SOBRECOSTOS DERIVADOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.....                                                                                                                                              | 520 |
| 15.1.11 | SOBRECOSTOS POR AJUSTES EN DISEÑOS COMO CONSECUENCIA DEL TRÁMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES POR RAZONES NO ATRIBUIBLES AL CONCESIONARIO.....                                                        | 522 |
| 15.1.12 | SOBRECOSTOS EN DISEÑOS POR DECISIONES DE LA ANI.....                                                                                                                                              | 523 |
| 15.1.13 | SOBRECOSTOS DERIVADOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS.....                                                                                                                                         | 524 |
| 15.1.14 | VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS.....                                                                                                                                                          | 525 |
| 15.1.15 | SOBRECOSTOS POR OBRAS MENORES.....                                                                                                                                                                | 525 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 11 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1.16 MAYORES CANTIDADES DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....                                                                                                             | 526 |
| 15.1.17 VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....                                                                                                    | 526 |
| 15.1.18 MENORES INGRESOS POR DISMINUCIÓN DEL RECAUDO DE PEAJES.....                                                                                                                               | 527 |
| 15.1.19 MENORES INGRESOS DERIVADOS DE EVASIÓN DEL PAGO DE PEAJES.....                                                                                                                             | 528 |
| 15.1.20 MENORES INGRESOS DERIVADOS DE ELUSIÓN DEL PAGO DE PEAJES.....                                                                                                                             | 528 |
| 15.1.21 NO OBTENCIÓN DEL CIERRE FINANCIERO.....                                                                                                                                                   | 529 |
| 15.1.22 ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y/O COSTOS DE LA LIQUIDEZ QUE RESULTEN DE LA VARIACIÓN EN LAS VARIABLES DEL MERCADO O CONDICIONES DEL PROYECTO.....                         | 529 |
| 15.1.23 INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA INTERVENTORÍA POR RAZONES NO ATRIBUIBLES AL CONCESIONARIO.....                                                                               | 530 |
| 15.1.24 LIQUIDEZ EN EL RECAUDO DE PEAJE.....                                                                                                                                                      | 532 |
| 15.1.25 RIESGO DE LIQUIDEZ GENERAL.....                                                                                                                                                           | 533 |
| 15.1.26 VARIACIONES DEL PESO FRENTE A OTRAS MONEDAS.....                                                                                                                                          | 533 |
| 15.1.27 COMPENSACIONES POR NUEVAS TARIFAS DIFERENCIALES.....                                                                                                                                      | 534 |
| 15.1.28 CAMBIO EN NORMATIVIDAD (TECNOLOGÍA DE RECAUDO ELECTRÓNICO DE PEAJES). 536                                                                                                                 |     |
| 15.1.29 CAMBIO EN NORMATIVIDAD. (REFORMA TRIBUTARIA).....                                                                                                                                         | 536 |
| 15.1.30 CAMBIO EN NORMATIVIDAD (NORMAS NIIF).....                                                                                                                                                 | 537 |
| 15.1.31 FUERZA MAYOR EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL OCASIONADA POR EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.....                                                                                           | 537 |
| 15.1.32 COSTOS OCIOSOS DE LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA QUE LLEGAREN A CAUSARSE POR EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.....                                                                      | 539 |
| 15.1.33 FUERZA MAYOR POR INTERFERENCIA DE REDES EN EL CORREDOR CONSIDERADO COMO EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.....                                                                           | 548 |
| 15.1.34 FUERZA MAYOR POR DEMORAS EN LA CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES EN UN PLAZO MAYOR DE 360 DÍAS POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO.....                                               | 549 |
| 15.1.35 FUERZA MAYOR POR DEMORAS EN MÁS DE UN 150% DEL TIEMPO MÁXIMO ESTABLECIDO POR LA LEY APLICABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO..... | 549 |
| 15.1.36 EVENTOS ASEGURABLES.....                                                                                                                                                                  | 551 |
| 15.1.37 EVENTOS NO ASEGURABLES.....                                                                                                                                                               | 552 |
| 15.2 RIESGOS DE LA ETAPA DE REVERSIÓN.....                                                                                                                                                        | 552 |
| 15.2.1 GUARDA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....                                                                                                                                                | 552 |
| 15.2.2 ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y SUS ANEXIDADES.....                                                                                                                                    | 553 |
| 15.2.3 DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS A COMPLETITUD.....                                                                                                                                    | 553 |
| 15.2.4 RIESGO DE LIQUIDEZ POR LAS RESTRICCIONES DE LA ETAPA DE REVERSIÓN ..                                                                                                                       | 553 |
| 15.2.5 CUBRIMIENTO DE LAS ACCIONES AMBIENTALES.....                                                                                                                                               | 553 |
| 15.2.6 AFECTACIÓN DE SEGUIMIENTO SOCIAL.....                                                                                                                                                      | 554 |
| 15.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....                                                                                                                                                              | 554 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 12 de 591</b>                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|        |                                                                                    |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.4   | FLUJO DE EGRESOS DE LOS PRESUPUESTO .....                                          | 556 |
| 15.5   | RECOMENDACIÓN.....                                                                 | 557 |
| 15.6   | CONCLUSIONES .....                                                                 | 557 |
| 16     | SEGUIMIENTO HALLAZGOS CONTRALORÍA.....                                             | 560 |
| 16.1   | HALLAZGO 1241 PRESUNTOS RETRASOS ENTREGA Y PLAN DE OBRAS DE LAS UF 1, 2 Y 3: ..... | 560 |
| 16.2   | HALLAZGO 1377 SUSPENSION CONSTRUCCIÓN UF 4 Y UF 5 , CON RECONOCIMIENTO EER.....    | 561 |
| 16.3   | HALLAZGO 1495: ESTUDIOS DE DETALLE PARA LOS PUENTES DE LA UF3.....                 | 567 |
| 17     | GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA .....                                                  | 583 |
| 17.1   | INFORMACIÓN GENERAL.....                                                           | 583 |
| 17.1.1 | PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.....                                                  | 583 |
| 17.1.2 | Equipo .....                                                                       | 585 |
| 17.1.3 | Vehículos.....                                                                     | 585 |
| 18     | CONCLUSIONES .....                                                                 | 586 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 13 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1 Pólizas de Cumplimiento .....                                                                                                       | 26  |
| Tabla 2 Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual .....                                                                             | 26  |
| Tabla 3 Ficha del Contrato .....                                                                                                            | 28  |
| Tabla 4 Descripción General de las Unidades Funcionales.....                                                                                | 29  |
| Tabla 5. Obligaciones suspendidas y no suspendidas por el Acta del 1 de Agosto de 2018 .....                                                | 32  |
| Tabla 6 Composición Accionaria .....                                                                                                        | 33  |
| Tabla 7 Modificaciones contractuales.....                                                                                                   | 33  |
| Tabla 8 Información General Del Proyecto. ....                                                                                              | 38  |
| Tabla 9 Esquema Abscisado de la Unidades Funcionales PR .....                                                                               | 39  |
| Tabla 10 Descripción General de las Unidades Funcionales Alcance y Características del Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca..... | 40  |
| Tabla 11 Características Geométricas del Alcance del Proyecto.....                                                                          | 41  |
| Tabla 12 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF2 .....                                                                    | 44  |
| Tabla 13 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF3A-UF3B.....                                                               | 46  |
| Tabla 14 Unidad Funcional 4.....                                                                                                            | 47  |
| Tabla 15 Unidad Funcional 5.....                                                                                                            | 48  |
| Tabla 16 Relación de Estudios y Diseños No Objetados.....                                                                                   | 52  |
| Tabla 17 Avance de obras de estabilización Talud Tilatá.....                                                                                | 59  |
| Tabla 18 "Puntos críticos" relacionados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ....                             | 64  |
| Tabla 19 Reuniones del mes de Marzo de 2025 .....                                                                                           | 68  |
| Tabla 20 Avance de Obras.....                                                                                                               | 68  |
| Tabla 21 Porcentaje de Avance Global de la UF1.....                                                                                         | 69  |
| Tabla 22 Porcentaje de Avance Global de la UF2.....                                                                                         | 69  |
| Tabla 23 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF2 .....                                                                     | 70  |
| Tabla 24 Porcentaje de Avance Global UF3 .....                                                                                              | 71  |
| Tabla 25 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF3 .....                                                                     | 71  |
| Tabla 26 Porcentaje de Avance Global de la UF4.....                                                                                         | 72  |
| Tabla 27 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF4 .....                                                                     | 72  |
| Tabla 28 Porcentaje de Avance Global de la UF5.....                                                                                         | 72  |
| Tabla 29 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF5 .....                                                                     | 73  |
| Tabla 1 Estado del clima marzo 2025.....                                                                                                    | 87  |
| Tabla 31 avance medición de indicadores para reversión .....                                                                                | 92  |
| Tabla 32 vehículos en operación en el presente periodo .....                                                                                | 94  |
| Tabla 33 Tráfico y TPD marzo 2025 .....                                                                                                     | 95  |
| Tabla 34 Servicios prestados durante marzo de 2025 .....                                                                                    | 96  |
| Tabla 35 Resumen prestación de servicios al usuario desde noviembre 2022 a marzo de 2025 ..                                                 | 96  |
| Tabla 36 Incidentes en el mes de marzo de 2025.....                                                                                         | 98  |
| Tabla 37 Estadísticas de víctimas por accidentalidad por UF marzo 2024 vs marzo 2025.....                                                   | 99  |
| Tabla 38 estadísticas de víctimas de accidentalidad por UF febrero 2025 vs marzo 2025 .....                                                 | 99  |
| Tabla 39 Víctimas desde el inicio del proyecto febrero de 2015 a marzo de 2025 .....                                                        | 100 |
| Tabla 40 Discriminación de víctimas por UF marzo 2025.....                                                                                  | 102 |
| Tabla 41 Consolidado de eventos hasta febrero de 2025 .....                                                                                 | 102 |
| Tabla 42 Consolidado de eventos hasta marzo de 2025.....                                                                                    | 103 |
| Tabla 43 Cantidad de accidentes que generan cada tipología de victima.....                                                                  | 103 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 14 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 44 Análisis cruzado Tipo de accidente ocurrido vs tipo de vehículo involucrado .....            | 104 |
| Tabla 45 Análisis hipótesis causa.....                                                                | 104 |
| Tabla 46 Accidentalidad histórica .....                                                               | 105 |
| Tabla 16 Tramos de concentración de accidentes .....                                                  | 110 |
| Tabla 48. Escuela capacitada durante marzo de 2025.....                                               | 113 |
| Tabla 49 valores de convenio 64 – 9 – 30006 – 21.....                                                 | 119 |
| Tabla 50. Comparendos – marzo 2025.....                                                               | 123 |
| Tabla 32. Causales de comparendos, marzo 2025. ....                                                   | 125 |
| Tabla 52. Operativos de sensibilización en vía, marzo 2025. ....                                      | 126 |
| Tabla 53. Operativos de regulación de tráfico – marzo 2025.....                                       | 127 |
| Tabla 54 Indicador E1 Iri .....                                                                       | 128 |
| Tabla 55 Indicador E2 Ahuellamiento .....                                                             | 129 |
| Tabla 56 Indicador E3 Fisuras.....                                                                    | 130 |
| Tabla 57 Indicador E4 Coeficiente de Fricción Transversal.....                                        | 131 |
| Tabla 58 Indicador E5 Textura .....                                                                   | 132 |
| Tabla 59 Indicador E6 Baches.....                                                                     | 133 |
| Tabla 60 Indicador E7 Hundimientos .....                                                              | 133 |
| Tabla 61 Indicador E8. Estado de Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho De Vía. .... | 134 |
| Tabla 62 Indicador E10 Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal .....                       | 134 |
| Tabla 63 Indicador E11 Señalización Vertical.....                                                     | 134 |
| Tabla 64 Indicador E12 Señalización Horizontal.....                                                   | 135 |
| Tabla 65 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención .....                                       | 136 |
| Tabla 66 Indicador E14 Iluminación.....                                                               | 136 |
| Tabla 67 Indicador E15 Puentes y Estructuras .....                                                    | 137 |
| Tabla 68 Indicador E16 Capacidad Estructural.....                                                     | 137 |
| Tabla 69 Indicador E17 Disponibilidad de la Vía.....                                                  | 139 |
| Tabla 70 Indicador O1 Índice De Mortalidad.....                                                       | 139 |
| Tabla 71 Indicador O2 Ocupación de Carriles .....                                                     | 139 |
| Tabla 72 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes .....                                          | 140 |
| Tabla 73 Indicador O5 Tiempo de Atención de Accidentes .....                                          | 140 |
| Tabla 74 Indicador O6. Disponibilidad del SICC. ....                                                  | 141 |
| Tabla 75 Indicador E1 Iri. ....                                                                       | 142 |
| Tabla 76 Indicador E2 Ahuellamiento .....                                                             | 143 |
| Tabla 77 Indicador E3 Fisuras.....                                                                    | 144 |
| Tabla 78 Indicador E4 Coeficiente de Fricción Transversal.....                                        | 144 |
| Tabla 79 Indicador E5. TEXTURA.....                                                                   | 145 |
| Tabla 80 Indicador E6 Baches.....                                                                     | 146 |
| Tabla 81 Indicador E7 Hundimientos .....                                                              | 146 |
| Tabla 82 Indicador E8 Estado de Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho de Vía. ....  | 147 |
| Tabla 83 Indicador E10 Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal .....                       | 147 |
| Tabla 84 Indicador E11 Señalización Vertical.....                                                     | 147 |
| Tabla 85 Indicador E12. Señalización Horizontal.....                                                  | 148 |
| Tabla 86 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención .....                                       | 149 |
| Tabla 87 Indicador E14 Iluminación.....                                                               | 149 |
| Tabla 88 Indicador E15 Puentes y Estructuras .....                                                    | 149 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 15 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 89 Indicador E16 Capacidad Estructural .....                                                   | 150 |
| Tabla 90 Indicador E17 Disponibilidad de la Vía .....                                                | 150 |
| Tabla 91 Indicador O1 Índice de Mortalidad .....                                                     | 150 |
| Tabla 92 Indicador O2 Ocupación de Carriles .....                                                    | 150 |
| Tabla 93 Indicador O3 Cola de Peaje .....                                                            | 151 |
| Tabla 94 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes. ....                                         | 151 |
| Tabla 95 Indicador O5. Tiempo de Atención de Accidentes. ....                                        | 152 |
| Tabla 96 Indicador O6 Disponibilidad del SICC .....                                                  | 153 |
| Tabla 97 Indicador E1 Iri .....                                                                      | 153 |
| Tabla 98 Indicador E2 Ahuellamiento .....                                                            | 154 |
| Tabla 99 Indicador E3 Fisuras.....                                                                   | 155 |
| Tabla 100 Indicador E4 Coeficiente De Fricción Transversal .....                                     | 155 |
| Tabla 101 Indicador E5. TEXTURA.....                                                                 | 157 |
| Tabla 102 Indicador E6 Baches.....                                                                   | 158 |
| Tabla 103 Indicador E7 Hundimientos.....                                                             | 158 |
| Tabla 104 Indicador E8 Estado De Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho de Vía..... | 158 |
| Tabla 105 Indicador E10. Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal. ....                    | 159 |
| Tabla 106 Indicador E11 Señalización Vertical.....                                                   | 159 |
| Tabla 107 Indicador E12 Señalización Horizontal.....                                                 | 159 |
| Tabla 108 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención.....                                      | 161 |
| Tabla 109 Indicador E14 Iluminación.....                                                             | 161 |
| Tabla 110 Indicador E15 Puentes y Estructuras .....                                                  | 161 |
| Tabla 111 Indicador E16 Capacidad Estructural .....                                                  | 161 |
| Tabla 112 Indicador E17 Disponibilidad De La Vía .....                                               | 162 |
| Tabla 113 Indicador O1 Índice de Mortalidad.....                                                     | 163 |
| Tabla 114 Indicador O2 Ocupación de Carriles .....                                                   | 163 |
| Tabla 115 Indicador O3 Cola De Peaje .....                                                           | 163 |
| Tabla 116 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes .....                                        | 164 |
| Tabla 117 Indicador O5. TIEMPO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES.....                                        | 165 |
| Tabla 118 Indicador O6 Disponibilidad del SICC .....                                                 | 165 |
| Tabla 119 Estaciones de Peaje. ....                                                                  | 176 |
| Tabla 120 Tarifas Peajes Año 2025.....                                                               | 177 |
| Tabla 121 Histórico Tarifas de Peaje Sopó.....                                                       | 178 |
| Tabla 122 Histórico de Tarifas Peaje La Cabaña. ....                                                 | 179 |
| Tabla 123 Histórico de Tarifas Los Patios.....                                                       | 179 |
| Tabla 124 Arqueos Peaje Sopó, La Cabaña y Los Patios .....                                           | 181 |
| Tabla 125 sobrantes y Faltantes Peaje de Sopó, La Cabaña y Los Patios.....                           | 181 |
| Tabla 126 Reportes Tráfico y Recaudo Peaje Sopó. ....                                                | 181 |
| Tabla 127 Tráfico y Recaudo Peaje La Cabaña. ....                                                    | 182 |
| Tabla 128 Tráfico y Recaudo Peaje Los Patios. ....                                                   | 182 |
| Tabla 129 Histórico de Tráficos Mensuales .....                                                      | 183 |
| Tabla 130 Resultados confiabilidad Peaje Sopó. ....                                                  | 190 |
| Tabla 131 Aforo 7X 24 Peaje Sopó. ....                                                               | 191 |
| Tabla 132 Ubicación cámaras en carriles estación Sopó. ....                                          | 191 |
| Tabla 133 Aforo 7X 24 Peaje La Cabaña.....                                                           | 192 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 16 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 134 Ubicación cámaras en carriles estación La Cabaña. ....                                           | 193 |
| Tabla 135 Aforo 7X 24 Peaje Los Patios. ....                                                               | 193 |
| Tabla 136 Ubicación cámaras en carriles estación Los Patios. ....                                          | 194 |
| Tabla 137 Beneficios Activos por Categorías Diferenciales.....                                             | 195 |
| Tabla 138 Estaciones de Pesaje. ....                                                                       | 195 |
| Tabla 139 Datos de pesado en Básculas marzo de 2025 .....                                                  | 196 |
| Tabla 140 Comparativo de Tráfico mensual con exentos de estaciones de Peaje, febrero y marzo de 2025 ..... | 197 |
| Tabla 142 Subcuenta de Redes .....                                                                         | 202 |
| Tabla 143 Valores Estudios y Diseños de Redes Húmedas.....                                                 | 203 |
| Tabla 144 Estudios y Diseños de Redes Secas.....                                                           | 204 |
| Tabla 145 Valores Corte No. 1 CODENSA .....                                                                | 206 |
| Tabla 146 Valores Corte No. 2 CODENSA .....                                                                | 207 |
| Tabla 147 Valores Corte No. 3 CODENSA .....                                                                | 207 |
| Tabla 148 Valores Corte No. 4 CODENSA .....                                                                | 208 |
| Tabla 149 Valores Corte No. 5 CODENSA .....                                                                | 208 |
| Tabla 150 Valores Corte No. 1 Alumbrado Vial.....                                                          | 209 |
| Tabla 150 Valores Corte No. 1 Alumbrado Vial.....                                                          | 210 |
| Tabla 151 Valores Corte No. 2 Alcantarillado .....                                                         | 210 |
| Tabla 150 Tramos Corte No. 2 Alcantarillado UF 2 .....                                                     | 210 |
| Tabla 153 Valores Corte No. 3 Acueducto .....                                                              | 211 |
| Tabla 154 Tramos Corte No. 3 Acueducto UF 2A .....                                                         | 211 |
| Tabla 155 Valores Corte No. 4 Acueducto .....                                                              | 212 |
| Tabla 156 Tramos Corte No. 4 Acueducto UF2A .....                                                          | 212 |
| Tabla 157 Valores Corte No. 5 Acueducto .....                                                              | 213 |
| Tabla 158 Tramos Corte No. 5 Acueducto UF2A .....                                                          | 213 |
| Tabla 159 Valores Corte No. 6 Acueducto .....                                                              | 214 |
| Tabla 160 Valores Corte No. 6 Acueducto UF2B .....                                                         | 214 |
| Tabla 161 Valores Corte No. 7 Acueducto .....                                                              | 214 |
| Tabla 162 Valores Corte No. 7 Acueducto UF2B .....                                                         | 215 |
| Tabla 163 Valores Corte No. 8 Acueducto .....                                                              | 215 |
| Tabla 164 Valores Corte No. 8 Acueducto UF2B .....                                                         | 216 |
| Tabla 165 Valores Corte No. 9 Acueducto .....                                                              | 216 |
| Tabla 166 Valores Corte No. 9 Acueducto UF3A .....                                                         | 216 |
| Tabla 167 Reporte de estado de avance Paga UF1.....                                                        | 220 |
| Tabla 168 Reporte de estado de avance Paga UF2.....                                                        | 222 |
| Tabla 169 Reporte de estado de avance Paga UF3A - 3B.....                                                  | 224 |
| Tabla 170 Comunicaciones Autoridades Ambientales. ....                                                     | 228 |
| Tabla 171 Permisos otorgados.....                                                                          | 230 |
| Tabla 172 Relación de Permisos Obtenidos, Cerrados y Suspendidos. ....                                     | 230 |
| Tabla 173 Trámites en proceso Autoridades Ambientales .....                                                | 234 |
| Tabla 174 Tipo de Compensación .....                                                                       | 236 |
| Tabla 175 Obligación y estado del BAMA.....                                                                | 262 |
| Tabla 176 Compensación con CAR.....                                                                        | 263 |
| Tabla 177 Resumen de las RS de Levantamiento de Veda. ....                                                 | 264 |
| Tabla 178 Procesos Actos Administrativos .....                                                             | 268 |
| Tabla 179 Eventos Eximentes de Responsabilidad Ambiental .....                                             | 275 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b><br><b>de 2022</b>                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 17 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 180 Identificación nacederos UF 4 - UF5 .....                                                                                                                         | 276 |
| Tabla 181 Reuniones y/o Mesas de Trabajo.....                                                                                                                               | 283 |
| Tabla 182 Comunicaciones ambientales emitidas por la interventoría.....                                                                                                     | 283 |
| Tabla 181 Lista de radicados por el area HSE .....                                                                                                                          | 293 |
| Tabla 182 Lista hallazgos pendientes por respuesta de la Concesión.....                                                                                                     | 297 |
| Tabla 183 Lista capacitaciones, inducciones y charlas .....                                                                                                                 | 298 |
| Tabla 184 Listado de personal con infracción a normas de seguridad industrial.....                                                                                          | 299 |
| Tabla 185. Estadística de accidentalidad Personal Interventoria año 2023 .....                                                                                              | 301 |
| Tabla 186. Estadística de accidentalidad Personal Interventoria año 2024 .....                                                                                              | 301 |
| Tabla 187. Estadística de accidentalidad Personal Interventoria año 2025 .....                                                                                              | 302 |
| Tabla 190 Personal de Gestión Social del Concesionario .....                                                                                                                | 307 |
| Tabla 191 Personal de Gestión Social de la Interventoría.....                                                                                                               | 307 |
| Tabla 192 Seguimiento Sistema de información al usuario. ....                                                                                                               | 308 |
| Tabla 193 Seguimiento Programa de Atención al usuario – Manifestaciones de la comunidad. ..                                                                                 | 309 |
| Tabla 194 Discriminado número de Manifestaciones recibidas del 2015 a 2022 .....                                                                                            | 311 |
| Tabla 195 Discriminado número de Manifestaciones recibidas por mes 2023 – 2024 - 2025.....                                                                                  | 311 |
| Tabla 196 Discriminado número de Manifestaciones recibidas por mes marzo 2025 .....                                                                                         | 312 |
| Tabla 197 Evaluación y Autoevaluación Oficina .....                                                                                                                         | 313 |
| Tabla 198 Seguimiento Atención al usuario – Medios de Atención.....                                                                                                         | 313 |
| Tabla 199 Seguimiento Sistema de Atención al usuario – Medios de Atención. ....                                                                                             | 314 |
| Tabla 200 Ubicación Paneles LED o Paneles de Mensajería Variable (PMV) .....                                                                                                | 318 |
| Tabla 201 Seguimiento – Estrategia de Comunicación. ....                                                                                                                    | 321 |
| Tabla 202 Seguimiento– Estrategia de Información .....                                                                                                                      | 322 |
| Tabla 203 Capacitaciones comunidad .....                                                                                                                                    | 323 |
| Tabla 204 Seguimiento– Perturbaciones .....                                                                                                                                 | 324 |
| Tabla 205 Seguimiento Programa de Apoyo a la capacidad de gestión Institucional .....                                                                                       | 327 |
| Tabla 206 Resumen etapas de la gestión predial .....                                                                                                                        | 334 |
| Tabla 207 Consolidado de gestión predial unidad funcional 1 .....                                                                                                           | 335 |
| Tabla 208 Consolidado de gestión predial unidad funcional 2 .....                                                                                                           | 336 |
| Tabla 209 Gestión realizada de la UF 2 para el corte de marzo de 2025 desde su última actuación.<br>(Pendiente por confirmar algunos predios con El Concesionario) .....    | 337 |
| Tabla 210 Gestión de expropiaciones unidad funcional 2 .....                                                                                                                | 338 |
| Tabla 211 Consolidado de gestión predial unidad funcional 3.....                                                                                                            | 339 |
| Tabla 212 Gestión realizada de la UF 3 para el corte de diciembre de 2024 desde su última<br>actuación. (Pendiente por confirmar algunos predios con El Concesionario)..... | 339 |
| Tabla 213 Expropiaciones unidad funcional 3.....                                                                                                                            | 341 |
| Tabla 214 Gestión de expropiaciones unidad funcional 3 .....                                                                                                                | 341 |
| Tabla 215 Indicadores de la gestión predial Marzo 2025 .....                                                                                                                | 342 |
| Tabla 216 Predios Baldíos .....                                                                                                                                             | 343 |
| Tabla 217 Compromisos comité predial.....                                                                                                                                   | 343 |
| Tabla 218 Caso Especial Unidades UF 4 y 5.....                                                                                                                              | 347 |
| Tabla 219 UTILIZACIÓN DE LA SUBCUENTA DE PREDIOS EN PESOS CORRIENTES FEBRERO<br>2025 .....                                                                                  | 347 |
| Tabla 220 Reporte subcuenta predial (Fiducia) .....                                                                                                                         | 347 |
| Tabla 221 Reporte subcuenta predial Pagos reportados en febrero de 2025 .....                                                                                               | 348 |
| Tabla 222 Áreas remanentes y sobrantes .....                                                                                                                                | 349 |
| Tabla 223 Hallazgos enero 2025 .....                                                                                                                                        | 350 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 18 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 224 Comunicados enviados y recibidos por parte de la interventoría .....                                                                   | 351 |
| Tabla 303 Aportes Equity – Concesionario .....                                                                                                   | 361 |
| Tabla 226 Funciones Generales.....                                                                                                               | 408 |
| Tabla 227 Pólizas vigentes con corte a 31 de marzo de 2025.....                                                                                  | 411 |
| Tabla 228 Otrosíes al Contrato de Concesión No. 002 de 2014.....                                                                                 | 412 |
| Tabla 229 Eventos Eximentes de Responsabilidad .....                                                                                             | 414 |
| Tabla 230 Seguimiento Eventos Eximentes de Responsabilidad vigentes .....                                                                        | 415 |
| Tabla 231 Seguimiento informes Eventos Eximentes de Responsabilidad vigentes .....                                                               | 417 |
| Tabla 232 - Procesos sancionatorios que se han tramitado durante la ejecución del Contrato de Concesión No.002 de 2014 son los siguientes: ..... | 417 |
| Tabla 233. Procedimientos Administrativos Sancionatorios vigentes y en curso: .....                                                              | 476 |
| Tabla 234 Conceptos emitidos por el área jurídica de la Interventoría durante el mes de marzo de 2025 .....                                      | 495 |
| Tabla 235 Indicadores de calidad .....                                                                                                           | 501 |
| Tabla 236. Control de equipos de medición Interventoría .....                                                                                    | 503 |
| Tabla 237 Descripción del riesgo No.1 .....                                                                                                      | 506 |
| Tabla 238 Consolidado de gestión predial unidad funcional 1.....                                                                                 | 506 |
| Tabla 239 Consolidado de gestión predial unidad funcional 2 .....                                                                                | 507 |
| Tabla 240 Consolidado de gestión predial unidad funcional 3.....                                                                                 | 508 |
| Tabla 241 Descripción del riesgo No.2 .....                                                                                                      | 509 |
| Tabla 242 Reporte subcuenta predial Pagos reportados en febrero de 2025 .....                                                                    | 510 |
| Tabla 243 Reporte subcuenta predial Pagos reportados en febrero de 2025 .....                                                                    | 510 |
| Tabla 244 Descripción del riesgo No.3 .....                                                                                                      | 512 |
| Tabla 245 Descripción del riesgo No.4 .....                                                                                                      | 512 |
| Tabla 246 Descripción del riesgo No.5 .....                                                                                                      | 513 |
| Tabla 247 Descripción del riesgo No.6 .....                                                                                                      | 514 |
| Tabla 248 Descripción del riesgo No.7 .....                                                                                                      | 515 |
| Tabla 249 Descripción del riesgo No.8 .....                                                                                                      | 517 |
| Tabla 250 Descripción del riesgo No.9 .....                                                                                                      | 517 |
| Tabla 251 Traslados y pendientes de Redes por unidad Funcional.....                                                                              | 518 |
| Tabla 252 Ejecución Subcuenta Redes (\$ constantes) .....                                                                                        | 519 |
| Tabla 253 Valor estimado Redes.....                                                                                                              | 520 |
| Tabla 254 Descripción del riesgo No.10 .....                                                                                                     | 520 |
| Tabla 255 Relación de Estudios y Diseños No Objetados.....                                                                                       | 520 |
| Tabla 256 Descripción del riesgo No.11 .....                                                                                                     | 522 |
| Tabla 257 Descripción del riesgo No.12 .....                                                                                                     | 523 |
| Tabla 258 Descripción del riesgo No.13 .....                                                                                                     | 524 |
| Tabla 259 Descripción del riesgo No.14 .....                                                                                                     | 525 |
| Tabla 260 Descripción del riesgo No.15 .....                                                                                                     | 525 |
| Tabla 261 Descripción del riesgo No.16 .....                                                                                                     | 526 |
| Tabla 262 Descripción del riesgo No.17 .....                                                                                                     | 526 |
| Tabla 263 Descripción del riesgo No.18 .....                                                                                                     | 527 |
| Tabla 264 Descripción del riesgo No.19 .....                                                                                                     | 528 |
| Tabla 265 Descripción del riesgo No.20 .....                                                                                                     | 528 |
| Tabla 266 Descripción del riesgo No.21 .....                                                                                                     | 529 |
| Tabla 267 Descripción del riesgo No.22 .....                                                                                                     | 529 |
| Tabla 268 Descripción del riesgo No.23 .....                                                                                                     | 530 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 19 de 591</b></p>                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 269 Descripción del riesgo No.24 .....                                                                                                   | 532 |
| Tabla 270 Descripción del riesgo No.25 .....                                                                                                   | 533 |
| Tabla 271 Descripción del riesgo No.26 .....                                                                                                   | 533 |
| Tabla 272 Descripción del riesgo No.27 .....                                                                                                   | 534 |
| Tabla 273 Descripción del riesgo No.28 .....                                                                                                   | 536 |
| Tabla 274 Descripción del riesgo No.29 .....                                                                                                   | 536 |
| Tabla 275 Descripción del riesgo No.30 .....                                                                                                   | 537 |
| Tabla 276 Descripción del riesgo No.31 .....                                                                                                   | 537 |
| Tabla 277 Descripción del riesgo No.32 .....                                                                                                   | 539 |
| Tabla 278 Eventos Eximentes de Responsabilidad Vigentes .....                                                                                  | 539 |
| Tabla 279 Lineamientos ANI Costos Ociosos .....                                                                                                | 541 |
| Tabla 280 Acuerdo No.2 .....                                                                                                                   | 546 |
| Tabla 281 Estimación de costos por menor recaudo Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ....                                            | 548 |
| Tabla 282 Descripción del riesgo No.33 .....                                                                                                   | 548 |
| Tabla 283 Descripción del riesgo No.34 .....                                                                                                   | 549 |
| Tabla 284 Descripción del riesgo No.35 .....                                                                                                   | 549 |
| Tabla 285 Descripción del riesgo No.36 .....                                                                                                   | 551 |
| Tabla 286 Descripción del riesgo No.37 .....                                                                                                   | 552 |
| Tabla 287 Descripción del riesgo No.1.2.1 .....                                                                                                | 552 |
| Tabla 288 Valoración riesgos .....                                                                                                             | 554 |
| Tabla 289 Presupuesto estimado que se espera ejecutar durante la vigencia del proyecto con corte informe financiero 30 de Diciembre 2024 ..... | 556 |
| Tabla 290 Trazabilidad del Evento de responsabilidad Eximente .....                                                                            | 561 |
| Tabla 291 Identificación nacederos UF 4 - UF5 .....                                                                                            | 563 |
| Tabla 292 Personal del Proyecto .....                                                                                                          | 583 |
| Tabla 293 Equipos de Cómputo de Interventoría .....                                                                                            | 585 |
| Tabla 294 Equipos de Comunicación de Interventoría .....                                                                                       | 585 |
| Tabla 295 Vehículos .....                                                                                                                      | 585 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 20 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1 Localización General POC .....                           | 39  |
| Figura 2 Accidentalidad acumulada en el proyecto .....            | 101 |
| Figura 3 Acumulado histórico de la accidentalidad .....           | 108 |
| Figura 4 Acumulado Trafico vs Muertos.....                        | 108 |
| Figura 5 Acumulado N° de accidentes vs Trafico .....              | 109 |
| Figura 6 Acumulado N° de heridos vs Trafico .....                 | 109 |
| Figura 7 Evaluación E1 Iri UF1A.....                              | 128 |
| Figura 8 Evaluación E1 Iri UF1B.....                              | 129 |
| Figura 9 Evaluación E2 Ahuellamiento UF1A .....                   | 130 |
| Figura 10 Evaluación E2 Ahuellamiento UF1B.....                   | 130 |
| Figura 11 Evaluación E4 Fricción Transversal UF1A .....           | 131 |
| Figura 12 Evaluación E4 Fricción Transversal UF1B .....           | 132 |
| Figura 13 Evaluación E5 Textura UF1A.....                         | 132 |
| Figura 14 Evaluación E5 Textura UF1B.....                         | 133 |
| Figura 15 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF1.....         | 135 |
| Figura 16 Evaluación E16 Capacidad Estructural UF1A .....         | 138 |
| Figura 17 Evaluación E16 Capacidad Estructural UF1B .....         | 138 |
| Figura 18 Evaluación O4.....                                      | 140 |
| Figura 19 Evaluación O5.....                                      | 141 |
| Figura 20 Evaluación E1 Iri UF2A.....                             | 142 |
| Figura 21 Evaluación E1 Iri UF2B.....                             | 142 |
| Figura 22 Evaluación E2 Ahuellamiento UF2A.....                   | 143 |
| Figura 23 Evaluación E2 Ahuellamiento UF2B.....                   | 143 |
| Figura 24 Evaluación E5 Textura UF2A.....                         | 145 |
| Figura 25 Evaluación E5 Textura UF2B.....                         | 146 |
| Figura 26 Evaluación indicador E12 Señalización Horizontal .....  | 148 |
| Figura 27 Evaluación O4 UF2 .....                                 | 152 |
| Figura 28 Evaluación O5 UF2 .....                                 | 152 |
| Figura 29 Evaluación E1 UF3A .....                                | 153 |
| Figura 30 Evaluación E1 UF3B .....                                | 154 |
| Figura 31 Evaluación E2 UF3A .....                                | 154 |
| Figura 32 Evaluación E2 UF3B .....                                | 155 |
| Figura 33 Comportamiento indicador E4 UF3A.....                   | 156 |
| Figura 34 Comportamiento indicador E4 UF3B.....                   | 156 |
| Figura 35 Comportamiento indicador E5 UF3A.....                   | 157 |
| Figura 36 Comportamiento indicador E5 UF3A.....                   | 157 |
| Figura 37 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF3.....         | 160 |
| Figura 38 Evaluación E16 UF3A.....                                | 162 |
| Figura 39 Evaluación E16 UF3B.....                                | 162 |
| Figura 40 Evaluación O4 UF3 .....                                 | 164 |
| Figura 41 Evaluación O5 UF3. ....                                 | 165 |
| Figura 42 Estado general por periodo de los indicadores UF1. .... | 166 |
| Figura 43 Seguimiento de acciones correctivas UF1 .....           | 167 |
| Figura 44 Cálculo índice de cumplimiento UF1.....                 | 168 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 21 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 45 Estado general por periodo de los indicadores UF2. ....  | 169 |
| Figura 46 Seguimiento acciones correctivas UF2. ....               | 170 |
| Figura 47 Cálculo índice de cumplimiento UF2. ....                 | 170 |
| Figura 48 Estado general por periodo de los indicadores UF3. ....  | 172 |
| Figura 49 Seguimiento acciones correctivas UF3. ....               | 173 |
| Figura 50 Cálculo índice de cumplimiento UF3. ....                 | 174 |
| Figura 51 Tráfico promedio mes a mes peaje SOPÓ. ....              | 187 |
| Figura 52 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025.....      | 187 |
| Figura 53 Tráfico promedio mes a mes peaje LA CABAÑA .....         | 188 |
| Figura 54 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025.....      | 188 |
| Figura 55 Tráfico Promedio Mes A Mes Peaje De Los Patios .....     | 189 |
| Figura 56 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025.....      | 189 |
| Figura 57 Comparativo Aforo 7x24 Peaje Sopó .....                  | 191 |
| Figura 58 Comparativo Aforo 7x24 Peaje La Cabaña. ....             | 192 |
| Figura 59 Comparativo Aforo 7x24 Peaje Los Patios .....            | 193 |
| Figura 60 . Norma de Alcaldía Mayor de Bogotá.....                 | 293 |
| Figura 61 Número de Manifestaciones recibidas por 2024 - 2025..... | 312 |
| Figura 62 Número de Manifestaciones recibidas por UF.....          | 313 |
| Figura 63 Cronos .....                                             | 502 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 22 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

## ÍNDICE DE ANEXOS

- Anexo 1 Técnico
- Anexo 2 Operación y mantenimiento
- Anexo 3 Peajes
- Anexo 4 Gestión Ambiental
- Anexo 5 SHE
- Anexo 6 Gestión Social
- Anexo 7 Control de Correspondencia Enviada y Recibida
- Anexo 8 Seguimiento de correspondencia del mes de marzo de 2025 - ANI
- Anexo 9 Plan de mejoramiento Auditoria Control Interno ANI 2023
- Anexo 10 Calidad
- Anexo 11 Acta de remuneración de Interventoría marzo 2025
- Anexo 12 Gestión Predial

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 23 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 1 INTRODUCCIÓN

El 8 de septiembre de 2014 la ANI y la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., firmaron el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 cuyo alcance del proyecto es la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del corredor Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.

Así mismo la ANI y el CONSORCIO INTERVÍAS 4G, celebraron el Contrato de Interventoría No. 169 del 12 de noviembre de 2014, de esta forma el CONSORCIO INTERVÍAS 4G adelantó las labores de Interventoría hasta el 31 de octubre de 2022.

Desde el 3 de noviembre de 2022, la Interventoría la adelanta el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, en virtud del Contrato de Interventoría No. VEJ 542 del 31 de octubre de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2014, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA", DEL PROYECTO "VICTORIAS TEMPRANAS".

En el actual informe se resumen las principales actividades desarrolladas por la sociedad concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá, S.A.S., durante el mes de marzo de 2025, dentro de la Etapa Preoperativa – Fase de Construcción, la cual finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024, en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente -; fallo compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el día 20 de diciembre de 2024), donde resuelve definitivamente las controversias entre las Partes en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de jurisdicción, responsabilidad y daños. En el Capítulo V de la Parte Resolutiva, numeral 900, subnumeral 9, se indica:

" (...)

*9. Estima fundada la pretensión subsidiaria de la ANI sobre Terminación Anticipada y declara la terminación del Contrato. La Terminación Anticipada es acogida en virtud de lo dispuesto en la Sección 14.1(e) del Contrato de Concesión, pero sobre la base de una causa imputable a la ANI al no haber detectado oportunamente los manantiales. (...). Se declara la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la fecha de la notificación de este Laudo..."*

En el presente Informe, se describen los principales temas que se creen más notables para el desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 y el seguimiento efectuado por parte del CONSORCIO INTERVENTOR ERS.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 24 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Es de aclarar que el 5 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, realizó la entrega de la información actualizada del Proyecto (un disco duro de 1,38 TB) Perimetral del Oriente de Cundinamarca, radicada por la anterior interventoría Consorcio Intervias 4G, en el marco de la terminación del contrato No. 169 de 2014, confirmada mediante el comunicado con radicado de salida ANI No. 20233060161301 del 12 de mayo de 2023; este informe contiene las actividades desarrolladas por el CONSORCIO INTERVENTOR ERS durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2025.

Es de resaltar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión 002 de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo respectivamente, - fallo compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el día 20 de diciembre de 2024 entrando a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato; debe tenerse en cuenta que se hace necesario considerar el reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ – 542 del 31 de octubre de 2022, ya que cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 25 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato del 31 de octubre de 2022, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Consorcio Interventor ERS:

Objeto: Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Social, Predial, Ambiental, Administrativa, de Seguros, Riesgos, Operativa, Mantenimiento, Administrativa de Aforo y Recaudo y de Gestión de Calidad al Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2014.

Contrato de Interventoría No.: VEJ 542 del 31 de octubre de 2022

Representante legal: Erika Liliana Acosta Álzate.

Fecha del Acta de Inicio: 3 de noviembre de 2022

Plazo contractual: 48 meses

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026

Valor Contrato: La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y siguiendo las fórmulas establecidas en la presente cláusula de la siguiente manera: Pagos mensuales por un valor máximo de \$244.419.704\* correspondientes a la Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las Unidades Funcionales construidas y pendientes por ejecutar hasta por 48 meses. El valor del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad es de \$244.419.704.

\* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% y demás gastos y tributos a que haya lugar, de conformidad con las normas vigentes.

Es de precisar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo (19 de diciembre de 2024), el 20 de diciembre de 2024 se dio inicio a la etapa de Reversión y posterior Liquidación del Contrato; por lo cual y en atención al alcance contractual debe tenerse en cuenta que se deberá considerar el reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ – 542 del 31 de octubre de 2022, ya que cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y posterior Liquidación del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014.

Por lo anterior, esta Interventoría mediante las comunicaciones CERS-OP-0025-2025 radicado ANI 20254090025512 del 10 de enero de 2025, CERS-OP-0102-2025 radicado ANI 20254090079472 del 22 de enero de 2025 y CERS-OP- 0126-2025 radicado ANI 20254090100002 del 27 de enero de 2025, solicitó a la Entidad instruir prioritariamente cómo proceder con las mesas de trabajo solicitadas por el Concesionario frente a la Etapa de Reversión y así mismo dar las claridades necesarias en referencia al alcance y modificaciones necesarias a realizar al Contrato de Interventoría frente a la Etapa de Reversión y posterior Liquidación.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 26 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Con la comunicación CERS-OP-0427-2025 radicado ANI 20254090334262 del 14 de marzo de 2025, se remitió la propuesta de modificación requerida a la plantilla de personal del contrato de interventoría VEJ-542 de 2022.

## 2.1 GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mediante el comunicado de salida ANI No. 20233060033511 de fecha 3 de febrero de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura da aprobación a la Póliza del Contrato de Interventoría No. 542 del 2022, suscrito con la Interventoría CONSORCIO ERS, acorde con lo siguiente:

**Tabla 1 Pólizas de Cumplimiento**

| Amparos                                                                     | Partes                              |              | Vigencia  |           | Valor Asegurado      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
|                                                                             | Asegurado                           | Beneficiario | Desde     | Hasta     |                      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |              | 3/11/2022 | 4/05/2027 | \$ 10.026.146.946,00 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales |                                     |              | 3/11/2022 | 4/11/2029 | \$ 1.253.268.368,00  |
| Calidad del servicio                                                        |                                     |              | 3/11/2026 | 4/11/2028 | \$ 2.506.536.736,00  |

Valor total de la Póliza: \$13.785.952.050,00. Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura

Mediante el comunicado de salida ANI 20233060033511 del 3 de febrero de 2023, se da aprobación a la póliza de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022.

## 2.2 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Tabla 2 Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual**

| Amparos                                       | Partes                              |              | Vigencia  |           | Valor Asegurado      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
|                                               | Asegurado                           | Beneficiario | Desde     | Hasta     |                      |
| Predios, labores y operaciones                | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |              | 3/11/2022 | 4/11/2023 | \$ 13.250.000.000,00 |
| Contratistas y subcontratistas independientes |                                     |              | 3/11/2022 | 4/11/2023 | \$ 13.250.000.000,00 |
| Patronal                                      |                                     |              | 3/11/2022 | 4/11/2023 | \$ 13.250.000.000,00 |
| Vehículos propios y no propios                |                                     |              | 3/11/2022 | 4/11/2023 | \$ 13.250.000.000,00 |
| Responsabilidad civil Cruzada                 |                                     |              | 3/11/2022 | 4/11/2023 | \$ 13.250.000.000,00 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 27 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Amparos        | Partes    |              | Vigencia  |           | Valor Asegurado      |
|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
|                | Asegurado | Beneficiario | Desde     | Hasta     |                      |
| Gastos médicos |           |              | 3/11/2022 | 4/11/2023 | \$ 13.250.000.000,00 |

Valor total de la Póliza: \$13.250.000.000,00

Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura

Nota: Las garantías descritas, fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones establecidas en el Contrato No. 542 de 2022, sobre el particular, verificando que se ajustan a éstas y a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, conforme a lo indicado en memorando de la Gerencia Jurídica con radicado ANI No. 20227050133753 03 de noviembre del 2022 y correo electrónico de la Gerencia Financiera del 02 de noviembre del 2022, en consecuencia, en mi condición de Vicepresidente Ejecutiva debidamente facultada, procedo a su aprobación.

Es de precisar que, mediante la comunicación 5143051ANI - CERS-OP-2598-2024 del 13 de noviembre de 2024 (con radicado ANI Numero 20244091416662), con el asunto: Actualización de Pólizas, el Consorcio Interventor ERS., remite a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, las pólizas de RCE que amparan el contrato de Interventoría de la referencia VEJ-542 de 2022, debidamente actualizadas, con vigencia del 01/11/2024 al 04/11/2025.

De la misma manera, mediante la comunicación, 5143051ANI - CERS-OP-2613-2024 del 15 de noviembre de 2024, (con radicado ANI Numero 20244091416662), el consorcio Interventor ERS, remite a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el soporte de pago de las pólizas de RCE, que amparan el contrato VEJ-542 de 2022

| AMPAROS                                    | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO   |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
|                                            | DEL        | AL         |                   |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL | 03/11/2023 | 04/11/2025 | 17.225.000.000,00 |

Mediante el comunicado de salida ANI 20253060030411 del 29 de enero de 2025, se da aprobación a la póliza de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022 (Respuesta radicado ANI 20244090053332. Aprobación Póliza de Interventoría el Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022.

### 2.3 ACTAS CONTRATO INTERVENTORÍA

El 3 de noviembre de 2022 se suscribió entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Consorcio Interventores ERS el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. VEJ 542 del 31 de octubre de 2022 Conforme lo siguiente:

**Fecha del Acta de Inicio:** 03 de noviembre de 2022

**Plazo contractual:** 48 meses

**Fecha Terminación:** 02 de noviembre de 2026



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 28 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 3 CONTRATO DE CONCESIÓN

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 del 8 de septiembre de 2014, Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, fue suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., con fecha de inicio del 19 de diciembre de 2014, conforme al Acta de Inicio suscrita entre las partes.

#### 3.1 GENERALIDADES

**Tabla 3 Ficha del Contrato**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>                                         | 002-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modalidad</b>                                        | Concesión bajo el esquema de APP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Concedente</b>                                       | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Concesionario</b>                                    | Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. – POB<br>Shikun & Binui VT AG 48,1250%<br>Colombiana Inversiones de Infraestructura S.A.S. 1,8750%<br>InfraRed Infraestructure Colombia SLU 49,9995%<br>InfraRed Infraestructure Colombia LP 0,0005%                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alcance</b>                                          | Financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial Perimetral del Oriente de Cundinamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha suscripción</b>                                | 08-sep-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mes de Referencia</b>                                | 31-dic-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha Acta de Inicio</b>                             | 19-dic-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha de inicio</b>                                  | 20-dic-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha de Acta de Terminación de Unidad Funcional</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de terminación de Unidad Funcional 1: 01 de febrero de 2019.</li> <li>Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 2: 17 de octubre de 2019</li> <li>Acta de terminación de Unidad Funcional 2: 31 de agosto de 2021</li> <li>Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 3: 07 de noviembre de 2019</li> <li>Acta de terminación de Unidad Funcional 3: 08 de abril de 2022</li> </ul> |
| <b>Valor del Contrato</b>                               | \$ 1.647.776.111.169 (a pesos de diciembre del 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Fuente: Informe Gerencial Sociedad Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá SAS – CIERS

El Contrato de Concesión No. 002 de 2014 tiene como alcance principal la Financiación, Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Perimetral del Oriente de Cundinamarca.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 29 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

El Proyecto de Concesión corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca, cuenta con una longitud aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el departamento de Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la Autopista Norte de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá – Villavicencio, discuriendo por el Oriente de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, Salitre – Guasca, Salitre – La Calera, Guasca – Sesquilé, Patios – La Calera, Límite Bogotá – Choachí, La Calera- Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre los Municipios de Sopó, La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza, proporcionando el comercio y el transporte entre el norte del país y el municipio de Villavicencio; adicionalmente interconectará los demás Municipios del Oriente Colombiano.

Geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como se evidencia en la figura No. 1 – Localización General POC, conformando la unión e integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. En la tabla 4 se indica la descripción general de cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto.

### 3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDADES FUNCIONALES

A continuación, se presenta una descripción general del proyecto, conforme lo establecido en el Otrosí 10:

**Tabla 4 Descripción General de las Unidades Funcionales**

| UF | SECTOR                     | CALZADA  | PR INICIAL                                                                            | PR FINAL                                                        | LONG  | CUMPLE LEY 105 | ALCANCE GENERAL                         |
|----|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------|
| 1  | Salitre - K3+300           | Sencilla | 23+640<br>R5009                                                                       | 27+092<br>Ruta 5009                                             | 3,3   | NO             | Mejoramiento                            |
|    | K3+300 – Guasca            | Sencilla | 27+092<br>R5009                                                                       | 34+660<br>R5009<br>Guasca<br>1.029.917,79 N<br>1.021.886,34 E   | 7,88  | NO             | Rehabilitación                          |
|    | Cuatro Esquinas - Sesquilé | Sencilla | 0+000<br>R0804<br>Intersección<br>hacia Guatavita<br>1.030.838,40 N<br>1.020.312,29 E | 27+282<br>R0803<br>Sesquilé<br>1.050.803,64 N<br>1.031.220,67 E | 27,24 | NO             | Rehabilitación                          |
| 2  | Sopó -Salitre              | Sencilla | 0+000<br>R50CN03                                                                      | 10+500<br>R50CN03                                               | 10,5  | SI             | Mejoramiento trazado y sec. Transversal |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 30 de 591</b>                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | SECTOR               | CALZADA  | PR INICIAL                                                                        | PR FINAL                                                                     | LONG  | CUMPLE LEY 105 | ALCANCE GENERAL                         |
|----|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------|
|    | Salitre - La Calera  | Sencilla | Sopó<br>1.035.082,85 N<br>1.014.968,17 E<br>23+652<br>Salitre<br>Ruta 5009        | Salitre<br>PR 23+652<br>Ruta 5009<br>9+992<br>La Calera<br>Ruta 5009         | 13,58 | SI             |                                         |
| 3  | La Calera – Patios   | Sencilla | Calera<br>9+992<br>Ruta 5009                                                      | 0+000<br>Patios<br>1.007.516,34 N<br>1.007.409,20 E                          | 9,92  | SI             | Mejoramiento                            |
|    | Lim. Bogotá- Choachí | Sencilla | 0+000<br>Límite Bogotá<br>996.591,086 N<br>1.007.966,919 E                        | 22+620<br>Choachí<br>992.350,33 N<br>1.017.006,49 E                          | 22,62 | NO             | Rehabilitación                          |
| 4  | La Calera - Choachí  | Sencilla | 11+212<br>La Calera<br>Ruta 5009                                                  | 38+700<br>R40CN06<br>Choachí<br>993.075,76 N<br>1.017.389,99 E               | 31    | SI             | Mejoramiento trazado y sec. Transversal |
| 5  | Choachí Cáqueza      | Sencilla | 23+850<br>Choachí<br>991.538,69 N<br>1.017.215,87 E                               | 51+000<br>R4006A<br>26+360<br>R4006                                          | 21,27 | SI             | Mejoramiento trazado y sec. Transversal |
|    | Variante de Choachí  | Sencilla | 36+800<br>R40CN06<br>Inicio Variante de Choachí (Al norte de Choachí Ruta 40CN06) | 25+428<br>R4006A<br>Final Variante de Choachí (Al sur de Choachí Ruta 4006A) | 4,85  | SI             | Construcción                            |

Fuente: Elaboración Propia - Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones – Otrosí 10

### 3.3 ETAPAS DEL CONTRATO

#### ETAPA PREOPERATIVA – FASE DE CONSTRUCCIÓN:

Duración estimada de 1.080 días, desde la fecha del Acta de inicio de la etapa de Construcción, el 16 de enero de 2016. Finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 31 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente) – (compartido desde la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, el día 20 de diciembre de 2024).

### ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 2.4 (b) Parte General. Finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024, en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente) - (compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, el día 20 de diciembre de 2024).

### ETAPA DE REVERSIÓN:

Esta etapa Inicia una vez haya terminado la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Se da inicio de manera anticipada, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente), - (compartido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, el 20 de diciembre de 2024).

Finaliza con la suscripción del Acta de Reversión.

Es de aclarar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo, entrando a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato, debe tenerse en cuenta que se hace necesario considerar el reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ – 542 del 31 de octubre de 2022, ya que cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014.

### 3.4 ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

El Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014, se encontraba en la Etapa de Operación y Mantenimiento, para las Unidades Funcionales UF1, UF2 y UF3; las Unidades Funcionales UF4 y UF5 fueron suspendidas a causa de un Evento Eximente de Responsabilidad – EER, encontrándose en Etapa Preoperativa – Fase de Construcción, la cual finalizó anticipadamente conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 32 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Es de advertir que, en las Unidades Funcionales 4 y 5, según el acta del 1 de agosto de 2018, se suspendieron ciertas actividades y se mantuvieron vigentes otras tantas, así:

**Tabla 5. Obligaciones suspendidas y no suspendidas por el Acta del 1 de Agosto de 2018**

| OBLIGACIONES SUSPENDIDAS                                                                       | OBLIGACIONES NO SUSPENDIDAS                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Todas las obras de mejoramiento y construcción asociadas a las intervenciones de las UF 4 y 5. | Obligaciones con terceros y autoridades.                                            |
|                                                                                                | Gestión social.                                                                     |
|                                                                                                | Obligaciones financieras.                                                           |
| Actividades de gestión ambiental y redes.                                                      | Intervenciones prioritarias.                                                        |
|                                                                                                | Obligaciones de operación y mantenimiento de la etapa preoperativa de las UF 4 y 5. |
|                                                                                                | Garantizar protección y estabilidad de lo construido hasta el 01/08/2018.           |

Fuente: Elaboración propia.

Es de precisar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo, entrando a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato, debe tenerse en cuenta que se hace necesario considerar el reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ – 542 del 31 de octubre de 2022, ya que cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014.

### 3.4.1 Suscripción del Contrato de Concesión

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 fue suscrito entre las partes: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. – POB S.A.S., el 8 de septiembre de 2014.

Inicialmente, el Concesionario es la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S, conformada por SHIKUN & BINUI VT AG, COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.S y C.I. GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, representada en este acto por el señor ALBER ALHADEF, en su calidad de Gerente General.

En el mes de septiembre de 2015, se tramitó ante la ANI el cambio de la composición accionaria del Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., determinando la salida de GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES como accionista del consorcio concesionario.

En el mes de enero de 2017, mediante comunicación No. POB: 2096-2016 –con radicado ANI No. 2016-409-119809-2– la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la existencia de nuevos accionistas, en el cual se indica que la participación accionaria de las sociedades INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP ("INFRARED II) e INFRARED

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 33 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U ("INFRARED I) en POB S.A.S, la cual sería la siguiente:

**Tabla 6 Composición Accionaria**

| Nombre del accionista                                 | %           |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Shikun & Binui VT AG * <b>Único Líder</b>             | 48.125 %    |
| INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U. ("INFRARED I) | 49.9995%    |
| COLOMBIANA INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.      | 1.875%      |
| INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP ("INFRARED II)    | 0.0005%     |
| <b>Total</b>                                          | <b>100%</b> |

Fuente: Elaboración propia.

### 3.4.2 Inicio Contrato de Concesión

La fecha de inicio del Contrato de Concesión es del 19 de diciembre de 2014. Así mismo, el Acta de Inicio de la Fase de Construcción fue firmada entre las Partes el 16 de enero de 2016, pero con efectos desde el 15 de diciembre de 2015, según Otrosí No. 4 del Contrato de Concesión.

### 3.4.3 Modificaciones al Contrato de Concesión

Se muestra enseguida la descripción de los Otrosíes suscritos en el desarrollo del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014.

**Tabla 7 Modificaciones contractuales**

| DOCUMENTO    | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Otrosí No. 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar el Literal (b) del numeral 2.3 de la Parte general del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.</li> <li>- Adicionar el literal L) al numeral 15.12 de la Parte general del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | 19-dic-2014 |
| Otrosí No. 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar el numeral 3.3.9.2 del Apéndice 2 "Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras" del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.</li> <li>- Modificar el numeral 19.17 de la "Tabla de Referencias de la Parte General" prevista en el Capítulo II de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.</li> </ul>                                                                                  | 27-may-2015 |
| Otrosí No. 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aclarar la Tabla 10 – UF2. Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal b).</li> <li>- Aclarar la Tabla 14 – UF3. Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal c).</li> </ul> | 02-dic-2015 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 34 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| DOCUMENTO    | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aclarar la Tabla 17 – UF4. Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d).</li> <li>- Modificar la Tabla 9 – UF 2: Obras especiales mínimas, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal b).</li> <li>- Modificar la Tabla 16 – UF 4: Obras especiales mínimas, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Otrosí No. 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la Sección 5.2 Programación de obras de la Parte Especial, en el cual se presentan los plazos máximos para el inicio de operación de las Unidades Funcionales, plazos que deberán contarse a partir del 15 de diciembre de 2015.</li> <li>- Se aclara que, con relación al plazo máximo de ejecución, para el inicio de la operación de las U.F. 4 y 5, para determinar el Plazo de Cura previsto en el último párrafo del de la sección 6.1(c) de la Parte Especial del Contrato y sólo en el evento en el que el Concesionario no logre terminar las intervenciones en el plazo máximo de ejecución, el Interventor otorgará al Concesionario un Plazo de Cura entre el 10% y el 20% del plazo previsto en el Contrato para la terminación de las U.F. 4 y 5.</li> </ul>                                                                                                      | 18-Abr-2016 |
| Otrosí No. 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante el cual se modificaron diversas secciones del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesión N° 002 de 2014</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19-Ago-2016 |
| Otrosí No. 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la Tabla 16 – UF 4: Obras especiales mínimas, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d)</li> <li>- Aclarar la Tabla 17 – UF4. Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d).</li> <li>- Modificar la Tabla 21-UF5: Características Geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1, numeral 2.5 literal e).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03-Nov-2016 |
| Otrosí No. 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adicionar a la sección 3.3.3.2.3 del apéndice técnico 2. "emisora de radio" los párrafos desde el tercero en adelante.</li> <li>- Aclarar modificar la tabla contenida en la sección 3.3. (a) de la parte especial del contrato de concesión.</li> <li>- Modificar la Tabla I – descripción de vías existentes comprendidas en el proyecto del Apéndice Técnico I del contrato de concesión.</li> <li>- Modificar la Tabla 3 – "Unidades Funcionales del Proyecto" del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión.</li> <li>- Modificar la tabla 4 – UF1- "Generalidades y subsectores" del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión.</li> <li>- Modificar la tabla 5 – UF1- "Obras especiales mínimas" del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión.</li> <li>- Modificar la tabla 24 – UF1- "Puentes Peatonales" del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión.</li> </ul> | 05-Feb-2018 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 35 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| DOCUMENTO     | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adicionar la tabla 5A "UF1 Obras especiales mínimas adicionales" al Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Otrosí No. 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.3.10.2 <i>Sistemas de Comunicación</i> del Apéndice Técnico 2.</li> <li>- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.4 (b) del Apéndice Técnico 1, en lo que respecta a las Unidades Funcionales 1 y 3 Subsector 2. (3.4. <i>Sistemas de comunicación y postes SOS</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23-Ago-2019 |
| Otrosí No. 9  | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Modificaciones referentes a la delimitación de las coordenadas de inicio de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la Tabla 1 - "Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto" del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión.</li> <li>- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 7).</li> <li>- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión.</li> <li>- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos" del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión.</li> <li>- Modificar la Sección 3.3 de la Parte Especial del Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 7).</li> </ul> </li> <li><b>Modificaciones referentes a los bienes, insumos y recursos entregados a la Policía de Carreteras.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar el Numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 "Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras" del Contrato de Concesión N° 002 de 2014 (según dicho numeral había sido modificado por el Otrosí No. 2)</li> </ul> </li> <li><b>Modificaciones referentes a la regulación de las Pólizas de Seguro.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adicionar el romanito (vi) a la Sección 12.8 de la Parte General del Contrato de Concesión, la cual quedará así: 12.8 Seguro de daños contra todo riesgo.</li> </ul> </li> </ol> | 08-Mar-2021 |
| Otrosí No. 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar el alcance de las Intervenciones en lo que respecta a las características geométricas y técnicas de la vía existente en el sector comprendido entre el K8+750 y el K9+020 (coordenadas I.007.284,865N, I.008.129,950E y I.007.089,147N I.008.005,819E), que corresponde a una longitud de 0,27 km, del municipio de La Calera de la Unidad Funcional 3 Subsector 1 del Proyecto, adelantando las intervenciones autorizadas con su respectiva Operación y Mantenimiento de acuerdo con los términos del Contrato de Concesión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5-Nov-2021  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 36 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| DOCUMENTO     | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", contenida en la Sección 2.4 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 9).</li> <li>- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" contenida en la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 9).</li> <li>- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos" contenida en la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente modificada mediante Otrosíes No. 3 y 9).</li> <li>- Adicionar el Numeral 3.8 en el Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión en los siguientes términos: 3.8 Paraderos: El Concesionario deberá ejecutar los siguientes Paraderos en la Unidad Funcional 3 del Proyecto, como Obras de Sustitución.</li> <li>- Modificar el numeral 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2).</li> <li>- Modificar el numeral 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2).</li> <li>- Modificar los Indicadores O2 y O3 contenidos en la Tabla 3 "Indicadores Pavimento Rígido y Flexible" del Apéndice Técnico 4 del Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje ubicada en la Unidad Funcional 3 Subsector 2, creándose la Tabla 3A.- Indicadores O2 y O3 Pavimento Rígido y Flexible - Estación de Peaje ubicada en la Unidad Funcional 3 Subsector 2</li> <li>- Ajustar la Tabla 25 - Estaciones de Peaje del Apéndice Técnico 1.</li> </ul> |             |
| Otrosí No. 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la Tabla 24 contenida en la Sección 3.5 (a) del Apéndice Técnico No. 1 del Contrato de Concesión (que a su vez había sido modificada por el Otrosí No. 7).</li> <li>- Adicionar el Numeral 3.9 en el Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión...3.9. Paso peatonal tipo cebra, resaltos parabólicos, paraderos, andenes y pompeyano en la Unidad Funcional 2: El Concesionario deberá ejecutar Obras de Sustitución.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-Dic-2021 |
| Otrosí No. 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificar la Cláusula Primera: Adicionar y Modificar diferentes secciones del Capítulo I "Definiciones" de la Parte General del Contrato de Concesión de APP No. 002 de 2014.</li> <li>- Modificar la Cláusula Segunda: Modificar la sección 4.17 de la Parte General del Contrato de Concesión APP No. 002 de 2014.</li> <li>- Cláusula Tercera: Adicionar los literales (e), (f), (g) y (h) a la sección 7.1. de la Parte General del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 "...Generalidades Gestión Predial..."</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20-Dic-2022 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 37 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| DOCUMENTO | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cláusula Cuarta: Modificar la sección 4.3 (b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 “...Cálculo de la Retribución...”.</li> <li>- Cláusula Quinta: Modificar el numeral 2.5. <i>Alcance de las Unidades Funcionales del Apéndice Técnico1</i> en relación con la remisión que hace a la sección 4.17 de la Parte General.</li> <li>- Cláusula Sexta: Vigencia y régimen de Transición.</li> <li>- Cláusula Séptima: Riesgos. ...En el presente Otrosí no conlleva modificación del esquema de asignación de riesgos.</li> <li>- Cláusula Octava: El Concesionario deberá tramitar dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del presente Otrosí, ante las compañías aseguradoras...</li> <li>- Cláusula Novena – Vigencia y Liquidez de lo no Modificado: ...conservan plena y total, vigencia y validez.</li> <li>- Cláusula Décima: DECLARACIONES.</li> <li>- Cláusula Décima Primera: Perfeccionamiento.</li> </ul> |       |

Fuente: Elaboración Propia

#### 3.4.4 Estado de Pólizas Vigentes

El estado de las pólizas vigentes del Contrato de Concesión 002 de 2014, con corte al 31 de marzo de 2025, se evidencian en el Capítulo del Área Jurídica (Ver capítulo jurídico).

#### 3.4.5. Estado Final del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.

El Contrato de Concesión finalizó Anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 el “Laudo Parcial Final” y el “Arbitraje”, respectivamente, Fallo compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el día 20 de diciembre de 2024, donde resuelve definitivamente las controversias entre las Partes en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de jurisdicción, responsabilidad y daños.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 38 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 4 INFORMACIÓN DEL PROYECTO VIAL

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca – POC, cuenta con una longitud aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el departamento de Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la Autopista Norte de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá – Villavicencio, discuriendo por el oriente de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, Salitre – Guasca, Salitre – La Calera, Guasca – Sesquilé, Patios – La Calera, Límite Bogotá – Choachí, La Calera-Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre los municipios de Sopó, La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza, proporcionando el comercio y el transporte entre el norte del país y el municipio de Villavicencio; adicionalmente interconectará los demás municipios del Oriente Colombiano.

**Tabla 8 Información General Del Proyecto.**

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Vía</b>                            | Perimetral del Oriente de Cundinamarca             |
| <b>Contrato de Concesión</b>          | 002 del 08 de sep.-2014                            |
| <b>Entidad Contratante</b>            | Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)          |
| <b>Contratista</b>                    | Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. |
| <b>Representante legal</b>            | Néstor Román Sánchez Amaya -CEO                    |
| <b>Primer Suplente</b>                | Tomer Ginesin - CFO                                |
| <b>Segundo Suplente</b>               | Matan Nir Pinto - CLO                              |
| <b>Longitud Concesión</b>             | 152,24 Km aprox.                                   |
| <b>Fecha inicio contrato</b>          | 19 de diciembre de 2014                            |
| <b>Fecha final contrato Concesión</b> | 15 de diciembre de 2039                            |
| <b>Valor del Contrato</b>             | \$ 1.647.776.111.169 (a pesos de dic/2012)         |


Fuente: Elaboración Propia

##### 4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como se evidencia en la figura No. 1 – Localización General POC -, conformando la unión e integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 39 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |


**Figura 1 Localización General POC**

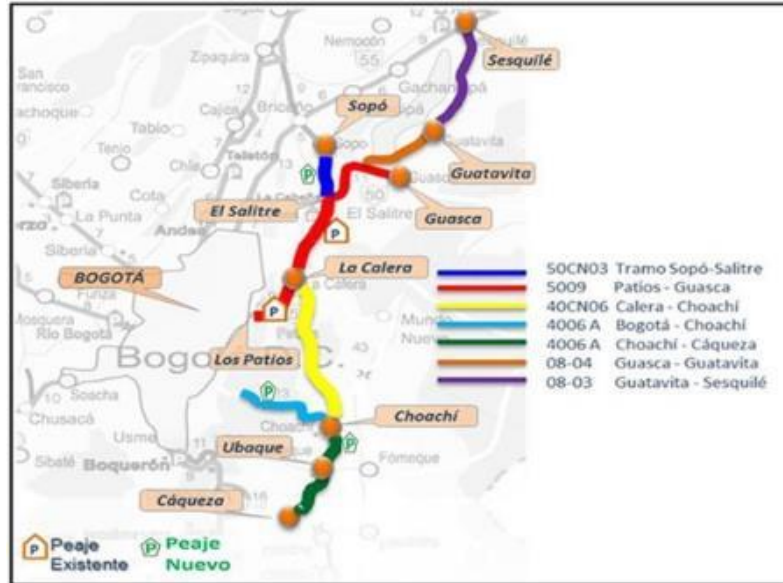

Fuente: Estudios Previos – Agencia Nacional de Infraestructura

#### 4.1.1 Esquema de Abscisado del Proyecto

**Tabla 9 Esquema Abscisado de la Unidades Funcionales PR**

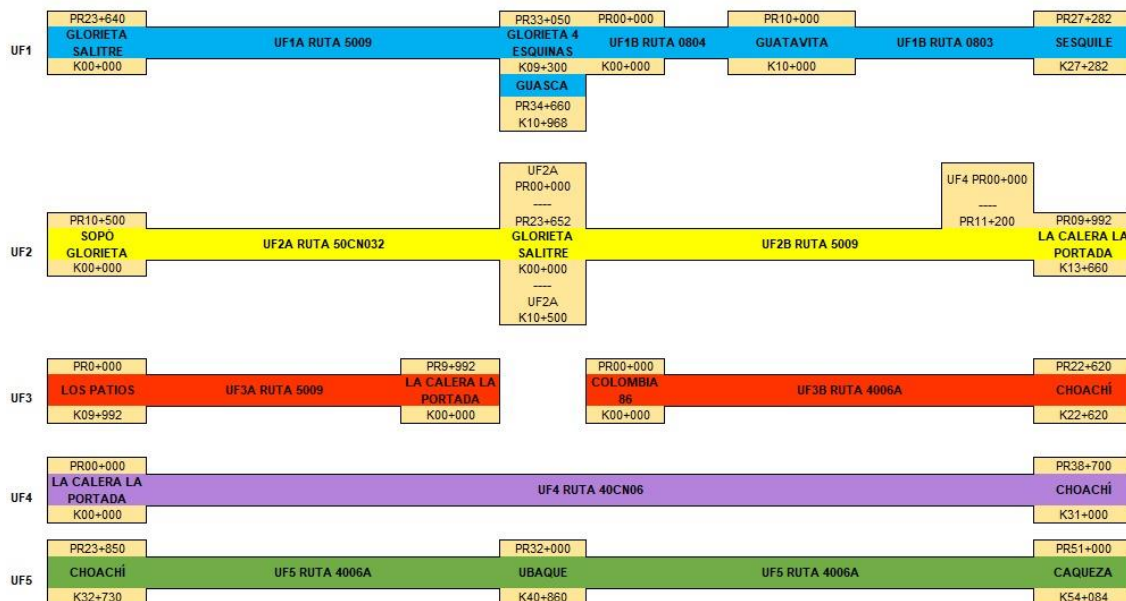

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 40 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 4.2 DESCRIPCIÓN ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se indican las Unidades Funcionales, así como el alcance actual y las características generales del proyecto:

**Tabla 10 Descripción General de las Unidades Funcionales Alcance y Características del Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.**

| UF | SECTOR                     | CALZADA  | PR INICIAL                                                                            | PR FINAL                                                        | LONG  | CUMPLE LEY 105 | ALCANCE GENERAL                               |
|----|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Salitre - K3+300           | Sencilla | 23+640<br>R5009                                                                       | 27+092<br>Ruta 5009                                             | 3,3   | NO             | Mejoramiento                                  |
|    | K3+300 – Guasca            | Sencilla | 27+092<br>R5009                                                                       | 34+660<br>R5009<br>Guasca<br>1.029.917,79 N<br>1.021.886,34 E   | 7,88  | NO             | Rehabilitación                                |
|    | Cuatro Esquinas - Sesquilé | Sencilla | 0+000<br>R0804<br>Intersección<br>hacia Guatavita<br>1.030.838,40 N<br>1.020.312,29 E | 27+282<br>R0803<br>Sesquilé<br>1.050.803,64 N<br>1.031.220,67 E | 27,24 | NO             | Rehabilitación                                |
| 2  | Sopó -Salitre              | Sencilla | 0+000<br>R50CN03<br>Sopó<br>1.035.082,85 N<br>1.014.968,17 E                          | 10+500<br>R50CN03<br>Salitre<br>PR 23+652<br>Ruta 5009          | 10,5  | SI             | Mejoramiento<br>trazado y sec.<br>Transversal |
|    | Salitre - La Calera        | Sencilla | 23+652<br>Salitre<br>PR 23+652<br>Ruta 5009                                           | 9+992<br>La Calera<br>Ruta 5009                                 | 13,58 | SI             |                                               |
| 3  | La Calera – Patios         | Sencilla | 9+992<br>Ruta 5009                                                                    | 0+000<br>Patios<br>1.007.516,34 N<br>1.007.409,20 E             | 9,92  | SI             | Mejoramiento                                  |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 41 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | SECTOR               | CALZADA  | PR INICIAL                                                                        | PR FINAL                                                                     | LONG  | CUMPLE LEY 105 | ALCANCE GENERAL                         |
|----|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------|
|    | Lim. Bogotá- Choachí | Sencilla | 0+000<br>Límite Bogotá<br>996.591,086 N<br>1.007.966,919 E                        | 22+620<br>Choachí<br>992.350,33 N<br>1.017.006,49 E                          | 22,62 | NO             | Rehabilitación                          |
| 4  | La Calera - Choachí  | Sencilla | 11+212<br>La Calera<br>Ruta 5009                                                  | 38+700<br>R40CN06<br>Choachí<br>993.075,76 N<br>1.017.389,99 E               | 31    | SI             | Mejoramiento trazado y sec. Transversal |
| 5  | Choachí Cáqueza      | Sencilla | 23+850<br>Choachí<br>991.538,69 N<br>1.017.215,87 E                               | 51+000<br>R4006A<br>26+360<br>R4006                                          | 21,27 | SI             | Mejoramiento trazado y sec. Transversal |
|    | Variante de Choachí  | Sencilla | 36+800<br>R40CN06<br>Inicio Variante de Choachí (Al norte de Choachí Ruta 40CN06) | 25+428<br>R4006A<br>Final Variante de Choachí (Al sur de Choachí Ruta 4006A) | 4,85  | SI             | Construcción                            |

Fuente: Elaboración Propia- Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones – Otrosí 10

#### 4.3 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO

El Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, contempla cinco (5) unidades funcionales, las cuales se indican en la siguiente tabla, donde se describen las características geométricas y técnicas para cada unidad, así:

**Tabla 11 Características Geométricas del Alcance del Proyecto**

| UF | SECTOR                                                          | ANCHO CALZADA | ANCHO CARRIL | ANCHO BERMA | VEL. DISEÑO Km/h | OBRAS ESPECIALES                                                           | ESTADO INICIAL Y OBSERVACIONES                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Salitre – K3+300<br>K3+300-Guasca<br>Cuatro esquinas – Sesquilé | 6,00          | 3,0          | N.A.        | 40               | Andenes en los dos costados de la vía en el paso por Guatavita y Sesquilé. | Vía bidireccional de dos carriles, de ancho variable entre 3,0 y 3,5 m. sin |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 42 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | SECTOR                                                | ANCHO CALZADA | ANCHO CARRIL | ANCHO BERMA  | VEL. DISEÑO Km/h | OBRAS ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO INICIAL Y OBSERVACIONES                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |               |              |              |                  | Intersección a nivel en Cuatro esquinas                                                                                                                                                                                                 | bermas, con pavimento.                                                                                             |
| 2  | Sopó –Salitre<br>Salitre - K4+000<br>K4+000 - K13+600 | 7,30          | 3,65         | 1,80         | 70<br>70<br>60   | Intersección a nivel en el acceso a la vía Salitre-Guasca.<br>Construcción de andenes en los dos costados de la vía en la zona urbana de Sopó y en un costado de la vía en la Zona Escolar El Salitre y en el paso urbano de La Calera. | Vía bidireccional de dos carriles de ancho variable entre 3,0 y 3,5 m. sin berma.                                  |
| 3  | La Calera - Patios<br>Lim. Bogotá-Choachí             | 7,30<br>6,00  | 3,65<br>3,00 | 2,00<br>N.A. | 40               | Andenes en los dos costados de la vía en el paso por la Calera                                                                                                                                                                          | Vía bidireccional de dos carriles, de ancho variable entre 3,0 y 3,5 m. con pavimento.                             |
| 4  | La Calera – Choachí                                   | 7,30          | 3,65         | 1,80         | 60               | Tercer carril en los sitios de pendiente mayor al 8%                                                                                                                                                                                    | Vía sin pavimento, con afirmado, ancho variable.                                                                   |
| 5  | Choachí - Cáqueza<br>Variante de Choachí              | 7,30<br>7,30  | 3,65<br>3,65 | 1,80<br>1,80 | 60               | Intersección a nivel de acceso a La vía Bogotá – Villavicencio<br>Intersección a nivel al inicio y al final de la variante                                                                                                              | Vía bidireccional de dos carriles de ancho variable entre 2,0 y 2,5 m. sin berma, en su mayor parte sin pavimento. |

Fuente: Elaboración Propia

#### 4.3.1 Unidades Funcionales

##### Terminación de la Unidad Funcional 1

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019, fecha desde cuando inició la Operación y Mantenimiento de dicha unidad, además inició el plazo de 180 días para efectuar correcciones en los diferentes aspectos técnicos, ambientales, sociales, prediales y otros. En este sentido y teniendo en cuenta que el 31 de julio de 2019 venció el plazo de 180 días para efectuar las correcciones que se indicaron anteriormente, la Interventoría anterior procedió a hacer revisión de lo concerniente durante el mes de agosto de 2019, encontrando que, si bien el Concesionario terminó en un gran porcentaje los pendientes de obra relacionados con andenes, glorieta de Cuatro Esquinas, estación de pesaje, área de servicio en lo relacionado con el tercer carril, desnivel entre la

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 43 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

calzada rehabilitada y las cunetas existentes, no obstante no terminó el total de las correcciones, situación que dio lugar a la suspensión del pago de la retribución, lo que obligó al Concesionario a terminar todos los pendientes de obra, quedando éstos culminados hacia el mes de noviembre de 2019. No obstante, en dicho mes aún quedaron algunos pendientes relacionados con predios que dieron lugar a un EER, lo que permitió reanudar desde diciembre de 2019 la retribución. Es de indicar que, en lo relacionado con el EER, el plazo de este venció en mayo de 2020, luego a través del mecanismo de resolución de controversias por Amigable Componedor, en diciembre de 2020 éste le otorgó al Concesionario un EER por el mismo predio que a la fecha sigue vigente. Al respecto, en el Capítulo correspondiente al área jurídica del presente informe, se puede observar el detalle del estado de dicho EER y otros relacionados con el tema.

## Terminación de la Unidad Funcional 2

Se procedió a firmar el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional 2 el 17 de octubre de 2019, fecha desde la cual entró en operación y mantenimiento, iniciando la Interventoría saliente la revisión y medición de indicadores para la suscripción del Acta de Compensación Especial que da a lugar, procediendo en el mes de noviembre de 2019 a la firma del Acta de Compensación Especial a que tiene derecho el Concesionario por la terminación parcial de Unidad Funcional.

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria POB SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un "*ACTA ACLARATORIA AL SEGUNDO ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 2 (SOPÓ - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA - PATIOS Y LÍMITE DE BOGOTÁ - CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA*" aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del **Acta de Terminación**, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que al respecto realizó la Interventoría anterior, y que fue acogida por las partes en el Acta de Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de Terminación Parcial. Es de anotar que a la fecha de cierre de presente informe, aún persiste uno de los EER (Arqueología sector de Alcaparros) que dieron origen al Acta de Terminación Parcial.

El Concesionario puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 2 para revisión y firma de Acta de Terminación, anotando que lo realizó argumentando una modificación de la estación de pesaje que permite la firma del Acta de Terminación, por lo que la Interventoría anterior realizó la respectiva verificación y emitió el informe correspondiente por medio de la comunicación CP-PER-9685C-2021 del 23 de julio de 2021; sobre el particular cabe anotar que de la revisión surgió el incumplimiento a algunos indicadores que

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 44 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

a posterior fueron subsanados por el Concesionario durante agosto de 2021, poniendo éste nuevamente a disposición los sectores del EER siendo nuevamente verificado por dicha Interventoría, encontrando que se realizó la subsanación de los diferentes indicadores y por tanto, se pudo proceder a la firma del Acta de terminación el 31 de agosto de 2021.

A continuación, se adjunta una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2:

**Tabla 12 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF2**

| ÍTEM                                              | EJECUTADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR | EJECUTADO MES<br>MARZO | EJECUTADO ACUMULADO TOTAL | ABSCISAS INTERVENIDAS EN EL MES | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Reparación de andenes, rampas y bordillos.</b> |                                     |                        |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 2A Ruta 50CN03                   | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado     |
| UNIDAD FUNCIONAL 2B Ruta 5009                     | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |
| <b>Construcción de accesos</b>                    |                                     |                        |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 2A Ruta 50CN03                   | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |
| UNIDAD FUNCIONAL 2B Ruta 5009                     | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |
| <b>Reparación de cunetas</b>                      |                                     |                        |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 2A Ruta 50CN03                   | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |
| UNIDAD FUNCIONAL 2B Ruta 5009                     | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |
| <b>Reparación de cercas</b>                       |                                     |                        |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 2A Ruta 50CN03                   | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |
| UNIDAD FUNCIONAL 2B Ruta 5009                     | 100,0%                              | N.A.                   | 100,0%                    | -                               | Culminado.    |

Fuente: Elaboración Propia

Es de aclarar que, aquellas observaciones surgidas del Acta de Terminación Parcial hacen parte del Acta de Terminación firmada el 31 de agosto de 2021, por lo que las mismas y aquellas surgidas de esta última, hacen parte de las labores que el Concesionario deberá corregir en los 180 días de que trata el Contrato y que iniciaron a contar a partir del 31 de agosto de 2021.

De acuerdo con las disposiciones Contractuales, los 180 días de que trata el Contrato vencieron el 28 de febrero de 2022, por lo que la Interventoría anterior – Consorcio Intervías 4G -, procedió a iniciar la verificación de los pendientes anotados tanto en el Acta de

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 45 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

Terminación Parcial como en el Acta de Terminación firmadas, proceso que finalizó la Interventoría saliente, emitiendo la comunicación CP-PER-11237C-2022 del 08 de abril de 2022 remitido a la Entidad y al Concesionario con los pormenores encontrados, dentro de lo que se destaca, la no ampliación del puente vehicular Teusacá II y el no cumplimiento de la NSR-10 en el CCO, entre otros. Es de advertir, en relación con el cumplimiento de la NSR-10 en el CCO, esta actividad se terminó el 28 de febrero de 2023, según verificación conjunta entre las partes.

El consorcio interventor ERS, en oficios CERS-OP-821-2023, DEL 21 DE MARZO DE 2023, CERS-OP-1848-2023, del 7 de julio de 2023, informo a la ANI (Radicado 20234090752772) que la Sociedad Concesionaria subsano las obligaciones pendientes para la terminación de la UF2.

En noviembre de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, verificó la terminación de todos los pendientes de la Unidad Funcional 2 en sus aspectos técnicos, principalmente, lo relacionado con la ampliación del puente Teusacá II, conforme lo emitido por la interventoría anterior en el comunicado CP-PER-11237C-2022; de acuerdo con lo revisado por el CONSORCIO INTERVENTOR ERS y según lo acordado en el Contrato de Transacción suscrito entre las partes el 1 de septiembre de 2023; en septiembre del 2024, el Concesionario finalizó el 100% las actividades de construcción para la Ampliación del Puente Vehicular Teusacá II. Sólo se ejecutan labores de demolición y retiro de rocas con sobre tamaños bajo el puente, así como la demolición y retiro de material proveniente de los vestigios del puente antiguo ubicados en el costado norte y sur, a solicitud de la CAR.

### Terminación de la Unidad Funcional 3

El Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3 fue firmada con fecha del 07 de noviembre de 2019, fecha desde la que la Interventoría saliente inició la revisión de indicadores para el pago de la Compensación Especial a que tiene derecho el Concesionario por la Terminación Parcial de Unidad Funcional.

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un “**ACTA ACLARATORIA AL SEGUNDO ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 2 (SOPÓ - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA – PATIOS Y LÍMITE DE BOGOTÁ – CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA**” aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del **Acta de Terminación**, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que al respecto realizó la Interventoría anterior y, que fue acogida por las partes en el Acta de Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de Terminación Parcial. Es de anotar que los EER que dieron origen al Acta de Terminación Parcial fueron superados con la firma del Otrosí No. 10, por lo que, de acuerdo con el Acta

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 46 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Aclaratoria Firmada por las partes y a la firma del Otrosí referido, el inicio del conteo de los 180 días para subsanación de pendientes inició el 5 de noviembre de 2021.

Ahora bien, el Concesionario con la comunicación D-157-2022 del 3 de febrero de 2022, puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 3, Por lo que la Interventoría anterior realizó las actividades correspondientes para verificación de la terminación de Unidad Funcional, dando como resultado lo indicado en la comunicación CP-PER-11081C-2021 del 14 de marzo de 2022, donde se evidencia el cumplimiento de los diferentes indicadores medidos, quedando aspectos por subsanar dentro de los 180 días que trata el Contrato, que tuvieron como vencimiento el 05 de octubre de 2022, fecha en la cual se inició la etapa operativa de este tramo.

A continuación, se muestra una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3:

**Tabla 13 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF3A-UF3B**

| ITEM                                              | EJECUTADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR | EJECUTADO MES MARZO 2025 | EJECUTADO ACUMULADO TOTAL | ABSCISAS INTERVENIDAS EN EL MES | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Reparación de andenes, rampas y bordillos.</b> |                                     |                          |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 3A<br>Ruta 5009                  | 100,00%                             | 0,00%                    | 100,00%                   | -                               | Culminado     |
| <b>Construcción de accesos</b>                    |                                     |                          |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 3A<br>Ruta 5009                  | 100,00%                             | 0,00%                    | 100,00%                   | -                               | Culminado     |
| UNIDAD FUNCIONAL 3B<br>Ruta 4006A                 | 100%                                | N.A.                     | 100%                      | -                               | Culminado     |
| <b>Reparación de cunetas</b>                      |                                     |                          |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 3A<br>Ruta 5009                  | 100,00%                             | 0,00%                    | 100,00%                   | -                               | Culminado     |
| UNIDAD FUNCIONAL 3B<br>Ruta 4006A                 | 100,00%                             | 0,00%                    | 100,00%                   | -                               | Culminado     |
| <b>Reparación de cercas</b>                       |                                     |                          |                           |                                 |               |
| UNIDAD FUNCIONAL 3A<br>Ruta 5009                  | 100,00%                             | 0,00%                    | 100,00%                   | -                               | Culminado     |

Fuente: Elaboración Propia

Mediante el comunicado CERS-OP-223-2023, el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, informa sobre el avance en los diversos temas e indica algunas consideraciones sobre las cercas.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 47 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Mediante el comunicado CERS-OP-660-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, da Alcance al comunicado CERS-OP-503-2023, respecto a la revisión de los aspectos definidos en los Acuerdos contenidos en los Numerales 3 y 5 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3. Contrato de Concesión No. 002 de 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca- (Tema: Informe respecto de pendientes UF3), donde concluye: *"... Con las revisiones conjuntas y el seguimiento que se ha efectuado a las correcciones de parte del Concesionario, EL CONSORCIO INTERVENTOR ERS encuentra que el Concesionario atendió todas las observaciones."*

Sigue pendiente la construcción de la estación de peaje Choachí, con diseños No objetados de fecha 25 de octubre de 2023; las labores constructivas ejecutadas se limitan a preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024 y, actualmente suspendidas por el concesionario desde el 19 de febrero de 2024.

Es de advertir que, el contrato terminó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje" - (compartido desde la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, el 20 de diciembre de 2024).

#### Unidad Funcional 4:

Para el periodo del mes de marzo de 2025, en recorrido realizado a esta Unidad Funcional, encontró algunas actividades de mantenimiento y mejoramiento en desarrollo; las actividades acumuladas hasta el fin del presente periodo son:

**Tabla 14 Unidad Funcional 4**

| <b>SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) – MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km)</b> |                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>ÍTEM</b>                                                                            | <b>Acumulado</b> | <b>Observaciones</b>                |
| <b>Explanaciones y Taludes</b>                                                         |                  |                                     |
| Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones (%).                                     | 7,60%            | Sin actividad en el periodo.        |
| <b>Drenajes</b>                                                                        |                  |                                     |
| Alcantarillas tubulares y en cajón                                                     | 10,50%           | Sin actividad en el periodo.        |
| Cuneta fundida in situ, incluye cordón cuneta y bordillo (%)                           | 0,00%            | Sin actividad en el periodo.        |
| <b>Estructura de Pavimento</b>                                                         |                  |                                     |
| Subbase Granular (Km)                                                                  | 0,00 Km          | NO HA INICIADO.<br>Afectado por EER |
| Base Granular (Km)                                                                     | 0,00 Km          |                                     |
| Rodadura                                                                               | 0,00 Km          |                                     |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 48 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) – MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) |           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| ÍTEM                                                                            | Acumulado | Observaciones                |
| <b>Estructuras</b>                                                              |           |                              |
| <b>Muros de contención</b>                                                      |           |                              |
| Estructuras de Contención (Muros) (%)                                           | 14,41%    | Sin actividad en el periodo. |
| <b>REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4</b>                               |           |                              |
| Secas                                                                           | 0,68 %    | Sin actividad en el periodo. |
| Húmedas                                                                         | 0,00 %    | Sin actividad en el periodo. |

(\*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 31,00 Km.

Fuente: Elaboración Propia

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., en la UF 4, se describen en el capítulo técnico del presente informe (Área Técnica).

#### Unidad Funcional 5:

Para el mes de marzo de 2025, en recorrido realizado a esta Unidad Funcional, encontró algunas actividades de mantenimiento y mejoramiento en desarrollo; las actividades acumuladas hasta el fin del presente periodo son:

**Tabla 15 Unidad Funcional 5**

| SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 – MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) |                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ÍTEM                                                                    | Ejecutado acumulado | Observaciones                             |
| <b>Explanaciones y Taludes</b>                                          |                     |                                           |
| Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones                           | 2,85%               | Sin actividad en el periodo               |
| <b>Drenajes</b>                                                         |                     |                                           |
| Alcantarillas tubulares y en cajón                                      | 0,08%               | Sin actividad en el periodo               |
| Cuneta fundida in situ                                                  | 0,00%               | Sin actividad en el periodo               |
| <b>Estructura de Pavimento</b>                                          |                     |                                           |
| Subbase Granular (Km)                                                   | 0,73 Km             | Sin actividad en el periodo               |
| Base Granular (Km)                                                      | 0,53 Km             | Sin actividad en el periodo               |
| Rodadura (Km)                                                           | 0,00 Km             | NO HA INICIADO. Afectado por EER          |
| <b>REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5</b>                       |                     |                                           |
| Secas                                                                   | 3 Un                | % Avance: 5%. Sin actividad en el periodo |
| Húmedas                                                                 | 0 %                 | % Avance: 0% Sin actividad en el periodo  |

Fuente: Elaboración Propia

(\*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 21,27 Km.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 49 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá, en la UF 5, se describen en el capítulo Técnico - Operativo del presente informe (Área Técnico-Operativa).

#### **Intervención y Labores de Mantenimiento En UF 4 Y UF 5**

Conforme el estado de los corredores viales entregados al Concesionario, de los sectores que conforman las Unidades Funcionales 4 y 5, según lo establecido en el Apéndice Técnico No. 1, se requiere de la ejecución de las siguientes actividades durante la Etapa de Construcción, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio del Proyecto, para la infraestructura que no está pavimentada y cuyo cuadro se encuentra definido como Intervenciones Prioritarias, así:

- (i) Conformación de la calzada existente
- (ii) Señalización vertical
- (iii) Remoción de derrumbes
- (iv) Limpieza de márgenes y separadores.
- (v) Limpieza de obras de drenaje.

Teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por la CAR y CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una zona de 100m a la redonda de la presencia de un manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las obligaciones relacionadas con: Obligaciones con terceros y autoridades, la Gestión social, las Obligaciones financieras, las intervenciones prioritarias, las Obligaciones de operación y mantenimiento de la etapa preoperativa de las UF 4 y 5, así como la de garantizar la protección y estabilidad de lo construido hasta el 01 de agosto de 2018.

Como se indicó anteriormente, las Unidades Funcionales 4 y 5 terminaron las actividades, teniendo en cuenta que el contrato terminó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el “Laudo Parcial Final” y el “Arbitraje” respectivamente. Fallo compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el día 20 de diciembre de 2024, donde resuelve definitivamente las controversias entre las Partes en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de jurisdicción, responsabilidad y daños.

#### **4.4 ETAPA ACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN**

El contrato se encontraba en la etapa Preoperativa en la Fase de Construcción, la cual finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 50 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje")

| Etapas del proyecto              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preoperativa</b>              | Fase de Pre-construcción. Desde la Fecha de Inicio (19-dic-2014) hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción (16-enero - 2016) Finalizada. Estimado de 360 días desde la fecha de inicio Fase de construcción. Estimado de 1.080 días desde la fecha de Acta de inicio de construcción (16 ener-2016). FINALIZADA.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Operación y Mantenimiento</b> | Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 2.4 (b) Parte General. FINALIZADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Etapade Reversión</b>         | Inicia una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Se declaró la Terminación anticipada del Contrato de Concesión, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, FIRMADO Y NOTIFICADO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL No. 01-20-0015-3123 (EL "LAUDO PARCIAL FINAL" Y EL "ARBITRAJE". FALLO ENVIADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 204, DESDE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. Finaliza con la suscripción del Acta de Reversión. |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 51 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 5 ÁREA TÉCNICA

### 5.1 GENERALIDADES

Desde noviembre 3 de 2022 no ha habido actividades de construcción representativas; el 19 de diciembre de 2024 falló el Tribunal de Arbitramento Internacional a favor de la demanda presentada por el Concesionario, en el Laudo Arbitral se informa de la terminación anticipada del Contrato de Concesión, iniciando la Etapa de Reversión del Contrato. Como actividades constructivas sin ejecución, se encuentran la construcción del Peaje Choachí en la UF3B, la terminación de la Zona de Pesaje en la UF2A por EER arqueológico y las actividades constructivas en las Unidades Funcionales 4 y 5.

### 5.2 TÉCNICA

#### 5.2.1 Gestión Estudios y Diseños Fase III

Con el acta de fecha 19 de diciembre de 2014, se inicia la fase de Proconstrucción, para la elaboración de Estudios y Diseños, fase que terminó el 14 de diciembre de 2015.

Durante el mes de noviembre de 2022, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. comentó que contaba con modificación de diseños para las unidades funcionales UF4 y UF5, en los que efectuaba variaciones en el alineamiento para no pasar sobre manantiales. Sin embargo, a la fecha y con corte a 19 de diciembre de 2024 no se presentaron modificaciones a los diseños de las unidades funcionales UF4 y UF5.

Durante el mes de junio de 2023, mediante comunicación CERS-OP-1729-2023 (ANI Número de Radicado 20234090702502) del 26 de junio de 2023 se realiza la no objeción a los diseños presentados para la estabilización del sector en el PR7+500, "Curvas del Guarapo" como actividad de mantenimiento de la UF3A. Intervención finalizada.

En el mes de agosto de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) del 25 de agosto de 2023, esta interventoría da su concepto de NO OBJECCIÓN a los Estudios y Diseños para la construcción de la estación de peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021, estas obras no fueron construidas.

En el talud de la UF3A Tilatá, la fase III de los estudios y diseños se terminó y los diseños fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-3090-2023 (ANI Número de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023, como actividad de mantenimiento, actualmente la intervención ya fue finalizada; esta actividad corresponde al mantenimiento del talud.

En el talud de la UF3A Arrayanes en el PR1+080 de la RN5009, se corrigen actualmente los diseños fase III a ser implementados, una vez revisados los diseños enviados mediante comunicación D-77-2025 la Interventoría emitió la comunicación 5143.051ANI CERS-OP-

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 52 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

0193-2025 (ANI Numero de Radicado 20254090151742) del 6 de febrero de 2025, con observaciones y concepto de NO OBJECCIÓN Técnico, presentando OBJECIONES ambientales que aún no han sido subsanadas.

A continuación, se relaciona el estado de los estudios y diseños para construcción, con corte a diciembre 19 de 2024, fecha de finalización anticipada del Contrato de Concesión.

**Tabla 16 Relación de Estudios y Diseños No Objetados**

| VOLUMEN DOCUMENTO / |                                                                       | UF1                                           | UF2                                           | UF3                                           | PEAJE CHOACHÍ UF3B                                     | UF4                                                                             | UF5                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                   | Estudio de Transporte                                                 | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2         | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682                                   | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 2                   | Información Geográfica Georreferenciada                               | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2         | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682                                   | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 3                   | Estudio De Trazado y Diseño Geométrico, Seguridad Vial y Señalización | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 2023409095979 2) 25 08-2023 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682<br>CP- PER 360 -2015 (09-12-2015) | CP-PER-356- 2015 (04-12-2015) 201540908 06042 |
| 4                   | Geología para Ingeniería y Geotecnia                                  | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2         | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682                                   | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 5                   | Estudio de estabilidad y estabilización de taludes                    | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2         | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682                                   | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 6                   | Estudio de suelos para el Diseño de fundaciones                       | NA                                            | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)                 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)                 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023)                         | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)                                                   | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022 de 2022</b>                                           | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 53 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| VOLUMEN DOCUMENTO | /                                         | UF1                                           | UF2                                           | UF3                                           | PEAJE CHOACHÍ UF3B                             | UF4                                           | UF5                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   |                                           |                                               | 201540908 26672                               | 201540906 62262                               | 2023409095979 2                                | 201540908 26682                               | 201540908 26742                               |
| 7                 | Estudio Geotécnico Y Diseño Del Pavimento | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 8                 | Hidrología, Hidráulica y Socavación       | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 9                 | 9.1 Paso peatonal                         | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | N/A                                            | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
|                   | 9.2 Puentes a rehabilitar                 |                                               |                                               |                                               |                                                |                                               |                                               |
|                   | 9.3 Puentes Nuevos                        |                                               |                                               |                                               |                                                |                                               |                                               |
|                   | 9.4 Alcantarillas Cajón                   |                                               |                                               |                                               |                                                |                                               |                                               |
|                   | 9.5 Alcantarillas Tubulares               |                                               |                                               |                                               |                                                |                                               |                                               |
|                   | 9.6 Muro de sostenimiento                 |                                               |                                               |                                               |                                                |                                               |                                               |
|                   | 9.7 Ampliación de puentes                 |                                               |                                               |                                               |                                                |                                               |                                               |
| 10                | Paisajismo y Urbanismo                    | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 11                | Arquitectura                              | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 12                | Iluminación Exterior                      | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 54 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| VOLUMEN DOCUMENTO |                                                                    | UF1                                           | UF2                                           | UF3                                           | PEAJE CHOACHÍ UF3B                             | UF4                                           | UF5                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 13                | Telecomunicaciones-Fibra Óptica                                    | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CERS-OP-2370-2023 (25 08-2023) 2023409095979 2 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |
| 14                | Especificaciones Técnicas de construcción generales y Particulares | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 201540908 26662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 201540908 26672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 201540906 62262 | CP-PER-276-2015 (14-12-2015) 2015409066226 2   | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 201540908 26682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 201540908 26742 |

Fuente: Elaboración propia

### 5.3 ACTIVIDADES TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO

#### 5.3.1 Seguimiento fallos por invierno en vía Patios - La Calera UF3A

El 21 y 22 de noviembre de 2022 se realizó acompañamiento a funcionarios de la Alcaldía de La Calera, funcionarios Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y representante de la CAR para el reconocimiento de fallos geotécnicos y árboles para tala en los sectores afectados por el evento de lluvias torrenciales en sectores de los taludes de Arrayanes en el PR1+080 margen izquierdo y PR1+180 margen derecha, Tilatá PR2+700 margen derecha e izquierda y el deslave provocando en el sector de Palomar en el PR3+900 margen derecha de la RN5009.

En el sector Arrayanes, UF3A PR01+000 a PR01+120 de la RN5009, el día 21 de diciembre de 2022 se efectuó una reunión en la Alcaldía de La Calera con presencia del Alcalde y representantes de la ANI, de la Concesión, la Interventoría, concejales de la región y representantes de las comunidades afectadas. Mediante comunicación CERS-OP-108-2022 (ANI Número de Radicado 20224091362562) del 5 de diciembre de 2022, la interventoría ha solicitado monitoreo permanente y solución geotécnica conjunta de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y la Alcaldía.

Con comunicación CERS-OP-214-2022 del 24 de enero de 2023 la Interventoría realizó respuesta al JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO referente a la Tutela interpuesta a la ANI por el COLEGIO TILATÁ, COLEGIO EKIRAYÁ, COLEGIO LA COLINA, COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS, GIMNASIO CAMPESTRE LOS ARRAYANES sobre los hechos acaecidos el 12 de noviembre de 2022 a raíz de los deslaves y afectaciones a drenajes y fallos en taludes de la zona de La Calera.

Desde noviembre de 2022, la Interventoría ha realizado acompañamientos continuos a las reuniones periódicas informativas a la comunidad a raíz de la Tutela interpuesta por los



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 55 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

habitantes de los sectores aledaños al fallo en el PR7+500 (Sector "Curvas el Guarapo"), los taludes de Arrayanes (PR1+080) y Tilatá (PR2+700) de la RN 5009.

### **Talud Arrayanes en la UF 3A**

A continuación, se describe brevemente la trazabilidad de los eventos y acciones ejecutadas en desarrollo de las actividades de interventoría para este talud:

Con oficio ANI 20233060082961 del 10 de marzo de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., fue informada sobre el fallo de tutela No. 48 NI 59647 a favor de los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz, ordenando a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Alcaldía de La Calera la realización de los estudios necesarios para definir el tipo de obra que se requiere en la estabilización del talud "Arrayanes" y de esta manera evitar el deslizamiento y colapso de la vivienda propiedad de los accionantes que está asentada en la corona del talud, a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación. El día 14 de marzo de 2023 la interventoría realizó acompañamiento al recorrido de verificación de la vivienda de los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz en compañía de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y funcionarios de la Alcaldía de La Calera.

Durante el mes de mayo de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debió suspender el 9 de mayo de 2023 las labores iniciadas de perforación para auscultación de suelo en Arrayanes, debido a que probablemente se afectaba el nacedero, el inconveniente se presentó con ASOARRAYANES, por lo cual se requiere nuevamente el acompañamiento de la CAR y ASOARRAYANES en el desarrollo de las actividades que se adelanten en el talud; el 29 de mayo de 2023 en reunión citada en oficinas de la Procuraduría, se señaló por parte del representante de la CAR que internamente la Entidad coordinaba la designación del personal encargado de realizar el acompañamiento técnico y las pruebas de laboratorio en el marco del acompañamiento a las actividades en el sector.

Durante el mes de agosto de 2023, las labores de auscultación geotécnica en el sector de Arrayanes para los diseños de la solución fueron reactivadas, limitando la intervención a auscultación sísmica y trámites ante la CAR, estos estudios fueron culminados durante el mes de octubre de 2023.

Mediante comunicación D-1708-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hizo entrega de los Estudios y Diseños Fase II para la estabilización del Talud "Arrayanes" al juzgado en cumplimiento de la tutela del 8 de marzo de 2023. Mediante comunicación CERS-OP-3305-2023 (RAD ANI 20234091316632) del 16 de noviembre la Interventoría realiza comentarios a estos diseños.

Con comunicación D-1770-2023 del 17 de noviembre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hace entrega de los diseños Fase II para la estabilización del Talud "Arrayanes" en el PR 1+080 de la RN 5009.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 56 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Durante el mes de diciembre de 2023 no se realizaron actuaciones técnicas sobre este talud.

El día 12 de enero de 2024 se realizó acompañamiento a la reunión citada por la Alcaldía de La Calera, en la Alcaldía de La Calera, con presencia del Sr. Alcalde, representantes de La Concesionaria, Corporación Autónoma Regional – CAR, y la Interventoría del Proyecto Consorcio Interventor ERS con el objeto de verificar el estado de los diseños de la estabilización del talud y la presentación de las dos alternativas de diseño Fase II para la estabilización del Talud y establecer cronograma de gestión del Talud Arrayanes.

El día 17 de enero de 2024, se realizó acompañamiento a la reunión citada por la ANI, en las oficinas de la ANI, con presencia de Sr. Alcalde, representantes de la Alcaldía y la Concesionaria, Corporación Autónoma Regional – CAR, la Gerente del Proyecto por parte de la ANI, representantes de la ANI y la Interventoría del Proyecto, Consorcio Interventor ERS, con el fin de conocer el concepto de viabilidad ambiental ante las alternativas técnicas presentadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para el sector Arrayanes; la mejor alternativa, en concepto de la CAR es la alternativa 1, que requiere la compra predial entre tres y cinco predios, el área requerida total estará definida con el resultado de los estudios y diseños fase III. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ofrece avanzar en este aspecto a manera de coadyuvancia como se hizo con los diseños fase II.

Durante el mes de febrero de 2024, la interventoría realizó el acompañamiento técnico tendiente a realizar el memorado de respuesta a la solicitud de información de acción de tutela Radicado No. 2023-00012-00 (59467), Accionantes: EDGAR MUÑOZ CAMACHO Y ALICIA ESCOBAR DE MUÑOZ, ACCIONADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y otros.

Desde el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT implementado, eliminando el cierre controlado partir del 23 de marzo de 2024, sujeto reactivación de PMT con base en el monitoreo permanente por la presencia de lluvias, desde esta fecha y durante lo corrido del año 2024, sigue igual.

Durante el mes de junio de 2024, se realizó seguimiento al estado de la vivienda y avance de asentamientos geotécnicos de la vivienda de propiedad del señor Edgar Muñoz, realizando puntos de control topográfico y verificación estructural del predio.

Durante el mes de diciembre de 2024, avanzaron las áreas prediales y jurídicas tanto de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., como de la ANI, con el apoyo de la Interventoría, para realizar acercamientos y la posible solución definitiva; es importante aclarar que el fallo de Tutela tiene inmersas actuaciones de los diferentes actores (V.G. Alcaldía de La Calera, INVIAS, ANI, CAR y Atención de Riesgos La Calera), los cuales deben aportar en la solución.

La decisión final del amigable componedor frente a la controversia del Talud "Arrayanes", define que, la intervención del Talud debe ser realizada por la Sociedad Concesionaria

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 57 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la compra de predios, debe ser realizada a cargo de la subcuenta predial del proyecto. Respecto al seguimiento técnico realizado, continúa igual, la parte técnica de la interventoría hace constante seguimiento a la estabilidad del predio.

El Concesionario mediante comunicación D-77-2025 del 23 de enero de 2025, entregó los diseños fase III corregidos, los cuales fueron revisados por la Interventoría, emitiendo la comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0193-2025 (ANI Numero de Radicado 20254090151742) del 6 de febrero de 2025, con observaciones y concepto de NO OBJECCIÓN Técnico, presentando OBJECIONES ambientales que aún no han sido subsanadas.

Durante el mes de marzo de 2025, se continuó el seguimiento al estado de la vivienda y avance de asentamientos geotécnicos de la vivienda de propiedad del señor Edgar Muñoz, realizando puntos de control topográfico y verificación estructural del predio, la vivienda no se ha movido ni vertical ni horizontalmente, sin embargo, las lluvias continúan afectando el talud, al costado sur principalmente.

A pesar de estar en Etapa de Reversión, a la luz del Contrato de Concesión, las actividades de Operación y mantenimiento deben continuar hasta la finalización del Contrato; esto aunado al fallo de Tutela proferido por el Juez, hace que el Concesionario este obligado a participar en las labores de estabilización del Talud hasta la liquidación del Contrato.

### **Talud Tilatá en la UF3A**

A continuación, se hace una breve descripción del proceso y actuaciones en este talud:

En Tilatá (PR2+700) desde el mes de marzo de 2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S realizó labores de verificación para establecer los individuos arbóreos que deben talarse en la corona superior del talud y realizar obras de estabilización temporal. Se implementaron medidas de mitigación y alerta en la zona del derrumbe mediante la instalación de perfiles y mallas que aíslan la zona.

Mediante comunicación D-1205-2023 del 24 de agosto de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. da respuesta al comunicado CERS-OP-2197-2023 (ANI Número de Radicado 20234090887612) del 9 de agosto de 2023 aclarando comentarios a los diseños entregados. Mediante comunicación CERS-OP-2508-2023 (ANI Número de Radicado 20234091019002) del 7 de septiembre de 2023 se emitió NO OBJECCIÓN al componente geotécnico de los diseños Fase III quedando pendiente el componente hidráulico; mediante comunicación CERS-OP-2511-2023 (ANI Número de Radicado 20234091019102) del 7 de septiembre de 2023, se hacen nuevamente comentarios a estos diseños.

En el mes de octubre de 2023, la fase III de los estudios y diseños para la estabilización del Talud Tilatá fue terminada y los Diseños fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-3090-2023 (ANI Número de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 58 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Durante los meses de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo y abril de 2024 no se realizaron actuaciones técnicas sobre este talud, solo hasta la última semana de mayo de 2024 se iniciaron labores ambientales de retiro de epífitas. En junio de 2024 se iniciaron las actividades de perfilado retirando materiales con riesgo de desprendimiento, instalación de anclajes activos y pasivos, malla de alta resistencia, zanjas de coronación, drenajes en el Talud, empradización y construcción disipadores de aguas. También instalaran inclinómetros para monitorear el talud.

Mediante comunicación CERS-OP-711-2024 (ANI Número de Radicado 20244090320332) del 13 de marzo de 2024, se da respuesta a la solicitud de concepto a comunicación con radicado ANI 20243060070811 del 28 de febrero de 2024 y recibida por esta interventoría el 4 de marzo de 2024, con asunto: Solicitud concepto a comunicación con radicado ANI No. 20244090044722 del 15 de enero de 2024 (D-22-2024) – Solicitud Comité Especial - Adquisición predios. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca. Predios Tilatá, generando un concepto integral para la adquisición del predio necesario para la ejecución de los diseños fase III entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Desde el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT eliminando la canalización instalada a partir del 23 de marzo de 2024, sujeto a reactivación de PMT con base en el monitoreo permanente, desde marzo de 2024 el talud permanece estable y sin intervenciones por parte del Concesionario.

Con comunicación CERS-OP-1072-2024 (RADICADO ANI 20244090454742) del 23 de abril de 2024, la Interventoría realiza solicitud a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para la presentación del cronograma actualizado de las obras de estabilización del Talud Tilatá, mediante comunicación CERS-OP-1301-2024 (ANI Número de Radicado 20244090611062) la interventoría realiza solicitud reiterada del cronograma de ejecución de obras para la estabilización del Talud.

El día 22 de mayo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó la socialización del cronograma y de las obras de estabilización definitivas a ejecutar, las cuales dieron inicio con la realización de talas y traslado de epífitas el 1 de mayo de 2024.

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá inició las intervenciones de estabilización del talud con actividades preliminares (Limpieza y adecuación, campamento, instalaciones EPC, traslado de epífitas y labores ambientales) e inició labores de perforación de anclajes.

En la actual Etapa de Reversión del Contrato, el Concesionario está obligado a continuar con las labores de Operación y Mantenimiento, incluidos los taludes Tilatá y Arrayanes.

El siguiente es el seguimiento con corte a marzo 31 de 2025 al cronograma presentado mediante comunicación D-1380-2024:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 59 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 17 Avance de obras de estabilización Talud Tilatá**

|          | NOMBRE ACTIVIDAD                                                        | COMIENZO         | FIN              | % PESO     | PROGRAMADO REAL | EJECUTADO | % COMPLETADO  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| <b>0</b> | <b>OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUD TILATÁ PR2+800 UF3A</b>                | <b>15-may-24</b> | <b>30-ene-25</b> |            | <b>100,00%</b>  |           | <b>99,94%</b> |
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                     | <b>15-may-24</b> | <b>19-jul-24</b> | <b>20%</b> | <b>20,00%</b>   |           | <b>19,93%</b> |
| 1,1      | Gestión Ambiental (traslado y reubicación de epífitas, tala de árboles) | 15-may-24        | 13-jun-24        | 6,7%       | 6,7%            | 99,00%    | 6,60%         |
| 1,2      | Construcción zanja de coronación                                        | 7-jun-24         | 16-nov-24        | 6,7%       | 6,7%            | 100,00%   | 6,67%         |
| 1,3      | Instalación de inclinómetros                                            | 2-jul-24         | 19-jul-24        | 6,7%       | 6,7%            | 100,00%   | 6,67%         |
| <b>2</b> | <b>OBRAS DE ESTABILIZACIÓN</b>                                          | <b>28-jun-24</b> | <b>30-ene-25</b> | <b>80%</b> | <b>80,00%</b>   |           | <b>80,00%</b> |
| 2,1      | Limpieza y Desmonte                                                     | 28-jun-24        | 19-jul-24        | 10%        | 10%             | 99,00%    | 9,90%         |
| 2,2      | Anclajes Activos                                                        | 18-jul-24        | 16-dic-24        | 15%        | 15%             | 100,00%   | 15,00%        |
| 2,3      | Anclajes Pasivos                                                        | 15-jul-24        | 12-ene-25        | 25%        | 25%             | 100,41%   | 25,10%        |
| 2,4      | Instalación malla de alta resistencia                                   | 2-dic-24         | 30-ene-25        | 15%        | 15%             | 100,00%   | 15,00%        |
| 2,5      | Instalación drenes horizontales                                         | 4-nov-24         | 26-ene-25        | 15%        | 15%             | 100,00%   | 15,00%        |

**Fuente: Comunicación D-1380-2024**

De acuerdo con la reprogramación presentada mediante la comunicación D-1380-2024, **se verifica que se presenta a 31 de marzo de 2025 un ejecutado estimado del 99,94% y un programado del 100%**, permaneciendo pendientes únicamente labores ambientales e instalación bajantes.

El siguiente es el personal y equipo en obra registrado en marzo de 2025:

**Personal**

Director: 1 (POB)  
 Topógrafos: 1(POB)  
 Controlador tráfico: 4 (POB)

**Contratista: CONSORCIO SOILTECH**

Residente: 5 (CONSORCIO SOILTECH)  
 Ingeniera ambiental:1 (CONSORCIO SOILTECH)  
 Ingeniera calidad:1 (CONSORCIO SOILTECH)  
 Coordinador SST: 1 (CONSORCIO SOILTECH)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 60 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

Supervisor: 1 (CONSORCIO SOILTECH)  
 Oficiales: 4 (CONSORCIO SOILTECH)  
 Mecánico: 2(CONSORCIO SOILTECH)  
 Operadores: 13 (CONSORCIO SOILTECH)  
 Auxiliares: 18(CONSORCIO SOILTECH)  
 Conductor: 1(CONSORCIO SOILTECH)

### Maquinaria

Contratista: CONSORCIO SOILTECH

| Marca       | Tipo                                 |
|-------------|--------------------------------------|
| Tools World | Pulidora Tools World                 |
| Truper      | Pulidora ERGO 4580                   |
| Bosch       | Pulidora GWS 2200-800                |
| Bosch       | Taladro GSB 13 RE                    |
| Bosch       | Taladro 60Z B3D 56                   |
| Eco Horse   | Planta Electrica Eco Horse KDF8500XE |
| Eco Horse   | Planta Electrica Eco Horse KDF8500XE |
| Airman      | Compresor Airman I                   |
| Boom        | Boom Lift Genie S80                  |
| Doosan      | Torre de Iluminación                 |

1 Camioneta

### Equipo

Equipo de Topografía.  
 Herramienta menor.  
 Equipo para trabajo en alturas

### Talud Palomar

En el sector Palomar (PR3+850 RN 5009), los fallos presentados al costado izquierdo han sido recuperados con renivelación de la carpeta asfáltica y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ha ejecutado sondeos e instalación de inclinómetros para los estudios del movimiento en masa presentado en el sector y así estimar posibles soluciones definitivas en la vía. Durante el mes de junio de 2024 se verificó la realización de sondeos exploratorios en el sector, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 61 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Bogotá S.A.S. a la fecha, no se han realizado actuaciones para la estabilización del talud por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Como trazabilidad, se puede informar que con comunicación D-1581-2023 del 20 de octubre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., envió el monitoreo de puntos de control topográfico en el sector conocido como El Palomar, ubicado en el PR3+780 al PR3+830 de la Unidad Funcional 3A; la cual fue respondida con comunicación CERS-OP-3144-2023 (ANI Número de Radicado 20234091256082) del 1 de noviembre de 2023, la cual contiene conceptos del especialista en geotecnia de la Interventoría. Como actividad de mantenimiento, con corte a marzo 31 de 2025 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., continúa con la repavimentación de los fallos en la vía como labor de Operación y Mantenimiento en la actual etapa de reversión del Contrato.

### Otros taludes del Corredor en Operación

El resumen del estado y avance de la atención a los demás fallos que se vienen atendiendo por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. se puede verificar en el formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de marzo de 2025, anexo a este informe; todos han sido atendidos y se realiza mantenimiento a los existentes que presentan algún inconveniente.

### 5.3.2 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 1

Durante el mes de marzo de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., continuó con las labores de mantenimiento y operación exigidas en el Contrato en la actual etapa de reversión de la siguiente manera: Sello de fisuras y el mantenimiento rutinario integral de la Ruta Nacional en toda la UF1.

### 5.3.3 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 2

Durante el mes de marzo de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., continuó con las labores de mantenimiento y operación exigidas en el Contrato en la actual etapa de reversión de la siguiente manera: Mantenimiento de taludes del PR10+000 al PR23+500 de la RN 5009, sello de fisuras del en toda la Unidad Funcional 2 y labores de mantenimiento de adoquines en el PR10+250 al PR10+400 en la RN50CN03. Las actividades Intervención de la sobrecubierta en el PR17+800 en la Unidad Funcional 2B fueron terminadas en este periodo.

### 5.3.4 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 3

Durante el mes de marzo de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., continuó con las labores de mantenimiento y operación exigidas en el Contrato en



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 62 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

la actual etapa de reversión de la siguiente manera: En la Ruta Nacional 5009 del PR0+000 al PR10+000 continúa la realización del mantenimiento de taludes, en el sector denominado “Tilatá” en el PR2+700 se continúa con el torqueo y tensionamiento de anclajes pasivos, activos y la terminación de los drenajes, el detalle de esta labor puede ser consultado en el aparte dedicado a este tema en el presente informe; en toda la UF 3A se realizó sello de fisuras, en toda la Unidad Funcional 3 se realizó mantenimiento rutinario integral. Durante el mes de marzo de 2025 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mantuvo inactivas las labores de construcción en el peaje de Choachí de la UF3B, las cuales se suspendieron desde el 16 de febrero de 2024.

### 5.3.5 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UF 4 Y UF 5

En el Laudo Arbitral Parcial se declaró la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la fecha de notificación del Laudo, 19 de diciembre de 2024. En ese sentido, desde el 20 de diciembre de 2024, el Proyecto entró a la Etapa de Reversión.

Mediante comunicación D-87-2025 fechada el 22 de enero de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. informa que ya no está obligado a realizar Intervenciones Prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5, que únicamente eran exigibles durante la Etapa Preoperativa de acuerdo con la Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1I, sino únicamente a cumplir con los Principios de Operación y las actuaciones de Mantenimiento de que tratan las secciones 3 y 6 del Apéndice Técnico 2.

Adicionalmente, el Concesionario destaca que no existen Niveles de Servicio aplicables a las actividades de O&M en las Unidades Funcionales 4 y 5, en tanto no se realizaron Intervenciones sobre dichas Unidades Funcionales. En este sentido entonces y de acuerdo con los recorridos realizados por la Interventoría, el Concesionario no realizó ninguna labor de Intervenciones Prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5 durante marzo de 2025, limitando la ejecución a labores de mantenimiento en las Unidades Funcionales 4 y 5. Específicamente, desde la segunda semana de marzo inició las labores de conformación de la vía, limpieza de drenajes (Cunetas y cabezales de alcantarillas) y de márgenes (Rocería) del PR8 al PR10 de la RN40CN06 en la UF4.

En la actual Etapa de Reversión, **no existen las obligaciones de Operación y Mantenimiento por Intervenciones Prioritarias** en las Unidades Funcionales 4 y 5 exigidas en la Etapa Preoperativa. La Terminación Anticipada del Contrato en Fase de Construcción y como consecuencia, la inexistencia de Etapa de Operación y Mantenimiento y la terminación misma del EER fundado para la Etapa de Construcción de estas Unidades Funcionales limita a que **únicamente sean exigibles para la Operación y el Mantenimiento en las Unidades Funcionales 4 y 5, las obligaciones establecidas en las secciones 3.1, 3.3.1, 6 y 6.1. del Apéndice Técnico 2 del Contrato.**

Así pues, la interventoría mantiene permanentes recorridos en la UF4 y UF5 que son registrados en el formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de marzo de 2025, se anexa en este informe para la verificación de estas obligaciones.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 63 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Durante el mes de marzo de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no realizó ninguna labor de intervenciones prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5.

### 5.3.6 PUNTOS DE INTERÉS O “PUNTOS CRÍTICOS” EN UF4 Y UF5:

Mediante comunicación D-180-2025 recibida el 25 de febrero por la Interventoría, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. informa el Estado de Puntos Críticos de las Unidades Funcionales 4 y 5, correspondiente a enero de 2025.

Según la Sociedad concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá se registran 61 y 31 “Puntos críticos” en las Unidades Funcionales 4 y 5, respectivamente.

En contraste, de acuerdo con el formato ET-5143.051ANI-F-34 existen los siguiente sitios críticos o puntos de interés que deben ser atendidos en las unidades funcionales 4 y 5:

-Unidad Funcional 4 (Vía secundaria Choachí-La Calera): 57

-Unidad Funcional 5 (Vía Choachí – Cáqueza): 36

En estos puntos se evidencian situaciones tales como: pérdida de banca por desconfinamiento de zona lateral y saturación del terreno, pérdida de banca y disminución del ancho efectivo de la calzada, agrietamiento en media luna con riesgo de pérdida de banca, pérdida de banca por problemas de escorrentía y socavación por colapso de tubería subterránea y hundimientos.

El acta de EER – Evento Eximente de Responsabilidad establece que las únicas actividades vigentes son aquellas actividades derivadas de obligaciones adquiridas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con terceros o autoridades, la Gestión Social, obligaciones financieras, obligaciones relacionadas con Intervenciones Prioritarias, así como las obligaciones de Operación y Mantenimiento correspondientes a la Etapa Preoperativa, siempre que no se encuentren afectadas por el EER.

De acuerdo con la información tomada de nuestro informe ambiental, donde se identifican los nacederos en las Unidades Funcionales 4 y 5 se puede realizar el siguiente ejercicio:

De los 61 “Puntos críticos” en la Unidad Funcional 4, existen 41 puntos hídricos (35 de SIAM y 6 nuevos de Isotopía) de los cuales únicamente 15 son manantiales, cinco (5) cercanos a la actual vía; de los 41 puntos hídricos, 20 son cercanos (antes de 100m.), es decir, 41 “Puntos críticos” no se encuentran afectados por la normatividad ambiental, sean o no manantiales.

De los 31 “Puntos críticos” en la Unidad Funcional 5, existen 56 puntos hídricos (54 de SIAM y 2 nuevos de Isotopía), de los cuales únicamente 49 son manantiales, siete (7) cercanos a la actual vía; de los 56 puntos hídricos detectados, 5 son cercanos (Antes de 100m.), es decir, 26 “Puntos críticos” no se encuentran afectadas por el EER, sean o no manantiales.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 64 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 18 “Puntos críticos” relacionados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.**

| Unidad Funcional | ID         | PR     | Punto de interés Hídrico Asociado         |
|------------------|------------|--------|-------------------------------------------|
| UF4              | UF4-PC-001 | 14+410 | UF4-139B-DI<br>UF4-139A-DI<br>UF4-139C-DI |
| UF4              | UF4-PC-002 | 17+350 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-003 | 18+720 | UF4-202-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-004 | 18+780 | UF4-202-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-005 | 19+035 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-006 | 19+090 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-007 | 19+180 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-008 | 19+335 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-009 | 22+000 | UF4-247-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-010 | 22+095 | UF4-247-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-011 | 22+300 | UF4-251-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-012 | 22+244 | UF4-251-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-013 | 22+490 | UF4-251-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-014 | 25+120 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-015 | 25+362 | UF4-274A-DI                               |
| UF4              | UF4-PC-016 | 26+050 | UF4-280-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-017 | 26+600 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-018 | 29+230 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-019 | 29+950 | UF4-311-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-020 | 30+150 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-021 | 32+020 | UF4-340A-DI                               |
| UF4              | UF4-PC-022 | 34+330 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-023 | 34+550 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-024 | 34+850 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-025 | 17+200 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-026 | 30+370 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-027 | 30+270 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-028 | 30+400 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-029 | 16+670 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-030 | 23+550 | UF4-260-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-031 | 22+750 | UF4-257-DI                                |
| UF4              | UF4-PC-032 | 26+300 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-033 | 8+940  | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-034 | 10+900 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-035 | 23+400 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-036 | 31+200 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-037 | 36+400 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-038 | 22+990 | NO AFECTADO                               |
| UF4              | UF4-PC-039 | 27+200 | NO AFECTADO                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 65 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Unidad Funcional | ID         | PR     | Punto de interés Hídrico Asociado |
|------------------|------------|--------|-----------------------------------|
| UF4              | UF4-PC-040 | 35+500 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-041 | 27+870 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-042 | 23+900 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-043 | 26+850 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-044 | 23+700 | UF4-260-DI                        |
| UF4              | UF4-PC-045 | 35+300 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-046 | 36+300 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-047 | 18+600 | UF4-199-DI                        |
| UF4              | UF4-PC-048 | 35+200 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-049 | 22+100 | UF4-251-DI                        |
| UF4              | UF4-PC-050 | 37+200 | UF4-414-DI                        |
| UF4              | UF4-PC-051 | 20+300 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-052 | 29+750 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-053 | 30+500 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-054 | 31+400 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-055 | 30+750 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-056 | 30+680 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-057 | 16+800 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-058 | 3+300  | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-059 | 18+900 | NO AFECTADO                       |
| UF4              | UF4-PC-060 | 23+600 | UF4-260-DI                        |
|                  | UF4-PC-061 | 15+150 | Uf-4-193-DI                       |
| UF5              | UF5-PC-01  | 24+070 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-02  | 24+560 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-03  | 25+439 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-04  | 25+750 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-05  | 25+810 | UF5-049B-DI<br>UF5-049A-DI        |
| UF5              | UF5-PC-06  | 26+256 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-07  | 26+320 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-08  | 26+710 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-09  | 27+135 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-10  | 27+990 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-11  | 29+244 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-12  | 29+860 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-13  | 29+997 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-14  | 30+100 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-15  | 30+585 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-16  | 35+640 | UF5-251-DI                        |
| UF5              | UF5-PC-17  | 45+883 | UF5-425-DI                        |
| UF5              | UF5-PC-18  | 50+810 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-19  | 48+750 | UF5-474-DI<br>UF5-472A-DI         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 66 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Unidad Funcional | ID        | PR     | Punto de interés Hídrico Asociado |
|------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
| UF5              | UF5-PC-20 | 30+650 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-21 | 25+210 | UF5-033-D                         |
| UF5              | UF5-PC-22 | 50+550 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-23 | 31+050 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-24 | 28+600 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-25 | 30+200 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-26 | 25+050 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-27 | 26+000 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-28 | 27+300 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-29 | 35+200 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-30 | 35+300 | NO AFECTADO                       |
| UF5              | UF5-PC-31 | 38+180 | NO AFECTADO                       |

Fuente: Elaboración propia

A pesar de los requerimientos realizados al Concesionario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Secciones 3.1, 3.3.1, 6, y 6.1 del Apéndice Técnico 2 del Contrato, relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 4 y 5, específicamente en las comunicaciones CERS-OP-1112-2023 (RAD ANI 20234090522612) del 12 de mayo de 2023, donde se indica y anexa el formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente a abril de 2023 de puntos de interés (Críticos): ***"Específicamente, el mantenimiento a los puntos referidos en el formato de seguimiento a recorridos de mantenimiento del proyecto correspondiente al mes de abril, detallando especialmente los taludes que no se ven afectados por nacederos de agua."*** y la Notificación de otorgamiento Plazo de Cura por parte de la Interventoría a PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.– de acuerdo con la no objeción otorgada por la ANI con oficio 20233060187601 del 1 de junio de 2023, emitida y comunicada al concesionario con comunicación CERS-OP-2134-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090872222) del 4 de agosto de 2023, donde se listan y envían todos los requerimientos realizados en este sentido, el Concesionario no atendió los puntos críticos de las UF4 y UF5, limitándose a Intervenciones Prioritarias.

A continuación, se describen los puntos de mayor interés y deterioro y su cercanía al DNO, los cuales han sido objeto de análisis por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá y la Interventoría:

UF4-PC-001 en el PR14+410 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 2.45m.

UF4-PC-018, en el PR29+230 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 2.70m, no tiene puntos hídricos cercanos asociados.

UF4-PC-019, en el PR29+950 RN40CN06 (Puente sobre quebrada Chuscal), el ancho actual de la vía es de 3.20m.

UF4-PC-053, en el PR30+500 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 3.35m.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 67 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

UF4-PC-055, en el PR30+750 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 2.80m, no tiene asociado ningún punto hídrico cercano.

UF4-PC-056, en el PR30+680 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 3.35m, no tiene puntos hídricos asociados.

UF5-PC-001, en el PR24+070 RN4006A, el ancho actual de la vía es de 2.85m, no tiene puntos hídricos asociados.

UF5-PC-006, en el PR26+256 RN4006A, el ancho actual de la vía es de 3.50m, no tiene puntos hídricos asociados.

UF5- PC-022, en el PR50+550 RN4006A, el ancho actual de la vía es de 3.90m, no existen puntos hídricos cercanos asociados.

En forma adicional el Concesionario identificó las siguientes obras en la Unidad Funcional 4, a las cuales estima debe realizársele un mantenimiento prioritario:

Pontón en el PR11+800 de la RN 40CN06, la estructura presenta fisuras importantes, está dentro de un punto hídrico asociado.

Pontón en el PR23+500 de la RN 40CN06, la estructura presenta deterioro en uno de sus estribos, está dentro de un punto hídrico asociado.

Vale la pena resaltar que, estos "Puntos Críticos" con seguimiento por parte de la Concesionaria, carecen de monitoreo y de instrumentalización por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., obligación solicitada en nuestras comunicaciones CERS-OP-2694-2023 (ANI 20234091087452) y CERS-OP-2864-2023 (ANI 20234091155592) con asunto "Solicitud información Programa de Monitoreo Unidades Funcionales 4 y 5 (Literal "(h)" del Numeral 6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.)", monitoreo que fue negado por la Concesionaria y respondida parcialmente en la comunicación D-1554-2023, con respuesta carente de respaldo, sin carteras topográficas ni resultados de monitoreo; a la fecha no se ha registrado avance de estos monitoreos. por lo que realmente resulta fundamental dar atención especial a los "Puntos Críticos".

No se conoce entonces, ningún documento entregado a esta interventoría sobre el monitoreo de los "Puntos Críticos", los cuales se generan por la inadecuada intervención ejecutando "Mantenimientos Prioritarios", generando cada vez más "Puntos Críticos"; una vía, que contara con un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo no generaría mayores puntos críticos, limitándolos solo al resultado de fallas geológicas o movimientos en masa.

Mediante comunicaciones CERS-OP-3021-2023 (ANI Número de Radicado 20234091202682) y CERS-OP-2951-2023 (Radicado ANI 20234091184052), respondidas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con comunicación D-1618-2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. se comprometió con el mantenimiento de las alcantarillas falladas o cuya tubería estaba

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 68 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

tapada, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del concesionario ni se ha evidenciado su ejecución, permaneciendo tapadas muchas de ellas.

Es innegable que, la falta de mantenimiento de los drenajes, alcantarillas y cunetas existentes, así como el manejo inadecuado de aguas y la falta de conformación de la corona de algunos sectores viales, genera que los taludes se recarguen de agua y queden propensos al fallo o inestabilidad.

Es de resaltar que, en forma reiterada y periódica también, la interventoría entrega el formato ET-5143.051ANI-F-34, en este caso se anexa el formato correspondiente al del mes de marzo de 2025, donde se expone el seguimiento que la interventoría hace a todos los puntos de interés del corredor concesionado, incluidos los "Puntos críticos" de las Unidades Funcionales 4 y 5.

### 5.3.7 Reuniones técnicas realizadas y aspectos técnicos relevantes de mantenimiento:

**Tabla 19 Reuniones del mes de Marzo de 2025**

| FECHA DE ASISTENCIA | HORA INICIAL | HORA FINAL  | TIPO DE REUNIÓN | CONCEPTO DE LA REUNIÓN                    |
|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 18/03/2025          | 9:00 a.m.    | 10:00 a.m.  | VIRTUAL         | Sala de juntas CCO - Comité Mensual DITRA |
| 19/03/2025          | 10:00 a.m.   | 12:00 a.m.  | PRESENCIAL      | Revisión Reversión                        |
| 25/03/2025          | 9:00 a. m    | 10:00 a. m. | VIRTUAL         | Comité Fiduciario                         |

Fuente: Elaboración Propia

### 5.4 PLAN DE OBRAS

El avance general con corte al 19 de diciembre de 2024, fecha de terminación del Contrato de Concesión, se muestra a continuación:

**Tabla 20 Avance de Obras**

|                                              |        |                |
|----------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>AVANCE GLOBAL EJECUTADO DEL PROYECTO</b>  | 43,23% | <b>- 0,34%</b> |
| <b>AVANCE GLOBAL PROGRAMADO DEL PROYECTO</b> | 43,57% |                |

Fuente Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el avance ejecutado estimado del 43,23% del proyecto en general presenta un atraso del -0,34% respecto al avance programado global del proyecto que se encuentra en 43,57% con fecha de corte diciembre 20 de 2024. Es importante aclarar que el avance global programado no tiene en cuenta el avance de las Unidades Funcionales 4 y 5 que no fueron construidas; también aclarar que las obras del peaje de Choachí durante este periodo no reportan avance constructivo alguno, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. únicamente ha realizado labores preliminares de construcción.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 69 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

#### 5.4.1 AVANCE PARTICULAR POR UNIDAD FUNCIONAL

UNIDAD FUNCIONAL 1. El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un programado acumulado del 100%, observando que las actividades de obra se encuentran culminadas en su totalidad.

**Tabla 21 Porcentaje de Avance Global de la UF1**

| UNIDAD FUNCIONAL 1 | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|--------------------|------------|-----------|------------|
|                    | 100%       | 100%      | 0%         |

Fuente Elaboración propia.

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 fue realizada el 01 de febrero de 2019.

UNIDAD FUNCIONAL 2. El porcentaje ejecutado acumulado es de 99,99%, mientras que el programado acumulado es del 100% con un atraso del 0,004% en relación con lo programado.

Es importante mencionar que la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., en términos generales, finalizó las obras de construcción de la Unidad Funcional 2, no obstante, existe un EER por hallazgos arqueológicos en la Estación de Pesaje de la UF2A que afecta el avance de las obras (evento que aún subsiste), éste aunque fue negado por la Entidad y el Consorcio INTERVÍAS 4G por no cumplir con los requisitos contractuales, fue dirimido por el Amigable Compondedor el 18 de diciembre de 2018, reconociéndolo como un EER. El día 31 de agosto de 2021, se suscribió el Acta de terminación de la Unidad Funcional 2, para marzo 31 de 2025 sigue pendiente la intervención por parte del Concesionario de las intervenciones faltantes en esta báscula.

Las obras que afectan el valor pendiente de 0,004% para alcanzar el 100% de ejecución de la Unidad Funcional, corresponden a un sector de la estación de Pesaje de Sopó (Con 0,004% del ponderado), éste último, como ya se indicó, afectado por EER arqueológico. Durante el mes de marzo de 2025 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. tiene entonces una ejecución estimada del 99,99% (Pendiente un 0,004%), el siguiente es el avance con fecha de corte 19 de diciembre de 2024, fecha de terminación del Contrato de Concesión:

**Tabla 22 Porcentaje de Avance Global de la UF2**

| UNIDAD FUNCIONAL 2 | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|--------------------|------------|-----------|------------|
|                    | 100%       | 99,99%    | - 0,01%    |

Fuente Elaboración propia.

En la siguiente tabla se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 2 según el Plan de Obras, se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 70 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 23 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF2**

| Construcción Unidad Funcional 2 (Diciembre 20 de 2024, fecha de inicio de la etapa de reversión) | % Acum         | % Faltante    | % Faltante Ponderado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                  | <b>99,99%</b>  | <b>0,01%</b>  |                      |
| UF-2 - Subsector 1 (El Salitre - Sopó) - Mejoramiento                                            | <b>100,0%</b>  | <b>0,0%</b>   |                      |
| Explanaciones y Taludes                                                                          | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Drenajes                                                                                         | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estructura de Pavimento                                                                          | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estructuras                                                                                      | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Intersecciones (El Salitre - Sopó)                                                               | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Señalización                                                                                     | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Obras sustitución Otrosí 11                                                                      | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| UF-2 - Subsector 2 (El Salitre - La Calera) - Mejoramiento                                       | <b>99,945%</b> | <b>0,055%</b> |                      |
| Explanaciones y Taludes                                                                          | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Drenajes                                                                                         | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estructura de Pavimento                                                                          | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estructuras                                                                                      | 100%           | 0,00%         |                      |
| Señalización                                                                                     | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Obras sustitución Otrosí 11                                                                      | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Redes de Servicios Públicos UF 2                                                                 | <b>100,0%</b>  | <b>0,0%</b>   |                      |
| Infraestructura de Operación UF2                                                                 | <b>99,96%</b>  | <b>0,04%</b>  |                      |
| Edificio de Operaciones CCO UF2                                                                  | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Área de Servicio UF2                                                                             | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estación de Peaje Sopó - UF2                                                                     | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estación de Peaje La Cabaña - UF2                                                                | 100,0%         | 0,0%          |                      |
| Estación de Pesaje Sopó UF2                                                                      | 99,63%         | 0,37%         | 0,004%               |
| <b>% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 2</b>                                    |                |               | <b>0,004%</b>        |

Fuente Elaboración propia.

UNIDAD FUNCIONAL 3. El porcentaje ejecutado acumulado es del 98,00% mientras que el programado acumulado es del 100%, observándose un atraso del 2,00% respecto a lo programado; el avance en las obras preliminares del Peaje de Choachí se estima en 0,04%.

De acuerdo con lo anterior, para alcanzar el 100% de ejecución de la Unidad Funcional, se encuentra pendiente la estación de peaje de Choachí con un peso global sobre la Unidad Funcional 3 de 2,00% sin construcción, con fecha de corte diciembre 20 de 2024 (Fecha de inicio de la reversión del Contrato) y desde el 26 de agosto de 2023, fecha en la cual se dio no objeción a los Estudios y Diseños, las labores constructivas se limitan a preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024, las intervenciones fueron suspendidas por el Concesionario desde el 19 de febrero de 2024, por presuntos problemas con la comunidad; la entidad rechazó la solicitud de reconocimiento de un EER.

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la comunicación D-157-2022 del 3 de febrero de 2022, puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 3, por lo que el Consorcio INTERVÍAS 4G realizó las actividades

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 71 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

correspondientes a la verificación de terminación de Unidad Funcional. El día 08 de abril de 2022 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3.

En las siguientes tablas se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 3, según el Plan de Obras se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad, con corte a diciembre 20 de 2024, fecha de inicio de la Etapa de Reversión del Contrato de Concesión:

**Tabla 24 Porcentaje de Avance Global UF3**

| UNIDAD FUNCIONAL 3            | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
|                               | 100%       | 98,00%    | - 2,00%    |
| UF 3-A - LA CALERA - PATIOS   | 100%       | 100%      | 0,00%      |
| UF 3B - LÍMITE BOGOTÁ-CHOACHÍ | 100%       | 94,11%    | - 5,89%    |

Fuente Elaboración propia.

**Tabla 25 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF3**

| Construcción Unidad Funcional 3<br>(Diciembre 20 de 2024, fecha de inicio de la etapa de reversión) | % Acum        | % Faltante   | % Faltante Ponderado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
|                                                                                                     | <b>98,00%</b> | <b>2,00%</b> |                      |
| UF-3A - (La Calera - Patios) - Mejoramiento                                                         | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| UF-3A - Mejoramiento y Construcción de Vía                                                          | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Explanaciones y Taludes UF3A                                                                        | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Obras de Drenaje UF3A                                                                               | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Estructura de Pavimento UF3A                                                                        | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Estructuras UF3A                                                                                    | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Señalización UF3A                                                                                   | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Obras sustitución Otrosí 10                                                                         | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Redes de Servicios Públicos UF3A                                                                    | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Infraestructura de Operación UF3A                                                                   | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Construcción de estación de peaje Patios UF3A                                                       | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| <b>UF-3B - (Lim Bogotá - Choachí) - Rehabilitación</b>                                              | <b>94,11%</b> | <b>5,89%</b> |                      |
| UF-3B - Rehabilitación de Vía                                                                       | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Obras de Drenaje UF3B                                                                               | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Estructura de Pavimento UF3B                                                                        | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| Señalización UF3B                                                                                   | 100,0%        | 0,0%         |                      |
| <b>Infraestructura de Operación UF3B</b>                                                            | <b>1,9%</b>   | <b>98,1%</b> |                      |
| Construcción de Estación de Peaje Choachí UF-3B                                                     | 1,9%          | 98,1%        | 2,00%                |
| <b>% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 3</b>                                       |               |              | <b>2,00%</b>         |

Fuente Elaboración propia.

UNIDAD FUNCIONAL 4. A partir de la firma del acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes de agosto de 2018, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no continuó ejecutando obras en la UF, no obstante, a continuación, se indica el porcentaje que alcanzó a ejecutar.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 72 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 26 Porcentaje de Avance Global de la UF4**

| UNIDAD FUNCIONAL 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|--------------------|------------|-----------|------------|
|                    | 5,07%      | 5,07%     | 0%         |

Fuente Elaboración propia.

**Tabla 27 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF4**

| UNIDAD FUNCIONAL 4                                                              |           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) – MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) |           |                        |
| ÍTEM                                                                            | Acumulado | Observaciones          |
| Explanaciones y Taludes                                                         |           |                        |
| Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones (%).                              | 7,60%     | En etapa de reversión. |
| Drenajes                                                                        |           |                        |
| Alcantarillas tubulares y en cajón                                              | 10,50%    | En etapa de reversión  |
| Cuneta fundida in situ, incluye cordón cuneta y bordillo (%)                    | 0,00%     | En etapa de reversión. |
| Estructura de Pavimento                                                         |           |                        |
| Subbase Granular (Km)                                                           | 0,00 Km   | En etapa de reversión  |
| Base Granular (Km)                                                              | 0,00 Km   |                        |
| Rodadura                                                                        | 0,00 Km   |                        |
| Estructuras                                                                     |           |                        |
| Muros de contención                                                             |           |                        |
| Estructuras de Contención (Muros) (%)                                           | 14,41%    | En etapa de reversión. |
| REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4                                      |           |                        |
| Secas                                                                           | 0,68 %    | En etapa de reversión. |
| Húmedas                                                                         | 0.00 %    | En etapa de reversión. |

Fuente Elaboración propia.

UNIDAD FUNCIONAL 5. Al igual que para la Unidad Funcional 4, a partir de la firma del acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes de agosto de 2018, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no continuó ejecutando obras en la Unidad Funcional, no obstante, a continuación, se indica el porcentaje que alcanzó a ejecutar la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

**Tabla 28 Porcentaje de Avance Global de la UF5**

| UNIDAD FUNCIONAL 5 | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|--------------------|------------|-----------|------------|
|                    | 1,69%      | 1,69%     | 0%         |

Fuente Elaboración propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 73 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 29 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF5**

| UNIDAD FUNCIONAL 5                                                      |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 – MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) |                     |                                     |
| ÍTEM                                                                    | Ejecutado acumulado | Observaciones                       |
| <b>Explanaciones y Taludes</b>                                          |                     |                                     |
| Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones                           | 2,85%               | En etapa de reversión               |
| <b>Drenajes</b>                                                         |                     |                                     |
| Alcantarillas tubulares y en cajón                                      | 0,08%               | En etapa de reversión               |
| Cuneta fundida in situ                                                  | 0,00%               | En etapa de reversión               |
| <b>Estructura de Pavimento</b>                                          |                     |                                     |
| Subbase Granular (Km)                                                   | 0,73 Km             | En etapa de reversión               |
| Base Granular (Km)                                                      | 0,53 Km             | En etapa de reversión               |
| Rodadura (Km)                                                           | 0,00 Km             | En etapa de reversión               |
| <b>REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5</b>                       |                     |                                     |
| Secas                                                                   | 3 Unid              | % Avance: 5%. En etapa de reversión |
| Húmedas                                                                 | 0 %                 | % Avance: 0% En etapa de reversión  |

**Fuente Elaboración propia.**

UNIDADES FUNCIONALES 4 y 5: La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con su comunicación D-916-2018 del 27 de abril de 2018, notificó un Evento Eximente de Responsabilidad por la existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5, el cual fue ratificado por la entidad, no hubo avances de obra desde esta fecha, actualmente el Proyecto se encuentra en Etapa de Reversión. Las partes, Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y Agencia Nacional de Infraestructura, procedieron a la firma del acta del EER a principios del mes de agosto de 2018.

De igual manera, se indica que con fecha de corte diciembre 19 de 2024, fecha de terminación del Contrato de Concesión, no hay avance en la ejecución de obras, a marzo 31 de 2025, continúa igual. Otras obras que a la fecha se realizan en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 corresponden a labores de operación y mantenimiento o corresponden a hallazgos posteriores al recibo y no generan avance (Intervenciones en Tilatá, Arrayanes y taludes de las UF3 y UF2).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 74 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 5.5 ESTADO DE PENDIENTES

A continuación, se describe el estado de los pendientes con corte a 19 de diciembre de 2024 por Unidad Funcional (Durante marzo de 2025 no se ejecutó ninguna labor de pendientes):

### 5.5.1 Pendientes Técnicos UF1 a diciembre 20 de 2024:

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019. El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un programado acumulado del 100%, observando las actividades de obra se encuentran culminadas en su totalidad.

No existen pendientes técnicos en la UF1.

### 5.5.2 Pendientes Técnicos UF2 a diciembre 20 de 2024:

En la Unidad Funcional 2A, falta culminar un sector de la Estación de Pesaje (Sector Alcaparros), que fue afectado por el EER de Arqueología, el cual no está vigente en la actual etapa de Reversión, durante el presente periodo de marzo de 2025 no se ha ejecutado ninguna actividad constructiva, por lo cual el avance no se ve afectado. Sin embargo, las labores arqueológicas han terminado y se espera que se concluyan las labores pendientes (Labores de catalogación del ICANH).

A la fecha solo están pendientes las labores de terminación en la Báscula de Sopó, que fueron cobijadas por EER de arqueología. No existen más pendientes en la UF2.

### 5.5.3 Pendientes Técnicos UF3 a diciembre 20 de 2024:

Con respecto al tema de ajustes a las cercas en la de la Unidad Funcional 3A. la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S presentó un cronograma de ejecución de acabados de las cercas para generar uniformidad, este cronograma fue cumplido y terminado el 15 de julio de 2023.

Unidad Funcional 3B: Con la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión, se establecieron las alternativas necesarias para superar los hechos que dieron lugar al Evento Eximente de Responsabilidad previsto en la Unidad Funcional 3 Subsector B; así, una vez cumplidos los requerimientos allí establecidos y acordados entre las Partes, se podría proceder con la construcción de la Estación de Peaje de Choachí; durante el mes de septiembre de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) del 25 de agosto de 2023, la Interventoría da NO OBJECCIÓN a los Estudios y Diseños para la construcción de la estación de peaje Choachí en la UF3B de la Ruta Nacional 4006A, ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. Con corte a 20 de diciembre de 2024, fecha de inicio de la Etapa de reversión del Contrato, las labores constructivas se limitan a preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 75 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Por considerar de importancia, a continuación, se describen las actuaciones de esta Interventoría en forma resumida en referencia al peaje de Choachí:

- El día 27 de enero de 2023 se realiza la revisión de la atención de las observaciones pendientes.
- El día 27 de abril de 2023 se reciben los comunicados D481-2023 y D583- 2023 donde se remite la nueva versión del documento y el oficio respuesta a las observaciones.
- Mediante comunicaciones CERS-OP-1311-2023 (ANI Número de Radicado 20234090546512) del 28 de mayo de 2023 y CERS-OP-1535-2023 (ANI Número de Radicado 20234090628302) del 7 de junio de 2023, la Interventoría realiza observaciones a estos diseños.
- Mediante comunicación D-913-2023 del 20 de junio de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S informa la entrega de la versión final de los diseños corregidos del peaje de Choachí.
- Durante el mes de julio de 2023, los diseños se encontraban en la última revisión por parte de la Interventoría, con las correcciones efectuadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. específicamente referentes a Arquitectura y Urbanismo y Seguridad Vial. Las siguientes son las últimas comunicaciones efectuadas: Comunicado CER-OP-2036-2023 (Rad. ANI 20234090827742) del 25 de julio de 2023: Revisión de la seguridad vial Versión final de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado D-913-2023, Respuesta a al comunicado CER-OP-2086-2023 (Radicado ANI 20234090846562) del 28 de julio de 2023: Revisión Diseño Geométrico - Versión Final de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado D-913-2023, Respuesta al comunicado CER- OP-2115-2023 (Radicado ANI 20234090856762) del 1 de agosto de 2023: Revisión Área de Urbanismo y Arquitectura - Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implementación del Peaje, y Respuesta al comunicado CER-OP-2114-2023 (Radicado ANI 20234090857252) del 1 de agosto de 2023: Revisión Especialista Estructural - Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implantación del Peaje Choachí. Comunicado D-913-2023.
- Mediante comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) del 25 de agosto de 2023, se dio **NO OBJECCIÓN** a los Estudios y Diseños para la construcción de la estación del peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 76 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

- Mediante comunicación **D-1223-2023 del 30 de agosto de 2023**, la Sociedad concesionaria Perimetral oriental de Bogotá S.A.S. solicitó a la ANI coordinar y definir las fechas y gestiones **para socializar las tarifas del peaje de Choachí con las comunidades del sector, así:**

*"...() dado que la Resolución 1462 de fecha 29 de mayo de 2014 por medio de la cual "se emite concepto vinculante previo al establecimiento de tres estaciones de peaje denominadas Ubaque, Choachí y Sopó, se establecen las tarifas a cobrar en las estaciones denominadas Ubaque, Choachí, Sopó, Los Patios y La Cabaña que pertenecen al proyecto Perimetral de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones", en su artículo sexto, indica "ARTICULO SEXTO: Seis meses antes de la instalación de las casetas de peaje, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá socializarlas con las comunidades del sector", lo anterior sin perjuicio que es competencia de la ANI adelantar la socialización relacionada con la estructura tarifaria, así como en lo pertinente a la definición de requisitos de acceso a beneficios y/o tarifas diferenciales que a bien tenga definir la Agencia Nacional de Infraestructura.*

*"...() le solicitamos a la ANI se sirva coordinar y definir las fechas y gestiones del caso para adelantar la respectiva socialización en lo pertinente a lo regulado en la Resolución 1462 de fecha 29 de mayo de 2014, teniendo en cuenta los plazos de construcción regulados en el Otrosí No 10 al Contrato de Concesión, plazos que se muestran en el Plan de Obras adjunto, por lo que requerimos su gestión a la mayor brevedad con el fin de que no se vea impactado el Plan de Obras adjunto."*

Así mismo, en la misma comunicación D-1223-2023, informa que como requisito del Apéndice Técnico 8 el Concesionario debe socializar las obras correspondientes al peaje de Choachí:

*"..() Así las cosas y teniendo en cuenta que, como requisito del Apéndice Técnico 8, establece realizar reuniones de inicio de obra con el ánimo de informar a las autoridades municipales y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las actividades constructivas que se van a realizar, así como las características técnicas de la intervención, requerimiento de mano de obra, entre otros temas de interés, el Concesionario está adelantando la citación a la comunidad y los demás actores, con el ánimo de socializar las obras correspondientes al peaje de Choachí."*

Anexo a esta comunicación fue entregado un cronograma, en el cual afirma el concesionario terminar las labores constructivas el día 13 de marzo de 2024, iniciando construcción el 15 de septiembre de 2023:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 77 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Id | Nombre de tarea                                                 | DIAS CALENDARIO | DIAS LABORALES | Comienzo   | Fin        | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CHOACHÍ                        | 201             | 172 días       | 25/08/2023 | 13/03/2024 |              |
| 2  | 1.1 Pre Construcción                                            | 39              | 33 días        | 25/08/2023 | 03/10/2023 |              |
| 3  | 1.1.1 No Objeción a los Diseños por parte de la Interventoría   | 0               | 0 días         | 25/08/2023 | 25/08/2023 |              |
| 4  | 1.1.2 Socialización de los trabajos por parte de la ANI         | 0               | 0 días         | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 3FC+17 días  |
| 5  | 1.1.3 Socialización de los trabajos por parte del Concesionario | 0               | 0 días         | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 3FC+17 días  |
| 6  | 1.1.4 Limpieza del Area de Trabajo                              | 18              | 15 días        | 15/09/2023 | 03/10/2023 | 5FC+1 día    |
| 7  | 1.1.5 Suministro y traslado de material                         | 18              | 15 días        | 15/09/2023 | 03/10/2023 | 5FC+1 día    |
| 8  | 1.2 Construcción                                                | 180             | 154 días       | 15/09/2023 | 13/03/2024 |              |

- Así las cosas, en cumplimiento del Otrosí N.º 10, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. **debió iniciar las labores constructivas (Con Proconstrucción) del Peaje Choachí el 26 de agosto de 2023.**
- Mediante comunicación D-1405-2023 del 29 de septiembre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. notifica a la ANI su solicitud de declarar un EER por no poder instalar el Peaje de Choachí. Anexando el mismo cronograma con fecha terminación el 13 de marzo de 2024.
- Mediante comunicación D-1414-2023 del 29 de septiembre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (En adelante “Concesionario”) realiza alcance a la comunicación D-1405-2023, que cualquier referencia realizada en dicha comunicación a la correspondiente compensación por menor recaudo, se entienda concreta y específicamente relacionada con lo regulado en la Sección 3.3(g)(i) de la Parte General del Contrato de Concesión.
- Mediante comunicación D-1457-2023 del 9 de octubre de 2023, el Concesionario remite el informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de finalización el 29 de abril, de acuerdo con el intento de socialización de construcción del Peaje programada para el 20 de octubre, y con fecha de iniciación de obras el 21 de octubre:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b><br><b>de 2022</b>                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 78 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Id | Nombre de tarea                                                                         | DIAS CALENDARIO | DIAS LABORALES | Comienzo   | Fin        | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CHOACHÍ                                                | 248             | 212 días       | 25/08/2023 | 29/04/2024 |              |
| 2  | 1.1 Pre Construcción                                                                    | 75              | 64 días        | 25/08/2023 | 08/11/2023 |              |
| 3  | 1.1.1 No Objeción a los Diseños por parte de la Interventoría                           | 0               | 0 días         | 25/08/2023 | 25/08/2023 |              |
| 4  | 1.1.2 Socialización de los trabajos por parte de la ANI (INICIAL)                       | 0               | 0 días         | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 3FC+17 días  |
| 5  | 1.1.3 Socialización de los trabajos por parte del Concesionario (INICIAL)               | 0               | 0 días         | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 3FC+17 días  |
| 6  | 1.1.4 Segunda convocatoria de socialización de los trabajos por parte del Concesionario | 0               | 0 días         | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 3FC+48 días  |
| 7  | 1.1.5 Limpieza del Area de Trabajo                                                      | 18              | 15 días        | 21/10/2023 | 08/11/2023 | 6FC+1 día    |
| 8  | 1.1.6 Suministro y traslado de materiales                                               | 18              | 15 días        | 21/10/2023 | 08/11/2023 | 6FC+1 día    |

- Mediante comunicación D-1551-2023 del 13 de octubre de 2023, se remite el informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de finalización el 13 de mayo, de acuerdo con el intento de socialización de construcción del Peaje programada para el 3 de noviembre, y con fecha de iniciación de obras el 4 de noviembre:

| Id | Nombre de tarea                                                                         | DIAS CALENDARIO | DIAS LABORALES | Comienzo   | Fin        | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1  | 1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CHOACHÍ                                                | 262             | 224 días       | 25/08/2023 | 13/05/2024 |              |
| 2  | 1.1 Pre Construcción                                                                    | 89              | 76 días        | 25/08/2023 | 22/11/2023 |              |
| 3  | 1.1.1 No Objeción a los Diseños por parte de la Interventoría                           | 0               | 0 días         | 25/08/2023 | 25/08/2023 |              |
| 4  | 1.1.2 Socialización de los trabajos por parte de la ANI (INICIAL)                       | 0               | 0 días         | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 3FC+17 días  |
| 5  | 1.1.3 Socialización de los trabajos por parte del Concesionario (INICIAL)               | 0               | 0 días         | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 3FC+17 días  |
| 6  | 1.1.4 Segunda convocatoria de socialización de los trabajos por parte del Concesionario | 0               | 0 días         | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 3FC+60 días  |
| 7  | 1.1.5 Limpieza del Area de Trabajo                                                      | 18              | 15 días        | 04/11/2023 | 22/11/2023 | 6FC+1 día    |
| 8  | 1.1.6 Suministro y traslado de materiales                                               | 18              | 15 días        | 04/11/2023 | 22/11/2023 | 6FC+1 día    |
| 9  | 1.2 Construcción                                                                        | 172             | 147 días       | 11/11/2023 | 01/05/2024 |              |

- Mediante comunicación D-1584-2023 del 20 de octubre de 2023, se remite el informe semanal de EER, sin anexos.
- Con comunicación CERS-OP-3058-2023 (ANI 20234091216462) del 23 de octubre de 2023, la Interventoría da respuesta a las comunicaciones D-1405-2023.1457, 1551 y 1584 de 2023, notificando al Concesionario que no procede la entrega de Informes Semanales sin el reconocimiento del EER.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 79 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

- Mediante comunicación D-1749-2023 del 10 de noviembre de 2023 el Concesionario da respuesta a la comunicación CERS-OP-3058-2023 dando alcance a la comunicación D-1405-2023 y solicitando el pronunciamiento de la ANI respecto de la solicitud de EER, como anexo a esta comunicación se anexan copias a las Alcaldías.
- Con comunicación CERS-3294-2023 del 15 de noviembre de 2023, la interventoría solicita la actualización del Plan de Obras.
- Mediante comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 el Concesionario da respuesta a la comunicación CERS-OP-3294-2023 entregando un cronograma actualizado de acuerdo con los intentos de socialización con fecha de inicio 4 de noviembre y fecha de finalización el 11 de mayo de 2024:

| Id | Nombre de tarea                                                                         | DÍAS CALENDARIO | DÍAS LABORALES | Comienzo     | Fin          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1  | 1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CHOACHÍ                                                | 260             | 223 días       | vie 25/08/23 | sáb 11/05/24 |
| 2  | 1.1 Pre Construcción                                                                    | 89              | 76 días        | vie 25/08/23 | mié 22/11/23 |
| 3  | 1.1.1 No Objeción a los Diseños por parte de la Interventoría                           | 0               | 0 días         | vie 25/08/23 | vie 25/08/23 |
| 4  | 1.1.2 Socialización de los trabajos por parte de la ANI (INICIAL)                       | 0               | 0 días         | vie 15/09/23 | vie 15/09/23 |
| 5  | 1.1.3 Socialización de los trabajos por parte del Concesionario (INICIAL)               | 0               | 0 días         | vie 15/09/23 | vie 15/09/23 |
| 6  | 1.1.4 Segunda convocatoria de socialización de los trabajos por parte del Concesionario | 0               | 0 días         | vie 3/11/23  | vie 3/11/23  |
| 7  | 1.1.5 Limpieza del Area de Trabajo                                                      | 10              | 8.75 días      | sáb 4/11/23  | mar 14/11/23 |
| 8  | 1.1.6 Suministro y traslado de materiales                                               | 18              | 15 días        | sáb 4/11/23  | mié 22/11/23 |
| 9  | 1.2 Construcción                                                                        | 172             | 147.25 días    | vie 10/11/23 | mar 30/04/24 |

- La Sociedad Concesionaria presentó el respectivo Plan de Obra del Peaje Choachí mediante la comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 en el cual expuso:



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 80 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 1 Plan de obras en Construcción Peaje de Choachí**

| Nombre de tarea                                                                         | DIAS CALENDARIO | DIAS LABORALES | Comienzo     | Fin          | Predecesoras |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CHOACHÍ                                                | 260             | 223 días       | vie 25/08/23 | sáb 11/05/24 |              |
| 1.1 Pre Construcción                                                                    | 89              | 76 días        | vie 25/08/23 | mié 22/11/23 |              |
| 1.1.1 No Objeción a los Diseños por parte de la Interventoría                           | 0               | 0 días         | vie 25/08/23 | vie 25/08/23 |              |
| 1.1.2 Socialización de los trabajos por parte de la ANI (INICIAL)                       | 0               | 0 días         | vie 15/09/23 | vie 15/09/23 | 3FC+17 días  |
| 1.1.3 Socialización de los trabajos por parte del Concesionario (INICIAL)               | 0               | 0 días         | vie 15/09/23 | vie 15/09/23 | 3FC+17 días  |
| 1.1.4 Segunda convocatoria de socialización de los trabajos por parte del Concesionario | 0               | 0 días         | vie 3/11/23  | vie 3/11/23  | 3FC+60 días  |
| 1.1.5 Limpieza del Area de Trabajo                                                      | 10              | 8.75 días      | sáb 4/11/23  | mar 14/11/23 | 6FC+1 día    |
| 1.1.6 Suministro y traslado de materiales                                               | 18              | 15 días        | sáb 4/11/23  | mié 22/11/23 | 6FC+1 día    |
| 1.2 Construcción                                                                        | 172             | 147.25 días    | vie 10/11/23 | mar 30/04/24 |              |
| 1.2.1 Preliminares                                                                      | 171             | 146 días       | sáb 11/11/23 | mar 30/04/24 |              |
| 1.2.1.1 Establecimiento Puntos de Control Topografico y Trazado, Localización y         | 171             | 146 días       | sáb 11/11/23 | mar 30/04/24 | 6FC+7 días   |

Fuente: Comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023

- Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Otrosí 10 suscrito por las Partes del Contrato de Concesión de la referencia, se entiende que el periodo de construcción de la Infraestructura del peaje será de: seis meses y veintiún días posteriores a la NO OBJECCIÓN de los diseños definitivos, la cual se materializó con la Comunicación CERS-OP-2370-2023 con Radicado ANI 20234090959792 del 25 de agosto de 2023, se concluye que la fecha de finalización de la etapa constructiva venció el 18 de marzo de 2024.
- En resumen, se presenta que el período de construcción del Peaje Choachí conforme el Plan de Obras vigente entregado y el Otrosí 10, corresponde al periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2023 y hasta el 18 de marzo de 2024, previas las actividades de Preconstrucción que el Concesionario planteó en su Plan de Obras.

No obstante, lo anterior, el Concesionario, mediante diferentes comunicados notificó a la ANI y a esta Interventoría de lo que consideró era el acaecimiento de un EER con ocasión del supuesto fracaso en la socialización del mismo.

- Mediante comunicación del 20233060379391 del 18 de octubre de 2023, la ANI requirió a esta Interventoría emitir concepto integral frente a la aludida solicitud presentada por el Concesionario.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 81 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- Por lo anterior, esta Interventoría emitió su concepto, mediante comunicación CERS-OP-3283-2023 del 15 de noviembre de 2023 20234091307232 de la misma fecha, considerando que no consideraba viable el reconocimiento del EER.
- El 24 de enero de 2024 por medio de comunicación ANI N° 20243060024191 de fecha 22 de enero de 2024 Al ANI emitió respuesta a la solicitud de reconocimiento de un EER, negando las pretensiones del concesionario.
- El 25 de enero de 2024 esta interventoría con el comunicado CERS-OP-228-2024, radicado ANI No. 20244090098672 reiteró al Concesionario la necesidad de adelantar las obras y evidenció el atraso presentado a la fecha y. que la fecha de finalización de la etapa constructiva venció el 18 de marzo de 2024. y no el 30 de abril como lo plantea la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. en su Plan de Obras.
- El concesionario informó y activó labores constructivas el día 6 de febrero de 2024.
- Ante el inicio de labores en el peaje de Choachí y la inconformidad de la comunidad por el sitio de construcción y posterior puesta en operación, por redes sociales la comunidad convocó a manifestaciones en el sitio de construcción para el día 9 de febrero de 2024.
- Ante las amenazas de posibles bloqueos el Concesionario y la ANI realizaron la gestión para establecer una reunión con la alcaldía de Choachí a fin de exponer las obligaciones contractuales, cumplimiento de precedentes que hacen necesario la construcción del peaje Choachí y con ello persuadir la institucionalidad local y comunidad de las vías de hecho anunciadas.
- El 9 de febrero de 2024 se realizó una reunión en la Alcaldía de Choachí a las 7:00 Am, con el alcalde, secretarios de despacho, Personería municipal, Policía municipal, la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., la ANI y la interventoría, donde desde la Alcaldía se expuso el malestar de la comunidad ante la inminente construcción y puesta en operación del peaje Choachí por su ubicación en el área de páramo, mal estado de las UF 4 y 5 y puesta en operación sin haberse definido la finalización de las mismas. Desde la ANI se explicaron: (i) las obligaciones contractuales, (ii) el cumplimiento de precedentes que hacen necesario la construcción del peaje Choachí, y se contextualizó sobre (iii) la existencia de un EER y (iv) un Arbitraje Internacional en curso en las Uf 4 y 5,
- El 9 de febrero de 2024, a las 9:00 Am, la comunidad realizó una manifestación y bloqueo en el sitio de construcción del peaje Choachí en la vía Bogotá Choachí,

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 82 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

impidiendo el tráfico normal de automotores desde aproximadamente las 9:00 a.m., hasta pasado el mediodía.

- El 15 de febrero de 2024 el Concesionario inició labores de demolición cunetas en costado derecho del sector peaje.
- El 16 de febrero de 2024, hacia aprox. las 6:15 Am habitantes de las comunidades de Choachí, Fómeque, Ubaque y la Calera bloquearon la vía Bogotá – La Calera, en el sector Patios - Arrayanes impidiendo e impactando ampliamente el tráfico normal de automotores en los dos sentidos, exponiendo sus inconformidades respecto de la construcción del Peaje Choachí, por una supuesta afectación al Páramo Cruz Verde, estado de las UF4 y 5 y algunas afectaciones en la Vía La Calera, así como la falta de definición ante el tribunal de arbitramento Internacional en curso.
- A 19 de febrero de 2024 no se visualizaban labores constructivas representativas ni mayor avance en el sitio del Peaje Choachí PR 2+040 RN4006A UF3B (avance del 0% respecto a lo programado).
- Así las cosas, las labores constructivas desarrolla por la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. a 16 de febrero de 2024, fecha en la que se suspendieron las actividades constructivas por la ANI ante las manifestaciones y bloqueos de vías por la comunidad, se limitan principalmente a actividades preliminares como: instalación de campamento (contenedor), replanteos Topográficos, instalación de cerramiento por costado derecho e inicio de la demolición mecánica de la cuneta Derecha del PR 2+020 al PR2+130, en longitud aproximada de 110 m.
- Atendiendo los compromisos del 16 de febrero de 2024 se desarrolló reunión del 19 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, con participación de los alcaldes Municipales, Gobernación de Cundinamarca, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Perimetral Oriental de Bogotá – POB, con el acompañamiento de esta Interventoría, ante las múltiples manifestaciones y exigencias de la comunidad argumentando nuevos bloqueos, la ANI informó la suspensión de las obras del peaje por un mes y se llegaron a las siguientes conclusiones:
  - a. Se suspenden las obras del peaje Choachí por el término de un (1) mes.
  - b. CORPORINOQUÍA realizará una visita al lugar de construcción del peaje Choachí para realizar un estudio sobre sus condiciones e impacto, y dependiendo de los resultados de aquel, se determinarán los efectos sobre las intervenciones.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 83 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

c. Se dejó claridad sobre la necesidad contractual de construir el peaje, pero se realizará una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, de socialización y contractuales del proyecto con la comunidad.

d. Se establecerán mesas de trabajo entre con la comunidad institucionalidad e implicados.

- El 23 de febrero de 2024, ante las solicitudes de comunidad y compromisos de la mesa de trabajo del 19 de febrero 2024 en Gobernación de Cundinamarca, Corporinoquia realizó la diligencia de inspección al sitio donde contractualmente se tiene definida la construcción del peaje Choachí, actividad que contó con asistencia de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., Comunidad Interventoría, ANI, entes de control.
- El 22 de marzo de 2024, se recibió visita de inspección de la Contraloría al sitio del peaje de Choachí, verificando actividades preliminares de construcción dentro del derecho de vía.
- Mediante comunicación CERS-OP-1309-2024 (RAD ANI 20244090611432) del 22 de mayo de 2024, la Interventoría da respuesta a la comunicación D-436-2024 con asunto: "Respuesta a su comunicado CERS-OP-357-2024 (R-450-2024) – Gestión ante autoridades correspondientes, frente a la amenaza de manifestaciones y alteraciones del orden público en la zona de obra peaje Choachí UF3B ruta 4006A PR02+100."
- Durante los meses de abril y mayo de 2024 las labores se mantuvieron suspendidas.
- Durante el mes de junio de 2024, se verificaron labores de poda de árboles en este sector.
- Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, no se verificaron labores constructivas en este sector.
- Con comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2424-2024 (ANI Número de Radicado 20244091264472) del 10 de octubre de 2024, esta interventoría realiza solicitud a la ANI de No Objeción a un Plazo de Cura por el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en (i) la cláusula 12 del Otrosí 10 y (ii) de la Sección 3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión respecto de la construcción e instalación de la Estación de Peaje de Choachí (Unidad Funcional 3 subsector 2).
- Durante el mes de noviembre de 2024, no se realizaron actuaciones ni labores constructivas en este Peaje, en diciembre de 2024, no se ejecutaron labores constructivas en este Peaje.
- En marzo 28 de 2025, no se realizaron actuaciones ni labores constructivas en este Peaje, desde diciembre 20 de 2024, el Proyecto se encuentra en Etapa de Reversión.

#### 5.5.4 Unidades Funcionales 4 y 5:

Como se dijo, las Partes, Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., procedieron a la firma de un acta de EER a principios

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 84 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

del mes de agosto de 2018, por lo que respecta a diciembre de 2024, persisten pendientes las labores constructivas de estas unidades funcionales que no van a ser subsanados por la terminación anticipada del Contrato de Concesión el 19 de diciembre de 2024.

En las Unidades Funcionales 4 y 5, se verifican serios problemas de inestabilidad y pérdida de banca, el Concesionario define "Puntos Críticos" como "Sector de la vía que presenta afectaciones que no pueden ser resueltas mediante Intervenciones Prioritarias"; tanto para la ANI como para la Interventoría, este concepto es errado, puesto que es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., la atención de mantenimiento de todo el corredor, sin excepción y no puede evadir su responsabilidad; la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. estima "Punto Crítico" como sectores deteriorados no atendidos por ellos mismos.

## 5.6 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA AREA TECNICA

La Interventoría viene realizando las siguientes actividades durante la etapa de operación y mantenimiento:

- Preparación y emisión de informes mensuales
- Asistencia a reuniones de comité técnico regularización y extraordinarios.
- Realización de registro fotográfico y video de las principales actividades.
- Apoyo a la verificación y la toma de indicadores
- Seguimiento técnico de mantenimiento a las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 en Operación.
- Seguimiento al estado e intervenciones por parte del Concesionario en las Unidades Funcionales 4 y 5.
- Seguimiento técnico a las labores de operación.
- Asesoría por parte de los especialistas para análisis de solicitudes de ajustes técnicos.
- Atención a informes solicitados por la entidad.
- Revisión formatos de reversión entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.
- Seguimiento y apoyo a la gestión predial.
- Seguimiento y apoyo a la gestión jurídica.

## 5.7 REQUERIMIENTOS E INFORMES SOLICITADOS AL CONCESIONARIO

Con la comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0372-2025 (ANI Numero de Radicado 20254090277622) del 4 de marzo, se requiere a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para que valide ante el INVIAS, Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de La Calera, las coordenadas de los Postes de referencia enviadas en la comunicación D-195-2025 que servirán de base para la actual Etapa de Reversión.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 85 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 5.8 CONCLUSIONES TÉCNICAS

El avance ejecutado estimado a 20 de diciembre de 2024, fecha de inicio de la Etapa de Reversión por Terminación Anticipada del Contrato, es del 43,23% del proyecto en general.

En Tilatá, talud de la UF3A, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la comunicación D-1380-2024 presentó una reprogramación con fecha de finalización el 30 de enero de 2025. El avance en las obras de estabilización con esta nueva programación se estima, a 31 de marzo de 2025, en una ejecución del 99,94% del 100% programado, quedando pendientes de terminación paisajística.

El Concesionario mediante comunicación D-77-2025 del 23 de enero de 2025, entregó los diseños fase III corregidos para las obras de estabilización del talud Arrayanes en el PR1+080 de la RN5009, los cuales fueron revisados por la Interventoría, emitiendo la comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0193-2025 (ANI Numero de Radicado 20254090151742) del 6 de febrero de 2025, con observaciones y concepto de NO OBJECCIÓN Técnico, presentando OBJECIONES ambientales que aún no han sido subsanadas.

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe validar las coordenadas de los Postes de Referencia ante el INVIAS, especialmente en la Unidad Funcional 1A donde fueron removidos; los restantes corresponden a Postes pertenecientes a Rutas a cargo de la Gobernación de Cundinamarca (UF1A, UF4 desde el PR0+000 al PR0+700, PR14+000 hasta Choachí en la RN40CN06 y UF5 del PR32+000 al PR51+000 de la RN 4006A) y la Alcaldía de La Calera (UF4 desde el PR0+700 hasta el PR14+000 RN40CN06) cuyas coordenadas deben ser validadas con estas entidades del estado.

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hizo entrega de 51 formatos de Reversión a la Interventoría mediante comunicación D-289-2025 del 18 de marzo de 2025, la cual fue respondida con observaciones por esta Interventoría mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0509-2025 (ANI número de Radicado 20254090379412) el 26 de marzo de 2025.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 86 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 6 ÁREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### 6.1 ANÁLISIS DE EVENTOS

En este capítulo se presentan las principales actividades de los eventos realizados en el mes de marzo 2025 por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, relacionados con la operación y mantenimiento de las tres unidades Funcionales que se encuentran terminadas y en operación, realizando mantenimientos tanto rutinarios como periódicos, teniendo en cuenta actividades como: (accidentes/incidentes) atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, discriminados por localización y gravedad de estos; esta información está relacionada con el cumplimiento de los indicadores O4 y O5, de acuerdo en lo contenido en el Apéndice Técnico No 2 del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No 002 de 08 de septiembre de 2014.

También se informan las actividades realizadas en los controles de peajes y tráfico en general del corredor vial concesionado, así como las actividades realizadas por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y el DITRA en seguridad vial.

### 6.2 VALLAS INFORMATIVAS.

El día 28 de junio de 2023 se recibió la comunicación ANI – 2023306022831 remitiendo la resolución 20233040025285 del 20 de junio de 2023, “Por la cual se establece la distribución, diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte que contrate el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA – AEROCIVIL”, junto a dicha resolución se anexa documento el cual contiene los lineamientos nombrados e información para el cumplimiento de la normatividad y estructuración de la elaboración de las nuevas vallas a construir para el respectivo cambio de las existentes.

Esta interventoría informa que, teniendo en cuenta el diseño de las vallas enviado en el anexo de la Resolución 20233040025285 del 20 de junio de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., envió a la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI” oficina de comunicaciones para la respectiva revisión, los diseños fueron revisados y devueltos con observaciones y una vez se subsanaron por el Concesionario fueron enviadas nuevamente a la ANI, donde finalmente fueron aprobados; en el transcurso del mes de diciembre 2023 se instalaron en los siguientes sectores:

#### UF1

- PR24+200 costado derecho. UF1A ruta 5009
- PR26+990 costado izquierdo. UF1B ruta 0803



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 87 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## UF2

- PR09+750 costado derecho UF2A ruta 50CN03

## UF3

- PR00+300 costado derecho UF3A ruta 5009
- PR00+100 costado izquierdo UF3B ruta 4006 A.

## 6.3 ESTADO DEL CLIMA.

Durante marzo de 2025 se presentaron temperaturas mínimas, máximas y promedio que se muestran en la siguiente tabla:

**Tabla 30 Estado del clima marzo 2025**

| Unidad Funcional 1, 2 y 3A | Mínima | Máxima | Promedio Marzo |
|----------------------------|--------|--------|----------------|
| Guasca                     | 9,8°C  | 18,7°C | 13,5°C         |
| Guatavita                  | 8,5°C  | 16,7°C | 12,0°C         |
| Sesquilé                   | 9,1°C  | 17°C   | 12,8°C         |
| Sopó                       | 9,8°C  | 18,7°C | 13,2°C         |
| La calera                  | 9,4°C  | 17,8°C | 12,5°C         |
| Unidad Funcional 3B, 4 y 5 | Mínima | Máxima | Promedio Marzo |
| Choachí                    | 12,1°C | 19,3°C | 15,0°C         |
| Cáqueza                    | 12,8°C | 19,3°C | 15,4°C         |
| Ubaque                     | 12,1°C | 19,3°C | 15,0°C         |

Fuente: Datos suministrado Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

La información de temperatura para los municipios de Guasca, La Calera y Sopó fue obtenida a través de las estaciones meteorológicas instaladas en los peajes de Patios, Cabaña y Sopó.

## 6.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO.

Esta Interventoría continúa supervisando y revisando las actividades de mantenimiento que la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. viene realizando con las diferentes cuadrillas dispuestas a lo largo de las unidades funcionales (1, 2, 3, 4 y 5) ejecutando en cada una de ellas, las diferentes actividades de mantenimiento rutinario y periódico, así como atendiendo las observaciones remitidas por esta interventoría durante marzo de 2025.

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. llevó a cabo mantenimientos en todas las Unidades Funcionales, mientras que la interventoría se encargó de revisar los indicadores y las actividades de mantenimiento de la siguiente manera:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 88 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## Unidades Funcionales 1A y 1B

UF1A comprendida entre la rotonda El Salitre y el Municipio de Guasca y la UF1B comprendida entre la rotonda 4 Esquinas – Guatavita - Sesquilé, donde se realizó mantenimientos rutinarios evidenciando la ejecución de las siguientes actividades:

- UF1A: Entre el PR23+600 sector Rotonda el Salitre y el PR 35+000 (Guasca), RN5009, se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas, limpieza de drenajes transversales (que lo requieran), rebordeo y poda.
- UF 1B: Entre los PR0+000 al PR27+200 se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas, limpieza de drenajes transversales (que lo requieran), rebordeo y poda.

En las Unidades Funcionales 1A y 1B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores correspondientes al mes de marzo de 2025:

**FISURAS (E3):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 1B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3427, se identificaron sectores que no sobrepasen los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4.

**BACHES (E6):** Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 1A y 1B, no se encontraron baches, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3428. Lo anterior sin generar incumplimientos en la UF1.

**HUNDIMIENTOS (E7):** Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF1B y UF1A, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3429, donde no se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación así las cosas sin generar incumplimientos en la unidad funcional 1.

**ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO DE MÁRGENES DE VÍA (E8):** Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3430. Donde se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimientos en los Segmento No. 25 PR13+910 RN0803, Segmento No. 33 PR21+255 RN0803 y Segmento No. 12 PR0+255 RN0804.

**DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10):** Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 89 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

código de revisión No. 3431, en donde se identificaron incumplimientos por colmatación en el segmento No. 23 PR11+890 RN0803.

**SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11):** Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3432. Lo anterior generando incumplimientos en el segmento No. 5,6,8,9,10 y 11 RN5009 y segmento No 35 RN 0803.

**BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13):** Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3433, lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 1.

**ILUMINACIÓN (E14):** Se realizó recorrido general de las Unidades funcionales 1A y 1B los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3434, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado en el apéndice técnico No.4.

#### **Unidades Funcionales 2A y 2B:**

UF2A localizada entre Rotonda el Salitre y el Municipio de Sopó, PR0+000 y el PR10+640 RN50CN03 y la UF2B entre el Municipio La Calera y la Vereda Salitre, PR9+990 y PR23+600 RN5009.

En las Unidades Funcionales UF2A y UF2B, se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo requieran).

En las Unidades Funcionales 2A y 2B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores correspondientes al mes de marzo de 2025:

**IRI (E1):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3461, No se identificaron sectores que sobrepasaban los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4.

**AHUELLAMIENTO (E2):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3462, No se identificaron sectores que sobrepasaban los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4.

**FISURAS (E3):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 90 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

código de revisión No. 3438, No se identificaron sectores que sobrepasaban los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4.

**COEFICIENTE DE FRICCIÓN TRANSVERSAL (E4):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3463, se identificaron sectores que sobrepasaban los valores mínimos de aceptación, lo anterior generando incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4 en los segmentos No. 48 RN50CN03 y 54 RN5009

**TEXTURA (E5):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3464, No se identificaron sectores que sobrepasaban los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4

**BACHES (E6):** Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados de la medición para el mes de marzo 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3441. Lo anterior sin generar incumplimiento en la unidad funcional 2.

**HUNDIMIENTOS (E7):** Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF2B y UF2A, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3442, Donde se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación generando, incumpliendo en la unidad funcional 2A Segmento No. 42 PR3+560 RN 50CN03.

**ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO DE MÁRGENES DE VÍA (E8):** Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3443. Donde se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación lo anterior sin generar incumplimientos en la UF2.

**DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10):** Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3444 en donde se encontraron incumplimientos por colmatación en los Segmentos No. 49 PR10+780 y 52 PR13+610 RN5009.

**SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11):** Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3465. Lo anterior generando incumplimientos en los Segmentos No. 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 UF2A, Segmentos No. 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 50 UF2B.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 91 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (E12):** Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.3466. Lo anterior generando incumplimientos en los Segmentos No. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 UF2A y Segmento No. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60,61 UF2B

**BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13):** Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3447, lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 2.

**ILUMINACIÓN (E14):** Se realizó recorrido general de las Unidades funcionales 2A y 2B, los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3448, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado en el apéndice técnico No.4.

### Unidades Funcionales 3A y 3B

UF3A localizada entre el Peaje de Patios y el Municipio de la Calera PR00+000 y PR9+992 RN5009 y la UF3B localizada entre límite de Bogotá y Choachí RN4006A PR00+000 y PR22+700.

En las Unidades Funcionales UF3A y UF3B, se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo requieran).

En las Unidades Funcionales 3A y 3B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores correspondientes al mes de marzo de 2025:

**FISURAS (E3):** Se realizó recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 3A y 3B, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3452, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4.

**BACHES (E6):** Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 3A y 3B, los resultados de la medición para el mes de marzo 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3441. Lo anterior sin generar incumplimiento en las unidades funcionales 3A y 3B.

**HUNDIMIENTOS (E7):** Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF3B y UF3A, los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3454, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 92 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO DE MÁRGENES DE VÍA (E8):** Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3455. Donde se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación en el segmento No. 82 PR11+262 RN 4006A y 87 PR16+000 RN4006A

**DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10):** Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.3456, en donde no se encontró incumplimiento por colmatación.

**SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11):** Los resultados de la medición de la UF3A Y UF3B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3457. Lo anterior generando incumplimientos en la unidad funcional 3 en los Segmento No. 69 UF3A y Segmentos No. 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 80 UF3B.

**BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13):** Los resultados de la evaluación de la UF3A Y UF3B para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3458, lo anterior sin generar incumplimientos en la UF3.

**ILUMINACIÓN (E14):** Se realizo recorrido general de la Unidad funcional 3A, los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3459, lo anterior sin generar incumplimiento según lo estipulado en el apéndice técnico No.4.

#### Unidades Funcionales 4 y 5:

En la unidad funcional 4 no se realizaron actividades de mantenimiento en la UF5 se realizó limpieza de márgenes del corredor, rocería y conformaciones de vía.

#### 6.5 MEDICION DE INDICADORES EN LA ETAPA DE REVERSION.

A marzo de 2025 se tiene el siguiente avance en la medición de indicadores para la etapa de reversión

**Tabla 31 avance medición de indicadores para reversión**

| ID | NOMBRE DE INDICADOR  | UF1A      | UF1B      | UF2A      | UF2B      | UF3A      | UF3B      |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E1 | IRI                  | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | PENDIENTE |
| E2 | AHUELLAMIENTO        | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO |
| E3 | FISURAS              | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E4 | FRICCIÓN TRANSVERSAL | PENDIENTE | PENDIENTE | EJECUTADO | EJECUTADO | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E5 | TEXTURA              | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO |
| E6 | BACHES               | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 93 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| ID  | NOMBRE DE INDICADOR     | UF1A      | UF1B      | UF2A      | UF2B      | UF3A      | UF3B      |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E7  | HUNDIMIENTOS            | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E8  | MÁRGENES                | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E10 | DRENAJES                | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E11 | SEÑALES VERTICALES      | PENDIENTE | PENDIENTE | EJECUTADO | EJECUTADO | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E12 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E13 | BARRERAS                | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E14 | ILUMINACIÓN             | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E15 | PUENTES                 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E16 | DEFLEXIÓN               | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| E17 | DISPONIBILIDAD DE VÍA   | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| O1  | MORTALIDAD              | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| O2  | OCUPACIÓN DE CARRILES   | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| O3  | COLA DE PEAJES          | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| O4  | ATENCIÓN DE INCIDENTES  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| O5  | ATENCIÓN DE ACCIDENTES  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |

Fuente: Elaboración propia

## 6.6 PLANES DE MANEJO DE TRANSITO ACTIVOS

### TALUD SECTOR TILATÁ PR2+700 UF3A

En este sector se tiene una canalización por berma con elementos tipo maletines, esta canalización se realiza como factor de disuasión para que los usuarios de la vía tengan precaución al paso por este punto de la vía, ya que se tiene un talud en proceso de estabilización, según la programación entregada por el concesionario la estabilización de este inicio el 29 de mayo de 2024.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 94 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |



## 6.7 VEHICULOS EN OPERACIÓN PARA EL PRESENTE PERIODO

**Tabla 32 vehículos en operación en el presente periodo**

| Placa  | Marca / Referencia | Tipo de Vehículo           | Ubicación        | Área             |
|--------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| KOZ416 | NISSAN URVAN       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| KOZ410 | NISSAN URVAN       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| KOY731 | NISSAN URVAN       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| KOX450 | FORD RANGER        | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| KOX448 | FORD RANGER        | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| KOW315 | FORD RANGER        | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| KOW319 | FORD RANGER        | Camioneta                  | Todo el Proyecto | DITRA            |
| TRN074 | KEMWORT            | Tractocamión               | Zona Norte       | Operación de Vía |
| S21707 | ROMARCO            | Semirremolque tractocamión | Zona norte       | Operación de Vía |
| WGP998 | CHEVROLET NPR      | Camión Doble troque        | Zona Norte       | Operación de Vía |
| TST365 | FOTON FRR          | Camión grúa plataforma     | Zona Sur         | Operación de Vía |
| TST467 | FOTON FRR          | Camión grúa plataforma     | Zona Norte       | Operación de Vía |
| NOK266 | FOTON FRR          | Camión grúa plataforma     | Zona Norte       | Operación de Vía |
| LIR662 | TOYOTA HILUX       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | Operación de Vía |
| LIR665 | TOYOTA HILUX       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | Operación de Vía |
| LIR634 | TOYOTA HILUX       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | Operación de Vía |
| LIR676 | TOYOTA HILUX       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | Operación de Vía |
| LIR693 | TOYOTA HILUX       | Camioneta                  | Todo el Proyecto | Operación de Vía |
| WGP986 | CHEVROLET NPR      | Camión Doble troque        | Zona Sur         | Operación de Vía |
| JSV021 | DUSTER RENAULT     | Camioneta                  | Todo el proyecto | Operación de Vía |
| CXY63F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta                | Zona norte       | DITRA            |
| CXY65F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta                | Zona norte       | DITRA            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 95 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Placa  | Marca / Referencia | Tipo de Vehículo | Ubicación  | Área  |
|--------|--------------------|------------------|------------|-------|
| CXY66F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY67F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY68F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY69F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY71F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY72F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY73F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY74F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona norte | DITRA |
| CXY75F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona sur   | DITRA |
| CXY76F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona sur   | DITRA |
| CXY77F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona sur   | DITRA |
| CXY78F | SUZUKI AT 650      | Motocicleta      | Zona sur   | DITRA |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental De Bogotá SAS

## 6.8 TRAFICO Y TPD MENSUAL POR UNIDADES FUNCIONALES

En la siguiente tabla se presenta el tráfico total por categorías que pasaron por los peajes de patios, cabaña y sopo respectivamente en los sentidos de cobro, el peaje con mayor número de vehículos registrados en el mes de marzo de 2025 fue el peaje de Patios localizado en la UF3A, con un total de 134532 vehículos y un tráfico Promedio diario (TPD) incluidos los vehículos exentos de 4805 y el peaje de menor paso de vehículos sigue siendo el de Sopo localizado en la UF2A con 51146 incluido exentos y un tráfico promedio diario (TPD) de 1827.

**Tabla 33 Tráfico y TPD marzo 2025**

| TRAFICO Y TPD MARZO 2025 |         |            |       |      |      |     |      |    |     |    |       |      |      |     |      |      |      |               |
|--------------------------|---------|------------|-------|------|------|-----|------|----|-----|----|-------|------|------|-----|------|------|------|---------------|
| UF                       | PEAJES  | CATEGORÍAS |       |      |      |     |      |    |     |    |       |      |      |     |      |      |      |               |
|                          | PATIOS  | I          | II    | III  | IV   | V   | VI   | EA | ER. | EG | IE    | IE2A | IE2B | IE3 | IE4  | 2A   | 2 E  | TRAFICO TOTAL |
| UF3A                     | Pagos   | 74533      | 5603  | 1171 | 1352 | 0   | 0    | 0  | 0   | 2  | 27352 | 7922 | 590  | 397 | 4755 | 5734 | 4370 | 133779        |
|                          | Exentos | 736        | 12    | 5    | 0    | 0   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 753           |
|                          | Total   | 75269      | 5615  | 1176 | 1352 | 0   | 0    | 0  | 0   | 2  | 27352 | 7922 | 590  | 397 | 4755 | 5734 | 4370 | 134532        |
|                          | CABAÑA  | I          | II    | III  | IV   | V   | VI   | EA | ER. | EG | IE    | IE2A | IE2B | IE3 | IE4  | 2A   | 2 E  | TRAFICO TOTAL |
| UF2                      | Pagos   | 51896      | 3783  | 818  | 740  | 367 | 1152 | 0  | 2   | 4  | 2024  | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 3146 | 63926         |
|                          | Exentos | 587        | 35    | 4    | 1    | 0   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 627           |
|                          | Total   | 52483      | 3818  | 822  | 741  | 367 | 1152 | 0  | 2   | 4  | 2024  | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 3146 | 64553         |
|                          | SOPO    | I          | II    | III  | IV   | V   | VI   | EA | ER. | EG | IE    | IE2A | IE2B | IE3 | IE4  | 2A   | 2 E  | TRAFICO TOTAL |
| UF2                      | Pagos   | 34312      | 2790  | 1030 | 2263 | 343 | 1216 | 0  | 8   | 9  | 7224  | 0    | 0    | 0   | 0    | 986  | 514  | 50678         |
|                          | Exentos | 457        | 11    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 468           |
|                          | Total   | 34769      | 2801  | 1030 | 2263 | 343 | 1216 | 0  | 8   | 9  | 7224  | 0    | 0    | 0   | 0    | 986  | 514  | 51146         |
| TOTALES POR CATEGORÍA    |         | 162521     | 12234 | 3028 | 4356 | 710 | 2368 | 0  | 10  | 15 | 36600 | 7922 | 590  | 397 | 4755 | 6720 | 8030 | 250231        |

Fuente: Elaboración propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 96 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 6.9 ASPECTOS OPERATIVOS

Son aquellos servicios con los que cuenta la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá para servicio de los usuarios en cada una de las 5 Unidades Funcionales del proyecto, estos servicios no tienen ningún costo para los usuarios.

### Atención y Servicios prestados a los Usuarios

En la siguiente tabla se muestran, los principales servicios prestados por la Concesionaria durante marzo de 2025.

**Tabla 34 Servicios prestados durante marzo de 2025**

| UF            | Ambulancia | Carro taller | G. Plataforma | Grúa Gancho | Inspector Vial | Total general |
|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| UF1           | 16         | 24           | 29            | 1           | 13             | 83            |
| UF2           | 13         | 52           | 65            | 4           | 20             | 154           |
| UF3A          | 17         | 47           | 53            | 1           | 12             | 130           |
| UF3B          | 7          | 29           | 16            | 1           | 0              | 53            |
| UF4           | 0          | 3            | 12            | 1           | 0              | 16            |
| UF5           | 2          | 11           | 15            | 3           | 0              | 31            |
| Total general | 55         | 166          | 190           | 11          | 45             | 467           |

Fuente: elaboración propia con Datos suministrados por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS.

Para el mes de marzo de 2025 las unidades funcionales 1, 2 ,3 siguen registrando el mayor número de servicios prestados, mientras que las unidades funcionales 4 y 5 registran el menor número de servicios.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los servicios prestados a los usuarios desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2025.

**Tabla 35 Resumen prestación de servicios al usuario desde noviembre 2022 a marzo de 2025**

| MES    | SERVICIOS DE AMBULANCIA | SERVICIOS DE CAMA BAJA | SERVICIOS DE CARRO TALLER | SERVICIOS DE GRÚA | ATENCIÓN INSPECTOR VIAL | TOTAL, SERVICIOS |
|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| nov-22 | 40                      | 0                      | 17                        | 151               | 94                      | 302              |
| dic-22 | 11                      | 0                      | 25                        | 175               | 91                      | 302              |
| ene-23 | 25                      | 0                      | 68                        | 145               | 97                      | 335              |
| feb-23 | 11                      | 0                      | 25                        | 194               | 107                     | 337              |
| mar-23 | 22                      | 0                      | 26                        | 179               | 94                      | 321              |
| abr-23 | 29                      | 0                      | 6                         | 24                | 18                      | 77               |
| may-23 | 15                      | 0                      | 18                        | 80                | 96                      | 209              |
| jun-23 | 19                      | 0                      | 2                         | 12                | 19                      | 52               |
| jul-23 | 22                      | 0                      | 1                         | 14                | 17                      | 54               |
| ago-23 | 15                      | 0                      | 0                         | 10                | 14                      | 39               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 97 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| MES            | SERVICIOS DE AMBULANCIA | SERVICIOS DE CAMA BAJA | SERVICIOS DE CARRO TALLER | SERVICIOS DE GRÚA | ATENCIÓN INSPECTOR VIAL | TOTAL, SERVICIOS |
|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| sep-23         | 27                      | 0                      | 24                        | 195               | 94                      | 340              |
| oct-23         | 77                      | 0                      | 31                        | 217               | 236                     | 561              |
| nov-23         | 43                      | 0                      | 32                        | 174               | 131                     | 380              |
| dic-23         | 44                      | 0                      | 31                        | 176               | 117                     | 368              |
| ene-24         | 18                      | 0                      | 27                        | 141               | 93                      | 279              |
| feb-24         | 40                      | 0                      | 28                        | 169               | 131                     | 221              |
| mar-24         | 61                      | 0                      | 116                       | 178               | 50                      | 405              |
| abr-24         | 41                      | 0                      | 100                       | 166               | 57                      | 364              |
| may-24         | 49                      | 0                      | 132                       | 191               | 51                      | 423              |
| jun-24         | 48                      | 0                      | 135                       | 193               | 55                      | 431              |
| jul-24         | 33                      | 0                      | 91                        | 160               | 46                      | 330              |
| ago-24         | 65                      | 1                      | 119                       | 200               | 46                      | 431              |
| sep-24         | 67                      | 0                      | 137                       | 188               | 57                      | 467              |
| oct-24         | 57                      | 0                      | 150                       | 211               | 48                      | 466              |
| nov-24         | 39                      | 0                      | 121                       | 196               | 59                      | 415              |
| dic-24         | 49                      | 0                      | 145                       | 204               | 49                      | 447              |
| ene-25         | 56                      | 0                      | 134                       | 188               | 44                      | 422              |
| feb-25         | 50                      | 2                      | 139                       | 200               | 45                      | 436              |
| mar-25         | 55                      | 0                      | 166                       | 201               | 45                      | 467              |
| <b>Totales</b> | <b>1128</b>             | <b>3</b>               | <b>2046</b>               | <b>4532</b>       | <b>2101</b>             | <b>9810</b>      |

Fuente Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

## 6.10 ANÁLISIS DE EVENTOS.

En este numeral se presenta el resumen de datos de los eventos (incidentes/accidentes) atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto en el presente periodo discriminados por localización y gravedad de estos; esta información está relacionada con el cumplimiento de los indicadores O4 y O5, de acuerdo con lo contenido en el Apéndice Técnico No 2 del Contrato de Concesión.

### 6.10.1 INCIDENTES

Incidente: Es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena en un daño a las personas, y puede incluir daños materiales a equipos o instalaciones. Este hecho da como resultado una condición de inseguridad vial y/o podría desencadenar un accidente.

A continuación, se presenta una discriminación general de la tipología de incidentes que se presentaron en marzo de 2025, es importante indicar que se clasifican como incidentes, los vehículos varados y que han tenido asistencia de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, también se han realizado actividades de simulacros realizados de forma interna, para el seguimiento del desempeño del personal y se clasifican como otros, los incidentes tipo choques leves, salida de vía, volcamiento, obstrucciones y atropellos sin consecuencias graves de los actores participantes.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 98 de 591</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

En el presente periodo marzo de 2025, se presentaron 247 incidentes de los cuales 218 son vehículos varados y 29 pertenecen a otro tipo de incidentes.

En la siguiente tabla se relacionan los incidentes presentados en marzo del 2025.

**Tabla 36 Incidentes en el mes de marzo de 2025**

| INCIDENTE                         | UNIDAD FUNCIONAL |           |           |           |           |           | Total general |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                   | UF1              | UF2       | UF3A      | UF3B      | UF4       | UF5       |               |
| CAÍDA DE OCUPANTE                 | 0                | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 2             |
| CHOQUE CON OBJETO FIJO            | 0                | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 3             |
| CHOQUE CON VEHÍCULO               | 0                | 2         | 1         | 2         | 0         | 0         | 5             |
| DERRUMBE                          | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1             |
| OBSTRUCCIÓN VÍA: OTRO             | 3                | 1         | 1         | 2         | 0         | 1         | 8             |
| OBSTRUCCIÓN VÍA: VEHÍCULO/CARGA   | 0                | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1             |
| OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA ÁRBOL/POSTE | 0                | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1             |
| SALIDA DE VÍA                     | 4                | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 7             |
| SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO     | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1             |
| VARADO                            | 31               | 82        | 54        | 25        | 12        | 14        | 218           |
| <b>Total general</b>              | <b>38</b>        | <b>88</b> | <b>59</b> | <b>31</b> | <b>13</b> | <b>18</b> | <b>247</b>    |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

La concentración de incidentes se mantiene en la zona norte (UF1, UF2 y 3A), donde se presentó el 75%, en la zona sur (UF3B, UF4 y UF5) se presentó el 25%; lo anterior obedece a que municipios como la Calera y Sopó son denominados “municipios dormitorio” y por lo tanto el flujo de vehículos desde y hacia Bogotá es muy alto, dado lo anterior la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá SAS y DITRA planifican actividades preventivas para bajar las cifras de accidentalidad.

## 6.10.2 ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD

**Accidente:** Es un acontecimiento no deseado ni planeado, que trae como consecuencia un daño a las personas (lesión, invalidez o muerte).

En este capítulo se presenta el resumen de datos de los eventos (accidentes/incidentes) atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, en el presente periodo, discriminados por localización y gravedad de estos

A continuación, se presenta el consolidado de eventos de marzo de 2024 vs marzo de 2025, discriminados por unidad funcional y en Accidente/Incidente, así como la severidad de las lesiones ocasionadas, análisis que se realiza sobre la información mes calendario.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        |  |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 99 de 591</b>                                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                                                           |

**Tabla 37 Estadísticas de víctimas por accidentalidad por UF marzo 2024 vs marzo 2025**

| UNIDAD FUNCIONAL | mar-24 |    |    |    |    |    |       | mar-25 |    |    |    |    |    |       |
|------------------|--------|----|----|----|----|----|-------|--------|----|----|----|----|----|-------|
|                  | 1      | 2  | 3A | 3B | 4  | 5  | Total | 1      | 2  | 3A | 3B | 4  | 5  | Total |
| Accidentes       | 15     | 8  | 5  | 1  | 0  | 1  | 30    | 6      | 6  | 11 | 3  | 0  | 0  | 26    |
| Incidentes       | 36     | 57 | 44 | 31 | 13 | 16 | 197   | 38     | 88 | 59 | 31 | 13 | 18 | 247   |
| Heridos Leves    | 19     | 8  | 6  | 0  | 0  | 2  | 35    | 5      | 5  | 14 | 4  | 0  | 0  | 28    |
| Heridos Graves   | 1      | 2  | 1  | 2  | 0  | 0  | 6     | 2      | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5     |
| Muertos          | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Incremento de accidentalidad   | -13,33% |
| Incremento de incidentes       | 25,38%  |
| Incremento de heridos leves    | -20,00% |
| incremento de heridos graves   | -16,67% |
| incremento de víctimas fatales | 0%      |

Con base en la tabla anterior, en marzo de 2025 se presentaron 26 accidentes, comparado con los accidentes presentados en marzo del año anterior esta cifra disminuyo; en esta misma línea, comparando marzo de 2024 y marzo de 2025 se generó una disminución del 13.00%.

También se puede observar que respecto a los incidentes, la cantidad aumento en un 25.38%, en cuanto a heridos leves hubo una disminución de 20.00% y con respecto a los heridos graves, la cantidad se disminuyó en un 16.67%. Por otra parte, en el presente periodo se presentaron 0 víctimas fatales, esta cifra se mantuvo con respecto a marzo de 2024.

A continuación, se presentan las estadísticas por unidad funcional de eventos presentados en enero de 2025 vs marzo de 2025.

**Tabla 38 estadísticas de víctimas de accidentalidad por UF febrero 2025 vs marzo 2025**

| UNIDAD FUNCIONAL | feb-25 |    |    |    |    |    |       | mar-25 |    |    |    |    |    |       |
|------------------|--------|----|----|----|----|----|-------|--------|----|----|----|----|----|-------|
|                  | 1      | 2  | 3A | 3B | 4  | 5  | Total | 1      | 2  | 3A | 3B | 4  | 5  | Total |
| Accidentes       | 2      | 13 | 10 | 0  | 1  | 1  | 27    | 6      | 6  | 11 | 3  | 0  | 0  | 26    |
| Incidentes       | 33     | 66 | 44 | 36 | 18 | 15 | 212   | 38     | 88 | 59 | 31 | 13 | 18 | 247   |
| Heridos Leves    | 3      | 16 | 13 | 0  | 0  | 1  | 33    | 5      | 5  | 14 | 4  | 0  | 0  | 28    |
| Heridos Graves   | 0      | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1     | 2      | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 100 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UNIDAD FUNCIONAL | feb-25 |   |    |    |   |   |       | mar-25 |   |    |    |   |   |       |
|------------------|--------|---|----|----|---|---|-------|--------|---|----|----|---|---|-------|
|                  | 1      | 2 | 3A | 3B | 4 | 5 | Total | 1      | 2 | 3A | 3B | 4 | 5 | Total |
| Muertos          | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0     | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0     |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| incremento de accidentalidad   | -3,70%  |
| incremento de incidentes       | 16,51%  |
| Incremento de heridos leves    | -15,15% |
| Incremento de heridos graves   | 400,00% |
| incremento de víctimas fatales | 0%      |

De acuerdo con la tabla anterior, en marzo de 2025 se presentaron 26 accidentes, comparado con los que se presentaron en febrero de 2025, se registró una disminución de 3,7%

También se puede observar que respecto a los incidentes, la cantidad aumento 16.51%, en cuanto a heridos leves se presentó una disminución de 15.15% y con respecto a los heridos graves se presenta un aumento del 400%, Por otra parte, en el presente periodo se presentó 0 víctimas fatales, comparado con enero de 2025 donde se presentaron 0 víctimas fatales, esta cifra se mantuvo.

En la siguiente tabla se reporta la estadística del número de eventos tipo accidente, heridos y fallecidos, presentados en las vías del proyecto (en las cinco (5) unidades funcionales), presentados desde el inicio del proyecto hasta marzo de 2025 (122 meses).

**Tabla 39 Victimas desde el inicio del proyecto febrero de 2015 a marzo de 2025**

| UF           | ACCIDENTES |           |                  | HERIDOS   |           |                  | MUERTOS   |           |                  |
|--------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
|              | EN EL MES  | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL |
| 1            | 6          | 920       | 7,54             | 7         | 1075      | 8,81             | 0         | 30        | 0,25             |
| 2            | 6          | 870       | 7,13             | 6         | 841       | 6,89             | 0         | 15        | 0,12             |
| 3A           | 11         | 974       | 7,98             | 16        | 932       | 7,64             | 0         | 13        | 0,11             |
| 3B           | 3          | 488       | 4,00             | 4         | 539       | 4,42             | 0         | 5         | 0,04             |
| 4            | 0          | 51        | 0,42             | 0         | 49        | 0,40             | 0         | 0         | 0,00             |
| 5            | 0          | 120       | 0,98             | 0         | 102       | 0,84             | 0         | 2         | 0,02             |
| <b>TOTAL</b> | 26         | 3423      | 28,06            | 33        | 3538      | 29,00            | 0         | 65        | 0,53             |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 101 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Figura 2
 Accidentalidad acumulada en el proyecto



Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

A continuación, se presenta en la siguiente tabla la clasificación de la severidad de las víctimas en el corredor concesionado por unidad funcional y víctimas por kilómetro.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 102 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 40 Discriminación de víctimas por UF marzo 2025**

| UF               | 1     | 2     | 3A   | 3B    | 4    | 5     | %    | Total  |
|------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|
| Longitud         | 38,42 | 24,09 | 9,94 | 22,62 | 38,2 | 27,38 |      | 160,65 |
|                  | 24%   | 15%   | 6%   | 14%   | 24%  | 17%   |      | 100%   |
| Heridos leves    | 5     | 5     | 14   | 4     | 0    | 0     | 85%  | 28     |
| Heridos graves   | 2     | 1     | 2    | 0     | 0    | 0     | 15%  | 5      |
| Muertos          | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0%   | 0      |
| Total víctimas   | 7     | 6     | 16   | 4     | 0    | 0     | 100% | 33     |
| % Total victimas | 21%   | 18%   | 48%  | 12%   | 0%   | 0%    |      | 100%   |
|                  | 88%   |       |      | 12%   |      |       |      |        |
| Víctimas / Km    | 0,18  | 0,25  | 1,61 | 0,18  | 0,00 | 0,00  |      | 0,21   |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

De la tabla anterior, se evidencia que el 85% de las víctimas totales corresponde a heridos leves, el 15% corresponde a heridos graves y el 0% a muertos, no obstante, nuevamente se presenta una mayor concentración en la zona norte, con el 88% de las víctimas. Así las cosas, el análisis para estas Unidades Funcionales es el siguiente:

- **Unidad Funcional 1**, corresponde al **24%** de la longitud actual y cuenta con el 21% de las víctimas con una tasa de 0,18 víctimas por Kilómetro.
- **Unidad Funcional 2**, corresponde al **15%** de la longitud actual y cuenta con el 18% de las víctimas con una tasa de 0,25 víctimas por Kilómetro.
- **Unidad Funcional 3A**, corresponde al **6%** de la longitud actual y cuenta con el 48% de las víctimas con una tasa de 1.61 víctimas por Kilómetro.
- **Unidad funcional 3B**, corresponde al **14%** de la longitud actual y cuenta con el 12% de las víctimas con una tasa de 0.18 víctimas por kilómetro.
- **Unidad Funcional 4**, corresponde al **24%** de la longitud actual y cuenta con el 0.0% de las víctimas con una tasa de 0,0 víctimas por Kilómetro.
- **Unidad Funcional 5**, corresponde al **17%** de la longitud actual y cuenta con el 0.0% de las víctimas con una tasa de 0,0 víctimas por Kilómetro.

**Tabla 41 Consolidado de eventos hasta febrero de 2025**

| UF | ACCIDENTES |           |                  | HERIDOS   |           |                  | MUERTOS   |           |                  |
|----|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
|    | EN EL MES  | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL |
| 1  | 2          | 914       | 7,55             | 3         | 1068      | 8,83             | 0         | 30        | 0,25             |
| 2  | 13         | 864       | 7,14             | 16        | 835       | 6,90             | 0         | 15        | 0,12             |
| 3A | 10         | 963       | 7,96             | 13        | 916       | 7,57             | 0         | 13        | 0,11             |
| 3B | 0          | 485       | 4,01             | 0         | 535       | 4,42             | 0         | 5         | 0,04             |
| 4  | 1          | 51        | 0,42             | 1         | 49        | 0,40             | 0         | 0         | 0,00             |
| 5  | 1          | 120       | 0,99             | 1         | 102       | 0,84             | 0         | 2         | 0,02             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 103 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF    | ACCIDENTES |           |                  | HERIDOS   |           |                  | MUERTOS   |           |                  |
|-------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
|       | EN EL MES  | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL |
| TOTAL | 27         | 3397      | 28,07            | 34        | 3505      | 28,97            | 0         | 65        | 0,54             |

Vs.

**Tabla 42 Consolidado de eventos hasta marzo de 2025**

| UF    | ACCIDENTES |           |                  | HERIDOS   |           |           | MUERTOS          |           |           |
|-------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|       | EN EL MES  | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | EN EL MES | EN EL MES | ACUMULADO | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADO | EN EL MES |
| 1     | 6          | 920       | 7,54             | 7         | 1075      | 8,81      | 0                | 30        | 0,25      |
| 2     | 6          | 870       | 7,13             | 6         | 841       | 6,89      | 0                | 15        | 0,12      |
| 3A    | 11         | 974       | 7,98             | 16        | 932       | 7,64      | 0                | 13        | 0,11      |
| 3B    | 3          | 488       | 4,00             | 4         | 539       | 4,42      | 0                | 5         | 0,04      |
| 4     | 0          | 51        | 0,42             | 0         | 49        | 0,40      | 0                | 0         | 0,00      |
| 5     | 0          | 120       | 0,98             | 0         | 102       | 0,84      | 0                | 2         | 0,02      |
| TOTAL | 26         | 3423      | 28,06            | 33        | 3538      | 29,00     | 0                | 65        | 0,53      |

Fuente: Elaboración propia Datos suministrados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

Como se observa en las tablas anteriores, el promedio mensual de accidentes disminuyo, ya que paso de 28.07 a 28.06 accidentes promedio mensual; por otro lado el promedio mensual de heridos aumento ya que paso de 28.97 a 29.00 heridos promedio mensual; el promedio de muertos disminuyo con respecto al mes anterior paso de 0,54 a 0,53 muertos promedio mensual.

Teniendo en cuenta que, en cada accidente se puede generar más de una víctima, en la siguiente tabla, se presenta la cantidad de accidentes que generaron cada tipo de víctima. Para marzo de 2025, se presentó un total de 33 víctimas como consecuencia de 26 accidentes, eso sucede debido a que en algunos eventos se presentaron varias víctimas de diferentes tipologías.

**Tabla 43 Cantidad de accidentes que generan cada tipología de victima**

| Tipo de Víctima      | No de victimas | Cantidad de eventos donde se presentaron |
|----------------------|----------------|------------------------------------------|
| Herido Leve          | 28             | 22                                       |
| Herido grave         | 5              | 4                                        |
| Muerto               | 0              | 0                                        |
| <b>Total eventos</b> | <b>33</b>      | <b>26</b>                                |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

A continuación, se presenta el análisis de la tipología de los vehículos que se han visto involucrados en las diferentes clases de accidente. Es importante aclarar que, en un solo accidente, se puede ver involucrado más de un vehículo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 104 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 44 Análisis cruzado Tipo de accidente ocurrido vs tipo de vehículo involucrado**

| tipo de accidente<br>tipo de vehículo | Caída de ocupante | Choque con vehículo | Salida de vía | Atropello | Total | %    |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|------|
| Motocicleta                           | 6                 | 12                  | 1             | 0         | 19    | 42%  |
| Automóvil                             | 0                 | 10                  | 1             | 0         | 11    | 24%  |
| Campero                               | 0                 | 1                   | 0             | 0         | 1     | 2%   |
| Camioneta                             | 0                 | 6                   | 0             | 2         | 8     | 18%  |
| Bicicleta                             | 1                 | 3                   | 1             | 0         | 5     | 11%  |
| Microbús                              | 0                 | 1                   | 0             | 0         | 1     | 2%   |
| Total                                 | 7                 | 33                  | 3             | 2         | 45    | 100% |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS.

Como se evidencia, los vehículos con mayor accidentalidad son las motocicletas con un 42%, mientras que el automóvil presenta el segundo porcentaje más alto con un 24%.

### 6.10.3 ANÁLISIS DE HIPÓTESIS DE CAUSA

Con el fin de poder identificar las causales más frecuentes de accidentes en el corredor concesionado, se realizó un análisis cruzado del tipo de accidente con las hipótesis de causa. Estas hipótesis son brindadas por la Policía Nacional en la atención de eventos en el marco del convenio de cooperación con el Concesionario. Dichas hipótesis se agruparon teniendo en cuenta la discriminación del Manual de infracciones de tránsito de la Policía Nacional y el Manual de diligenciamiento del Informe Policial de Accidentes de Tránsito – IPAT-. Esta discriminación realiza teniendo en cuenta los factores de impacto en la accidentalidad:

**El factor humano** Agrupa todas las hipótesis que son directamente derivadas de los comportamientos de los usuarios de la vía. Agrupa las hipótesis de ciclistas, motociclistas, del conductor en general, del peatón y de los pasajeros y acompañantes.

**Vehículos:** Correspondiente al estado técnico-mecánico de los vehículos implicados en el evento.

**La vía:** Este factor se clasifica según la condición de la vía, correspondiente al estado de la infraestructura al momento del evento y obstrucción de esta, por objetos externos que no son parte de la infraestructura misma, incluye los semovientes.

**Tabla 45 Análisis hipótesis causa**

| Hipótesis   | Factor Humano | Factor Vía | Factor Vehículo | Total |
|-------------|---------------|------------|-----------------|-------|
| <b>Tipo</b> |               |            |                 |       |
| Atropello   | 1             | 0          | 0               | 1     |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 105 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Tipo              | Hipótesis | Factor Humano | Factor Vía | Factor Vehículo | Total     |
|-------------------|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| Caída de ocupante |           | 7             | 0          | 0               | 7         |
| Choque            |           | 15            | 0          | 0               | 15        |
| Salida de vía     |           | 3             | 0          | 0               | 3         |
| <b>total</b>      |           | <b>26</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>26</b> |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

Realizando un cruce de información entre el tipo de accidente y la hipótesis- probable de la causa de este, el 100% de los accidentes son ocasionados por el factor humano, esto debido a maniobras inapropiadas por parte de los usuarios del corredor vial.

En el caso del corredor vial de la Perimetral Oriental de Bogotá, en este periodo, no se presentaron accidentes ocasionados por el estado de la vía

En la siguiente tabla se muestra la serie histórica de accidentes, heridos y muertos desde el inicio del proyecto (enero 2015) hasta marzo de 2025.

**Tabla 46 Accidentalidad histórica**

| Periodo | Nº Accidentes | Heridos | Muertos |
|---------|---------------|---------|---------|
| ene-15  | 18            | 16      | 2       |
| feb-15  | 16            | 10      | 0       |
| mar-15  | 28            | 18      | 0       |
| abr-15  | 30            | 19      | 2       |
| may-15  | 32            | 20      | 0       |
| jun-15  | 34            | 23      | 0       |
| jul-15  | 44            | 27      | 1       |
| ago-15  | 34            | 25      | 0       |
| sep-15  | 30            | 22      | 0       |
| oct-15  | 26            | 9       | 0       |
| nov-15  | 49            | 30      | 0       |
| dic-15  | 38            | 34      | 0       |
| ene-16  | 38            | 24      | 0       |
| feb-16  | 38            | 29      | 0       |
| mar-16  | 42            | 40      | 0       |
| abr-16  | 35            | 30      | 0       |
| may-16  | 27            | 28      | 0       |
| jun-16  | 26            | 19      | 0       |
| jul-16  | 29            | 26      | 0       |
| ago-16  | 43            | 39      | 0       |
| sep-16  | 40            | 24      | 0       |
| oct-16  | 54            | 42      | 1       |
| nov-16  | 50            | 50      | 2       |
| dic-16  | 40            | 43      | 0       |
| ene-17  | 41            | 43      | 1       |
| feb-17  | 40            | 25      | 1       |
| mar-17  | 44            | 41      | 0       |
| abr-17  | 42            | 32      | 0       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 106 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Periodo | N° Accidentes | Heridos | Muertos |
|---------|---------------|---------|---------|
| may-17  | 47            | 33      | 1       |
| jun-17  | 53            | 51      | 0       |
| jul-17  | 49            | 44      | 0       |
| ago-17  | 60            | 29      | 2       |
| sep-17  | 59            | 44      | 0       |
| oct-17  | 30            | 39      | 0       |
| nov-17  | 24            | 31      | 1       |
| dic-17  | 29            | 35      | 0       |
| ene-18  | 25            | 33      | 0       |
| feb-18  | 27            | 29      | 2       |
| mar-18  | 36            | 47      | 0       |
| abr-18  | 30            | 34      | 1       |
| may-18  | 26            | 28      | 1       |
| jun-18  | 37            | 40      | 1       |
| jul-18  | 21            | 27      | 0       |
| ago-18  | 21            | 27      | 0       |
| sep-18  | 20            | 27      | 0       |
| oct-18  | 29            | 34      | 0       |
| nov-18  | 21            | 25      | 0       |
| dic-18  | 24            | 26      | 4       |
| ene-19  | 17            | 19      | 0       |
| feb-19  | 24            | 28      | 0       |
| mar-19  | 24            | 32      | 0       |
| abr-19  | 22            | 30      | 0       |
| may-19  | 17            | 21      | 0       |
| jun-19  | 27            | 30      | 0       |
| jul-19  | 13            | 16      | 0       |
| ago-19  | 27            | 32      | 0       |
| sep-19  | 27            | 30      | 1       |
| oct-19  | 17            | 24      | 0       |
| nov-19  | 20            | 23      | 0       |
| dic-19  | 18            | 19      | 0       |
| ene-20  | 24            | 28      | 0       |
| feb-20  | 24            | 27      | 0       |
| mar-20  | 16            | 19      | 0       |
| abr-20  | 7             | 9       | 0       |
| may-20  | 8             | 8       | 0       |
| jun-20  | 16            | 25      | 0       |
| jul-20  | 13            | 15      | 0       |
| ago-20  | 13            | 16      | 1       |
| sep-20  | 28            | 38      | 1       |
| oct-20  | 33            | 41      | 0       |
| nov-20  | 28            | 28      | 1       |
| dic-20  | 31            | 33      | 0       |
| ene-21  | 31            | 35      | 2       |
| feb-21  | 28            | 32      | 3       |
| mar-21  | 21            | 25      | 1       |
| abr-21  | 18            | 21      | 0       |
| may-21  | 22            | 31      | 2       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 107 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| Periodo          | N° Accidentes | Heridos     | Muertos   |
|------------------|---------------|-------------|-----------|
| jun-21           | 19            | 21          | 1         |
| jul-21           | 17            | 25          | 0         |
| ago-21           | 27            | 35          | 1         |
| sep-21           | 21            | 24          | 0         |
| oct-21           | 17            | 19          | 0         |
| nov-21           | 29            | 38          | 0         |
| dic-21           | 21            | 22          | 1         |
| ene-22           | 21            | 24          | 1         |
| feb-22           | 30            | 40          | 0         |
| mar-22           | 25            | 28          | 0         |
| abr-22           | 25            | 32          | 4         |
| may-22           | 32            | 39          | 1         |
| jun-22           | 22            | 22          | 0         |
| jul-22           | 27            | 33          | 0         |
| ago-22           | 39            | 46          | 0         |
| sep-22           | 25            | 28          | 0         |
| oct-22           | 21            | 24          | 2         |
| nov-22           | 21            | 23          | 0         |
| dic-22           | 23            | 23          | 4         |
| ene-23           | 21            | 24          | 1         |
| feb-23           | 15            | 10          | 0         |
| mar-23           | 25            | 29          | 1         |
| abr-23           | 29            | 38          | 1         |
| may-23           | 18            | 21          | 0         |
| jun-23           | 21            | 26          | 0         |
| jul-23           | 22            | 23          | 0         |
| ago-23           | 15            | 15          | 2         |
| sep-23           | 34            | 43          | 1         |
| oct-23           | 25            | 32          | 2         |
| nov-23           | 26            | 27          | 1         |
| dic-23           | 26            | 27          | 1         |
| ene-24           | 29            | 35          | 1         |
| feb-24           | 20            | 21          | 0         |
| mar-24           | 30            | 41          | 0         |
| abr-24           | 22            | 32          | 0         |
| may-24           | 24            | 26          | 1         |
| jun-24           | 21            | 24          | 0         |
| Jul-24           | 20            | 24          | 0         |
| Ago-24           | 34            | 43          | 0         |
| sep-24           | 31            | 41          | 2         |
| oct-24           | 30            | 35          | 0         |
| nov-24           | 16            | 17          | 0         |
| dic-24           | 20            | 26          | 1         |
| ene-25           | 33            | 41          | 0         |
| feb-25           | 27            | 34          | 0         |
| mar-25           | 26            | 33          | 0         |
| <b>Acumulado</b> | <b>3412</b>   | <b>3540</b> | <b>65</b> |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 108 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

En las siguientes figuras se presentan gráficas con los datos suministrados por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, realizando una relación entre la suma total acumulada mensual de accidentalidad vs víctimas

**Figura 3 Acumulado histórico de la accidentalidad**


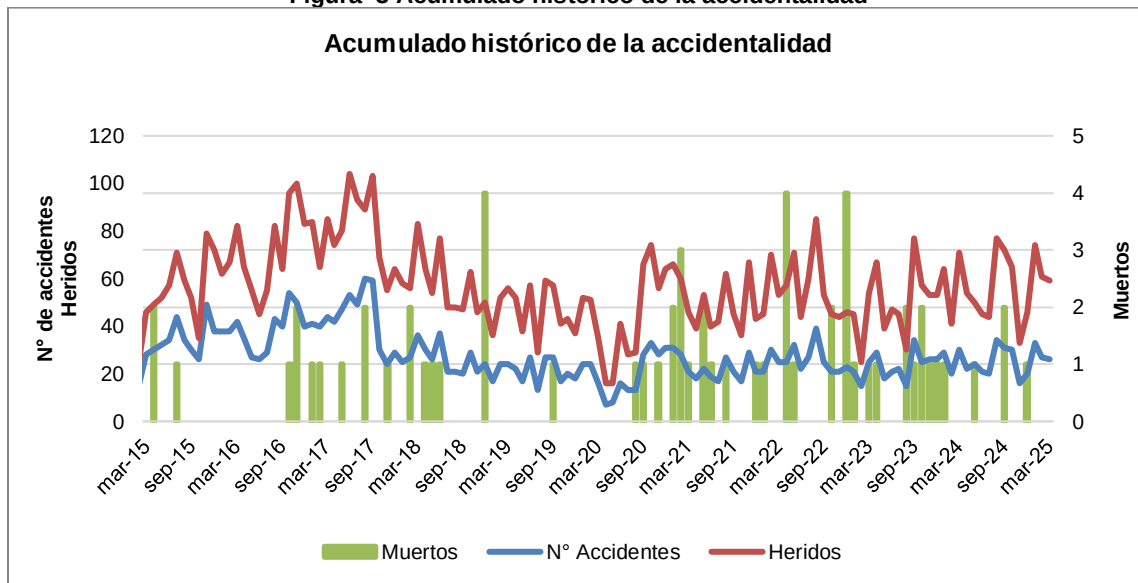


**Figura 4 Acumulado Trafico vs Muertos**

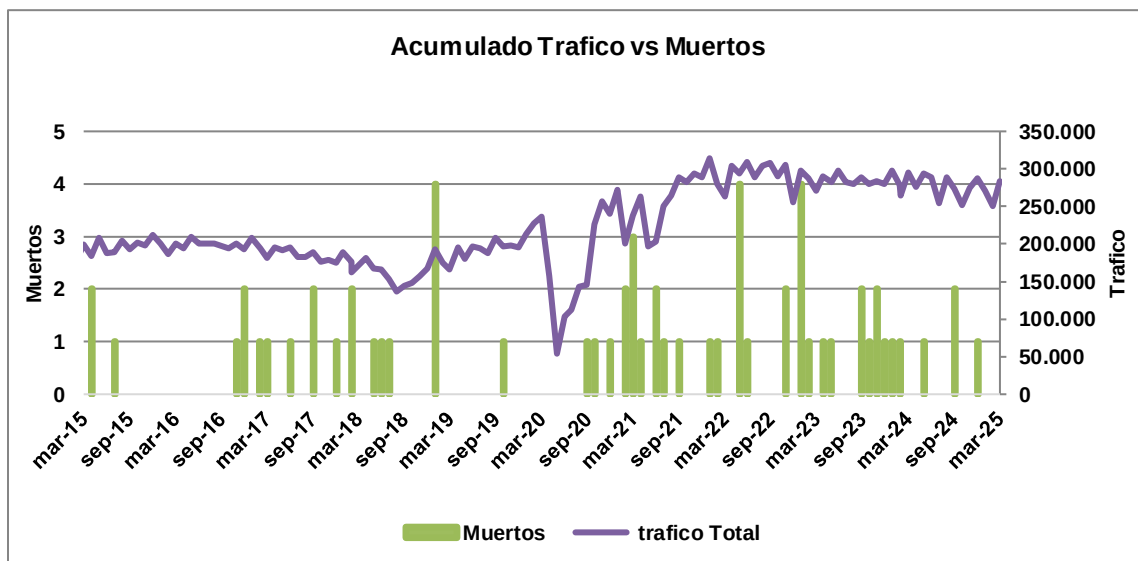

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 109 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

Figura 5 Acumulado N° de accidentes vs Trafico


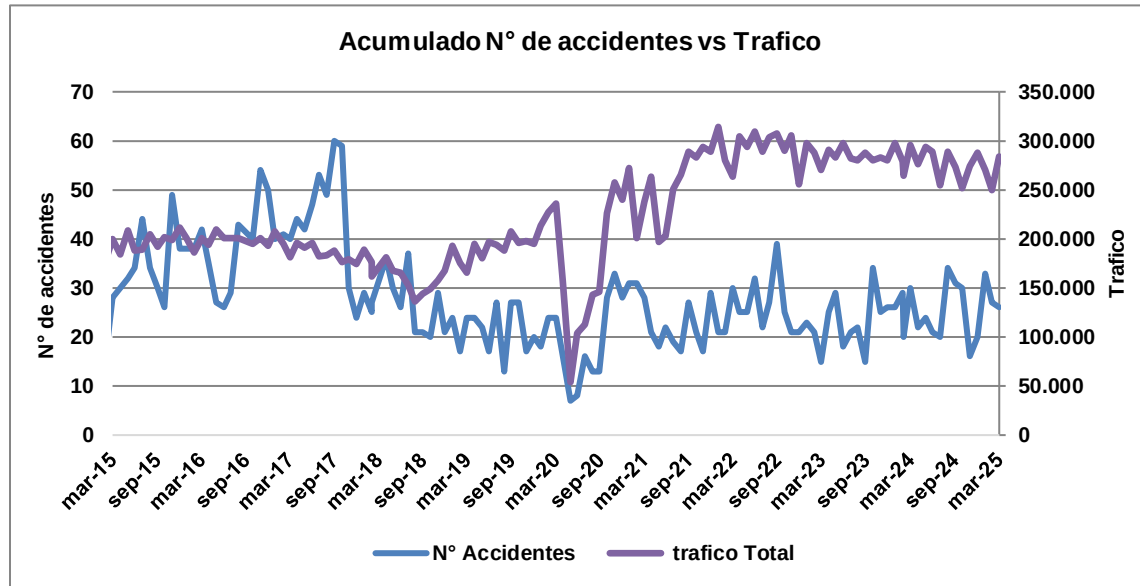


Figura 6 Acumulado N° de heridos vs Trafico

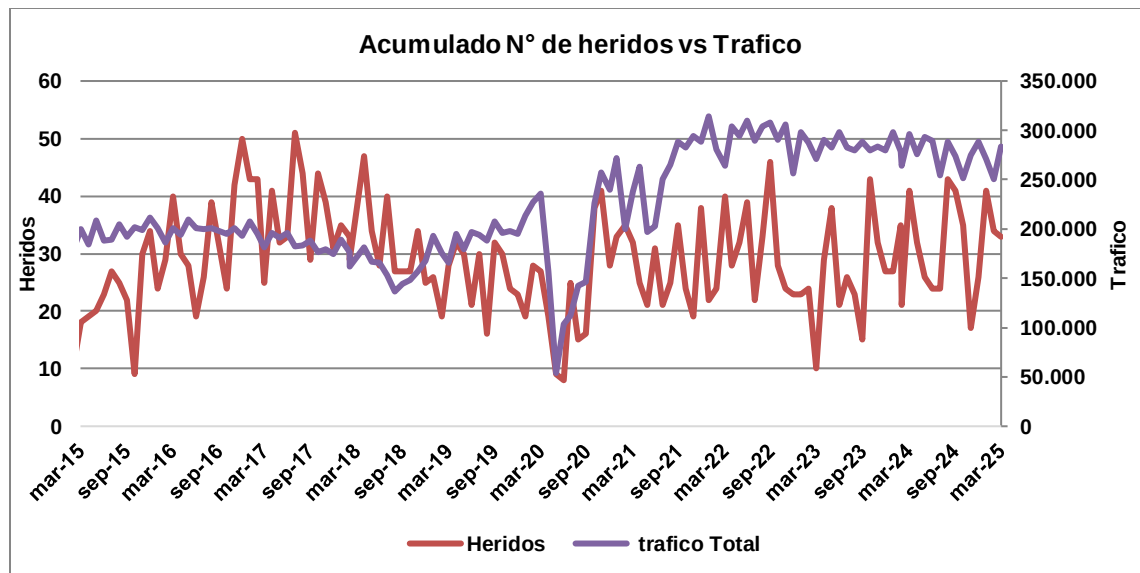

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 110 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 6.10.4 ANÁLISIS DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES

Para marzo de 2025, se trabajó con base en los TCA establecidos para el cuarto trimestre de 2024, que generan los siguientes TCA.

**Tabla 47 Tramos de concentración de accidentes**

| Unidad Funcional | Ruta   | PR inicio | PR fin   |
|------------------|--------|-----------|----------|
| UF 1             | 5009   | Pr26+001  | Pr27+000 |
|                  | 0804   | Pr08+001  | Pr09+000 |
|                  | 0803   | Pr15+001  | Pr16+000 |
|                  | 0803   | Pr16+001  | Pr17+000 |
| UF 2             | 5009   | Pr17+001  | Pr18+000 |
|                  | 5009   | Pr19+001  | Pr20+000 |
|                  | 5009   | Pr20+001  | Pr21+000 |
|                  | 50CN03 | Pr02+001  | Pr03+000 |
|                  | 50CN03 | Pr08+001  | Pr09+000 |
| UF 3A            | 5009   | Pr00+000  | Pr01+000 |
|                  | 5009   | Pr02+001  | Pr03+000 |
|                  | 5009   | Pr05+001  | Pr06+000 |
|                  | 5009   | Pr09+001  | Pr10+000 |
| UF 5             | 4006A  | Pr25+001  | Pr26+000 |

Fuente: Elaboración propia con información suministrada para Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS

#### 6.10.5 VÍCTIMAS FATALES EN TCA

Para marzo de 2025 se presentaron cero (0) víctimas fatales en el corredor Concesionado.

#### 6.11 ACCIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA VÍA

Dentro de las acciones dirigidas a los usuarios de la vía se realizaron: capacitaciones al personal de la Concesión, operativos de sensibilización, regulación y control y campañas de prevención dirigidas a la comunidad a escuelas y empresas del área de influencia del corredor; así mismo, se programan mesas de trabajo y reuniones de seguimiento, orientadas a revisar el comportamiento mensual de la accidentalidad del corredor, con el fin de implementar las medidas necesarias para mejorar los parámetros de seguridad vial y garantizar los niveles de servicio y movilidad de los corredores viales.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 111 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 6.12 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CONCESIÓN

Durante el mes de marzo, se continuó con la programación de capacitaciones de forma virtual y presencial. No obstante, el personal tiene acceso al servidor, a todos los procedimientos relacionados con la operación, los cuales consultan de forma periódica como auto capacitación y para mantenerse actualizados; las capacitaciones presenciales se realizaron conservando todas las medidas de bioseguridad. A continuación, se relacionan las capacitaciones al personal de la empresa en el período:

- Capacitación en inspección de aparejos y equipos por tipo de vehículos: 17 de marzo de 2025, la cual se realizó de manera presencial por la empresa Colmena – ARL, donde se trataron temas como:
  - ✓ Inspección de equipos y herramientas
  - ✓ Causas y consecuencias de los accidentes
  - ✓ Señales de mano estandarizadas
  - ✓ Toneladas métricas y cortas
  - ✓ Criterios de rechazo de los aparejos



- Inducción SGSV-PESV: 18 de marzo de 2025, la cual se realizó de manera presencial y se trataron temas como:
  - ✓ Seguridad vial
  - ✓ Que es el sistema de Gestión de seguridad vial (SGSV)
  - ✓ Que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)
  - ✓ Factores de desempeño

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 112 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |



## 6.13 PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNIDADES ALEDAÑAS

### 6.13.1.1 LÍNEA DE TRABAJO ESCUELAS

El Concesionario realiza las capacitaciones con base en la metodología establecida en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad Vial que establece el desarrollo de la capacitación en cuatro momentos:

**Momento 1:** Actividades para compartir experiencias, ideas y conocimientos en torno al tema a desarrollar en la sesión. Esta actividad se realizó por medio de una lluvia de ideas con los estudiantes para medir las conductas de entrada.

**Momento 2:** Desarrollo de contenidos, para contrastar lo conocido con lo nuevo por aprender, incluye presentación de videos. Para este caso, se trabajaron temas relacionados con los cinco actores viales, la señalización y el tránsito seguro de peatones y ciclistas, según el grado al cual fuese dirigida la actividad.

**Momento 3:** Actividades orientadas a la aplicación del aprendizaje, con el fin de fortalecer las habilidades aprendidas. Correspondiente a una actividad lúdica con los estudiantes.

**Momento 4:** Actividades para evaluar los aprendizajes, identificando lo logrado y reforzando aquello en que se tiene mayor dificultad.

Para el periodo del presente informe se realizaron dos sesiones del proyecto de Seguridad Vial, dirigidas a los estudiantes de últimos grados del centro educativo PIO XII del municipio de Guatavita, Líneas de trabajo:

| IED         | UF | Municipio | Localización | Nivel | Fecha               |
|-------------|----|-----------|--------------|-------|---------------------|
| IED PIO XII | 1  | Guatavita | PR           |       | 13 de marzo de 2025 |
|             |    |           |              |       | 28 de marzo de 2025 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 113 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 48. Escuela capacitada durante marzo de 2025.**



**Sesión 13-mar-2025**



**Sesión 28-mar-2025**

### 6.13.1.2 LÍNEA DE TRABAJO COMUNIDADES

#### A. Campañas de Prevención siniestralidad vial

Durante todo marzo de 2025, en conjunto con la Policía Nacional, se realizaron 10 campañas de prevención de la siniestralidad vial dirigida a motociclistas y acompañantes, ciclistas, conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, conductores, pasajeros y peatones en la que se trataron los siguientes temas:

- Uso adecuado del casco de protección Res 1080 del 2019
- Ley 1696 del año 2013
- Ley 769 del 2002

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 114 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

- Respeto por las normas y señales de tránsito
- No adelantar por la berma, cuneta, andén o donde la señalización lo indique
- No realizar maniobras peligrosas ni exceder los límites de velocidad
- Señales manuales de ciclistas
- Uso del cinturón de seguridad
- Sistemas de retención infantil
- Conductas correctas para viajar
- Estado mecánico de motocicletas
- Implicaciones de la conducción
- Accidentes de Tránsito
- Señales de Tránsito
- Revisión del estado mecánico del vehículo
- Revisión documental
- Constitución política Art 6, 90, 95
- Recomendaciones de una adecuada conducción.
- Recomendaciones para cruzar la vía
- Factores de riesgo en la vía como peatón
- Infracciones de tránsito a los diferentes actores viales
- Buenas prácticas de conducción
- Pasos seguros para peatones
- Uso de puentes peatonales



**Báscula de Guatavita, 12 de marzo**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 115 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |



**Zona Urbana de La Calera, 14 de marzo**



**Peaje de Sopó, 18 de marzo**



**Sector La Chorrera, UF3B, 19 de marzo**

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 116 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |



**Puente peatonal El Chuzcal, UF2, 18 de marzo**

## **B. Puntos Seguros**

Con el fin de promover la seguridad vial y la protección de los conductores de todo tipo de vehículo (motorizado y no motorizado), durante marzo continuamos implementando "Puntos Seguros" en varios sectores del Corredor Concesionado, los cuales han sido establecidos con base en los sectores de mayor accidentalidad; los cuales se basan en la metodología de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En los Puntos seguros, se brinda servicio de hidratación, pausas activas y asistencia médica básica por medio de las ambulancias del Concesionario. Así mismo, la Policía Nacional realiza inspección de las condiciones del vehículo y brinda información sobre los aspectos preoperacionales para tener en cuenta antes de iniciar cualquier desplazamiento, así como los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo y la vía. Adicionalmente, se recuerda a los usuarios los servicios prestados por el Concesionario, el uso de los Postes S.O.S y el #POB, así como de la presencia de la Policía de Carreteras.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 117 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

En esta ocasión, se atendieron biciusuarios, motociclistas y conductores de vehículos de carga y de pasajeros, en las siguientes ubicaciones:

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad Funcional 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área de Servicio Guasca, Ruta 5009</li> <li>• Bahía 4 Esquinas PR32+800 Ruta 5009</li> <li>• Bascula Guatavita PR6+800, Ruta 0804</li> </ul>                                                                                             |
| Unidad Funcional 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peaje Sopó PR2+000, Ruta 50CN03</li> <li>• Recta Kubik PR7+000 Ruta 50CN03</li> <li>• Altos de las arepas PR13+500 Ruta 5009</li> <li>• CCO La Calera PR17+800, Ruta 5009 área</li> <li>• Peaje la Cabaña PR21+650, Ruta 5009</li> </ul> |
| Unidad Funcional 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peaje los Patios PR0+010, Ruta 5009</li> <li>• Embalse Wiesner PR6+500, Ruta 5009</li> <li>• Colombia 86</li> <li>• Sector La Virgen</li> <li>• Sector Gacha</li> </ul>                                                                  |



CCO



Peaje La Cabaña

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 118 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |



**Peaje Los Patios**



**Área de servicio**

#### **6.13.1.3 LÍNEA DE TRABAJO INSTITUCIONES Y EMPRESAS**

Con el fin de promover comportamientos seguros de usuarios del corredor, el Concesionario trabaja en fortalecer la capacidad institucional para aplicar el control y coordinar acciones, reconociendo el rol de las empresas como fundamento en la construcción de una sociedad con seguridad vial. El 26 de marzo se realizó capacitación dirigida al personal de la empresa Autobuses Tour, enfocado en la Resolución 0011268 de 2012 y Ley 769 Código Nacional de Tránsito.



**Capacitación en la Resolución 0011268 de 2012 y Ley 769 de 2002, personal de la empresa Autobuses Tour.**

#### **6.14 CONVENIO DITRA.**

Convenio de cooperación 64 – 9 – 30006 – 21 suscrito entre el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y la Policía Nacional de Colombia el 5 de abril del 2021.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 119 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Acta suscrita el 08 de septiembre de 2014 entre el CONCESIONARIO y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI el contrato de concesión bajo el esquema del APP 002 de 2014.

El día 08 de marzo de 2021 se suscribió, entre la ANI y CONCESIONARIO PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S el otro sí N° 09 al contrato de concesión bajo el esquema de APP 002 de 2014, por medio del cual se viabilizó la revisión de los bienes y recursos a entregar a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA en virtud de lo previsto en el CONVENIO DE COOPERACIÓN, los valores de este convenio durante los años en que ha estado vigente se presentan a continuación:

**Tabla 49 valores de convenio 64 – 9 – 30006 – 21**

| Año  | Valor en pesos – COP |
|------|----------------------|
| 2021 | \$ 1.550.000.000     |
| 2022 | \$ 1.550.000.000     |
| 2023 | \$ 2.100.000.000     |

Fuente Oficio D-574-2024 Concesionario Perimetral Oriental De Bogotá S.A.S

## 6.15 ÁREAS DE PREVENCIÓN

Con el fin de reducir la accidentalidad y garantizar la normal movilización sobre el corredor, la Policía Nacional instaló áreas de prevención en el Corredor, en las cuales se realizaron controles para verificación de documentos, estado general de ocupantes, revisión técnico-mecánica, equipo de carretera, llantas, etc. Estas áreas se ubican en sitios estratégicos del corredor para contribuir a mejorar la movilidad y así mitigar la accidentalidad que se pueda presentar. A continuación, se presenta la ubicación de las áreas seguras para el mes de marzo:

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad Funcional 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahía de 4 esquinas. Pr 33+000 Ruta 5009</li> <li>• Área de servicio. Pr 24+200 Ruta 5009</li> <li>• Curvas del machetero. Pr 08+250 Ruta 0804</li> <li>• Bascula de Guatavita. Pr 07+000 Ruta 0804</li> </ul> |
| Unidad Funcional 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto de las arepas. Pr13+900 Ruta 5009</li> <li>• Peaje Sopó. Pr2+000 Ruta 50CN03</li> <li>• Peaje la Cabaña. Pr21+500 Ruta 5009</li> </ul>                                                                    |
| Unidad Funcional 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peaje los Patios. Pr0+050 Ruta 5009,</li> <li>• Planta Wiesner. Pr6+100 Ruta 5009</li> <li>• Colombia 86. Pr0+000 Ruta 4006 A</li> </ul>                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 120 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |



**Peaje Sopó**



**Base Sur**

#### **6.16 OPERATIVOS DE CONTROL**

En el marco del Convenio de Cooperación 64-9-30006-21, suscrito entre La Concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Policía Nacional de Colombia, durante el mes de marzo, el personal de DITRA asignado al Convenio realizó un total de 74 operativos de control según se discriminan a continuación:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| • Control Velocidad        | 4  |
| • Control Embriaguez       | 10 |
| • Control Motociclistas    | 23 |
| • Control Ciclistas        | 7  |
| • Control Servicio Público | 15 |
| • Control Técnico mecánica | 15 |

A continuación, se presenta el registro fotográfico de algunos de los controles realizados.



|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 121 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |



**Control de Velocidad**



**Control de Embriaguez**



**Control de Motociclistas**

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 122 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |



**Control de Ciclistas**



**Control de Servicio público y Transporte de Carga**



**Control de Técnico-mecánica**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 123 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Como resultado de los operativos de control, se generó un total de 647 comparendos, clasificados de la siguiente forma:

- Comparendos a Motociclistas: 451 Que representan el 69.7% de los comparendos
- Comparendos a otros actores: 196 Que representan el 30.3% de los comparendos

A continuación, se presenta el resumen de los comparendos generados.

**Tabla 50. Comparendos – marzo 2025.**

| Código | Infracción                                                                                                                                   | Total    |    | Motociclistas |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|----|
|        |                                                                                                                                              | Cantidad | %  | Cantidad      | %  |
| B-01   | *Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.                                                                          | 4        | 1% | 4             | 1% |
| B-02   | *Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.                                                                                 | 40       | 6% | 25            | 6% |
| B-03   | *Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.                                                                    | 26       | 4% | 11            | 2% |
| B-07   | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo.                                                 | 3        | 0% | 1             | 0% |
| B-08   | No pagar el peaje en los sitios establecidos.                                                                                                | 2        | 0% | 1             | 0% |
| C-01   | Presentar licencia de conducción adulterada o ajena                                                                                          | 1        | 0% | 0             | 0% |
| C-02   | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.                                                                                                 | 1        | 0% | 1             | 0% |
| C-06   | No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.                                                                | 3        | 0% | 2             | 0% |
| C-08   | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este Código.                                         | 2        | 0% | 0             | 0% |
| C-14   | *Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.                                                        | 4        | 1% | 3             | 1% |
| C-15   | Conducir un vehículo particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación. | 1        | 0% | 0             | 0% |
| C-24   | Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente Código.                                                             | 19       | 3% | 19            | 4% |
| C-28   | Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos.                            | 1        | 0% | 0             | 0% |
| C-31   | No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.                                                               | 3        | 0% | 2             | 0% |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 124 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Código | Infracción                                                                                                                                                                                                                                | Total    |     | Motociclistas |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad | %   | Cantidad      | %   |
| C-34   | Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código.                                                                                          | 1        | 0%  | 1             | 0%  |
| C-35   | *No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes. | 408      | 63% | 306           | 68% |
| C-37   | Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas.                                                                                           | 1        | 0%  | 1             | 0%  |
| D-01   | Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente.                                                                                                                                                           | 29       | 4%  | 23            | 5%  |
| D-02   | *Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.                                                                                                                                                                                    | 30       | 5%  | 19            | 4%  |
| D-05   | Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.                                                             | 1        | 0%  | 1             | 0%  |
| D-06   | Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique.                                           | 47       | 7%  | 26            | 6%  |
| D-08   | *Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código.                                          | 1        | 0%  | 0             | 0%  |
| D-12   | *Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.                                                                                               | 2        | 0%  | 1             | 0%  |
| D-13   | En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado.                                                                                                           | 10       | 2%  | 0             | 0%  |
| F      | *Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinógenas                                                                                                                                                          | 1        | 0%  | 0             | 0%  |
| H-02   | El conductor que no porte la licencia de tránsito                                                                                                                                                                                         | 6        | 1%  | 4             | 1%  |
| Total  |                                                                                                                                                                                                                                           | 647      |     |               |     |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 125 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

Del análisis de la Tabla 51 observamos las siguientes causales de imposición de comparendos.

**Tabla 51. Causales de comparendos, marzo 2025.**

| Concepto                             | Cantidad   | % General     |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| Conductas no apropiadas              | 54         | 8,3%          |
| Embriaguez                           | 1          | 0,2%          |
| Estacionar en sitios prohibidos      | 1          | 0,2%          |
| Exceso de velocidad                  | 0          | 0,0%          |
| Licencia de Conducción               | 74         | 11,4%         |
| Licencia de tránsito                 | 6          | 0,9%          |
| Normas, leyes o señalización         | 45         | 7,0%          |
| Peaje                                | 2          | 0,3%          |
| Placas                               | 26         | 4,0%          |
| Porte de documentos o seguros de ley | 30         | 4,6%          |
| Revisión Técnico-mecánica            | 408        | 63,1%         |
| Exceso de peso, dimensiones o carga  | 0          | 0,0%          |
| <b>Total</b>                         | <b>647</b> | <b>100,0%</b> |

**Gráfica 1. Tipificación de infracciones, marzo 2025.**

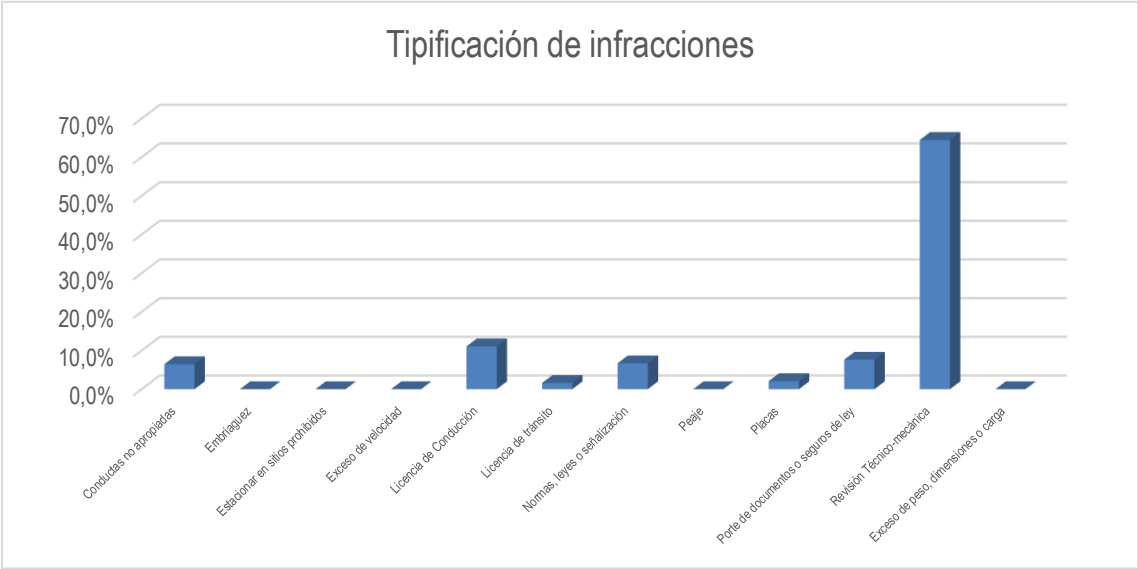

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 126 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Como se puede observar, el 63,1% de las infracciones obedecen a revisión técnica, poniendo en riesgo no solo su propia seguridad, sino también la de los demás usuarios de la vía, por otra parte, el principal factor generador de sanciones se debe a adelantar a otro vehículo en berna, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados, lo cual es otro factor atribuible al componente humano.

#### 6.17 OPERATIVOS DE SENSIBILIZACIÓN EN VÍA

En el periodo del informe, DITRA realizó sesenta y cuatro (64) operativos de sensibilización en vía, con un total de 2184 personas sensibilizadas; Estos operativos fueron dirigidos a ciclistas, motociclistas, conductores de servicio público y de carga, vehículo particular, pasajeros y peatones.

El objetivo de estos operativos es sensibilizar a estos actores viales frente a los riesgos inherentes al tránsito por un corredor vial, en especial frente a su vulnerabilidad frente a otros actores, los cuidados a tener frente al entorno y los factores climáticos y a la velocidad y el consumo de alcohol; estas charlas toman entre 15-20 minutos.

**Tabla 52. Operativos de sensibilización en vía, marzo 2025.**

| No. | Dirigido a                       | Cantidad de operativos | # Personas sensibilizadas |
|-----|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1   | Servicio de carga                | 1                      | 27                        |
| 2   | Ciclistas                        | 11                     | 425                       |
| 3   | Conductor de servicio particular | 11                     | 406                       |
| 4   | Conductor de servicio público    | 8                      | 216                       |
| 5   | Motociclista                     | 23                     | 788                       |
| 6   | Pasajeros                        | 6                      | 215                       |
| 7   | Peatones                         | 4                      | 107                       |

#### 6.18 OPERATIVOS DE REGULACIÓN

En el periodo del informe, DITRA realizó setenta y seis (76) operativos de regulación de tráfico, según se indica en la siguiente tabla, con el fin de mejorar las condiciones de fluidez del tráfico que circula por el corredor, en ocasión a puntos de atracción de usuarios y puntos de alto tránsito vehicular, tales como restaurantes concurridos y estaciones de peaje, en los cuales se han evidenciado inconvenientes de congestión a lo largo del Corredor concesionado.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 127 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 53. Operativos de regulación de tráfico – marzo 2025**

| No. | Ruta   | PR     | Lugar de referencia | Cantidad de operativos |
|-----|--------|--------|---------------------|------------------------|
| 1   | 5009   | 06+300 | Planta Wiesner      | 15                     |
| 2   | 4006A  | 18+600 | Gacha               | 6                      |
| 3   | 5009   | 18+000 | Granja Naranja      | 4                      |
| 4   | 5009   | 17+500 | Márquez             | 4                      |
| 5   | 5009   | 00+050 | Peaje Los Patios    | 17                     |
| 6   | 5009   | 21+500 | Peaje Cabaña        | 14                     |
| 7   | 5009   | 02+990 | Tilatá              | 8                      |
| 8   | 08-04  | 05+900 | Casa Loca           | 1                      |
| 9   | 08-03  | 15+450 | Sector Cocineritos  | 4                      |
| 10  | 50CN03 | 02+100 | Peaje Sopó          | 1                      |
| 11  | 4006A  | 15+300 | Pulpito             | 2                      |

## 6.19 MEDICIÓN DE INDICADORES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

### 6.19.1 Informe de Indicadores marzo de 2025

De conformidad con lo establecido en la ley 1508 y en el Decreto 1467 de 2012, el Concesionario deberá cumplir con los Estándares de Calidad y los Niveles de Servicio que se definan en el Contrato de Concesión, para lo cual, el Apéndice técnico 4, Incorpora los Indicadores que permiten medir de manera específica, oportuna, pertinente y viable, las condiciones de Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al Proyecto, así como el Nivel de Servicio de esta.

Cada Indicador está compuesto de los siguientes elementos. Identificador, Concepto de Medición, Frecuencia de Medición, Unidad de Medición, Método de Medida y Valor Mínimo de Aceptación. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un Tiempo Máximo de Corrección durante el cual el Concesionario podrá solucionar cualquier evento en el que los resultados del indicador resulten ser inferiores al Valor Mínimo de Aceptación.

Los Indicadores serán aplicables al Concesionario a partir de la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades Funcionales. Estos Indicadores son: Indicadores de estructuras (E) y operación (O) para las diferentes estructuras de pavimento.

- Acta de Terminación de la UF1 firmada 01 de febrero de 2019.
- Acta de Terminación de la UF2 firmada 17 de octubre de 2019.
- Acta de Terminación de la UF3 firmada 07 de noviembre de 2019.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 128 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

A continuación, se relacionan los indicadores evaluados en cada una de las unidades funcionales durante el mes de **marzo** del año 2025. Teniendo en cuenta el tiempo de corrección, el resultado de todas las unidades funcionales es 1.0

### 6.19.2 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF1.


**Tabla 54 Indicador E1 Iri**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Frecuencia de medición.</b>      | Semestral.                                                     |
| <b>Valor de aceptación.</b>         | Valor puntual $\leq 3.5$ mm/m ó<br>Valor medio $\leq 3.0$ mm/m |
| <b>Tiempo máximo de corrección.</b> | 3 meses                                                        |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3278, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes segmentos: 11 (PR33+858 a PR33+957) **UF1A ruta 5009** y 14 (PR2+700 a PR2+800), 16 (PR4+400 a PR4+500, PR4+900 a PR5+000,), 17 (PR5+000 a PR5+100, PR5+200 a PR5+300), 18 (PR6+200 a PR6+300, PR6+500 a PR6+600, PR6+800 a PR6+900), 19 (PR7+800 a PR7+900), 24 (PR12+400 a PR12+500), 25 (PR13+400 a 13+500), 27 (PR15+400 a PR15+500) y 38 (PR26+900 a PR27+000) **UF1B ruta 0803 y 0804**.

**Figura 7 Evaluación E1 Iri UF1A**

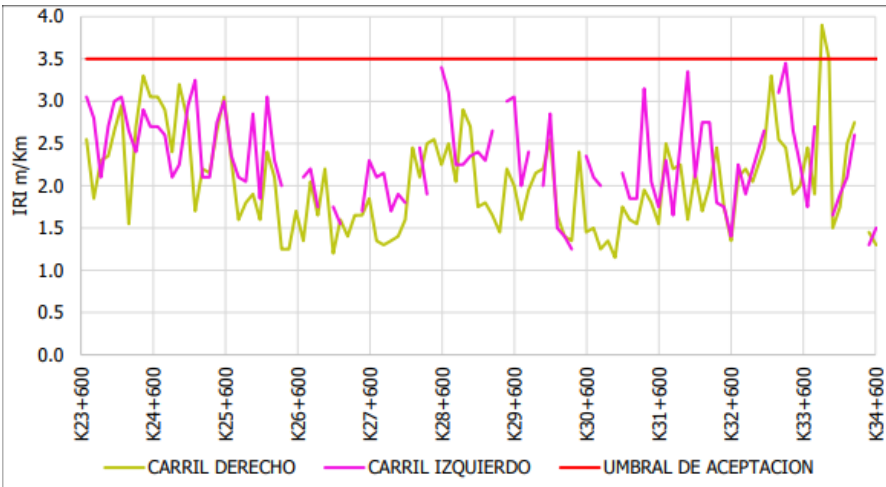


Fuente: Elaboración Propia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 129 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 8 Evaluación E1 Iri UF1B.**

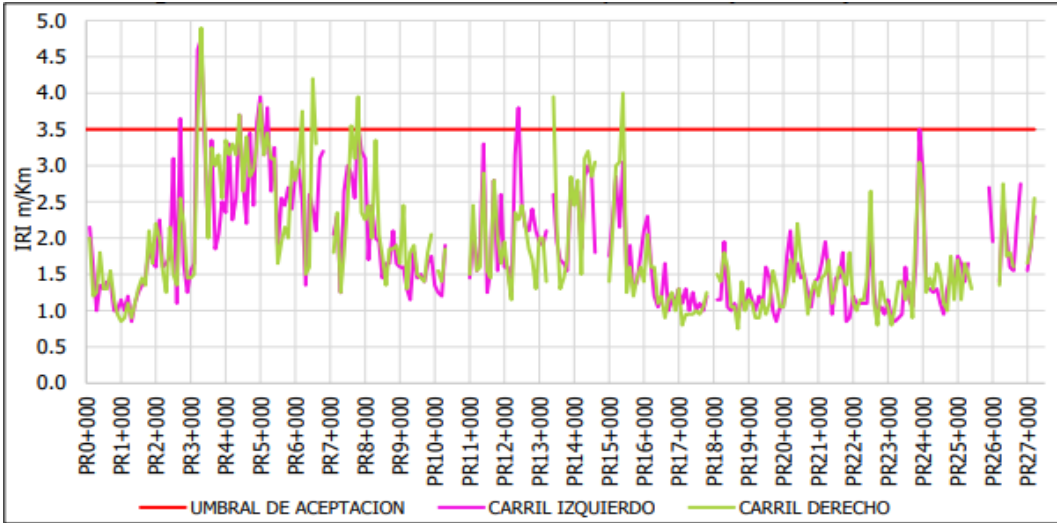

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 55 Indicador E2 Ahuellamiento**


|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                               |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 20$ mm ó<br>Valor medio $\leq 15$ mm |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3348, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en los siguientes gráficos.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 130 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 9 Evaluación E2 Ahuellamiento UF1A**

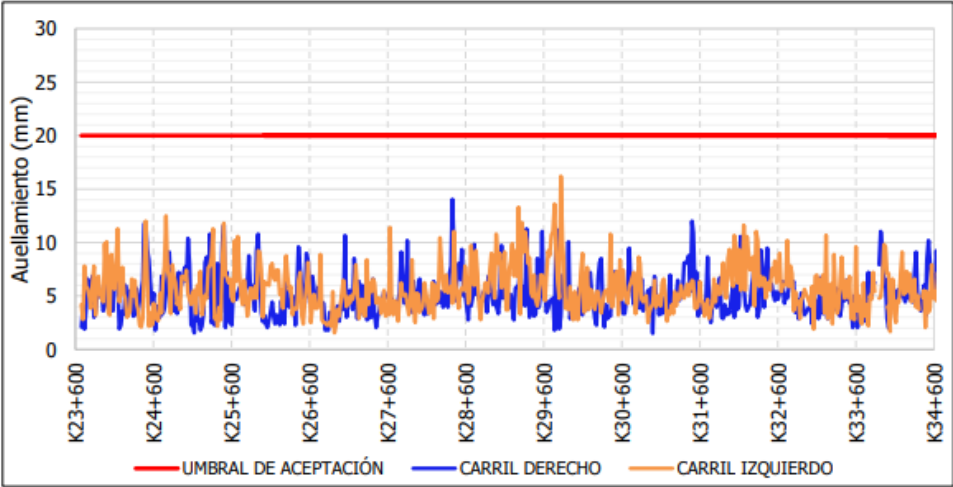

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 10 Evaluación E2 Ahuellamiento UF1B.**

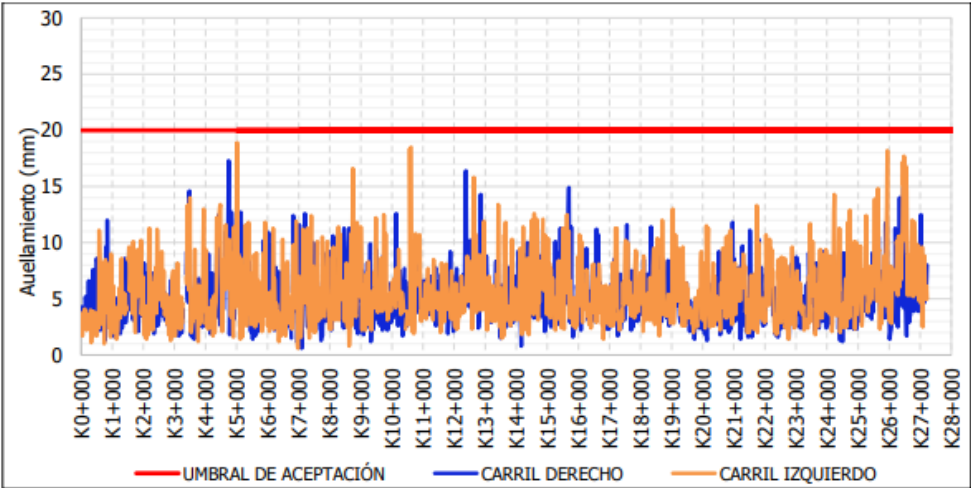

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 56 Indicador E3 Fisuras**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                 |
| Valor de aceptación.         | Área afectada menor o igual a 1% del área de la calzada. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 meses                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 131 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3427, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.


**Tabla 57 Indicador E4 Coeficiente de Fricción Transversal**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                         |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 40$ ó<br>Valor medio $\leq 45$ |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3281, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimiento en 10 segmentos 7, 9, 10, y 11 de la **UF1A ruta 5009**. 13, 17, 22, 28, 37, y 38 de la **UF1B rutas 0803 y 0804**.


**Figura 11 Evaluación E4 Fricción Transversal UF1A**

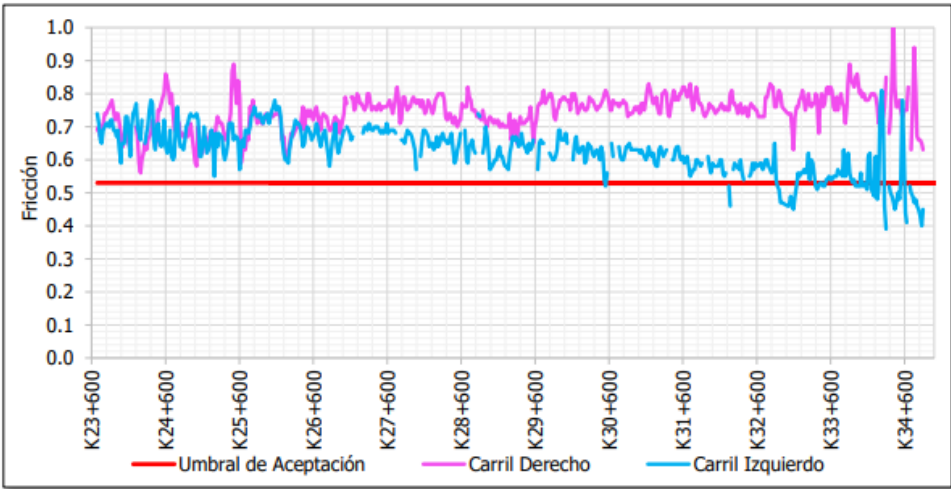

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 132 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 12 Evaluación E4 Fricción Transversal UF1B**

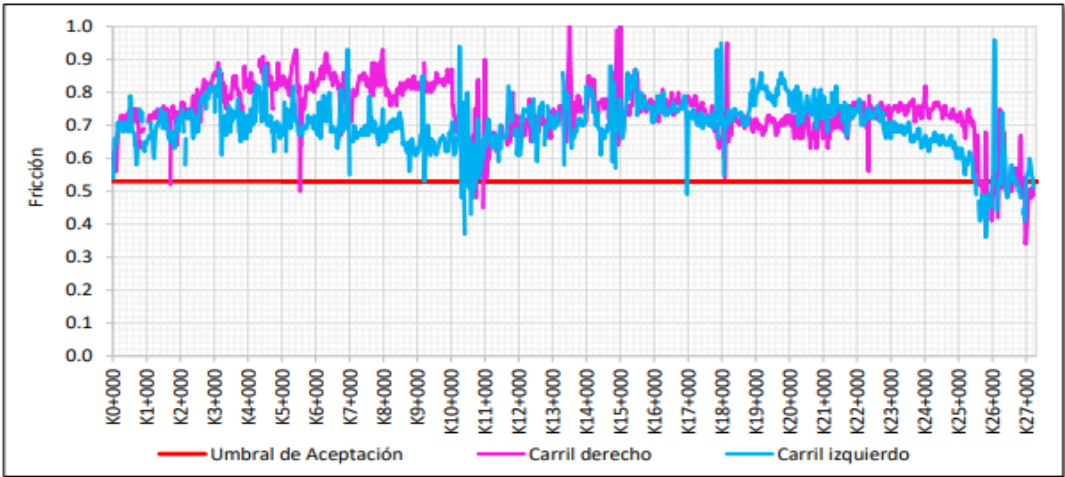

Fuente: Elaboración Propia.


**Tabla 58 Indicador E5 Textura**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                  |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 0.5$ mm |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3282, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en los siguientes gráficos.


**Figura 13 Evaluación E5 Textura UF1A**

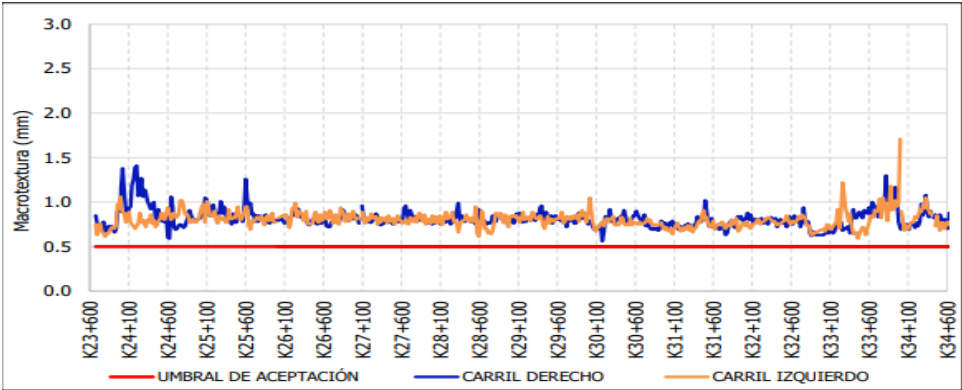

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 133 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 14 Evaluación E5 Textura UF1B**

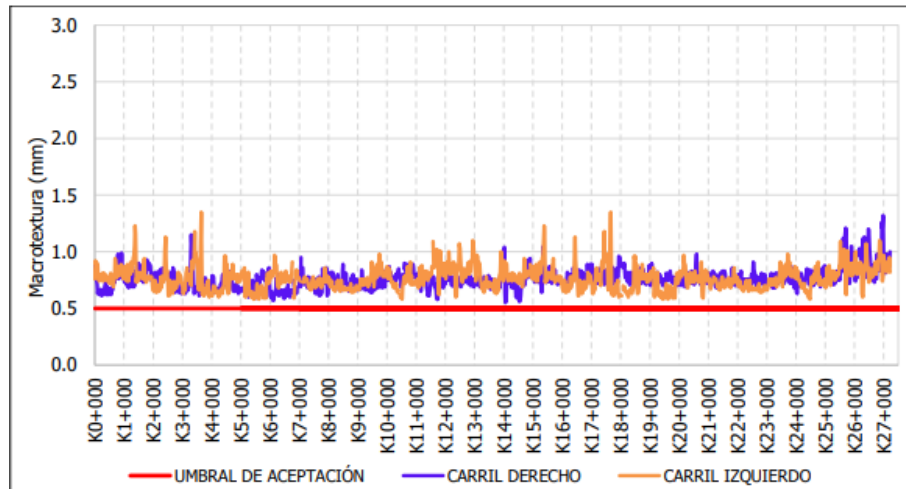

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 59 Indicador E6 Baches**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.     |
| Valor de aceptación.         | Ningún bache |
| Tiempo máximo de corrección. | 24 horas     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3428, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 60 Indicador E7 Hundimientos**

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                   |
| Valor de aceptación.         | Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 0,1 % del área de la calzada. |
| Tiempo máximo de corrección. | 2 semanas                                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3429, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 134 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Tabla 61 Indicador E8. Estado de Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho De Vía.**

| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de aceptación.         | Ninguna de las medidas a la vegetación resulta superior a 30 cm de altura.<br>No existe vegetación que afecte la seguridad vial por disminución de distancia de seguridad u ocultación de señales.<br>Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento y operación. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3430, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimientos en los segmentos 12 (PR0+030), 25 (PR13+900) y 33 (PR21+270) de la ruta 0803 y 0804 UF1B.

**Tabla 62 Indicador E10 Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal**

| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de aceptación.         | Sección hidráulica de cada obra de drenaje obstruida menor o igual al 25% del total de la sección. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                           |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3431, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimiento el segmento 23 (PR11+900) de la ruta 0803 UF1B.

**Tabla 63 Indicador E11 Señalización Vertical**

| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de aceptación.         | La señal cumple con lo definido en la NTC 4739.<br>La señal está presente en la posición definida en el proyecto, cumple con las dimensiones, colores y rotulado.<br>La señal es inequívocamente legible por un conductor que se desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 3. retroreflectividad $\geq 80$ % del valor tomado de la instalación. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 horas para las señales ilegibles y/o dañadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 135 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3432, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación con 2 o más señales con novedad, generando incumplimientos en 6 segmentos.

Se recomienda a la concesión que realice la acción correctiva correspondiente de manera física y posteriormente, efectúe una nueva medición de la retroreflectividad. En caso de que los resultados de esta segunda medición sigan siendo inferiores al valor mínimo de aceptación, se deberán reemplazar las señales correspondientes.

**Tabla 64 Indicador E12 Señalización Horizontal**

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                                                                                                     |
| Valor de aceptación.         | Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ m <sup>2</sup> *Lux.<br>Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ m <sup>2</sup> *Lux. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                                                       |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3288, revelando que algunos sectores no alcanzan el valor de aceptación, generando incumplimientos, a continuación, se presentan en detalle los resultados por kilómetro para cada tramo de la UF, en las siguientes tablas se puede observar que hubo un incumplimiento en todos los segmentos. Sin embargo, el Concesionario realizó las correcciones correspondientes dentro de los plazos establecidos en el Apéndice Técnico N° 4, y esta Interventoría lo confirmo.

**Figura 15 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF1.**

| ABSCISA |         | PR       |          | Línea Izquierda Blanca                                                     | Línea Central Amarilla                                                     | Línea Derecha Blanca                                                       | Cumplimiento cada 20m |
|---------|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DESDE   | HASTA   | DESDE    | HASTA    | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 250$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 200$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 250$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) |                       |
| K23+677 | K24+662 | PR0+000  | PR1+000  | 119                                                                        | 121                                                                        | 154                                                                        | NO CUMPLE             |
| K24+662 | K25+582 | PR1+000  | PR2+000  | 134                                                                        | 124                                                                        | 206                                                                        | NO CUMPLE             |
| K25+582 | K26+679 | PR2+000  | PR3+000  | 178                                                                        | 136                                                                        | 277                                                                        | NO CUMPLE             |
| K26+679 | K27+693 | PR3+000  | PR4+000  | 212                                                                        | 145                                                                        | 273                                                                        | NO CUMPLE             |
| K27+693 | K28+691 | PR4+000  | PR5+000  | 210                                                                        | 110                                                                        | 252                                                                        | NO CUMPLE             |
| K28+691 | K29+698 | PR5+000  | PR6+000  | 178                                                                        | 87                                                                         | 190                                                                        | NO CUMPLE             |
| K29+698 | K30+695 | PR6+000  | PR7+000  | 200                                                                        | 124                                                                        | 266                                                                        | NO CUMPLE             |
| K30+695 | K31+699 | PR7+000  | PR8+000  | 162                                                                        | 105                                                                        | 181                                                                        | NO CUMPLE             |
| K31+699 | K32+701 | PR8+000  | PR9+000  | 146                                                                        | 84                                                                         | 152                                                                        | NO CUMPLE             |
| K32+701 | K33+758 | PR9+000  | PR10+000 | 106                                                                        | 91                                                                         | 134                                                                        | NO CUMPLE             |
| K33+758 | K34+810 | PR10+000 | PR11+000 | 128                                                                        | 86                                                                         | 158                                                                        | NO CUMPLE             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 136 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|          |          |          |          |     |     |     |           |
|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----------|
| K0+001   | K1+000   | PR0+000  | PR1+000  | 150 | 131 | 123 | NO CUMPLE |
| K1+000   | K2+000   | PR1+000  | PR2+000  | 118 | 103 | 154 | NO CUMPLE |
| K2+000   | K3+000   | PR2+000  | PR3+000  | 130 | 115 | 154 | NO CUMPLE |
| K3+000   | K4+003   | PR3+000  | PR4+000  | 162 | 142 | 190 | NO CUMPLE |
| K4+003   | K41+004  | PR4+000  | PR5+000  | 166 | 90  | 170 | NO CUMPLE |
| K41+004  | K6+000   | PR5+000  | PR6+000  | 186 | 113 | 227 | NO CUMPLE |
| K6+000   | K61+000  | PR6+000  | PR7+000  | 119 | 86  | 165 | NO CUMPLE |
| K61+000  | K8+002   | PR7+000  | PR8+000  | 111 | 73  | 196 | NO CUMPLE |
| K8+002   | K9+002   | PR8+000  | PR9+000  | 164 | 110 | 197 | NO CUMPLE |
| K9+002   | K10+006  | PR9+000  | PR10+000 | 136 | 96  | 220 | NO CUMPLE |
| K10+006  | K11+002  | PR10+000 | PR11+000 | 68  | 128 | 117 | NO CUMPLE |
| K11+002  | K12+003  | PR11+000 | PR12+000 | 129 | 69  | 168 | NO CUMPLE |
| K12+003  | K13+003  | PR12+000 | PR13+000 | 189 | 78  | 168 | NO CUMPLE |
| K13+003  | K14+002  | PR13+000 | PR14+000 | 203 | 89  | 186 | NO CUMPLE |
| K14+002  | K15+002  | PR14+000 | PR15+000 | 173 | 70  | 220 | NO CUMPLE |
| K15+002  | K16+001  | PR15+000 | PR16+000 | 202 | 90  | 194 | NO CUMPLE |
| K16+001  | K17+003  | PR16+000 | PR17+000 | 231 | 98  | 194 | NO CUMPLE |
| K17+003  | K18+002  | PR17+000 | PR18+000 | 185 | 107 | 208 | NO CUMPLE |
| K18+002  | K19+001  | PR18+000 | PR19+000 | 220 | 100 | 195 | NO CUMPLE |
| K19+001  | K20+003  | PR19+000 | PR20+000 | 214 | 96  | 207 | NO CUMPLE |
| K20+003  | K201+003 | PR20+000 | PR21+000 | 247 | 67  | 163 | NO CUMPLE |
| K201+003 | K22+001  | PR21+000 | PR22+000 | 251 | 102 | 207 | NO CUMPLE |
| K22+001  | K23+000  | PR22+000 | PR23+000 | 199 | 110 | 223 | NO CUMPLE |
| K23+000  | K231+000 | PR23+000 | PR24+000 | 175 | 115 | 214 | NO CUMPLE |
| K231+000 | K25+002  | PR24+000 | PR25+000 | 175 | 90  | 185 | NO CUMPLE |
| K25+002  | K26+000  | PR25+000 | PR26+000 | 102 | 104 | 134 | NO CUMPLE |
| K26+000  | K27+220  | PR26+000 | PR27+000 | 147 | 90  | 90  | NO CUMPLE |

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 65 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención**

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | No deben existir tramos de una longitud igual a 20 m en los que las barreras y elementos de contención incumplan lo establecido en el numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y mantenimiento. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 mes                                                                                                                                                                                              |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3433, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 66 Indicador E14 Iluminación**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 137 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                            |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias defectuosa del total instalados para ese kilómetro. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3434, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 67 Indicador E15 Puentes y Estructuras**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de medición.      | Anual.            |
| Valor de aceptación.         | Inspección visual |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 mes             |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación anual del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3291, Lo anterior sin generar incumplimientos conforme a lo estipulado en el Apéndice Técnico 4. Se cargan al sistema SICC los formatos de inspección SIPUCOL.

**Tabla 68 Indicador E16 Capacidad Estructural**


|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Cada 2 años.                         |
| Valor de aceptación.         | NT-1 < 100<br>NT-2 < 80<br>NT-3 < 60 |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                              |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4

En enero de 2023, se llevó a cabo la evaluación bianual del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 4180, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 138 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 16 Evaluación E16 Capacidad Estructural UF1A**

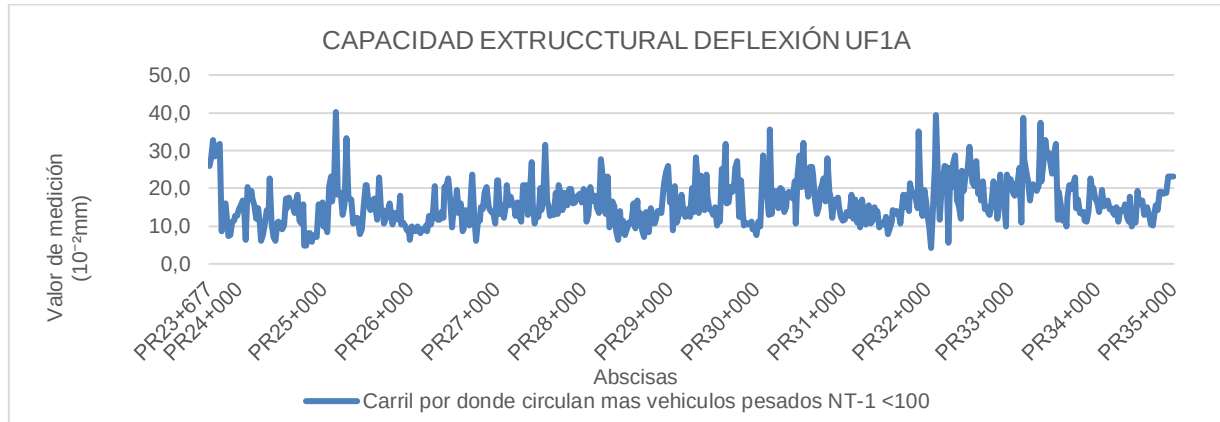


Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 17 Evaluación E16 Capacidad Estructural UF1B**

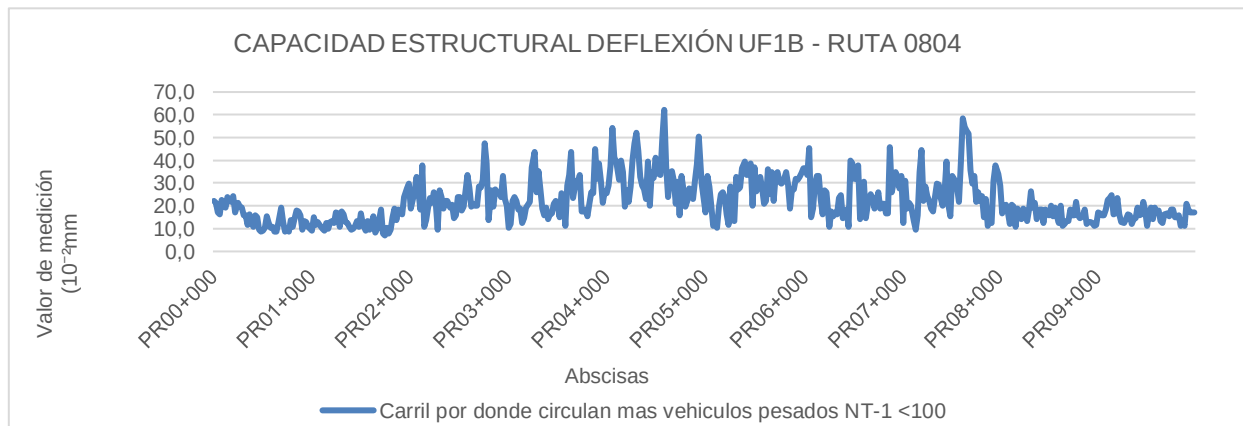

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 139 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

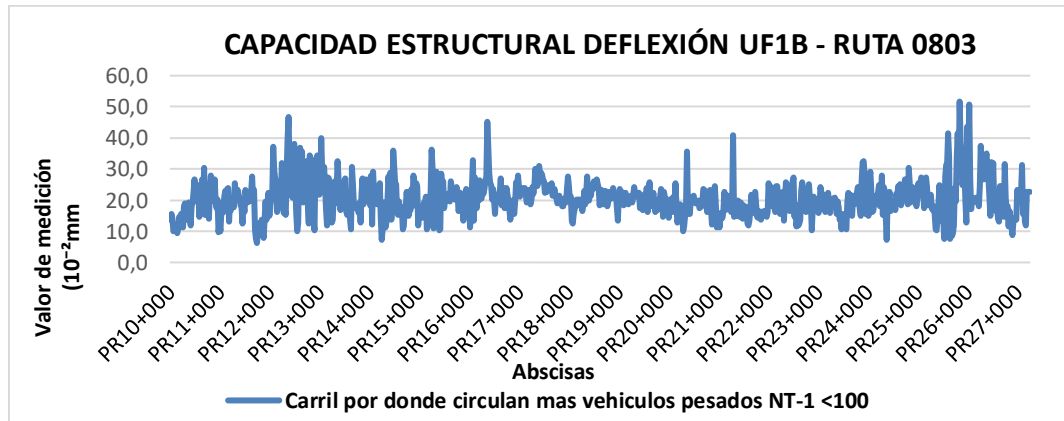

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 69 Indicador E17 Disponibilidad de la Vía.**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                     |
| Valor de aceptación.         | Debe permanecer disponible en todo momento. |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3435, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 70 Indicador O1 Índice De Mortalidad**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                         |
| Valor de aceptación.         | 1m mes debe ser menor de a 0.13. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                              |

Fuente- apéndice técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 89. Durante este periodo no se presentaron víctimas fatales.

**Tabla 71 Indicador O2 Ocupación de Carriles**

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                                                           |
| Valor de aceptación.         | Longitudes de retención debidas a cortes de carriles por la concesionaria < 300m. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 hora                                                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 140 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 90. Durante este periodo no se registran colas debido a cierres de carril o calzada.

**Indicador O3 Cola de Peaje.** No aplica para la unidad funcional 1.


**Tabla 72 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes**

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos establecidos para, señalización y despeje. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                               |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 180. En estos se registran 38 incidentes, el concesionario atendió dichos incidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

**Figura 18 Evaluación O4**

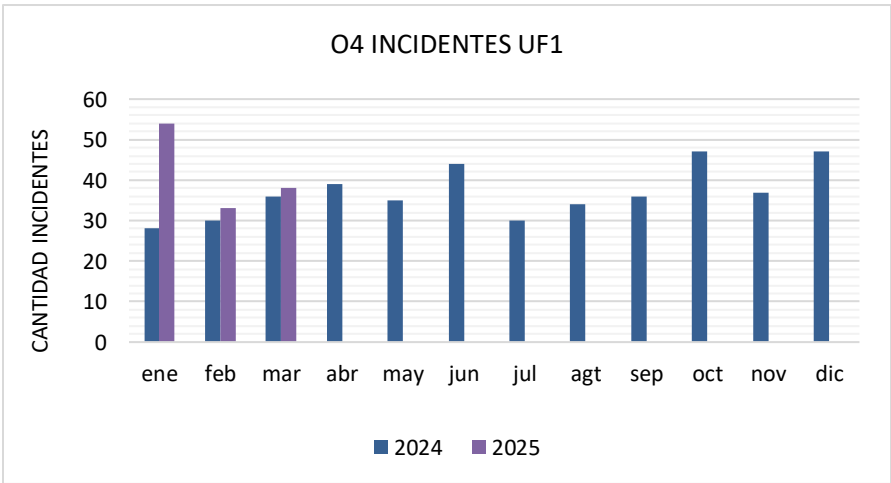

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 73 Indicador O5 Tiempo de Atención de Accidentes**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Frecuencia de medición. | Diaria. |
|-------------------------|---------|




|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 141 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de aceptación.         | En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos establecidos para, señalización y llegada de ambulancia<br>Tiempo de respuesta de señalización 1 hora<br>Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos<br>Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fuente: Apéndice Técnico No 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 160. En estos se registran 6 Accidentes, el concesionario atendió dichos Accidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

**Figura 19 Evaluación O5**

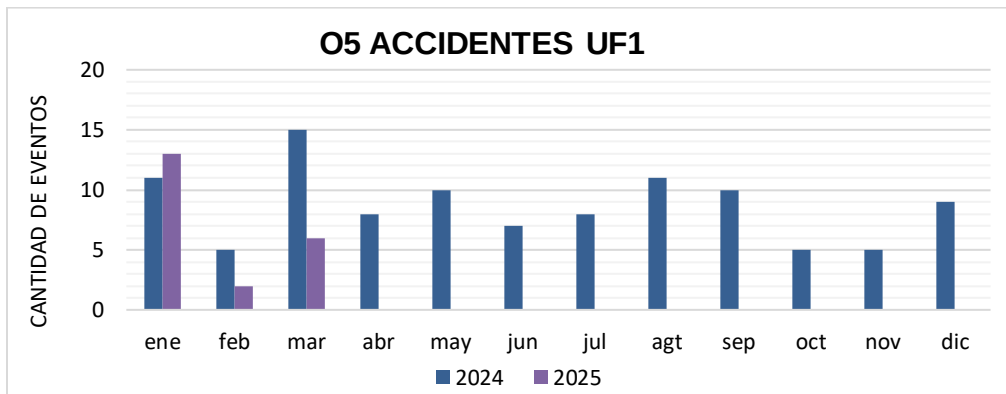

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 74 Indicador O6. Disponibilidad del SICC.**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                   |
| Valor de aceptación.         | El SICC debe contar con una disponibilidad mínima del 99%. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                   |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

El indicador de disponibilidad del SICC es evaluado por una firma independiente, la cual certifica que el sistema cumple con los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4. En marzo de 2025, la disponibilidad del SICC alcanzó un 99.81%, valor que da cumplimiento con lo requerido en el Apéndice Técnico No. 4. Este documento se encuentra adjunto en los anexos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 142 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 6.19.3 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF2.


**Tabla 75 Indicador E1 Iri.**

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                                     |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 3.5$ mm/m ó<br>Valor medio $\leq 3.0$ mm/m |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                                        |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.


En marzo de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3461, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en los siguientes gráficos.

**Figura 20 Evaluación E1 Iri UF2A**

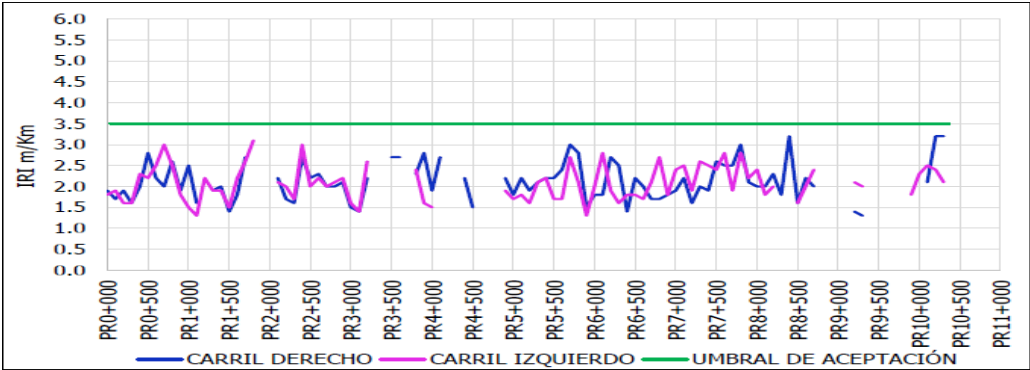

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 21 Evaluación E1 Iri UF2B.**

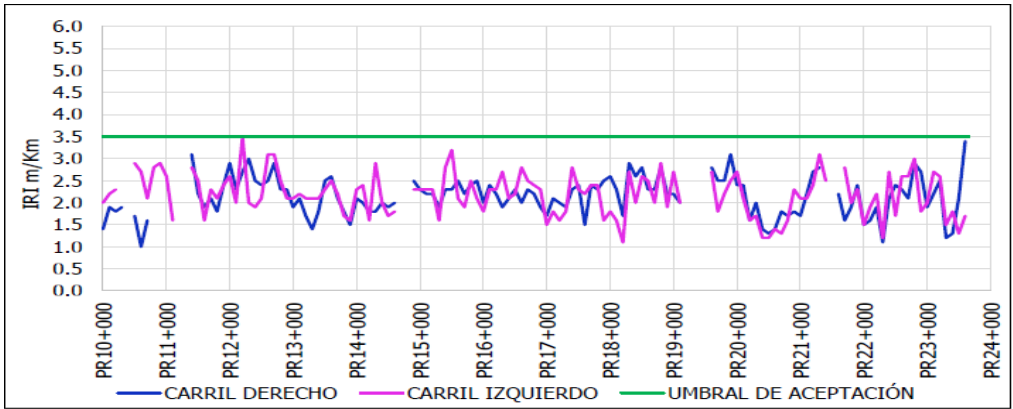

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 143 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |


**Tabla 76 Indicador E2 Ahuellamiento**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                               |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 20$ mm ó<br>Valor medio $\leq 15$ mm |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.


En marzo de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3462, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en los siguientes gráficos.

**Figura 22 Evaluación E2 Ahuellamiento UF2A.**

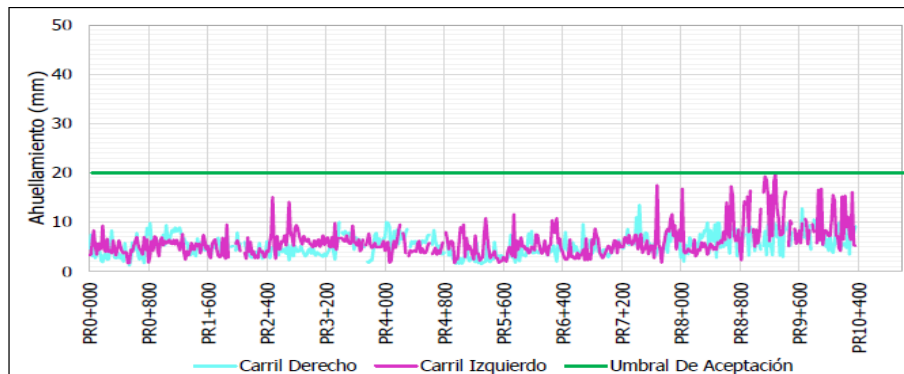

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 23 Evaluación E2 Ahuellamiento UF2B.**

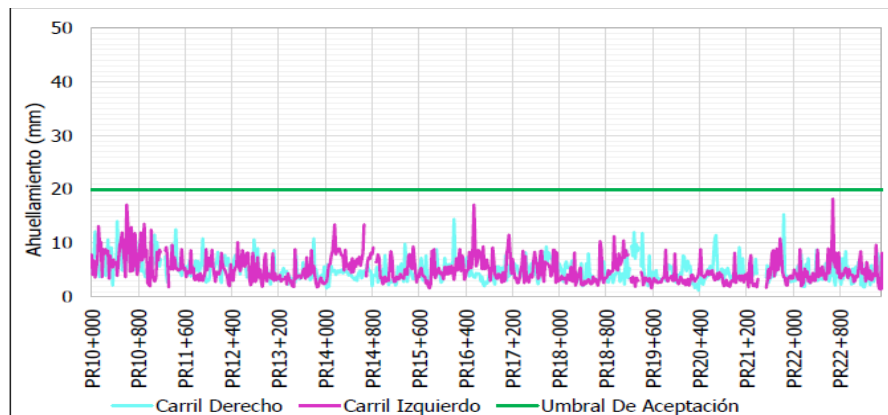

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 144 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 77 Indicador E3 Fisuras**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                 |
| Valor de aceptación.         | Área afectada menor o igual a 1% del área de la calzada. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 meses                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3438, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.


**Tabla 78 Indicador E4 Coeficiente de Fricción Transversal**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                         |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 40$ ó<br>Valor medio $\leq 45$ |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3463, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes segmentos: 48 (PR9+068 y PR10+419) y 54 (PR15+035). Como se aprecia en los siguientes gráficos.


**Figura 25 Evaluación E4 Fricción UF2A.**

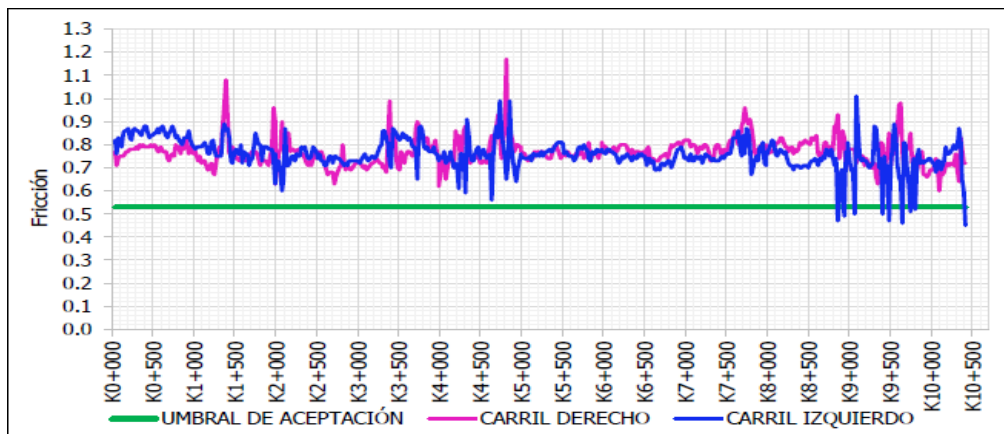

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b><br><b>de 2022</b>                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 145 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 26 Evaluación E4 Fricción UF2B.**

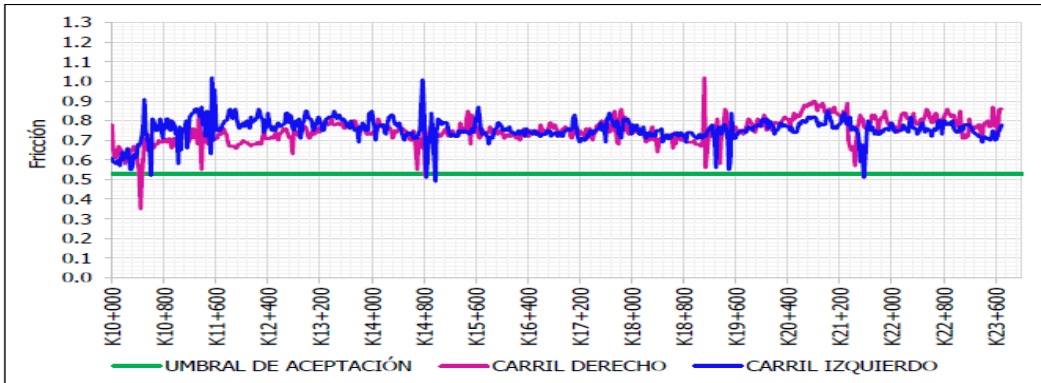

Fuente: Elaboración Propia.


**Tabla 79 Indicador E5. TEXTURA.**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                  |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 0.5$ mm |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3464, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en los siguientes gráficos.


**Figura 24 Evaluación E5 Textura UF2A**

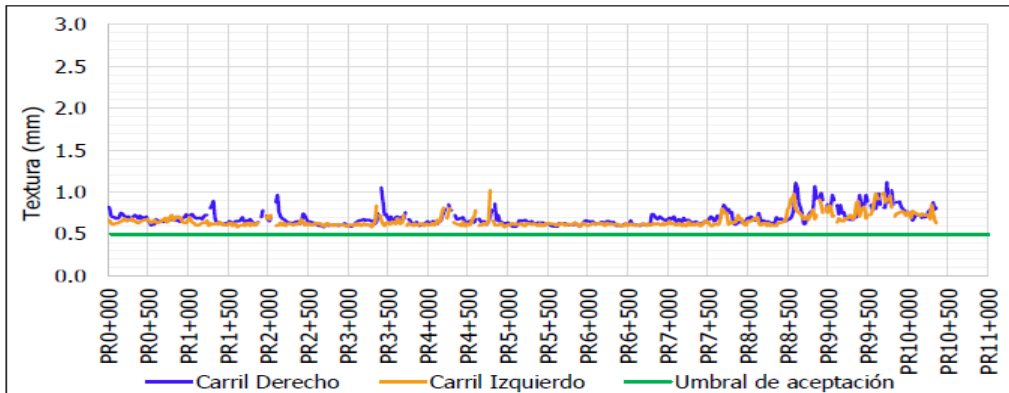

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 146 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Figura 25 Evaluación E5 Textura UF2B**

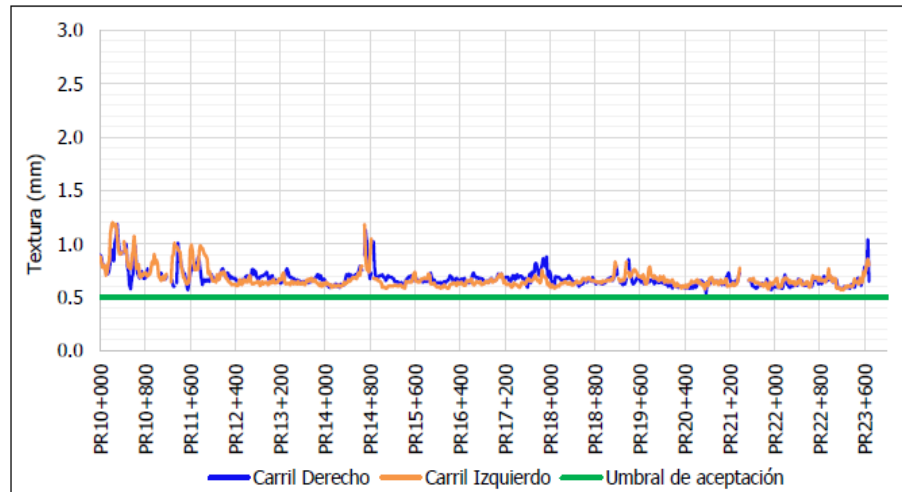

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 80 Indicador E6 Baches**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.     |
| Valor de aceptación.         | Ningún bache |
| Tiempo máximo de corrección. | 24 horas     |

Fuente: Apéndice Técnico N.º 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3441, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 81 Indicador E7 Hundimientos**

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                   |
| Valor de aceptación.         | Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 0,1 % del área de la calzada. |
| Tiempo máximo de corrección. | 2 semanas                                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N.º 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3442, revelando que algunos sectores superan los valores de aceptación generando incumplimientos en el siguiente segmento: 42 (PR3+560) **UF2A ruta 50CN03**.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 147 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 82 Indicador E8 Estado de Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho de Vía.**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor de aceptación.         | Ninguna de las medidas a la vegetación resulta superior a 30 cm de altura.<br>No existe vegetación que afecte la seguridad vial por disminución de distancia de seguridad u ocultación de señales.<br>Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento y operación. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3443, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 83 Indicador E10 Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal**

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | Sección hidráulica de cada obra de drenaje obstruida menor o igual al 25% del total de la sección. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                           |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3444, revelando que algunos sectores superan los valores de aceptación generando incumplimientos en el siguiente segmento: 49 (PR10+740), 52 (PR13+410 y PR13+650) **UF2B ruta 5009**.

**Tabla 84 Indicador E11 Señalización Vertical**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición. | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor de aceptación.    | La señal cumple con lo definido en la NTC 4739.<br>La señal está presente en la posición definida en el proyecto, cumple con las dimensiones, colores y rotulado<br>La señal es inequívocamente legible por un conductor que se desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 3. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 148 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Retroreflectividad $\geq 80$ % del valor tomado de la instalación.                                           |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 horas para las señales ilegibles y/o dañadas. |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3465, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación con 2 o más señales con novedad, generando incumplimientos en 20 segmentos.

Se recomienda a la concesión que realice la acción correctiva correspondiente de manera física y, posteriormente, efectúe una nueva medición de la retroreflectividad. En caso de que los resultados de esta segunda medición sigan siendo inferiores al valor mínimo de aceptación, se deberán reemplazar las señales correspondientes.

**Tabla 85 Indicador E12. Señalización Horizontal**

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                                                                                                                                                                                               |
| Valor de aceptación.         | Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ m <sup>2</sup> *Lux<br>Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ m <sup>2</sup> *Lux<br>Cada 50 m de longitud o menos sin tachas obligatorias, según lo definido en el proyecto. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                                                                                                                                                 |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3466. A continuación, se presentan el detalle los resultados por kilómetro para cada tramo de la Unidad Funcional.

**Figura 26 Evaluación indicador E12 Señalización Horizontal**

| Segmento | ABSCISA |         | Línea Izquierda Blanca                                                     | Línea Central Amarilla                                                     | Línea Derecha Blanca                                                       | Cumplimiento |
|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | DESDE   | HASTA   | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 250$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 200$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 250$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) |              |
| 39       | K0+042  | K1+056  | 222                                                                        | 134                                                                        | 257                                                                        | NO CUMPLE    |
| 40       | K1+056  | K1+056  | 252                                                                        | 158                                                                        | 264                                                                        | NO CUMPLE    |
| 41       | K2+038  | K2+038  | 281                                                                        | 167                                                                        | 260                                                                        | NO CUMPLE    |
| 42       | K3+032  | K3+032  | 230                                                                        | 167                                                                        | 228                                                                        | NO CUMPLE    |
| 43       | K4+037  | K4+037  | 216                                                                        | 170                                                                        | 220                                                                        | NO CUMPLE    |
| 44       | K5+042  | K5+042  | 255                                                                        | 162                                                                        | 243                                                                        | NO CUMPLE    |
| 45       | K6+029  | K6+029  | 256                                                                        | 161                                                                        | 235                                                                        | NO CUMPLE    |
| 46       | K7+047  | K7+047  | 197                                                                        | 130                                                                        | 170                                                                        | NO CUMPLE    |
| 47       | K8+061  | K8+061  | 171                                                                        | 123                                                                        | 172                                                                        | NO CUMPLE    |
| 48       | K9+048  | K10+359 | 118                                                                        | 98                                                                         | 118                                                                        | NO CUMPLE    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 149 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

|    |         |         |     |     |     |           |
|----|---------|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 49 | K10+000 | K11+006 | 96  | 107 | 83  | NO CUMPLE |
| 50 | K11+006 | K12+003 | 146 | 120 | 133 | NO CUMPLE |
| 51 | K12+003 | K13+014 | 196 | 138 | 183 | NO CUMPLE |
| 52 | K13+014 | K14+035 | 246 | 131 | 233 | NO CUMPLE |
| 53 | K14+035 | K15+035 | 292 | 133 | 280 | NO CUMPLE |
| 54 | K15+035 | K16+032 | 346 | 119 | 333 | NO CUMPLE |
| 55 | K16+032 | K17+038 | 396 | 88  | 383 | NO CUMPLE |
| 56 | K17+038 | K18+044 | 446 | 90  | 433 | NO CUMPLE |
| 57 | K18+044 | K19+045 | 496 | 142 | 483 | NO CUMPLE |
| 58 | K19+045 | K20+047 | 547 | 150 | 534 | NO CUMPLE |
| 59 | K20+047 | K21+042 | 596 | 165 | 583 | NO CUMPLE |
| 60 | K21+042 | K22+043 | 645 | 152 | 632 | NO CUMPLE |
| 61 | K22+043 | K23+650 | 714 | 132 | 701 | NO CUMPLE |

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 86 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención**

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | No deben existir tramos de una longitud igual a 20 m en los que las barreras y elementos de contención incumplan lo establecido en el numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y mantenimiento. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 mes                                                                                                                                                                                              |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3447, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 87 Indicador E14 Iluminación**

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                            |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias defectuosa del total instalados para ese kilómetro. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3448, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 88 Indicador E15 Puentes y Estructuras**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de medición.      | Anual.            |
| Valor de aceptación.         | Inspección visual |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 mes             |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 150 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2024, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3044. Lo anterior sin generar incumplimientos conforme a lo estipulado en el Apéndice Técnico 4. Además, se cargan en el SICC los formatos de inspección SIPUCOL.

**Tabla 89 Indicador E16 Capacidad Estructural**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Cada 2 años.                     |
| Valor de aceptación.         | NT-1 < 100, NT-2 < 80, NT-3 < 60 |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                          |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

La última evaluación se llevó a cabo en septiembre de 2023, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N° 2230 la próxima medición se deberá realizar en el mes de septiembre de 2025.

**Tabla 90 Indicador E17 Disponibilidad de la Vía**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                     |
| Valor de aceptación.         | Debe permanecer disponible en todo momento. |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3449, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 91 Indicador O1 Índice de Mortalidad**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                         |
| Valor de aceptación.         | Im mes debe ser menor de a 0.13. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                              |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 89. Durante este periodo no se presentaron víctimas fatales.

**Tabla 92 Indicador O2 Ocupación de Carriles**

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición. | Diaria.                                                                           |
| Valor de aceptación.    | Longitudes de retención debidas a cortes de carriles por la concesionaria < 300m. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 151 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiempo máximo de corrección. | 1 hora |
|------------------------------|--------|

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 91. Durante este periodo no se registran colas debido a cierres de carril o calzada.

**Tabla 93 Indicador O3 Cola de Peaje**

|                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mínimo 5 veces al mes durante 4 horas cada una y en días representativos.                                                                                                                                               |
| Valor de aceptación.         | No podrá acumularse un número igual o mayor a 10 vehículos por carril en la mitad de las estaciones de pago manual o semiautomático que se encuentran en servicio, por un periodo igual o mayor a sesenta (60) minutos. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                                                                                                                                                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 155. Durante los 5 períodos evaluados no se presentó ningún evento o acumulaciones iguales o superiores a 10 vehículos, por un tiempo mayor a 60 minutos.

**Las 5 mediciones se realizaron en las siguientes fechas y horarios:**

14 de marzo de 2025 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00  
 14 de marzo de 2025 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00  
 21 de marzo de 2025 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00  
 21 de marzo de 2025 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00  
 22 de marzo de 2025 desde las 8:00:00 hasta las 12:00:00


**Tabla 94 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes.**

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos establecidos para, señalización y despeje. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                               |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 181. En estos se registran 88 incidentes, el concesionario atendió dichos incidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

Figura 27 Evaluación O4 UF2

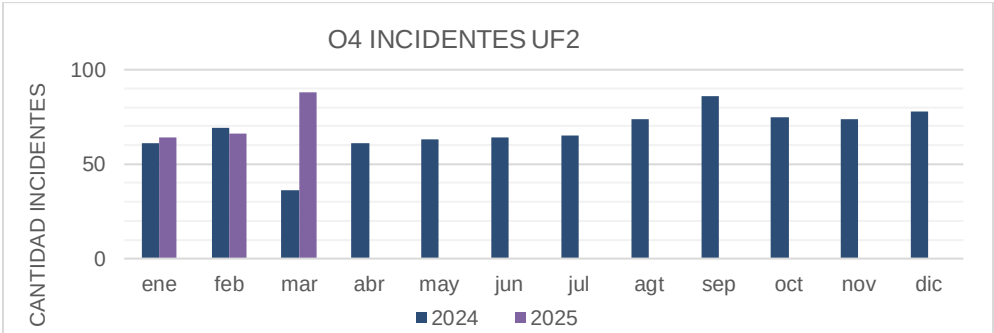

Fuente: Elaboración Propia.


Tabla 95 Indicador O5. Tiempo de Atención de Accidentes.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos establecidos para, señalización y llegada de ambulancia<br>Tiempo de respuesta de señalización 1 hora<br>Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos<br>Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 161. En estos se registran 6 Accidentes, el concesionario atendió dichos Accidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

Figura 28 Evaluación O5 UF2

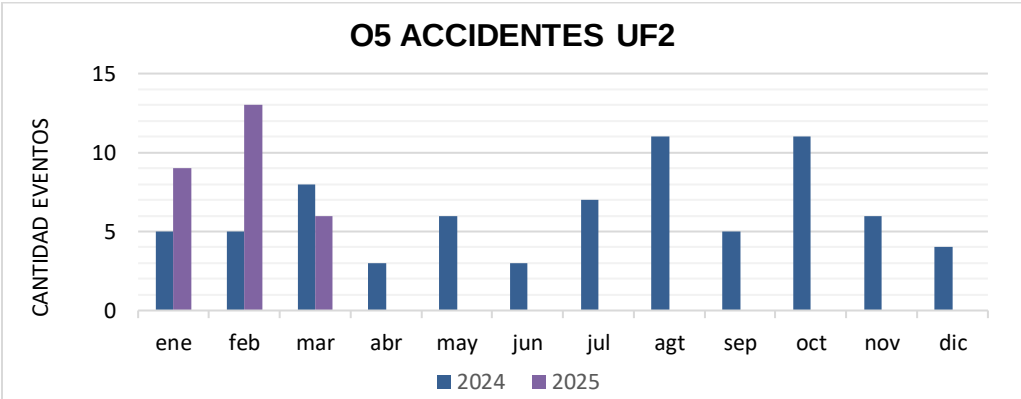

Fuente: Elaboración Propia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 153 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 96 Indicador O6 Disponibilidad del SICC**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                   |
| Valor de aceptación.         | El SICC debe contar con una disponibilidad mínima del 99%. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                   |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

El indicador de disponibilidad del SICC es evaluado por una firma independiente, la cual certifica que el sistema cumple con los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4. En marzo de 2025, la disponibilidad del SICC alcanzó un 99.81%, valor que da cumplimiento con lo requerido en el Apéndice Técnico No. 4. Este documento se encuentra adjunto en los anexos.

#### 6.19.4 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF3.


**Tabla 97 Indicador E1 Iri**

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                                     |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 3.5$ mm/m ó<br>Valor medio $\leq 3.0$ mm/m |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                                        |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

La última evaluación se llevó a cabo en diciembre de 2024, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3223, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimientos en 11 segmentos: 71, 72, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 91 y 92 de la **UF3B ruta 4006A**.


**Figura 29 Evaluación E1 UF3A**

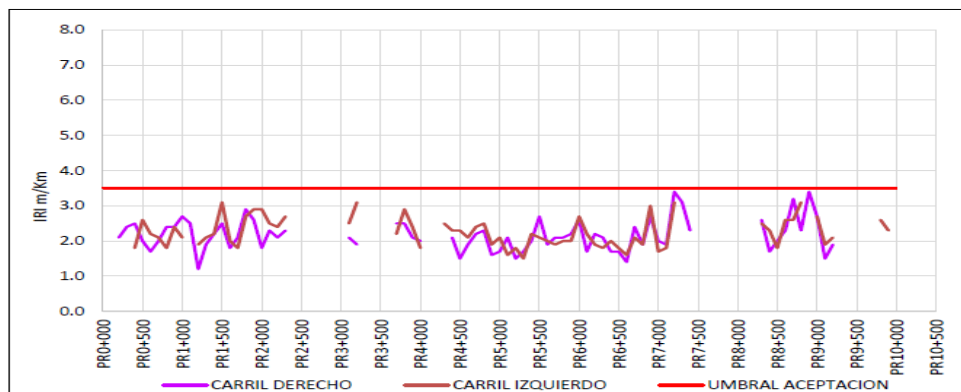

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 154 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Figura 30 Evaluación E1 UF3B**

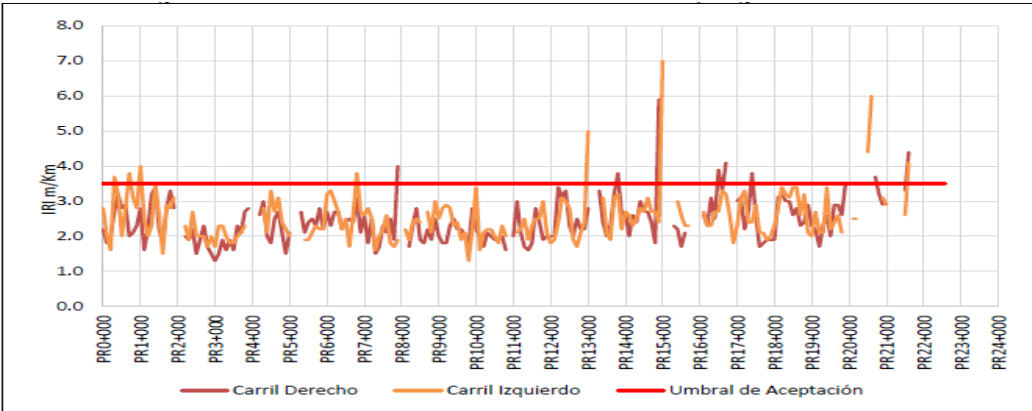

Fuente: Elaboración Propia.


**Tabla 98 Indicador E2 Ahuellamiento**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                               |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 20$ mm ó<br>Valor medio $\leq 15$ mm |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2024, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3224 revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en los siguientes gráficos.


**Figura 31 Evaluación E2 UF3A**

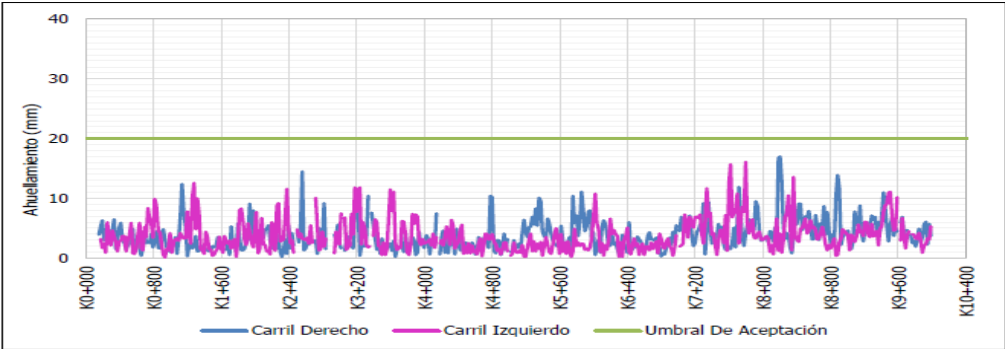

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 155 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 32 Evaluación E2 UF3B**

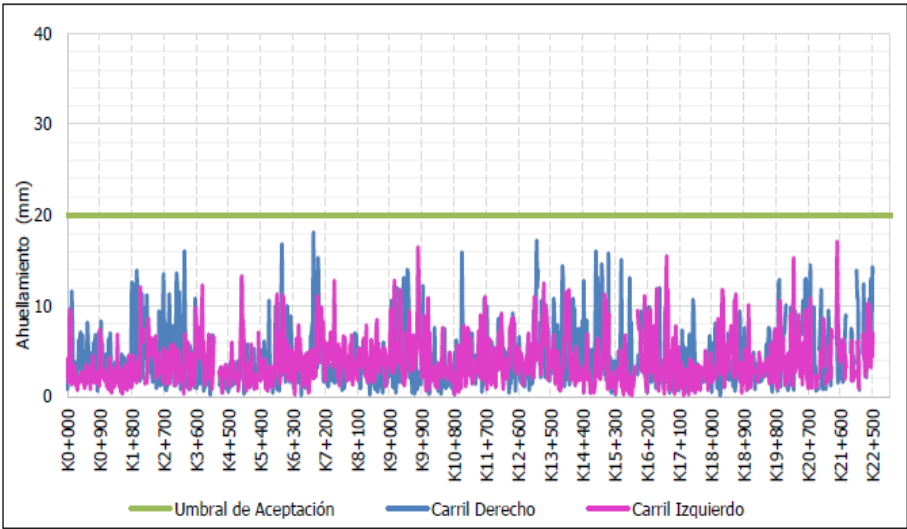

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 99 Indicador E3 Fisuras**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                 |
| Valor de aceptación.         | Área afectada menor o igual a 1% del área de la calzada. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 meses                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3452, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 100 Indicador E4 Coeficiente De Fricción Transversal**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                                         |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 40$ ó<br>Valor medio $\leq 45$ |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.


Durante el mes de diciembre de 2024, no fue posible medir el indicador debido a que el equipo de medición se encuentra en proceso de calibración en el Reino Unido. En consecuencia, esta Interventoría envió la comunicación CERS-OP-2708-2024 con Numero

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/>01 al 31 de Marzo de 2025</p>                                                                               | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/><b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca".</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 156 de 591</b></p>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                   |

de Radicado ANI 20244091506942 del 02/12/2024 y Numero de Radicado POB R-3983-2024, en la que se informó sobre la programación de medición de indicadores para el mes de diciembre y se anunció la imposibilidad de medir el indicador debido a la calibración del equipo.


Para enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3304, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación, generando incumplimientos en 10 segmentos: 66, 69 y 70 de la ruta 5009 UF3A 71, 76, 80, 86, 90, 91 y 92 de la **UF3B ruta 4006A**. La próxima medición se deberá realizar en el mes de junio de 2025.

**Figura 33 Comportamiento indicador E4 UF3A**

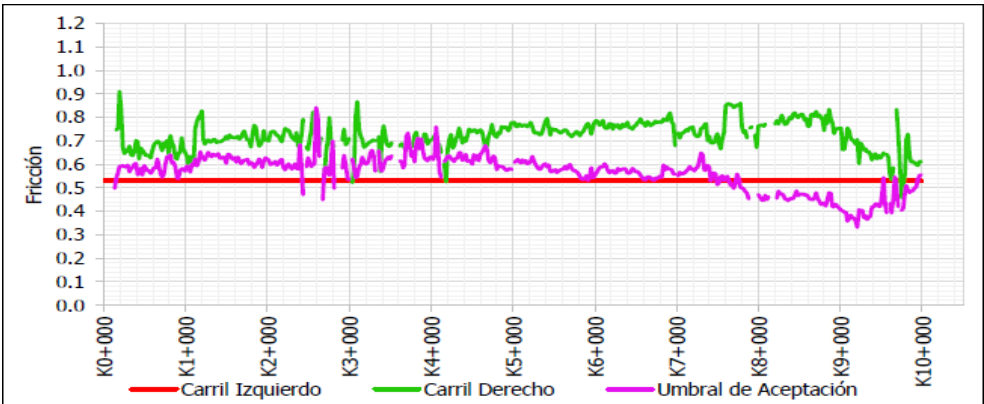

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 34 Comportamiento indicador E4 UF3B**

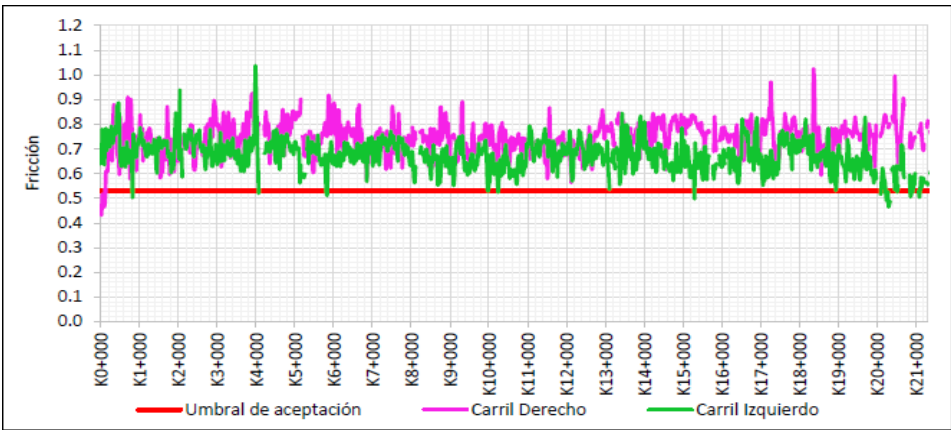

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 157 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |


**Tabla 101 Indicador E5. TEXTURA.**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Semestral.                  |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual $\leq 0.5$ mm |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.


La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2024, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3227 revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en los siguientes gráficos.

**Figura 35 Comportamiento indicador E5 UF3A**

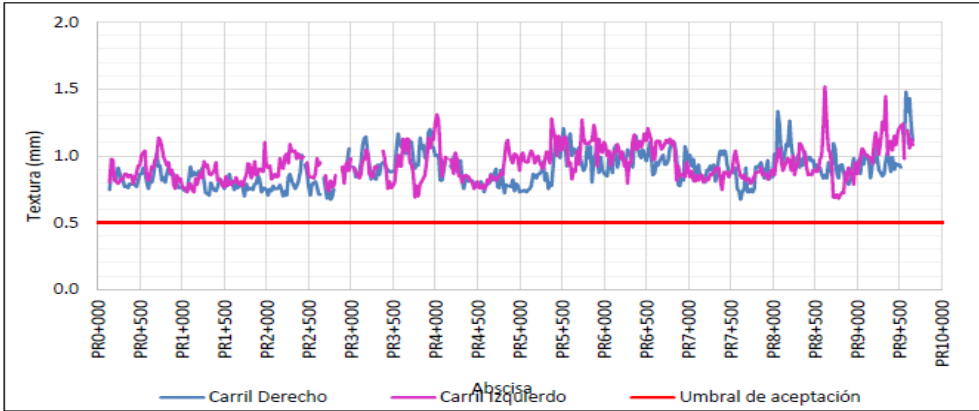

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 36 Comportamiento indicador E5 UF3A**

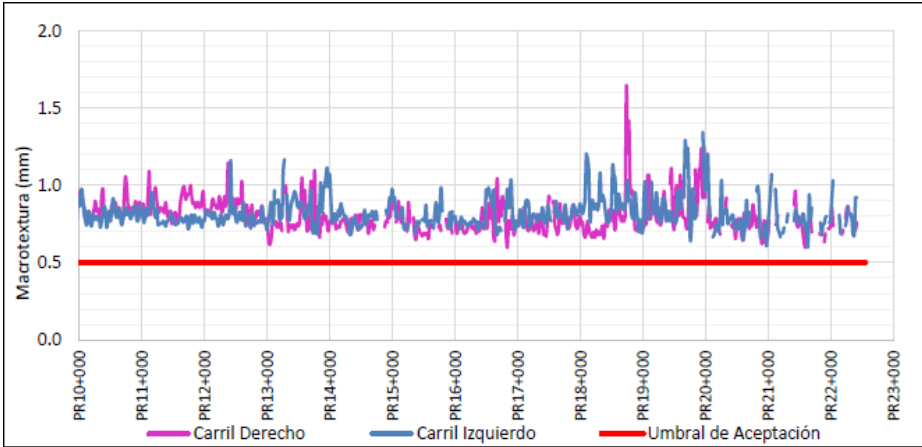

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 158 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 102 Indicador E6 Baches**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.     |
| Valor de aceptación.         | Ningún bache |
| Tiempo máximo de corrección. | 24 horas     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3453, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 103 Indicador E7 Hundimientos**

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                   |
| Valor de aceptación.         | Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 0,1 % del área de la calzada. |
| Tiempo máximo de corrección. | 2 semanas                                                                  |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3454, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 104 Indicador E8 Estado De Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho de Vía.**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor de aceptación.         | Ninguna de las medidas a la vegetación resulta superior a 30 cm de altura.<br>No existe vegetación que afecte la seguridad vial por disminución de distancia de seguridad u ocultación de señales.<br>Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento y operación. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3455, revelando que algunos sectores superan los valores de aceptación generando incumplimientos en el siguiente segmento: 82 (PR11+250) y 87 (PR17+000) **UF3B ruta 4006A.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 159 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 105 Indicador E10. Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal.**

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | Sección hidráulica de cada obra de drenaje obstruida menor o igual al 25% del total de la sección. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                           |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3456, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 106 Indicador E11 Señalización Vertical**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor de aceptación.         | La señal cumple con lo definido en la NTC 4739. La señal está presente en la posición definida en el proyecto, cumple con las dimensiones, colores y rotulado<br>La señal es inequívocamente legible por un conductor que se desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 3. Retroreflectividad $\geq 80$ % del valor tomado de la instalación. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 horas para las señales ilegibles y/o dañadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3457, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación con 2 o más señales con novedad, generando incumplimientos en 17 segmentos.

Se recomienda a la concesión que realice la acción correctiva correspondiente de manera física y, posteriormente, efectúe una nueva medición de la retroreflectividad. En caso de que los resultados de esta segunda medición sigan siendo inferiores al valor mínimo de aceptación, se deberán reemplazar las señales correspondientes.

**Tabla 107 Indicador E12 Señalización Horizontal**

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición. | Semestral.                                                                                                                 |
| Valor de aceptación.    | Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/m <sup>2</sup> *Lux<br>Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/m <sup>2</sup> *Lux |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 160 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Cada 50 m de longitud o menos sin tachas obligatorias, según lo definido en el proyecto. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                 |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

La última evaluación se llevó a cabo en diciembre de 2024, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3233, revelando que algunos sectores no alcanzan el valor de aceptación, generando incumplimientos, a continuación, se presentan en detalle los resultados por kilómetro para cada tramo de la UF, en las siguientes tablas se puede observar que hubo un incumplimiento en todos los segmentos. Sin embargo, el Concesionario realizó las correcciones correspondientes dentro de los plazos establecidos en el Apéndice Técnico N° 4, y esta Interventoría lo confirmo.

**Figura 37 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF3**

| Segmento | Abscisa |         | Linea Izquierda Blanca                                                     | Line Central Derecha Amarilla                                              | Linea Derecha Blanca                                                       | Cumplimiento |
|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | Desde   | Hasta   | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 250$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 200$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) | Valor de aceptación para el segmento: $\geq 250$ (mcd/m <sup>2</sup> /lux) |              |
| 1        | K0+012  | K1+016  | 127                                                                        | 88                                                                         | 129                                                                        | NO CUMPLE    |
| 2        | K1+016  | K2+015  | 144                                                                        | 87                                                                         | 140                                                                        | NO CUMPLE    |
| 3        | K2+015  | K3+017  | 131                                                                        | 91                                                                         | 161                                                                        | NO CUMPLE    |
| 4        | K3+017  | K4+022  | 104                                                                        | 92                                                                         | 93                                                                         | NO CUMPLE    |
| 5        | K4+022  | K5+017  | 126                                                                        | 93                                                                         | 139                                                                        | NO CUMPLE    |
| 6        | K5+017  | K7+019  | 202                                                                        | 100                                                                        | 171                                                                        | NO CUMPLE    |
| 7        | K7+019  | K8+045  | 196                                                                        | 95                                                                         | 177                                                                        | NO CUMPLE    |
| 8        | K8+045  | K9+009  | 153                                                                        | 88                                                                         | 157                                                                        | NO CUMPLE    |
| 9        | K9+009  | K9+989  | 115                                                                        | 99                                                                         | 133                                                                        | NO CUMPLE    |
| 1        | K0+000  | K1+000  | 321                                                                        | 95                                                                         | 270                                                                        | NO CUMPLE    |
| 2        | K1+000  | K2+004  | 337                                                                        | 113                                                                        | 216                                                                        | NO CUMPLE    |
| 3        | K2+004  | K3+008  | 324                                                                        | 115                                                                        | 209                                                                        | NO CUMPLE    |
| 4        | K3+008  | K4+014  | 305                                                                        | 91                                                                         | 213                                                                        | NO CUMPLE    |
| 5        | K4+014  | K5+017  | 290                                                                        | 86                                                                         | 162                                                                        | NO CUMPLE    |
| 6        | K5+017  | K6+019  | 314                                                                        | 103                                                                        | 191                                                                        | NO CUMPLE    |
| 7        | K6+019  | K7+016  | 297                                                                        | 104                                                                        | 174                                                                        | NO CUMPLE    |
| 8        | K7+016  | K8+032  | 293                                                                        | 88                                                                         | 189                                                                        | NO CUMPLE    |
| 9        | K8+032  | K9+037  | 291                                                                        | 102                                                                        | 157                                                                        | NO CUMPLE    |
| 10       | K9+037  | K10+042 | 307                                                                        | 89                                                                         | 151                                                                        | NO CUMPLE    |
| 11       | K10+042 | K11+047 | 288                                                                        | 96                                                                         | 171                                                                        | NO CUMPLE    |
| 12       | K11+047 | K12+046 | 242                                                                        | 93                                                                         | 192                                                                        | NO CUMPLE    |
| 13       | K12+046 | K13+053 | 204                                                                        | 106                                                                        | 196                                                                        | NO CUMPLE    |
| 14       | K13+053 | K14+054 | 292                                                                        | 125                                                                        | 297                                                                        | NO CUMPLE    |
| 15       | K14+054 | K15+058 | 313                                                                        | 96                                                                         | 341                                                                        | NO CUMPLE    |
| 16       | K15+058 | K16+068 | 290                                                                        | 111                                                                        | 326                                                                        | NO CUMPLE    |
| 17       | K16+068 | K17+067 | 314                                                                        | 110                                                                        | 316                                                                        | NO CUMPLE    |
| 18       | K17+067 | K18+065 | 321                                                                        | 102                                                                        | 280                                                                        | NO CUMPLE    |
| 19       | K18+065 | K19+078 | 309                                                                        | 98                                                                         | 343                                                                        | NO CUMPLE    |
| 20       | K19+078 | K20+082 | 330                                                                        | 112                                                                        | 293                                                                        | NO CUMPLE    |
| 21       | K20+082 | K21+052 | 317                                                                        | 110                                                                        | 260                                                                        | NO CUMPLE    |
| 22       | K21+052 | K22+656 | 226                                                                        | 129                                                                        | 224                                                                        | NO CUMPLE    |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 161 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 108 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención**

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                                                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | No deben existir tramos de una longitud igual a 20 m en los que las barreras y elementos de contención incumplan lo establecido en el numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y mantenimiento. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 mes                                                                                                                                                                                              |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3458, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 109 Indicador E14 Iluminación**

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                                                            |
| Valor de aceptación.         | Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias defectuosa del total instalados para ese kilómetro. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3459, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 110 Indicador E15 Puentes y Estructuras**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de medición.      | Anual.            |
| Valor de aceptación.         | Inspección visual |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 mes             |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2024, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3236 revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Se cargan al SICC los formatos de inspección SIPUCOL. Próxima revisión diciembre de 2025.

**Tabla 111 Indicador E16 Capacidad Estructural**


|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Cada 2 años.                     |
| Valor de aceptación.         | NT-1 < 100, NT-2 < 80, NT-3 < 60 |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                          |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 162 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |


La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2023, los resultados se cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3032 revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en los siguientes gráficos.

**Figura 38 Evaluación E16 UF3A**

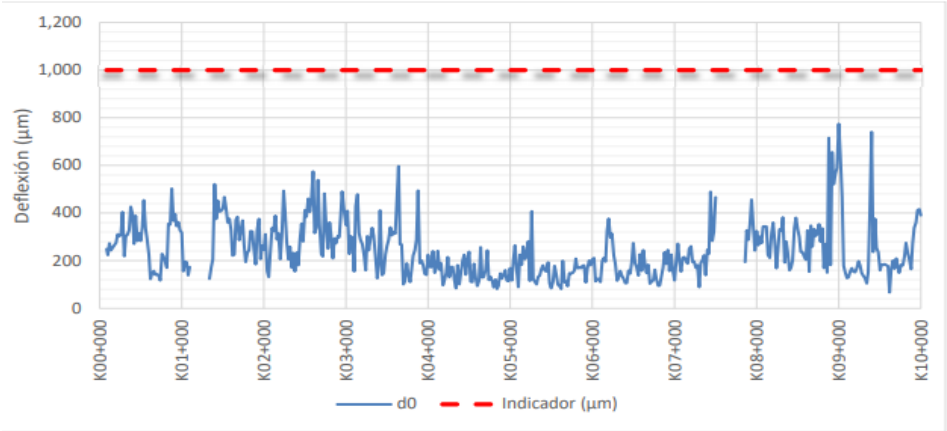

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 39 Evaluación E16 UF3B**

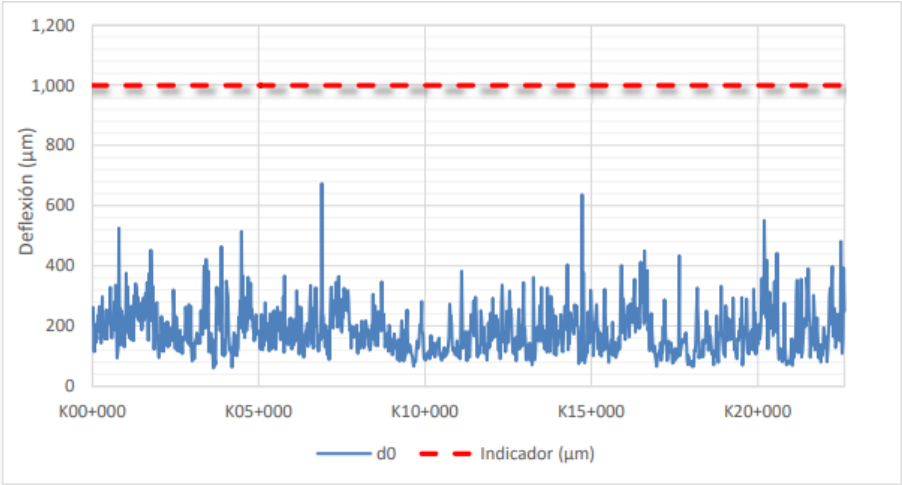

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 112 Indicador E17 Disponibilidad De La Vía**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Frecuencia de medición. | Diaria. |
|-------------------------|---------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 163 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Valor de aceptación.         | Debe permanecer disponible en todo momento. |
| Tiempo máximo de corrección. | 3 meses                                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 3460, revelando que los valores cumplen con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4.

**Tabla 113 Indicador O1 Índice de Mortalidad**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                         |
| Valor de aceptación.         | Im mes debe ser menor de a 0.13. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                              |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 89. Durante este periodo no se presentaron víctimas fatales.

**Tabla 114 Indicador O2 Ocupación de Carriles**

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                                                           |
| Valor de aceptación.         | Longitudes de retención debidas a cortes de carriles por la concesionaria < 300m. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 hora                                                                            |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 92. Durante este periodo no se registran colas debido a cierres de carril o calzada.

**Tabla 115 Indicador O3 Cola De Peaje**

|                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mínimo 5 veces al mes durante 4 horas cada una y en días representativos.                                                                                                                                               |
| Valor de aceptación.         | No podrá acumularse un número igual o mayor a 10 vehículos por carril en la mitad de las estaciones de pago manual o semiautomático que se encuentran en servicio, por un periodo igual o mayor a sesenta (60) minutos. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                                                                                                                                                     |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 164 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 156. Durante los 5 períodos evaluados no se presentó ningún evento o acumulaciones iguales o superiores a 10 vehículos, por un tiempo mayor a 60 minutos.

**Las 5 mediciones se realizaron en las siguientes fechas y horarios:**

14 de marzo de 2025 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00  
 14 de marzo de 2025 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00  
 21 de marzo de 2025 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00  
 21 de marzo de 2025 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00  
 22 de marzo de 2025 desde las 8:00:00 hasta las 12:00:00


**Tabla 116 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes**

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Diaria.                                                                                           |
| Valor de aceptación.         | En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos establecidos para, señalización y despeje. |
| Tiempo máximo de corrección. | N/A                                                                                               |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 182. En estos se registran 90 incidentes, el concesionario atendió dichos incidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

**Figura 40 Evaluación 04 UF3**

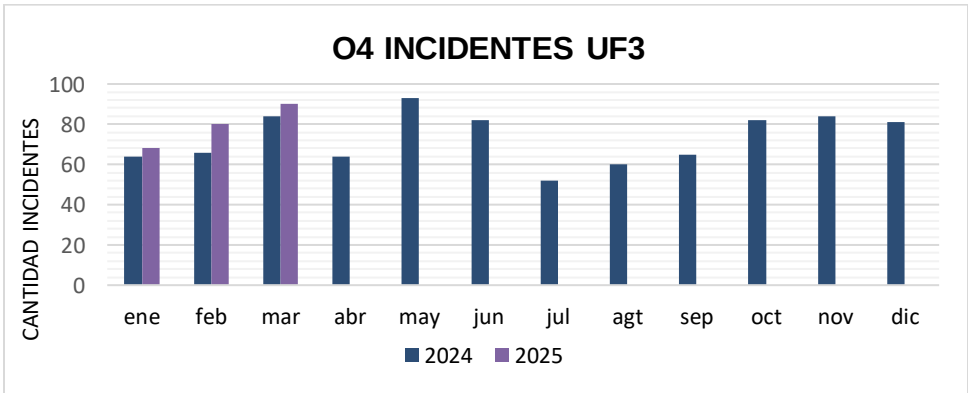

Fuente: Elaboración Propia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 165 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |


**Tabla 117 Indicador O5. TIEMPO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES.**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición. | Diaria.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor de aceptación.    | En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos establecidos para, señalización y llegada de ambulancia<br>Tiempo de respuesta de señalización 1 hora<br>Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos<br>Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

En marzo de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el código de revisión N.º 162. En estos se registran 14 Accidentes, el concesionario atendió dichos Accidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

**Figura 41 Evaluación 05 UF3.**

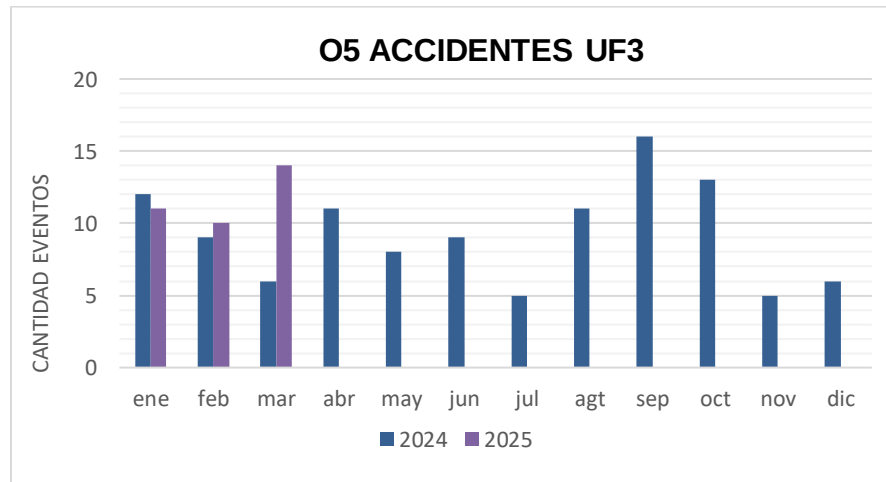

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 118 Indicador O6 Disponibilidad del SICC**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de medición.      | Mensual.                                                   |
| Valor de aceptación.         | El SICC debe contar con una disponibilidad mínima del 99%. |
| Tiempo máximo de corrección. | 1 semana                                                   |

Fuente: Apéndice Técnico N° 4.

El indicador de disponibilidad del SICC es evaluado por una firma independiente, la cual certifica que el sistema cumple con los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 166 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

En marzo de 2025, la disponibilidad del SICC alcanzó un 99.81%, valor que da cumplimiento con lo requerido en el Apéndice Técnico No. 4. Este documento se encuentra adjunto en los anexos.

#### 6.19.5 Reporte mensual de indicadores.

**Figura 42 Estado general por periodo de los indicadores UF1.**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL<br>ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO (IC) |                                                                              |                          |                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| FECHA ELABORACIÓN: 8/04/2025                                                              |                                                                              | PERIODO EVALUADO: mar-25 |                                 |                            |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): 1                                                                  |                                                                              | LONGITUD UF (Km): 38,42  |                                 |                            |
| EVALUACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES                                                       |                                                                              |                          |                                 |                            |
| IDT                                                                                       | INDICADOR                                                                    | EVALUACIÓN INTERVENTORÍA | AUTOEVALUACIÓN<br>CONCESIONARIO | EN TIEMPO DE<br>CORRECCIÓN |
| E1                                                                                        | IRI                                                                          | NO CUMPLE                | SIN REGISTRAR                   | SI                         |
| E2                                                                                        | Ahuellamiento                                                                | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E3                                                                                        | Fisuras                                                                      | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | SI                         |
| E4                                                                                        | Coefficiente de Fricción Transversal                                         | NO CUMPLE                | SIN REGISTRAR                   | SI                         |
| E5                                                                                        | Textura                                                                      | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E6                                                                                        | Baches                                                                       | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E7                                                                                        | Hundimientos                                                                 | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E8                                                                                        | Estado de Márgenes, separador central.<br>Área de servicio y Derecho de vía. | NO CUMPLE                | SIN REGISTRAR                   | SI                         |
| E10                                                                                       | Drenajes Superficiales, longitudinal y<br>transversal.                       | NO CUMPLE                | SIN REGISTRAR                   | SI                         |
| E11                                                                                       | Señalización Vertical                                                        | NO CUMPLE                | SIN REGISTRAR                   | SI                         |
| E12                                                                                       | Señalización Horizontal                                                      | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E13                                                                                       | Barreras y Elementos de Contención                                           | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E14                                                                                       | Iluminación                                                                  | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| E15                                                                                       | Puentes y Estructuras                                                        | CUMPLE                   | CUMPLE                          | N/A                        |
| E16                                                                                       | Capacidad Estructural                                                        | CUMPLE                   | CUMPLE                          | N/A                        |
| E17                                                                                       | Disponibilidad de la Vía                                                     | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| O1                                                                                        | Índice de Mortalidad                                                         | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| O2                                                                                        | Ocupación de Carriles                                                        | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| O4                                                                                        | Tiempo de Atención de Incidentes                                             | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| O5                                                                                        | Tiempo de Atención de Accidentes y<br>Emergencias                            | CUMPLE                   | SIN REGISTRAR                   | N/A                        |
| O6                                                                                        | Disponibilidad del SICC                                                      | CUMPLE                   | CUMPLE                          | N/A                        |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 167 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 43 Seguimiento de acciones correctivas UF1**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO (IC) |                                                                           |                                     |            |                                 |           |                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| FECHA ELABORACIÓN:                                                                     |                                                                           | 8/04/2025                           |            | PERIODO EVALUADO:               |           | mar-25                    |                                   |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF):                                                                 |                                                                           | 1                                   |            | LONGITUD UF (Km):               |           | 38,42                     |                                   |
| IDT                                                                                    | INDICADOR                                                                 | PERIODO TIEMPO MÁXIMO DE CORRECCIÓN |            | LOCALIZACIÓN                    |           | ACCIÓN CORRECTIVA EXITOSA | AFECTACIÓN ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO |
|                                                                                        |                                                                           | INICIO                              | FIN        | SEGMENTOS*                      | VÍA       |                           |                                   |
| E1                                                                                     | IRI                                                                       | 31/01/2025                          | 30/04/2025 | 11                              | 5009      | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                                           |                                     |            | 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27 y 38 | 803 y 804 |                           |                                   |
| E4                                                                                     | Coeficiente de Fricción Transversal                                       | 10/02/2025                          | 10/05/2025 | 7, 9, 10 y 11                   | 5009      | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                                           |                                     |            | 13, 17, 22, 28, 37 y 38         | 803 y 804 |                           |                                   |
| E8                                                                                     | Estado de Márgenes, separador central. Área de servicio y Derecho de vía. | 7/04/2025                           | 14/04/2025 | 12, 25, 33                      | 803 y 804 | EN TIEMPO                 | NO                                |
| E10                                                                                    | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal.                       | 7/04/2025                           | 14/04/2025 | 23                              | 803       | EN TIEMPO                 | NO                                |
| E11                                                                                    | Señalización Vertical                                                     | 7/04/2025                           | 14/04/2025 | 5, 6, 8, 9, 10 y 11             | 5009      | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                                           |                                     |            | 35                              | 803       |                           |                                   |

(\*) En caso de afectación al Índice de Cumplimiento se indica entre paréntesis la longitud del segmento incumplido.

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 168 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 44 Cálculo índice de cumplimiento UF1.**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL<br>INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| FECHA ELABORACIÓN: 8/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | PERIODO EVALUADO: mar-25                                                             |            |                 |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | LONGITUD UF (Km): 38,42                                                              |            |                 |
| VALOR PONDERADO DE CADA INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| IDT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                    | VALOR CUMPLIMIENTO<br>(Km <sub>c</sub> / P <sub>c</sub> / R / I <sub>c</sub> / A <sub>c</sub> ) | VALOR TOTAL<br>(Km <sub>t</sub> / P <sub>t</sub> / I <sub>t</sub> / A <sub>t</sub> ) | PESO       | VALOR PONDERADO |
| E1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRI                                                                          | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,1520     | 0,1520          |
| E2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ahuellamiento                                                                | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0140     | 0,0140          |
| E3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fisuras                                                                      | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0020     | 0,0020          |
| E4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coefficiente de Fricción Transversal                                         | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0032     | 0,0032          |
| E5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Textura                                                                      | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0130     | 0,0130          |
| E6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baches                                                                       | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0070     | 0,0070          |
| E7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hundimientos                                                                 | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0070     | 0,0070          |
| E8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado de Márgenes, separador central.<br>Área de servicio y Derecho de vía. | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0040     | 0,0040          |
| E10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal.                          | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0030     | 0,0030          |
| E11                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Señalización Vertical                                                        | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0020     | 0,0020          |
| E12                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Señalización Horizontal                                                      | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0080     | 0,0080          |
| E13                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barreras y Elementos de Contención                                           | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0040     | 0,0040          |
| E14                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iluminación                                                                  | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0030     | 0,0030          |
| E15                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puentes y Estructuras                                                        | 2                                                                                               | 2                                                                                    | 0,0020     | 0,0020          |
| E16                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacidad Estructural                                                        | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,0013     | 0,0013          |
| E17                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disponibilidad de la Vía                                                     | 38,42                                                                                           | 38,42                                                                                | 0,7190     | 0,7190          |
| O2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocupación de Carriles                                                        | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0240     | 0,0240          |
| O4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo de Atención de Incidentes                                             | 38                                                                                              | 38                                                                                   | 0,0045     | 0,0045          |
| O5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias                               | 6                                                                                               | 6                                                                                    | 0,0220     | 0,0220          |
| O6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disponibilidad del SICC                                                      | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0050     | 0,0050          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 | TOTAL IC                                                                             | 1,0000     | 1,0000          |
| O1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Índice de Mortalidad                                                         | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0100     | 0,0100          |
| CONVENCIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| CUMPLIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| Km <sub>c</sub> : Kilómetros; P <sub>c</sub> : Puentes y Estructuras; R: Resultado del Indicador (0 si no cumple o 1 si cumple); I <sub>c</sub> : Incidentes en tiempo; A <sub>c</sub> : Accidentes en tiempo                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| Km <sub>t</sub> : Kilómetros; P <sub>t</sub> : Puentes y Estructuras; I <sub>t</sub> : Incidentes totales; A <sub>t</sub> : Accidentes totales                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte de la ecuación indicada en el Contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No 4: Indicadores (ver página 40) para el cálculo del índice de cumplimiento (IC), y su peso se le sumará a este siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INDICADOR DE MORTALIDAD O1 PARA SER CONSIDERADO EN EL CÁLCULO DEL IC                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | VALORACIÓN |                 |
| Si la suma entre el valor del índice de cumplimiento con el indicador de mortalidad es menor a 1.<br>IC (1,000) + 0,01 < 1                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | NO CUMPLE  |                 |
| Si se cumple el valor de aceptación del indicador de Mortalidad O1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | CUMPLE     |                 |
| APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | NO         |                 |
| ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1 EN EL MES DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            | 1,0000          |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 169 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 45 Estado general por periodo de los indicadores UF2.**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC) |                                                                              |                          |                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| FECHA ELABORACIÓN: 8/04/2025                                                           |                                                                              | PERIODO EVALUADO: mar-25 |                              |                         |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): 2                                                               |                                                                              | LONGITUD UF (Km): 24,09  |                              |                         |
| EVALUACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES                                                    |                                                                              |                          |                              |                         |
| IDT                                                                                    | INDICADOR                                                                    | EVALUACIÓN INTERVENTORÍA | AUTOEVALUACIÓN CONCESIONARIO | EN TIEMPO DE CORRECCIÓN |
| E1                                                                                     | IRI                                                                          | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E2                                                                                     | Ahuellamiento                                                                | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E3                                                                                     | Fisuras                                                                      | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E4                                                                                     | Coefficiente de Fricción Transversal                                         | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E5                                                                                     | Textura                                                                      | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E6                                                                                     | Baches                                                                       | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E7                                                                                     | Hundimientos                                                                 | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E8                                                                                     | Estado de Márgenes, separador central.<br>Área de servicio y Derecho de vía. | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E10                                                                                    | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal.                          | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E11                                                                                    | Señalización Vertical                                                        | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E12                                                                                    | Señalización Horizontal                                                      | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E13                                                                                    | Barreras y Elementos de Contención                                           | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E14                                                                                    | Iluminación                                                                  | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E15                                                                                    | Puentes y Estructuras                                                        | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E16                                                                                    | Capacidad Estructural                                                        | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |
| E17                                                                                    | Disponibilidad de la Vía                                                     | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |
| O1                                                                                     | Índice de Mortalidad                                                         | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O2                                                                                     | Ocupación de Carriles                                                        | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O3                                                                                     | Cola de Peaje                                                                | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |
| O4                                                                                     | Tiempo de Atención de Incidentes                                             | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O5                                                                                     | Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias                               | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O6                                                                                     | Disponibilidad del SICC                                                      | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 170 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 46 Seguimiento acciones correctivas UF2.**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO (IC) |                                                     |                                     |            |                                            |         |                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| FECHA ELABORACIÓN: <u>8/04/2025</u>                                                    |                                                     |                                     |            | PERIODO EVALUADO: <u>mar-25</u>            |         |                           |                                   |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): <u>2</u>                                                        |                                                     |                                     |            | LONGITUD UF (Km): <u>24,09</u>             |         |                           |                                   |
|                                                                                        |                                                     | PERIODO TIEMPO MÁXIMO DE CORRECCIÓN |            | LOCALIZACIÓN                               |         |                           |                                   |
| IDT                                                                                    | INDICADOR                                           | INICIO                              | FIN        | SEGMENTOS*                                 | VÍA     | ACCIÓN CORRECTIVA EXITOSA | AFECTACIÓN ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO |
| E4                                                                                     | Coeficiente de Fricción Transversal                 | 7/04/2025                           | 7/07/2025  | 48                                         | 50CN03  | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                     |                                     |            | 54                                         | 5009    |                           |                                   |
| E7                                                                                     | Hundimientos                                        | 7/04/2025                           | 21/04/2025 | 42                                         | 50CN03  | EN TIEMPO                 | NO                                |
| E10                                                                                    | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal. | 7/04/2025                           | 14/04/2025 | 49                                         | 50CN03  | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                     |                                     |            | 52                                         | 5009    |                           |                                   |
| E11                                                                                    | Señalización Vertical                               | 7/04/2025                           | 21/04/2025 | 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 y 48        | 50CN030 | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                     |                                     |            | 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 50 | 5009    |                           |                                   |

(\*) En caso de afectación al Índice de Cumplimiento se indica entre paréntesis la longitud del segmento incumplido.

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 47 Cálculo índice de cumplimiento UF2.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b><br><b>de 2022</b>                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 171 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| FECHA ELABORACIÓN: 8/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                 | PERIODO EVALUADO: mar-25                                                             |            |                 |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                 | LONGITUD UF (Km): 24,09                                                              |            |                 |
| VALOR PONDERADO DE CADA INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| IDT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                 | VALOR CUMPLIMIENTO<br>(Km <sub>c</sub> / P <sub>c</sub> / R / I <sub>c</sub> / A <sub>c</sub> ) | VALOR TOTAL<br>(Km <sub>t</sub> / P <sub>t</sub> / I <sub>t</sub> / A <sub>t</sub> ) | PESO       | VALOR PONDERADO |
| E1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRI                                                                       | 2409                                                                                            | 2409                                                                                 | 0,1520     | 0,1520          |
| E2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ahuellamiento                                                             | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0140     | 0,0140          |
| E3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fisuras                                                                   | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0020     | 0,0020          |
| E4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coefficiente de Fricción Transversal                                      | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0032     | 0,0032          |
| E5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Textura                                                                   | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0130     | 0,0130          |
| E6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baches                                                                    | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0070     | 0,0070          |
| E7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hundimientos                                                              | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0070     | 0,0070          |
| E8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado de Márgenes, separador central. Área de servicio y Derecho de vía. | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0040     | 0,0040          |
| E10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal.                       | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0030     | 0,0030          |
| E11                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Señalización Vertical                                                     | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0020     | 0,0020          |
| E12                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Señalización Horizontal                                                   | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0080     | 0,0080          |
| E13                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barreras y Elementos de Contención                                        | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0040     | 0,0040          |
| E14                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iluminación                                                               | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0030     | 0,0030          |
| E15                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puentes y Estructuras                                                     | 2                                                                                               | 2                                                                                    | 0,0020     | 0,0020          |
| E16                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacidad Estructural                                                     | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,0013     | 0,0013          |
| E17                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disponibilidad de la Vía                                                  | 24,09                                                                                           | 24,09                                                                                | 0,6890     | 0,6890          |
| O2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocupación de Carriles                                                     | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0240     | 0,0240          |
| O3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cola de Peaje                                                             | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0300     | 0,0300          |
| O4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo de Atención de Incidentes                                          | 88                                                                                              | 88                                                                                   | 0,0045     | 0,0045          |
| O5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias                            | 6                                                                                               | 6                                                                                    | 0,0220     | 0,0220          |
| O6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disponibilidad del SICC                                                   | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0050     | 0,0050          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                 | TOTAL IC                                                                             | 1,0000     | 1,0000          |
| O1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Índice de Mortalidad                                                      | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0100     | 0,0100          |
| CONVENCIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| CUMPLIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| Km <sub>c</sub> : Kilómetros; P <sub>c</sub> : Puentes y Estructuras; R: Resultado del Indicador (0 si no cumple o 1 si cumple); I <sub>c</sub> : Incidentes en tiempo; A <sub>c</sub> : Accidentes en tiempo                                                                                   |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| Km <sub>t</sub> : Kilómetros; P <sub>t</sub> : Puentes y Estructuras; I <sub>t</sub> : Incidentes totales; A <sub>t</sub> : Accidentes totales                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte de la ecuación indicada en el Contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No 4: Indicadores (ver página 40) para el cálculo del índice de cumplimiento (IC), y su peso se le sumará a este siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INDICADOR DE MORTALIDAD O1 PARA SER CONSIDERADO EN EL CÁLCULO DEL IC                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      | VALORACIÓN |                 |
| Si la suma entre el valor del índice de cumplimiento con el indicador de mortalidad es menor a 1.<br>IC (1,000) + 0,01 < 1                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      | NO CUMPLE  |                 |
| Si se cumple el valor de aceptación del indicador de Mortalidad O1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      | CUMPLE     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      | APLICA     | NO              |
| ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 2 EN EL MES DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                      |            | 1,0000          |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 172 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 48 Estado general por periodo de los indicadores UF3.**

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL  
INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

FECHA ELABORACIÓN: 8/04/2025  
UNIDAD FUNCIONAL (UF): 3

PERIODO EVALUADO: mar-25  
LONGITUD UF (Km): 32.56

| EVALUACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES |                                                                           |                          |                              |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| IDT                                 | INDICADOR                                                                 | EVALUACIÓN INTERVENTORÍA | AUTOEVALUACIÓN CONCESIONARIO | EN TIEMPO DE CORRECCIÓN |
| E1                                  | IRI                                                                       | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E2                                  | Ahuellamiento                                                             | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E3                                  | Fisuras                                                                   | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E4                                  | Coficiente de Fricción Transversal                                        | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E5                                  | Textura                                                                   | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E6                                  | Baches                                                                    | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E7                                  | Hundimientos                                                              | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E8                                  | Estado de Márgenes, separador central. Área de servicio y Derecho de vía. | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E10                                 | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal.                       | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E11                                 | Señalización Vertical                                                     | NO CUMPLE                | NO REGISTRA                  | SI                      |
| E12                                 | Señalización Horizontal                                                   | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E13                                 | Barreras y Elementos de Contención                                        | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E14                                 | Iluminación                                                               | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| E15                                 | Puentes y Estructuras                                                     | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |
| E16                                 | Capacidad Estructural                                                     | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |
| E17                                 | Disponibilidad de la Vía                                                  | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O1                                  | Índice de Mortalidad                                                      | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O2                                  | Ocupación de Carriles                                                     | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O3                                  | Cola de Peaje                                                             | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |
| O4                                  | Tiempo de Atención de Incidentes                                          | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O5                                  | Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias                            | CUMPLE                   | NO REGISTRA                  | N/A                     |
| O6                                  | Disponibilidad del SICC                                                   | CUMPLE                   | CUMPLE                       | N/A                     |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 173 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Figura 49 Seguimiento acciones correctivas UF3.**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO (IC) |                                                                           |                                     |            |                                                                |       |                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|
| FECHA ELABORACIÓN: <u>8/04/2025</u>                                                    |                                                                           |                                     |            | PERIODO EVALUADO: <u>mar-25</u>                                |       |                           |                                   |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): <u>3</u>                                                        |                                                                           |                                     |            | LONGITUD UF (Km): <u>32,56</u>                                 |       |                           |                                   |
|                                                                                        |                                                                           | PERIODO TIEMPO MÁXIMO DE CORRECCIÓN |            | LOCALIZACIÓN                                                   |       |                           |                                   |
| IDT                                                                                    | INDICADOR                                                                 | INICIO                              | FIN        | SEGMENTOS*                                                     | VÍA   | ACCIÓN CORRECTIVA EXITOSA | AFECTACIÓN ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO |
| E1                                                                                     | IRI                                                                       | 10/01/2025                          | 10/04/2025 | 71, 72, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 91 y 92                    | 4006A | EN TIEMPO                 | NO                                |
| E4                                                                                     | Coeficiente de Fricción Transversal                                       | 10/02/2025                          | 10/05/2025 | 66, 69 y 70                                                    | 5009  | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                                           |                                     |            | 71, 76, 80, 86, 90, 91, y 92                                   | 4006A |                           |                                   |
| E8                                                                                     | Estado de Márgenes, separador central. Área de servicio y Derecho de vía. | 7/04/2025                           | 14/04/2025 | 82 Y 87                                                        | 4006A | EN TIEMPO                 | NO                                |
| E11                                                                                    | Señalización Vertical                                                     | 7/04/2025                           | 14/04/2025 | 69                                                             | 5009  | EN TIEMPO                 | NO                                |
|                                                                                        |                                                                           |                                     |            | 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 80 | 4006A |                           |                                   |

(\*) En caso de afectación al Índice de Cumplimiento se indica entre paréntesis la longitud del segmento incumplido.

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b><br><hr/> <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 174 de 591</b><br><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". |                                                                                                                                       |

**Figura 50 Cálculo índice de cumplimiento UF3.**

| INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL<br>INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| FECHA ELABORACIÓN: 8/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | PERIODO EVALUADO: mar-25                                                             |            |                 |
| UNIDAD FUNCIONAL (UF): 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | LONGITUD UF (Km): 32,56                                                              |            |                 |
| VALOR PONDERADO DE CADA INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| IDT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                    | VALOR CUMPLIMIENTO<br>(Km <sub>c</sub> / P <sub>c</sub> / R / I <sub>t</sub> / A <sub>c</sub> ) | VALOR TOTAL<br>(Km <sub>c</sub> / P <sub>c</sub> / I <sub>t</sub> / A <sub>c</sub> ) | PESO       | VALOR PONDERADO |
| E1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRI                                                                          | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,1520     | 0,1520          |
| E2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ahuellamiento                                                                | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0140     | 0,0140          |
| E3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fisuras                                                                      | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0020     | 0,0020          |
| E4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coefficiente de Fricción Transversal                                         | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0032     | 0,0032          |
| E5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Textura                                                                      | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0130     | 0,0130          |
| E6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baches                                                                       | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0070     | 0,0070          |
| E7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hundimientos                                                                 | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0070     | 0,0070          |
| E8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado de Márgenes, separador central.<br>Área de servicio y Derecho de vía. | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0040     | 0,0040          |
| E10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal.                          | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0030     | 0,0030          |
| E11                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Señalización Vertical                                                        | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0020     | 0,0020          |
| E12                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Señalización Horizontal                                                      | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0080     | 0,0080          |
| E13                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barreras y Elementos de Contención                                           | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0040     | 0,0040          |
| E14                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iluminación                                                                  | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0030     | 0,0030          |
| E15                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puentes y Estructuras                                                        | 3                                                                                               | 3                                                                                    | 0,0020     | 0,0020          |
| E16                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacidad Estructural                                                        | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,0013     | 0,0013          |
| E17                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disponibilidad de la Vía                                                     | 32,56                                                                                           | 32,56                                                                                | 0,6890     | 0,6890          |
| O2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocupación de Carriles                                                        | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0240     | 0,0240          |
| O3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cola de Peaje                                                                | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0300     | 0,0300          |
| O4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo de Atención de Incidentes                                             | 90                                                                                              | 90                                                                                   | 0,0045     | 0,0045          |
| O5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias                               | 14                                                                                              | 14                                                                                   | 0,0220     | 0,0220          |
| O6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disponibilidad del SICC                                                      | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0050     | 0,0050          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 | TOTAL IC                                                                             | 1,0000     | 1,0000          |
| O1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Índice de Mortalidad                                                         | 1                                                                                               | ---                                                                                  | 0,0100     | 0,0100          |
| CONVENCIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| CUMPLIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| Km <sub>c</sub> : Kilómetros; P <sub>c</sub> : Puentes y Estructuras; R: Resultado del Indicador (0 si no cumple o 1 si cumple); I <sub>t</sub> : Incidentes en tiempo; A <sub>c</sub> : Accidentes en tiempo                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| Km <sub>t</sub> : Kilómetros; P <sub>t</sub> : Puentes y Estructuras; I <sub>t</sub> : Incidentes totales; A <sub>t</sub> : Accidentes totales                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte de la ecuación indicada en el Contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No 4: Indicadores (ver página 40) para el cálculo del índice de cumplimiento (IC), y su peso se le sumará a este siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INDICADOR DE MORTALIDAD O1 PARA SER CONSIDERADO EN EL CÁLCULO DEL IC                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            |                 |
| CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | VALORACIÓN |                 |
| Si la suma entre el valor del índice de cumplimiento con el indicador de mortalidad es menor a 1.<br>IC (1,000) + 0,01 < 1                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | NO CUMPLE  |                 |
| Si se cumple el valor de aceptación del indicador de Mortalidad O1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | CUMPLE     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      | APLICA     | NO              |
| ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 3 EN EL MES DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |            | 1,0000          |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 175 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 7 AUDITORIA DE PEAJES.

### 7.1 PRELIMINARES.

El presente Capítulo presenta la Auditoría de peajes llevada cabo por la Interventoría, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato **VEJ-542 DE 2022** ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, los objetivos de la auditoría a los equipos y sistemas de control de tráfico y a la gestión administrativa de aforo y recaudo en las estaciones de peaje son:

Auditar, supervisar, controlar, registrar y conceptuar sobre los aspectos técnicos en la operación, implementación y mantenimiento de los equipos de control de tránsito, contemplados en el Contrato de Concesión de recaudo y operación de las estaciones de peaje y pesaje que se encuentran a cargo de la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS.

Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura, las novedades de sistemas que se deriven de la aplicación del plan de auditoría de sistemas durante el periodo evaluado. "Presentación de informes de auditoría de sistemas".

Verificar el cumplimiento de la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, de acuerdo con los requerimientos contractuales del Contrato de Concesión N° 002 de 2014.

Emitir el concepto del Auditor de Sistemas dando claridad en el análisis de la información, conceptuando las recomendaciones a que dé lugar, conclusiones y puntos de control que se consideren, para el mejoramiento continuo de los sistemas que operan en las estaciones de peaje y pesaje del Corredor Vial.

### 7.2 METODOLOGÍA DE AUDITORIA.

La evaluación se desarrolló bajo pruebas, seguimientos y verificaciones de las actividades que se llevan a cabo en los procesos de operación en las estaciones de peaje y de las cuales se referencia en el plan de auditoría de sistemas propuesto por esta Interventoría.

A continuación, se relacionan los escenarios evaluados:

- Monitoreo del sistema.
- Confiabilidad del sistema.
- Arqueos en cabinas de recaudo.
- Funcionamiento interfaz de usuarios.
- Sistema de respaldo: planta eléctrica y ups.
- Funcionamiento sistema de detección de tráfico.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 176 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- Inventario y estado de elementos en carriles y estación.
- Informes de tráfico y recaudo / reportes de discrepancias.
- Seguridades físicas: carriles, sala de sistemas y estación.
- Verificación recibos de pago: consecutivos por categoría, valor de tarifas.
- Versiones y tamaños de programas instalados para la operación de Tráfico y Recaudo.

### 7.3 ESTACIONES DE PEAJE.

En la siguiente tabla, se informan las características generales de las estaciones de peaje presentes en el corredor vial Concesionado:

**Tabla 119 Estaciones de Peaje.**

| ESTACIÓN   | LOCALIZACIÓN           | CARACTERÍSTICAS                                           |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SOPO       | PR02+000 - Ruta 50CN03 | 3 carriles de recaudo unidireccionales – 1 carril NO pago |
| LA CABAÑA  | PR21+650 - Ruta 5009   | 4 carriles de recaudo unidireccionales – 1 Carril NO pago |
| LOS PATIOS | PR00+100 - Ruta 5009   | 5 carriles de recaudo unidireccionales – 1 Carril NO pago |

Fuente: Elaboración Propia.

Equipos a los que se realizó auditoría en el mes de marzo de 2025 fueron los siguientes:

- Sistema que conforma el sistema de detección de tráfico.
  - Peanas.
  - Display.
  - Ópticos.
  - Lectores de tarjetas.
  - Monitores.
  - Terminales de información.
  - Detector de masas.
  - Antenas.
  - Aplicativos.
- Sistemas de contingencia: Plantas eléctricas, UPS.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 177 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 7.4 TARIFAS

**Tabla 120 Tarifas Peajes Año 2025**

| Categoría | Descripción                                                  | Patos                    |                          | La Cabaña                |                          | Sopó                     |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                              | 2025-1<br>(desde 01-ene) | 2025-2<br>(desde 16-ene) | 2025-1<br>(desde 01-ene) | 2025-2<br>(desde 16-ene) | 2025-1<br>(desde 01-ene) | 2025-2<br>(desde 16-ene) |
| I         | Autos, camperos, camionetas y microbuses con llanta sencilla | \$ 13.100                | \$ 13.900                | \$ 13.100                | \$ 13.900                | \$ 13.100                | \$ 13.900                |
| II        | Buses y Busetas, camiones pequeños, doble llanta de 2 ejes   | \$ 20.600                | \$ 21.700                | \$ 20.600                | \$ 21.700                | \$ 20.600                | \$ 21.700                |
| III       | Camiones de dos ejes grandes                                 | \$ 31.800                | \$ 33.500                | \$ 31.800                | \$ 33.500                | \$ 34.600                | \$ 36.300                |
| IV        | Camiones de 3 y 4 ejes                                       | \$ 46.500                | \$ 49.000                | \$ 46.500                | \$ 49.000                | \$ 51.000                | \$ 53.600                |
| V         | Camiones de 5 ejes                                           | \$ 63.700                | \$ 67.100                | \$ 63.700                | \$ 67.100                | \$ 69.500                | \$ 73.000                |
| VI        | Camiones de 6 ejes                                           | \$ 64.100                | \$ 67.500                | \$ 64.100                | \$ 67.500                | \$ 70.200                | \$ 73.800                |
|           | Eje Remolque                                                 | \$ 11.300                | \$ 11.900                | \$ 11.300                | \$ 11.900                | \$ 11.300                | \$ 11.900                |
|           | Eje Grúa                                                     | \$ 8.600                 | \$ 9.100                 | \$ 8.600                 | \$ 9.100                 | \$ 8.600                 | \$ 9.100                 |
|           | Eje Adicional                                                | \$ 11.700                | \$ 12.300                | \$ 11.700                | \$ 12.300                | \$ 11.700                | \$ 12.300                |
|           | IE                                                           | \$ 7.000                 | \$ 7.400                 | \$ 7.000                 | \$ 7.400                 | \$ 2.800                 | \$ 2.900                 |
|           | IIA                                                          | \$ 7.400                 | \$ 7.800                 | N/A                      | N/A                      | \$ 7.400                 | \$ 7.800                 |
|           | IIE                                                          | \$ 14.100                | \$ 14.800                | \$ 14.100                | \$ 14.800                | \$ 14.100                | \$ 14.800                |
|           | IE2A                                                         | \$ 3.200                 | \$ 3.400                 |                          |                          |                          |                          |
|           | IE2B                                                         | \$ 3.200                 | \$ 3.400                 |                          |                          |                          |                          |
|           | IE3                                                          | \$ 4.200                 | \$ 4.400                 |                          |                          |                          |                          |
|           | IE4                                                          | \$ 4.600                 | \$ 4.800                 |                          |                          |                          |                          |

Fuente: Elaboración Propia.

Mediante resolución número 202430400065055 del 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Transporte, resuelve incrementar a partir del 1° de enero de 2025, el 60% del valor pendiente por normalizar y a partir del 16 de enero incrementar el valor correspondiente según el procedimiento indicado en la resolución y teniendo en cuenta el IPC emitido por el DANE para el mes de diciembre de 2024 (correspondiente al incremento del 5,2%), así mismo, el incremento del valor de FOSEVI, en \$ 526.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 178 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Con la finalidad de aportar a la ANI información sobre las tarifas que se han aplicado en las estaciones de peaje del Proyecto a lo largo de la ejecución de la Etapa de Operación, se presenta en la siguiente tabla los valores históricos:

**Tabla 121 Histórico Tarifas de Peaje Sopó.**

| Categoría | Descripción                                                  | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024     |              | Año 2025     |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                              |          |          |          | desde 16-ene | desde 01-ago | desde 01-ene | desde 16-ene |
| I         | Autos, camperos, camionetas y microbuses con llanta sencilla | \$10.200 | \$10.800 | \$10.800 | \$12.300     | \$12.800     | \$13.100     | \$13.900     |
| II        | Buses y Busetas, camiones pequeños, doble llanta de 2 ejes   | \$16.000 | \$16.900 | \$16.900 | \$19.200     | \$20.100     | \$20.600     | \$21.700     |
| III       | Camiones de dos ejes grandes                                 | \$26.900 | \$28.400 | \$28.400 | \$32.200     | \$33.700     | \$34.600     | \$36.300     |
| IV        | Camiones de 3 y 4 ejes                                       | \$39.600 | \$41.800 | \$41.800 | \$47.400     | \$49.600     | \$51.000     | \$53.600     |
| V         | Camiones de 5 ejes                                           | \$54.000 | \$57.000 | \$57.000 | \$64.600     | \$67.600     | \$69.500     | \$73.000     |
| VI        | Camiones de 6 ejes                                           | \$54.500 | \$57.600 | \$57.600 | \$65.300     | \$68.300     | \$70.200     | \$73.800     |
|           | Eje Remolque                                                 | \$8.800  | \$9.300  | \$9.300  | \$10.500     | \$11.000     | \$11.300     | \$11.900     |
|           | Eje Grúa                                                     | \$6.700  | \$7.100  | \$7.100  | \$8.000      | \$8.400      | \$8.600      | \$9.100      |
|           | Eje Adicional                                                | \$9.100  | \$9.600  | \$9.600  | \$10.900     | \$11.400     | \$11.700     | \$12.300     |
|           | IE                                                           | \$2.100  | \$2.200  | \$2.200  | \$2.600      | \$2.700      | \$2.800      | \$2.900      |
|           | IIA                                                          | \$5.700  | \$6.000  | \$6.000  | \$6.900      | \$7.200      | \$7.400      | \$7.800      |
|           | IIE                                                          | \$10.900 | \$11.500 | \$11.500 | \$13.100     | \$13.700     | \$14.100     | \$14.800     |

Fuente: Elaboración propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 179 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 122 Histórico de Tarifas Peaje La Cabaña.**

| Categoría     | Descripción                                                  | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | 2024         |              | 2025         |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                                              |          |          |          | desde 16-ene | desde 01-ago | desde 01-ene | desde 16-ene |
| I             | Autos, camperos, camionetas y microbuses con llanta sencilla | \$10.200 | \$10.800 | \$10.800 | \$12.300     | \$12.800     | \$13.100     | \$13.900     |
| II            | Buses y Busetas, camiones pequeños, doble llanta de 2 ejes   | \$16.000 | \$16.900 | \$16.900 | \$19.200     | \$20.100     | \$20.600     | \$21.700     |
| III           | Camiones de dos ejes grandes                                 | \$24.700 | \$26.100 | \$26.100 | \$29.600     | \$31.000     | \$31.800     | \$33.500     |
| IV            | Camiones de 3 y 4 ejes                                       | \$36.200 | \$38.200 | \$38.200 | \$43.300     | \$45.300     | \$46.500     | \$49.000     |
| V             | Camiones de 5 ejes                                           | \$49.500 | \$52.300 | \$52.300 | \$59.300     | \$62.000     | \$63.700     | \$67.100     |
| VI            | Camiones de 6 ejes                                           | \$49.900 | \$52.700 | \$52.700 | \$59.700     | \$62.400     | \$64.100     | \$67.500     |
| Eje Remolque  |                                                              | \$8.800  | \$9.300  | \$9.300  | \$10.500     | \$11.000     | \$11.300     | \$11.900     |
| Eje Grúa      |                                                              | \$6.700  | \$7.100  | \$7.100  | \$8.000      | \$8.400      | \$8.600      | \$9.100      |
| Eje Adicional |                                                              | \$9.100  | \$9.600  | \$9.600  | \$10.900     | \$11.400     | \$11.700     | \$12.300     |
| IE            |                                                              | \$5.400  | \$5.700  | \$5.700  | \$6.500      | \$6.800      | \$7.000      | \$7.400      |
| IIA           |                                                              | N/A      | N/A      | N/A      | N/A          | N/A          | N/A          | N/A          |
| IIE           |                                                              | \$10.900 | \$11.500 | \$11.500 | \$13.100     | \$13.700     | \$14.100     | \$14.800     |

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 123 Histórico de Tarifas Los Patios.**

| Categoría | Descripción                                                  | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | 2024         |              | 2025         |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                              |          |          |          | desde 16-ene | desde 01-ago | desde 16-ene | desde 16-ene |
| I         | Autos, camperos, camionetas y microbuses con llanta sencilla | \$10.200 | \$10.800 | \$10.800 | \$12.300     | \$12.800     | \$13.100     | \$13.900     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 180 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Categoría | Descripción                                                | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | 2024         |              | 2025         |              |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                            |          |          |          | desde 16-ene | desde 01-ago | desde 16-ene | desde 16-ene |
| II        | Buses y Busetas, camiones pequeños, doble llanta de 2 ejes | \$16.000 | \$16.900 | \$16.900 | \$19.200     | \$20.100     | \$20.600     | \$21.700     |
| III       | Camiones de dos ejes grandes                               | \$24.700 | \$26.100 | \$26.100 | \$29.600     | \$31.000     | \$31.800     | \$33.500     |
| IV        | Camiones de 3 y 4 ejes                                     | \$36.200 | \$38.200 | \$38.200 | \$43.300     | \$45.300     | \$46.500     | \$49.000     |
| V         | Camiones de 5 ejes                                         | \$49.500 | \$52.300 | \$52.300 | \$59.300     | \$62.000     | \$63.700     | \$67.100     |
| VI        | Camiones de 6 ejes                                         | \$49.900 | \$52.700 | \$52.700 | \$59.700     | \$62.400     | \$64.100     | \$67.500     |
|           | Eje Remolque                                               | \$8.800  | \$9.300  | \$9.300  | \$10.500     | \$11.000     | \$11.300     | \$11.900     |
|           | Eje Grúa                                                   | \$6.700  | \$7.100  | \$7.100  | \$8.000      | \$8.400      | \$8.600      | \$9.100      |
|           | Eje Adicional                                              | \$9.100  | \$9.600  | \$9.600  | \$10.900     | \$11.400     | \$11.700     | \$12.300     |
|           | IE                                                         | \$5.400  | \$5.700  | \$5.700  | \$6.500      | \$6.800      | \$7.000      | \$7.400      |
|           | IIA                                                        | \$5.700  | \$6.000  | \$6.000  | \$6.900      | \$7.200      | \$7.400      | \$7.800      |
|           | IIE                                                        | \$10.900 | \$11.500 | \$11.500 | \$13.100     | \$13.700     | \$14.100     | \$14.800     |
|           | IE2A                                                       |          |          | \$2.600  | \$3.000      | \$3.100      | \$3.200      | \$3.400      |
|           | IE2B                                                       |          |          | \$2.600  | \$3.000      | \$3.100      | \$3.200      | \$3.400      |
|           | IE3                                                        |          |          | \$3.400  | \$3.900      | \$4.100      | \$4.200      | \$4.400      |
|           | IE4                                                        |          |          | \$3.700  | \$4.300      | \$4.500      | \$4.600      | \$4.800      |

Fuente: Elaboración propia.

## 7.5 ARQUEOS EN CABINAS DE RECAUDO.

La Interventoría en cumplimiento de los lineamientos contractuales, realizó arqueos de manera aleatoria en las casetas de recaudo de las estaciones de peaje y a su vez, verificó los arqueos que realizó la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, y como consecuencia se obtuvieron los siguientes resultados:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 181 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 124 Arqueos Peaje Sopó, La Cabaña y Los Patios**

| Estación de Peaje | Fecha     | Caseta de Recaudo No. | Carril No. | Conteo de Dinero Recaudado | Reporte del Equipo | Sobrante | Faltante |
|-------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| SOPÓ              | 4/03/2025 | 1                     | 1          | \$ 3.536.600               | \$ 3.536.500       | \$ 100   | S/N      |
| SOPÓ              | 4/03/2025 | 1                     | 3          | \$ 0                       | \$ 0               | S/N      | S/N      |
| LA CABAÑA         | 4/03/2025 | 1                     | 1          | \$ 1.934.700               | \$ 1.934.700       | S/N      | S/N      |
| LA CABAÑA         | 4/03/2025 | 1                     | 2          | \$ 2.973.000               | \$ 2.973.000       | S/N      | S/N      |
| LOS PATIOS        | 3/03/2025 | 1                     | 1          | \$ 389.500                 | \$ 389.500         | S/N      | S/N      |
| LOS PATIOS        | 3/03/2025 | 1                     | 2          | \$ 3.457.700               | \$ 3.457.600       | \$ 100   | S/N      |
| LOS PATIOS        | 3/03/2025 | 1                     | 3          | \$ 4.824.800               | \$ 4.834.500       | S/N      | \$ 9.700 |

Fuente: Elaboración Propia. ----- S/N=Sin novedad.

**Tabla 125 sobrantes y Faltantes Peaje de Sopó, La Cabaña y Los Patios**

| Peaje      | Mes        | Concepto   | Valor \$   |
|------------|------------|------------|------------|
| SOPÓ       | Marzo 2025 | Faltantes: | \$ 393.700 |
|            |            | Sobrantes: | \$ 250.300 |
| LA CABAÑA  |            | Faltantes: | \$ 454.400 |
|            |            | Sobrantes: | \$ 240.950 |
| LOS PATIOS |            | Faltantes: | \$ 472.700 |
|            |            | Sobrantes: | \$ 457.100 |

Fuente: Elaboración Propia.

## 7.6 TRÁFICO Y RECAUDO.

Esta Interventoría efectuó la recepción y verificación de los informes de tráfico y recaudo del mes de marzo de 2025 donde La Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS reporta el tráfico del total de vehículos que circularon por cada estación de peaje y que hacen parte de las categorías para pago de tarifa de peaje, también son considerados los vehículos exentos por ley 787. Por lo anterior se presenta una muestra del análisis de estos, las cuales cuentan con soportes de revisión: informes de tráfico, recaudo y discrepancias para evaluar los equipos de control de tráfico que operan en las estaciones de peaje, todas las consultas han sido analizadas, revisadas y como resultado de lo anterior se obtiene los siguientes resultados:

**Tabla 126 Reportes Tráfico y Recaudo Peaje Sopó.**

| Fecha             | 3/3/2025   | 4/3/2025     | 5/3/2025     | 6/3/2025     | 7/3/2025     | 8/3/2025     |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sobrantes</b>  | \$ 300     | \$ 1.500     | \$ 200       | \$ 5.100     | \$ 1.500     | \$ 10.000    |
| <b>P. Tarjeta</b> | \$ 909.900 | \$ 1.022.400 | \$ 1.080.200 | \$ 1.094.800 | \$ 1.162.400 | \$ 1.311.300 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 182 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Fecha                    | 3/3/2025     | 4/3/2025     | 5/3/2025     | 6/3/2025     | 7/3/2025     | 8/3/2025     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>P. Electrónico</b>    | \$9.715.500  | \$10.203.500 | \$12.435.300 | \$11.596.900 | \$13.344.900 | \$11.668.400 |
| <b>T. Recaudo + Sob.</b> | \$24.227.200 | \$24.826.400 | \$27.596.200 | \$30.929.300 | \$33.660.300 | \$33.345.700 |
| <b>Seguridad vial</b>    | \$790.578    | \$789.526    | \$834.762    | \$883.680    | \$984.672    | \$1.168.772  |

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 127 Tráfico y Recaudo Peaje La Cabaña.**

| Fecha                    | 10/3/2025    | 11/3/2025    | 12/3/2025     | 13/3/2025    | 14/3/2025    | 15/3/2025    |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sobrantes</b>         | \$ 1.950     | \$ 900       | \$ 21.200     | \$ 3.200     | \$ -         | \$ 54.200    |
| <b>P. Tarjeta</b>        | \$ 1.186.800 | \$ 1.152.100 | \$ 1.373.100  | \$ 1.096.700 | \$ 1.443.000 | \$ 1.553.300 |
| <b>P. Electrónico</b>    | \$11.389.100 | \$11.362.200 | \$ 17.721.700 | \$12.212.100 | \$12.694.800 | \$14.030.800 |
| <b>T. Recaudo + sob.</b> | \$29.914.050 | \$29.977.000 | \$43.676.300  | \$31.917.400 | \$34.896.500 | \$42.595.900 |
| <b>Seguridad vial</b>    | \$920.500    | \$915.766    | \$1.403.368   | \$984.672    | \$1.077.248  | \$1.443.344  |

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 128 Tráfico y Recaudo Peaje Los Patios.**

| Fecha                    | 17/3/2025    | 18/3/2025    | 19/3/2025    | 20/3/2025    | 21/3/2025    | 22/3/2025    |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sobrantes</b>         | \$ 33.100    | \$ 9.900     | \$ 9.200     | \$27.600     | \$1.900      | \$31.850     |
| <b>P. Tarjeta</b>        | \$ 3.439.400 | \$ 2.987.900 | \$ 3.559.300 | \$ 3.947.300 | \$ 4.193.000 | \$ 3.392.900 |
| <b>P. Electrónico</b>    | \$18.651.000 | \$18.030.000 | \$20.629.300 | \$21.328.100 | \$21.958.800 | \$17.755.700 |
| <b>T. Recaudo + sob.</b> | \$52.116.000 | \$48.541.900 | \$55.868.300 | \$57.568.600 | \$65.974.400 | \$77.721.650 |
| <b>Seguridad vial</b>    | \$2.302.302  | \$2.084.012  | \$2.416.444  | \$2.460.102  | \$2.766.760  | \$3.258.570  |

Fuente: Elaboración Propia.

La Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS realiza cobro de la tarifa de peaje y clasificación de las categorías de manera correcta en cumplimiento de la resolución 0000842 de abril de 2014, y el cumplimiento de las condiciones descritas en la resolución 787 de 2002 para vehículos exentos de pago de la tasa de peaje.

## 7.7 SEGUIMIENTO AL TRAFICO HISTORICO.

El corredor vial Concesionado está conformado por (3) estaciones de Peaje: Sopo, La Cabaña y Los Patios, A continuación, se presenta el tráfico total que ha circulado por las estaciones de peaje del Proyecto desde el inicio del contrato de concesión:



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 183 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

La información de Tráfico y Recaudo se puede observar con mayor detalle en el Anexo Tráfico y Recaudo Acumulado.

**Tabla 129 Histórico de Tráficos Mensuales**

| MES        | PATIOS  |       | LA CABAÑA |       | SOPÓ    |     |
|------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-----|
|            | TRAFICO | TPD   | TRAFICO   | TPD   | TRAFICO | TPD |
| Dic – 2014 | 60.451  | 5.038 | 21.329    | 1.777 | ---     | --- |
| Ene – 2015 | 140.079 | 4.519 | 54.233    | 1.749 | ---     | --- |
| Feb – 2015 | 132.930 | 4.748 | 46.516    | 1.661 | ---     | --- |
| Mar – 2015 | 147.559 | 4.760 | 53.016    | 1.710 | ---     | --- |
| Abr – 2015 | 135.432 | 4.514 | 49.994    | 1.666 | ---     | --- |
| May – 2015 | 152.745 | 4.927 | 56.779    | 1.832 | ---     | --- |
| Jun – 2015 | 138.464 | 4.615 | 50.662    | 1.689 | ---     | --- |
| Jul – 2015 | 138.202 | 4.458 | 51.848    | 1.673 | ---     | --- |
| Ago – 2015 | 148.002 | 4.774 | 57.469    | 1.854 | ---     | --- |
| Sep-2015   | 142.512 | 4.750 | 50.867    | 1.696 | ---     | --- |
| Oct – 2015 | 148.603 | 4.794 | 54.381    | 1.754 | ---     | --- |
| Nov- 2015  | 145.825 | 4.861 | 53.774    | 1.792 | ---     | --- |
| Dic-2015   | 156.298 | 5.042 | 56.516    | 1.823 | ---     | --- |
| Ene – 2016 | 142.677 | 4.602 | 59.250    | 1.911 | ---     | --- |
| Feb – 2016 | 137.255 | 4.733 | 50.147    | 1.729 | ---     | --- |
| Mar – 2016 | 143.846 | 4.640 | 57.752    | 1.863 | ---     | --- |
| Abr – 2016 | 144.442 | 4.815 | 50.772    | 1.692 | ---     | --- |
| May – 2016 | 151.879 | 4.899 | 58.128    | 1.875 | ---     | --- |
| Jun – 2016 | 145.847 | 4.862 | 55.660    | 1.855 | ---     | --- |
| Jul – 2016 | 143.789 | 4.638 | 57.389    | 1.851 | ---     | --- |
| Ago – 2016 | 145.099 | 4.681 | 56.902    | 1.836 | ---     | --- |
| Sep-2016   | 143.766 | 4.792 | 51.633    | 1.721 | ---     | --- |
| Oct – 2016 | 145.712 | 4.700 | 55.783    | 1.799 | ---     | --- |
| Nov- 2016  | 140.530 | 4.684 | 53.610    | 1.787 | ---     | --- |
| Dic-2016   | 152.842 | 4.930 | 56.252    | 1.815 | ---     | --- |
| Ene – 2017 | 138.194 | 4.458 | 57.460    | 1.854 | ---     | --- |
| Feb – 2017 | 132.178 | 4.721 | 50.300    | 1.796 | ---     | --- |
| Mar – 2017 | 142.914 | 4.610 | 53.616    | 1.730 | ---     | --- |
| Abr – 2017 | 137.465 | 4.582 | 54.906    | 1.830 | ---     | --- |
| May – 2017 | 143.200 | 4.619 | 53.371    | 1.722 | ---     | --- |
| Jun – 2017 | 134.480 | 4.483 | 48.992    | 1.633 | ---     | --- |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 184 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| MES        | PATIOS  |       | LA CABAÑA |       | SOPÓ    |       |
|------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|            | TRAFICO | TPD   | TRAFICO   | TPD   | TRAFICO | TPD   |
| Jul – 2017 | 132.498 | 4.274 | 51.680    | 1.667 | ---     | ---   |
| Ago – 2017 | 137.221 | 4.426 | 52.224    | 1.685 | ---     | ---   |
| Sep-2017   | 129.769 | 4.326 | 47.165    | 1.572 | ---     | ---   |
| Oct – 2017 | 128.929 | 4.159 | 50.819    | 1.639 | ---     | ---   |
| Nov- 2017  | 128.146 | 4.272 | 47.548    | 1.585 | ---     | ---   |
| Dic-2017   | 138.828 | 4.478 | 50.832    | 1.640 | ---     | ---   |
| Ene – 2018 | 126.042 | 4.066 | 51.172    | 1.651 | ---     | ---   |
| Feb – 2018 | 119.737 | 3991  | 42.861    | 1.429 | ---     | ---   |
| Mar – 2018 | 134.256 | 4.331 | 47.801    | 1.542 | ---     | ---   |
| Abr – 2018 | 126.293 | 4.210 | 41.754    | 1.392 | ---     | ---   |
| May – 2018 | 129.445 | 4.176 | 37.042    | 1.195 | ---     | ---   |
| Jun – 2018 | 120.884 | 4.029 | 32.871    | 1.096 | ---     | ---   |
| Jul – 2018 | 105.789 | 3.413 | 30.919    | 997   | ---     | ---   |
| Ago – 2018 | 113.652 | 3.666 | 31.160    | 1.039 | ---     | ---   |
| Sep-2018   | 113.956 | 3.799 | 35.393    | 1.180 | ---     | ---   |
| Oct – 2018 | 118.015 | 3.807 | 40.209    | 1.297 | ---     | ---   |
| Nov- 2018  | 123.116 | 4.104 | 45.235    | 1.508 | ---     | ---   |
| Dic-2018   | 141.107 | 4.552 | 52.613    | 1.697 | ---     | ---   |
| Ene – 2019 | 123.050 | 3.969 | 53.376    | 1.722 | ---     | ---   |
| Feb – 2019 | 119.785 | 4.278 | 47.116    | 1.683 | ---     | ---   |
| Mar – 2019 | 138.481 | 4.467 | 57.981    | 1.870 | ---     | ---   |
| Abr – 2019 | 126.309 | 4.210 | 54.644    | 1.821 | ---     | ---   |
| May – 2019 | 140.747 | 4.540 | 57.468    | 1.854 | ---     | ---   |
| Jun – 2019 | 137.555 | 4.585 | 57.356    | 1.912 | ---     | ---   |
| Jul – 2019 | 130.228 | 4.201 | 59.035    | 1.904 | ---     | ---   |
| Ago – 2019 | 146.620 | 4.730 | 62.509    | 2.016 | ---     | ---   |
| Sep – 2019 | 137.788 | 4.593 | 59.514    | 1.984 | ---     | ---   |
| Oct – 2019 | 139.557 | 4.502 | 59.862    | 1.931 | ---     | ---   |
| Nov – 2019 | 135.556 | 4.519 | 60.547    | 2.018 | ---     | ---   |
| Dic – 2019 | 150.459 | 4.854 | 63.997    | 2.064 | ---     | ---   |
| Ene – 2020 | 136.255 | 4.395 | 64.716    | 2.088 | 27.960  | 1.748 |
| Feb – 2020 | 129.060 | 4.450 | 58.462    | 2.016 | 50.707  | 1.749 |
| Mar – 2020 | 84.638  | 2.730 | 38.786    | 1.251 | 35.398  | 1.142 |
| Abr – 2020 | 26.513  | 884   | 12.621    | 421   | 16.234  | 541   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 185 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| MES        | PATIOS  |       | LA CABAÑA |       | SOPÓ    |       |
|------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|            | TRAFICO | TPD   | TRAFICO   | TPD   | TRAFICO | TPD   |
| May – 2020 | 53.370  | 1.722 | 23.086    | 745   | 28.599  | 923   |
| Jun – 2020 | 59.940  | 1.998 | 26.614    | 887   | 27.940  | 931   |
| Jul – 2020 | 75.685  | 2.441 | 33.613    | 1.084 | 35.690  | 1.151 |
| Ago – 2020 | 78.048  | 2.518 | 35.554    | 1.147 | 34.879  | 1.125 |
| Sep – 2020 | 116.438 | 3.881 | 58.713    | 1.957 | 53.736  | 1.791 |
| Oct – 2020 | 132.893 | 4.287 | 66.102    | 2.132 | 60.833  | 1.962 |
| Nov – 2020 | 117.914 | 3.930 | 62.841    | 2.095 | 61.347  | 2.045 |
| Dic – 2020 | 141.890 | 4.577 | 68.429    | 2.207 | 64.243  | 2.072 |
| Ene – 2021 | 95.179  | 3.070 | 55.899    | 1.803 | 51.599  | 1.664 |
| Feb – 2021 | 124.800 | 4.457 | 61.248    | 2.187 | 54.365  | 1.942 |
| Mar – 2021 | 139.844 | 4.511 | 67.111    | 2.165 | 59.137  | 1.908 |
| Abr – 2021 | 95.216  | 3.174 | 55.040    | 1.835 | 48.789  | 1.626 |
| May – 2021 | 103.057 | 3.324 | 54.625    | 1.762 | 47.313  | 1.526 |
| Jun – 2021 | 129.989 | 4.333 | 66.491    | 2.216 | 56.543  | 1.885 |
| Jul – 2021 | 137.233 | 4.427 | 69.965    | 2.257 | 60.231  | 1.943 |
| Ago – 2021 | 151.889 | 4.900 | 76.299    | 2.461 | 63.424  | 2.046 |
| Sep – 2021 | 153.282 | 5.109 | 73.186    | 2.440 | 59.168  | 1.972 |
| Oct – 2021 | 156.948 | 5.063 | 76.538    | 2.469 | 62.530  | 2.017 |
| Nov – 2021 | 152.471 | 5.082 | 74.826    | 2.494 | 63.620  | 2.121 |
| Dic – 2021 | 163.585 | 5.277 | 81.168    | 2.618 | 71.364  | 2.302 |
| Ene – 2022 | 138.288 | 4.461 | 77.444    | 2.498 | 66.373  | 2.141 |
| Feb – 2022 | 138.480 | 4.946 | 69.154    | 2.470 | 58.026  | 2.072 |
| Mar – 2022 | 155.197 | 5.006 | 83.028    | 2.678 | 68.335  | 2.204 |
| Abr - 2022 | 145.443 | 4.848 | 80.278    | 2.676 | 70.046  | 2.335 |
| May – 2022 | 161.458 | 5.208 | 80.327    | 2.591 | 69.693  | 2.248 |
| Jun – 2022 | 149.992 | 5.000 | 75.190    | 2.506 | 65.865  | 2.196 |
| Jul – 2022 | 155.461 | 5.015 | 83.103    | 2.681 | 67.160  | 2.166 |
| Ago – 2022 | 162.563 | 5.244 | 82.676    | 2.667 | 64.693  | 2.087 |
| Sep – 2022 | 152.682 | 5.089 | 78.921    | 2.631 | 60.416  | 2.014 |
| Oct – 2022 | 159.373 | 5.141 | 84.016    | 2.710 | 64.417  | 2.078 |
| Nov – 2022 | 114.951 | 3.832 | 71.215    | 2.374 | 72.473  | 2.416 |
| Dic – 2022 | 158.510 | 5.113 | 74.412    | 2.400 | 67.152  | 2.166 |
| Ene – 2023 | 145.382 | 4.690 | 79.422    | 2.562 | 64.641  | 2.085 |
| Feb – 2023 | 141.077 | 5.038 | 72.473    | 2.588 | 59.061  | 2.109 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 186 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| MES               | PATIOS         |              | LA CABAÑA     |              | SOPÓ          |              |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   | TRAFICO        | TPD          | TRAFICO       | TPD          | TRAFICO       | TPD          |
| Mar – 2023        | 151.734        | 4.895        | 74.928        | 2.417        | 65.910        | 2.126        |
| Abr – 2023        | 145.685        | 4.856        | 75.526        | 2.518        | 63.288        | 2.110        |
| May – 2023        | 156.874        | 5.060        | 78.507        | 2.532        | 64.761        | 2.089        |
| Jun – 2023        | 149.910        | 4.997        | 72.669        | 2.422        | 61.705        | 2.057        |
| Jul – 2023        | 144.382        | 4.657        | 75.142        | 2.424        | 62.243        | 2.008        |
| Ago – 2023        | 153.134        | 4.940        | 75.397        | 2.432        | 62.054        | 2.002        |
| Sep – 2023        | 149.882        | 4.996        | 70.537        | 2.351        | 59.466        | 1.982        |
| Oct – 2023        | 149.578        | 4.825        | 73.974        | 2.386        | 59.777        | 1.928        |
| Nov – 2023        | 149.388        | 4.980        | 70.997        | 2.367        | 59.664        | 1.989        |
| Dic – 2023        | 156.281        | 5.041        | 76.779        | 2.477        | 64.889        | 2.093        |
| Ene – 2024        | 140.174        | 4.522        | 75.710        | 2.442        | 63.010        | 2.033        |
| Feb – 2024        | 144.933        | 4.998        | 64.448        | 2.222        | 55.146        | 1.902        |
| Mar – 2024        | 157.408        | 5.078        | 76.459        | 2.466        | 61.915        | 1.997        |
| Abr – 2024        | 154.975        | 5.166        | 65.691        | 2.190        | 55.289        | 1.843        |
| May – 2024        | 162.931        | 5.256        | 71.637        | 2.311        | 58.365        | 1.883        |
| Jun – 2024        | 153.573        | 5.119        | 73.967        | 2.466        | 61.787        | 2.060        |
| Jul – 2024        | 134.441        | 4.337        | 66.456        | 2.144        | 55.523        | 1.791        |
| Ago - 2024        | 153.251        | 4.944        | 75.885        | 2.448        | 59.606        | 1.923        |
| Sep – 2024        | 133.702        | 4.457        | 66.488        | 2.216        | 51.671        | 1.722        |
| Oct – 2024        | 146.537        | 4.727        | 70.762        | 2.283        | 56.231        | 1.814        |
| Nov – 2024        | 147.410        | 4.914        | 69.595        | 2.320        | 57.420        | 1.914        |
| Dic – 2024        | 152.966        | 4.934        | 73.454        | 2.369        | 61.552        | 1.986        |
| Ene-2025          | 139.564        | 4.502        | 72.855        | 2.350        | 58.301        | 1.881        |
| Feb-2025          | 134.532        | 4.805        | 64.553        | 2.305        | 51.146        | 1827         |
| <b>Mar – 2025</b> | <b>148.560</b> | <b>4.792</b> | <b>76.384</b> | <b>2.464</b> | <b>59.090</b> | <b>1.906</b> |


Fuente: Elaboración Propia.

**NOTA:** En la anterior tabla se reporta el total de vehículos que circularon por cada estación de peaje pagando la tarifa correspondiente ya que pertenecen a las categorías definidas para el pago de esta, además se incluyen los vehículos exentos por la ley 787. No se contabilizan motocicletas ya que estos vehículos no pagan tarifa de peaje.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 187 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

En la gráfica siguiente, se presenta el comportamiento del Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) en la estación de peaje de Sopó, en el periodo de marzo de 2024 a marzo de 2025. Destacando que, para este último el TPD con exentos en esta estación alcanzó un total de 1.906 vehículos, lo que representa un aumento del 4,32 % respecto al TPD del mes anterior.


Figura 51 Tráfico promedio mes a mes peaje SOPÓ.

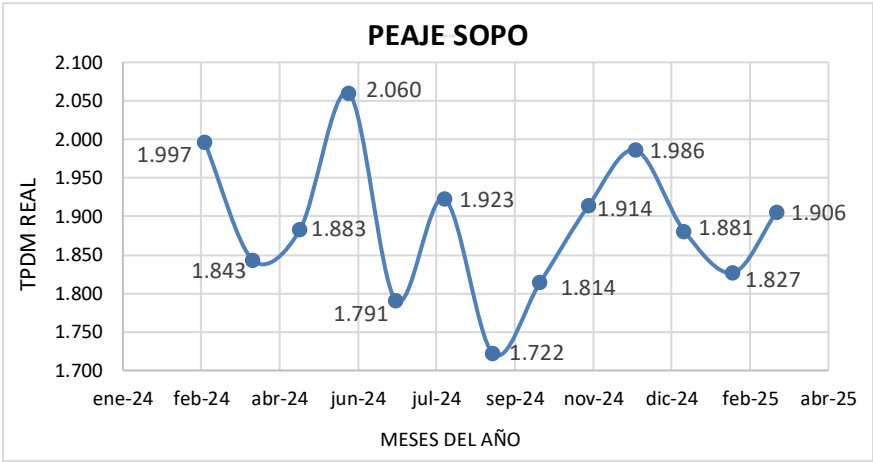

Fuente: Elaboración Propia.

En la gráfica siguiente, se puede observar que el Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) en el peaje de Sopó experimentó una disminución del 4,55 % en marzo de 2025, en comparación con marzo de 2024.

Figura 52 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025.

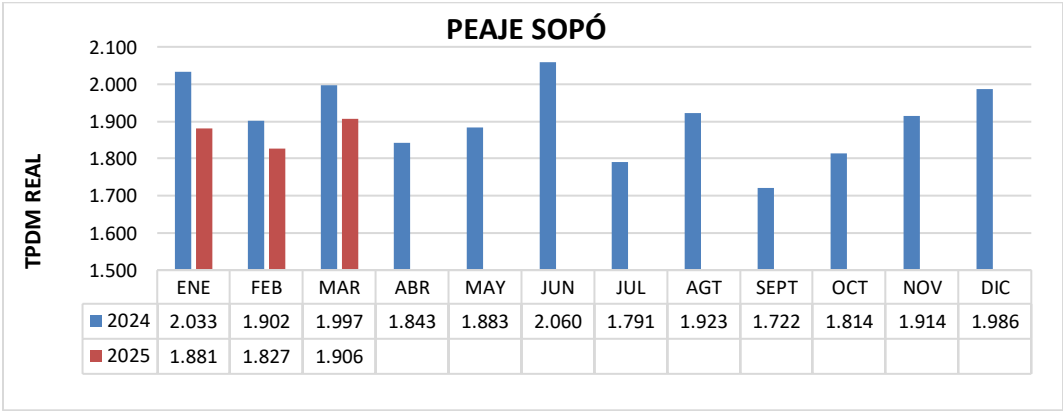


Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 188 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

En la gráfica siguiente, se presenta el comportamiento del Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) en la estación de peaje de La Cabaña, en el periodo de marzo de 2024 a marzo de 2025. Destacando que, para este último el TPD con exentos en esta estación alcanzó un total de 2.464 vehículos, lo que representa un aumento del 6.89 % respecto al TPD del mes anterior.


Figura 53 Tráfico promedio mes a mes peaje LA CABAÑA

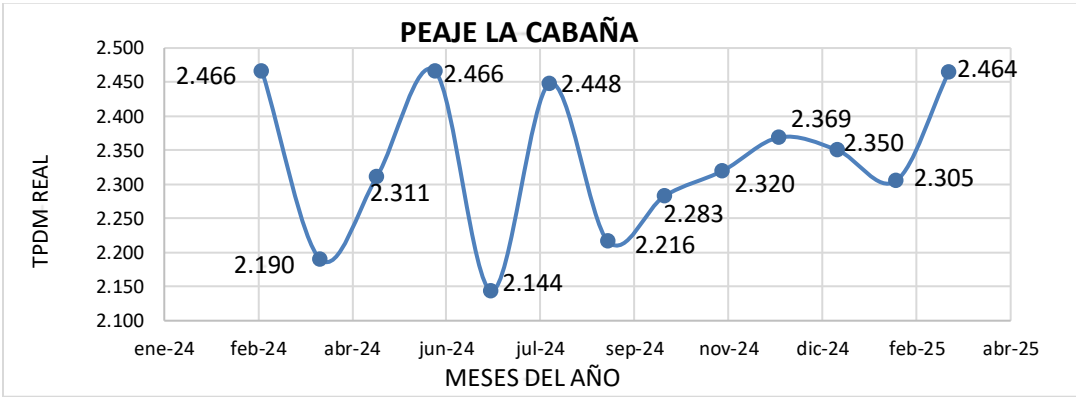

Fuente: Elaboración Propia.

En la gráfica siguiente, se puede observar que el Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) en el peaje de La Cabaña tuvo un comportamiento similar en marzo de 2025 y marzo de 2024.

Figura 54 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025.

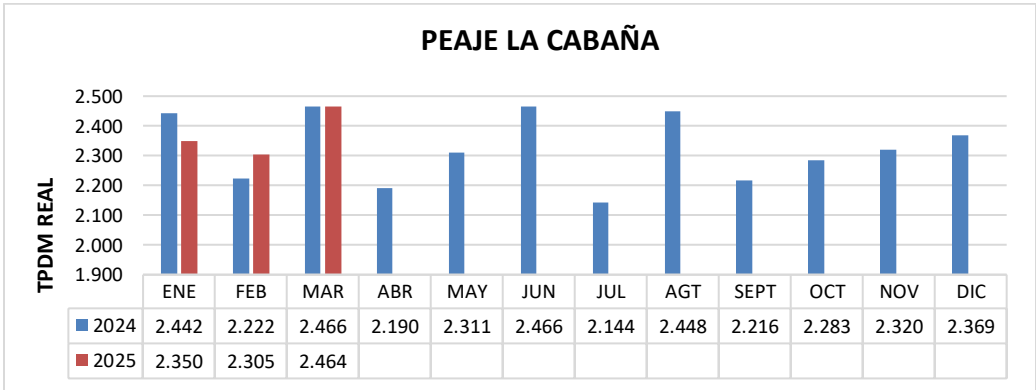


Fuente: Elaboración Propia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 189 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

En la gráfica siguiente, se presenta el comportamiento del Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) en la estación de peaje de Los Patios, en el periodo de marzo de 2024 a marzo de 2025. Destacando que, para este último el TPD con exentos en esta estación alcanzó un total de 4.792 vehículos, lo que representa una disminución del 0.27 % respecto al TPD del mes anterior.


Figura 55 Tráfico Promedio Mes A Mes Peaje De Los Patios

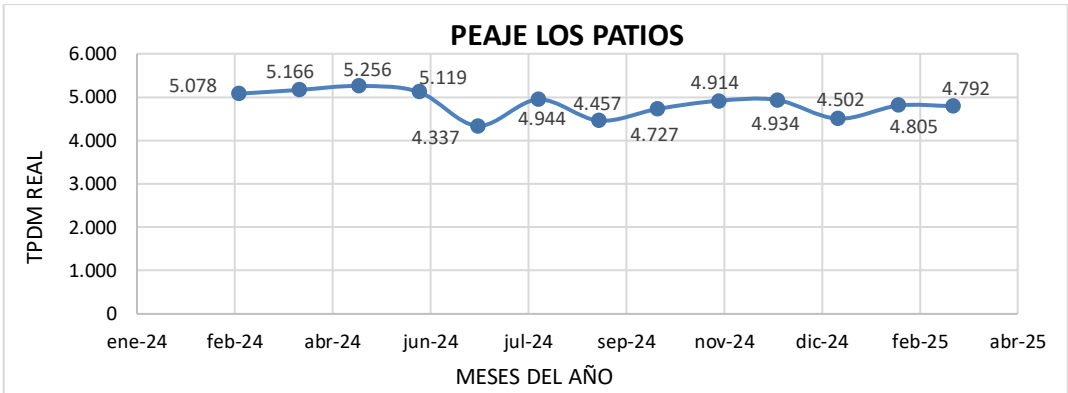

Fuente: Elaboración Propia.

En la gráfica siguiente, se puede observar que el Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) en el peaje de Los Patios experimentó una disminución del 5.63 % en marzo de 2025, en comparación con marzo de 2024.

Figura 56 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025.

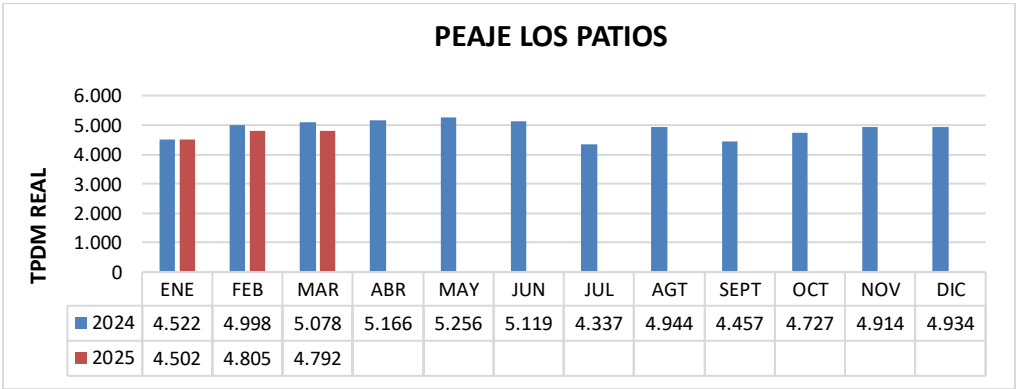

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 190 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 7.8 CONFIABILIDAD DEL SISTEMA.

En cumplimiento de los lineamientos contractuales, la Interventoría realizó conteos de vehículos en las estaciones de peaje de Sopó, La Cabaña y Los Patios durante el mes de marzo de 2025, con el fin de medir la confiabilidad del sistema de detección de tráfico. Los conteos se llevaron a cabo sin novedad durante los periodos de conteo en campo.

**Tabla 130 Resultados confiabilidad Peaje Sopó.**

| PEAJE      | FECHA     | CARRIL | TOTAL, VEHÍCULOS | CONFIABILIDAD | HORA INICIO | HORA FIN | OBSERVACIONES |
|------------|-----------|--------|------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| SOPÓ       | 4-03-2025 | 1      | 50               | 100%          | 13:00:00    | 14:00:00 | N/A           |
|            | 4-03-2025 | 2      | 34               | 100%          | 13:00:00    | 14:00:00 | N/A           |
|            | 4-03-2025 | 3      | 23               | 100%          | 13:00:00    | 14:00:00 | N/A           |
| LA CABAÑA  | 4-03-2025 | 1      | 67               | 100%          | 8:00:00     | 10:00:00 | N/A           |
|            | 4-03-2025 | 2      | 106              | 100%          | 8:00:00     | 10:00:00 | N/A           |
|            | 4-03-2025 | 3      | 75               | 100%          | 8:00:00     | 10:00:00 | N/A           |
| LOS PATIOS | 3-03-2025 | 1      | 33               | 100%          | 10:00:00    | 11:00:00 | N/A           |
|            | 3-03-2025 | 2      | 53               | 100%          | 10:00:00    | 11:00:00 | N/A           |
|            | 3-03-2025 | 3      | 75               | 100%          | 10:00:00    | 11:00:00 | N/A           |
|            | 3-03-2025 | 4      | 45               | 100%          | 10:00:00    | 11:00:00 | N/A           |

Fuente: Elaboración Propia.

## 7.9 FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DE TRÁFICO.

Durante el proceso de revisión y verificación, esta interventoría detectó que la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS ha implementado ajustes y mejoras en el sistema de detección de tráfico EasyRoad, lo que ha permitido reducir las discrepancias.

## 7.10 INFORME DE AFORO 7 X 24.

De acuerdo con el contrato de Interventoría, se realizaron siete días de aforos consecutivos en los peajes La Cabaña, Los Patios y Sopo, del 1 al 7 de marzo de 2025.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 191 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 131 Aforo 7X 24 Peaje Sopó.**

| PEAJE SOPÓ |        |               |            |                              |                                 |
|------------|--------|---------------|------------|------------------------------|---------------------------------|
| Fecha      | Conteo | Concesionario | Diferencia | Confiabilidad Total Paso (%) | Confiabilidad Por Categoría (%) |
| 1-mar-25   | 2297   | 2298          | 1          | 100                          | 99,70                           |
| 2-mar-25   | 2342   | 2342          | 0          | 100,00                       | 100,00                          |
| 3-mar-25   | 1516   | 1519          | 3          | 100                          | 99,80                           |
| 4-mar-25   | 1521   | 1521          | 0          | 100,00                       | 99,87                           |
| 5-mar-25   | 1609   | 1609          | 0          | 100                          | 99,75                           |
| 6-mar-25   | 1701   | 1701          | 0          | 100                          | 100,00                          |
| 7-mar-25   | 1888   | 1891          | 3          | 99,84                        | 99,63                           |
| <b>TPD</b> | 1839   |               |            |                              |                                 |

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 57 Comparativo Aforo 7x24 Peaje Sopó**

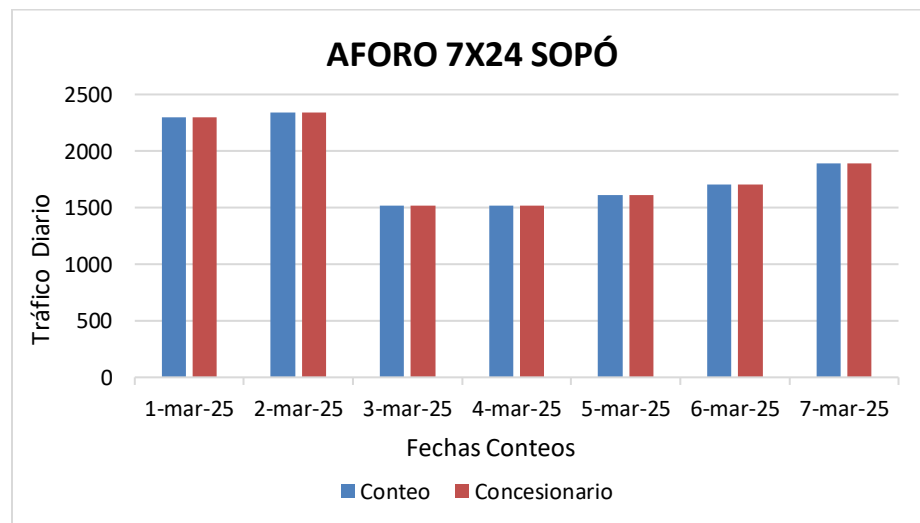

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 132 Ubicación cámaras en carriles estación Sopó.**

| CÁMARA | CARRIL | SENTIDO   |
|--------|--------|-----------|
| 1      | 1      | IZQUIERDA |
| 2      | 2      | IZQUIERDA |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 192 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| CÁMARA | CARRIL | SENTIDO   |
|--------|--------|-----------|
| 3      | 3      | IZQUIERDA |


Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 133 Aforo 7X 24 Peaje La Cabaña.**

| PEAJE LA CABAÑA |             |               |            |                              |                                 |
|-----------------|-------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------------------|
| Fecha           | Conteo      | Concesionario | Diferencia | Confiabilidad Total Paso (%) | Confiabilidad Por Categoría (%) |
| 1-mar-25        | 3210        | 3211          | 1          | 99,97                        | 99,72                           |
| 2-mar-25        | 3824        | 3824          | 0          | 100,00                       | 99,84                           |
| 3-mar-25        | 1857        | 1858          | 1          | 99,95                        | 99,84                           |
| 4-mar-25        | 1966        | 1967          | 1          | 99,95                        | 99,14                           |
| 5-mar-25        | 1879        | 1880          | 1          | 99,95                        | 99,31                           |
| 6-mar-25        | 1921        | 1921          | 0          | 100,00                       | 100,00                          |
| 7-mar-25        | 2063        | 2063          | 0          | 100,00                       | 100,00                          |
| <b>TPD</b>      | <b>2389</b> |               |            |                              |                                 |

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 58 Comparativo Aforo 7x24 Peaje La Cabaña.**

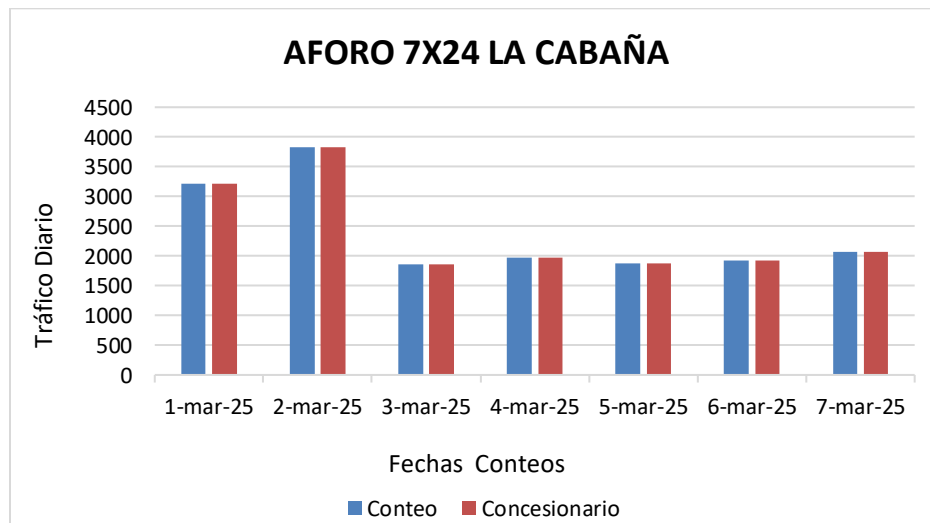

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 193 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 134 Ubicación cámaras en carriles estación La Cabaña.**

| CÁMARA | CARRIL | SENTIDO   |
|--------|--------|-----------|
| 1      | 1      | IZQUIERDA |
| 1      | 2      | DERECHA   |
| 2      | 3      | IZQUIERDA |
| 2      | 4      | DERECHA   |


Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 135 Aforo 7X 24 Peaje Los Patios.**

| PEAJE PATIOS |             |               |            |                              |                                 |
|--------------|-------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------------------|
| Fecha        | Conteo      | Concesionario | Diferencia | Confiabilidad Total Paso (%) | Confiabilidad Por Categoría (%) |
| 1-mar-25     | 3138        | 3135          | 3          | 100                          | 99,84                           |
| 2-mar-25     | 4210        | 4210          | 0          | 100,00                       | 100,00                          |
| 3-mar-25     | 4352        | 4353          | 1          | 100                          | 99,93                           |
| 4-mar-25     | 4561        | 4561          | 0          | 100,00                       | 99,91                           |
| 5-mar-25     | 4571        | 4571          | 0          | 100                          | 99,91                           |
| 6-mar-25     | 4725        | 4725          | 0          | 100                          | 99,87                           |
| 7-mar-25     | 4932        | 4932          | 0          | 100,00                       | 99,80                           |
| <b>TPD</b>   | <b>4356</b> |               |            |                              |                                 |

Fuente: Elaboración Propia.

**Figura 59 Comparativo Aforo 7x24 Peaje Los Patios**

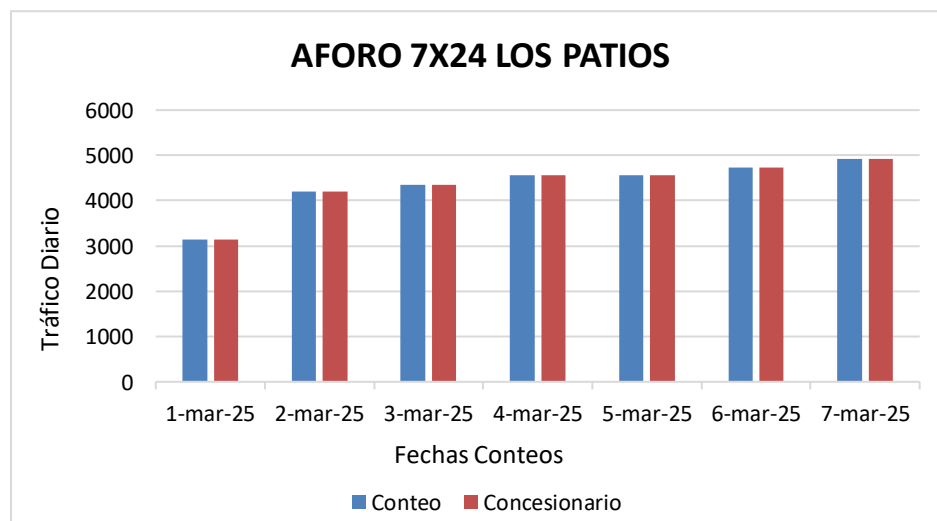

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 194 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 136 Ubicación cámaras en carriles estación Los Patios.**

| CÁMARA | CARRIL | SENTIDO   |
|--------|--------|-----------|
| 1      | 1      | IZQUIERDA |
| 1      | 2      | DERECHA   |
| 2      | 3      | IZQUIERDA |
| 2      | 4      | DERECHA   |
| 3      | 4      | IZQUIERDA |
| 3      | 5      | DERECHA   |
| 4      | 5      | IZQUIERDA |

Fuente: Elaboración Propia.

### 7.11 SEGUIMIENTO AL SISTEMA IP/REV.

Mediante la (Resolución 546 de 2018), Se requiere implementación en un carril por sentido de peaje, en cada una de las estaciones de peaje correspondientes al corredor vial Concesionado, La Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS ha mostrado los avances en materia de Hardware, por lo que la Interventoría propone realizar planes de trabajo orientados a la puesta en marcha del nuevo sistema de cobro, esto teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte amplió los plazos del periodo de transición establecido en el artículo 33 de la Resolución 546 del 2018, por un año más, mediante resolución 883 del 12 de marzo de 2019. Paralelamente, el Concesionario de acuerdo con este nuevo plazo deberá obtener su certificación como operador IP/REV.

El Concesionario POB debe estar certificado y apto para operación de recaudo Electrónico Vehicular, para recibir la lectura y pago de la tasa de Peaje en convenio con todos los Intermediadores debidamente certificados por el Ministerio de Transporte. Con plazo máximo 29 de octubre de 2022.

El Concesionario POB, pone en Funcionamiento 100% los carriles dedicados al cobro Electrónico de cada una de las estaciones de peaje que conforman el corredor vial – Peaje Sopó, Peaje La Cabaña y Peaje Los Patios, el día 11 de octubre de 2022, los intermediadores habilitados son 6, Gopass, Flypass, FacilPass, Copiloto, Viarapida y Openpass, esta Interventoría ha observado la señalización horizontal y vertical de acuerdo con el anexo 3 de la resolución 546 de 2018.

En la siguiente tabla se presentan los beneficios activos por categorías diferenciales y por estación de peaje con corte a 31 de marzo de 2025.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 195 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Tabla 137 Beneficios Activos por Categorías Diferenciales.**

| Categoría    | Los Patios   | La Cabaña  | Sopó       | Total        |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| IE           | 4.626        | 145        | 459        | 5.230        |
| IIE          | 24           | 103        | 17         | 144          |
| IIA          | 66           | 0          | 46         | 112          |
| IE2A         | 911          |            |            | 911          |
| IE2B         | 114          |            |            | 114          |
| IE3          | 74           |            |            | 74           |
| IE4          | 550          |            |            | 550          |
| <b>Total</b> | <b>6.365</b> | <b>248</b> | <b>522</b> | <b>7.135</b> |

Fuente: POB.

## 7.12 ESTACIONES DE PESAJE.

En la siguiente tabla, se informan las características generales de las estaciones de pesaje presentes en el corredor vial Concesionado:

**Tabla 138 Estaciones de Pesaje.**

| Báscula                        | Localización         | Características                                                                                     | Fecha Última Calibración Prometálicos |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fija Sopo Costado izquierdo    | PR 1+700 Ruta 50CN03 | báscula camionera clasificada como clase III, con capacidad máxima de 100.000 kg y mínima de 200 Kg | 07 - mayo - 2024                      |
| Fija Guatavita Costado derecho | PR 6+900 Ruta 0804   | báscula camionera clasificada como clase III, con capacidad máxima de 100.000 kg y mínima de 200 kg | 08 - mayo - 2024                      |

Fuente: Elaboración Propia.

La Báscula de Sopo costado izquierdo, inicio en funcionamiento modo pedagógico a partir del 12 de marzo de 2022, en estas fechas se concluyó la conveniencia de iniciar el proceso con las mediciones efectuadas en las básculas del corredor vial, teniendo en cuenta que a la fecha no se contaba con la certificación de la OAVM.

La Empresa de basculas Prometálicos, aplicando lo establecido en la guía SIM (MWG7) 2009, realizó la revisión y calibración de las básculas Sopo el día 07 de mayo de 2024 y la Báscula de Guatavita el 08 de mayo de 2024.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 196 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

La certificación de Metro legal se realiza el 19 febrero de 2024 en la báscula de Sopó, y en la báscula de Guatavita el 06 de junio de 2024.

Cabe anotar que las certificaciones por calibración se realizan cada año, o cuando se requiera por algún evento especial, el certificado de Calibración reporta análisis de las siguientes pruebas:

- Exactitud
- Excentricidad
- Repetibilidad
- Identificación de patrones
- Condiciones ambientales
- Trazabilidad
- Movilidad
- Ubicación
- Señalización
- Condiciones de seguridad y calidad

Dicho certificado de Calibración se encuentra publicado en cada una de las estaciones de pesaje, como lo exige la circular externa N.21 de 2016 de la Superintendencia de puertos y Transporte.

Se realizaron las siguientes inspecciones en las básculas, en el presente mes.

- Revisión de procedimientos de vehículos pesados.
- Pruebas de Excentricidad.
- Pruebas de Repetibilidad.
- Estado de elementos en básculas.

A continuación, se presenta la información correspondiente al total de vehículos pesados registrados en el sistema de básculas de Sopó y Guatavita, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2025.

**Tabla 139 Datos de pesado en Básculas marzo de 2025**

| Basculas                  | Sobrepesos | Total, Vehículos Pesados |
|---------------------------|------------|--------------------------|
| Sopó Costado Izq.         | 12         | 4.588                    |
| Guatavita Costado Derecho | 0          | 400                      |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 197 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 140 Comparativo de Tráfico mensual con exentos de estaciones de Peaje, febrero y marzo de 2025**

| Peajes           | Tráfico Mensual |            |
|------------------|-----------------|------------|
|                  | Febrero 2025    | Marzo 2025 |
| Peaje Sopo       | 51.146          | 59.090     |
| Peaje La cabaña  | 64.553          | 76.384     |
| Peaje Los Patios | 134.532         | 148.560    |

Fuente: Elaboración Propia.

### 7.13 HALLAZGOS.

- No se identificaron hallazgos durante la auditoria.

### 7.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AUDITORÍA.

- Durante el mes de marzo de 2025, el Concesionario opero las estaciones de peaje y pesaje de manera eficiente y sin interrupciones, durante la auditoria no se presentan hallazgos ni observaciones, de acuerdo con lo anterior el resultado de la auditoria fue satisfactorio.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 198 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 8 GESTIÓN DE REDES

Se desarrolla el Informe de Redes de Interventoría, de conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, el Apéndice Técnico 5 – Interferencia de Redes el cual contiene las obligaciones del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. en lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicación del Apéndice Técnico 5 – Interferencia de Redes deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable.

### 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONCESIÓN PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.

#### 8.1.1 Unidad Funcional 1A (Sector Salitre – Guasca)

En la Unidad Funcional 1A (Sector Salitre – Guasca), se desarrolló mejoramiento de trazado y rehabilitación; a la fecha esta Unidad Funcional ya se encuentra terminada y con la totalidad de los traslados por interferencia de redes concluidos, para esta Unidad Funcional únicamente se realizaron traslados de redes eléctricas de Media Tensión aéreas del Operador CODENSA en algunos sectores.

Por ende, durante el periodo del mes de marzo de 2025 no se realizaron actividades de obra de traslados y/o reubicación de redes.

#### 8.1.2 Unidad Funcional 1B (Cuatro Esquinas – Guatavita – Sesquilé)

En la Unidad Funcional 1B, no se realizó traslado de redes con cargo a la subcuenta, dado que su intervención prevista consistió en rehabilitación.

#### 8.1.3 Unidad Funcional 2A (Sector Sopo – Salitre)

En la Unidad Funcional 2A, la intervención prevista consistió en mejoramiento de trazado y sección transversal, a la fecha las intervenciones correspondientes a traslado de redes por interferencia con el proyecto, ya se encuentran finalizadas en su totalidad. En esta Unidad Funcional se realizaron traslados de redes eléctricas de Media y Baja Tensión aéreas, del Operador CODENSA, y traslado de redes de acueducto y alcantarillado de diferentes empresas de servicios públicos presentes en el corredor.

Por ende, durante el periodo del mes de marzo 2025 no se realizaron actividades de obra de traslados y/o reubicación de redes.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 199 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

#### 8.1.4 Unidad Funcional 2B (Sector Salitre – La Calera)

En la Unidad Funcional 2B, la intervención prevista consistió en mejoramiento de trazado y sección transversal, a la fecha las intervenciones correspondientes a traslado de redes por interferencia con el proyecto, ya se encuentran finalizadas en su totalidad. En esta Unidad Funcional se realizaron traslados de redes eléctricas de Media y Baja Tensión aéreas, del Operador CODENSA, y traslado de redes de acueducto y alcantarillado de diferentes empresas de servicios públicos presentes en el corredor.

Por ende, durante el periodo del mes de marzo 2025 no se realizaron actividades de obra de traslados y/o reubicación de redes.

#### 8.1.5 Unidad Funcional 3A (Sector La Calera – Patios)

En la Unidad Funcional 3A, la intervención prevista consistió en mejoramiento de trazado y sección transversal, a la fecha las intervenciones correspondientes a traslado de redes por interferencia con el proyecto, ya se encuentran finalizadas en su totalidad. En esta Unidad Funcional se realizaron traslados de redes eléctricas de Media y Baja Tensión, aéreas del Operador CODENSA, traslado de redes de alumbrado público cuyo Operador es el Municipio de La Calera, traslado de red subterránea de voz y datos del Operador MOVISTAR, y traslado de redes de acueducto y alcantarillado de diferentes empresas de servicios públicos presentes en el corredor.

Por ende, durante el periodo del mes de marzo 2025, no se realizaron actividades de obra de traslados y/o reubicación de redes.

#### 8.1.6 Unidad Funcional 3B (Limite Bogotá – Choachí)

En la Unidad Funcional 3B, no se realizó traslado de redes con cargo a la subcuenta, dado que su intervención prevista consistió en rehabilitación.

#### 8.1.7 Unidad Funcional 4 (Sector La Calera – Choachí)

En esta Unidad Funcional, la intervención prevista consistió en mejoramiento general de trazado y sección transversal, a la fecha no se han concluido la totalidad de los traslados por interferencia de redes; se ha intervenido parcialmente con el traslado de algunas redes eléctricas de Media y Baja Tensión elevadas y algunos tramos de red de acueducto, sin embargo sus actividades están suspendidas en virtud del "ACTA DE DECLARATORIA DE EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD Y CONSECUENTE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES No. 4 y 5, CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA REFERIDA EN DESARROLLO DEL PROYECTO PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA CONCESIÓN PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 002 de 2014".

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 200 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

### 8.1.8 Unidad Funcional 5 (Sector Choachí - Cáqueza)

En esta Unidad Funcional, la intervención prevista consistió en mejoramiento general de trazado y sección transversal, a la fecha no se han concluido la totalidad de los traslados por interferencia de redes; se ha intervenido parcialmente con el traslado de algunas redes eléctricas de Media y Baja Tensión elevadas, sin embargo sus actividades están suspendidas en virtud del “ACTA DE DECLARATORIA DE EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD Y CONSECUENTE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES No. 4 y 5, CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA REFERIDA EN DESARROLLO DEL PROYECTO PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA CONCESIÓN PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 002 de 2014”.

## 8.2 INVENTARIO DE REDES

En el periodo del mes de marzo 2025, la Interventoría Consorcio ERS no realizó el aval a ninguna actualización al Inventario y Acta de Redes. Sin embargo, dada la información presentada por el Consorcio Intervías 4G en su Informe Final de Interventoría, se pudo establecer que a la fecha se encuentran en estado de aprobación las siguientes actualizaciones al Inventario de Redes (Información extraída del Informe Final de Interventoría elaborado por el Consorcio Intervías 4G):

### 8.2.1 Actualización de Inventario de Redes No. 1

Esta fue radicada por la Concesión Perimetral Oriental de Bogota S.A.S., mediante la comunicación CPOB-1031-2017 del 17 de mayo de 2022, en el que se presentó lo que denominaron en el asunto: “(...) Remisión de la Actualización del Acta e Inventario de Redes correspondiente a las UF – 1 – 2 – 3 – 4 y 5. (...)”, siendo esta versión la que corresponde a la Actualización del Inventario de Redes No. 1, incluyendo redes húmedas y secas correspondientes a las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4 y 5. Esta comunicación fue respondida por medio de nuestra comunicación CP-PER-1914-2017 (RAD. ANI 2017-409-054964-2) del 24 de mayo de 2017.

### 8.2.2 Actualización de Inventario de Redes No. 2

Esta fue radicada por Concesión Perimetral Oriental de Bogota S.A.S., mediante la comunicación D-1202-2020, con fecha del 14 de julio de 2020, en el que se presentó lo que denominaron en el asunto: “(...) Respuesta Oficio CP-PER-7344C-2020 (R2394-2020) En Respuesta a nuestro oficio D903-2020 en respuesta a sus comunicados CP-PER-6660-2020 (Rad. Interno R800-2020) – Respuesta oficio D-284-2020: Remisión de la segunda actualización del Inventario De Redes correspondiente a las UF-2- 3 – Redes Secas ENEL-CODENSA Y redes húmedas y respuesta a su comunicado CP-PER-6933C-2020 (Rad.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 201 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Interno R1499-2020) – Respuesta oficio D-591-2020: Remisión de la actualización N°2 del inventario de Redes Húmedas. (...), siendo esta versión la que corresponde a la Actualización del Inventario de Redes No. 2, incluyendo redes eléctricas, redes de acueducto y de alcantarillado correspondientes a las Unidades Funcionales 2 y 3. Esta comunicación fue respondida por medio de la comunicación del Consorcio Intervías 4G, CP-PER-7600C-2020, con fecha del 31 de julio de 2020.

### 8.2.3 Actualización de Inventario de Redes No. 3

Esta fue radicada por Concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., mediante la comunicación D-1415-2022, con fecha del 7 de septiembre de 2022, en el que se presentó lo que denominaron en el asunto: “(...) Respuesta al comunicado CP-PER-12057C-2022 (Rad. Interno R3247-2022): Respuesta oficio 01162-2022 Remisión de la tercera actualización del inventario y acta de redes correspondiente a las UF-2-3- Redes Subterráneas ENEL-CODENSA- Actualización No 3 del inventario y Acta de Redes. (...)”, siendo esta versión la que corresponde a la Actualización del Inventario de Redes No. 3, incluyendo redes eléctricas subterráneas del Operador CODENSA correspondientes a las Unidades Funcionales 2 y 3. Esta comunicación fue respondida por medio de nuestra comunicación CP-PER-12219C-2022 (RAD. ANI 20224091064082) del 21 de septiembre de 2022.

## 8.3 PLAN PARA EL TRASLADO Y/O MANEJO DE REDES

En el periodo del mes de marzo 2025, la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., no realizó la radicación de ninguna actualización al Plan para el traslado y/o manejo de Redes, sin embargo dada la información presentada por el Consorcio Intervías 4G en su Informe Final de Interventoría, se pudo establecer que a la fecha se encuentran en estado de aprobación las siguientes actualizaciones al Plan para el traslado y/o manejo de Redes (Información extraída del Informe Final de Interventoría elaborado por el Consorcio Intervías 4G):

### 8.3.1 Plan Para el Traslado y/o Manejo de Redes (Revisión 3)

Este se radicó por medio de la comunicación CPOB-1105-2015, con fecha del 9 de diciembre de 2015, en el que se presentó lo que denominaron en el asunto: “(...) Entrega Plan de Manejo y/o Traslado de Redes de las cinco Unidades Funcionales (Revisión 03) (...)”, incluyendo redes húmedas y secas correspondientes a las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4 y 5. Esta comunicación fue respondida por medio de la comunicación CP-PER-366-2015 del Consorcio Intervías 4G, con fecha del 11 de diciembre de 2015.

### 8.3.2 Plan Para el Traslado y/o Manejo De Redes, Actualización No. 2

El presente plan fue radicado por medio de la comunicación D-434-2021, con fecha del 2 de marzo de 2021, en el que se presentó lo que denominaron en el asunto: “(...)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 202 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Actualización del plan para el manejo y traslado de redes de alumbrado público Unidad Funcional 3A (...)", incluyendo redes de alumbrado vial correspondiente a la Unidad Funcional 3A. Esta comunicación fue respondida por medio de la comunicación CP-PER-9039C-2021 del Consorcio Intervías 4G, con fecha del 15 de marzo de 2021.

#### 8.4 SUBCUENTA DE REDES

Tal y como se precisa en el numeral 4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo, literal (c) Subcuenta de Redes "(...) El Valor estimado de Redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta de Redes corresponde a la suma de once mil quinientos cincuenta millones novecientos treinta y seis mil ochocientos ocho (\$11.550.936.808) Pesos del Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta de Redes según se establece a continuación (...)"

**Tabla 141 Subcuenta de Redes**

| Aporte a la Subcuenta Redes | Monto                                                                                                                                               | Fecha Máxima del Aporte                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aporte 1                    | Cinco mil setecientos setenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro (\$5.775.468.404) Pesos del Mes de Referencia. | Dentro de los cinco (5) Días siguientes al transcurso de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la Fecha de Inicio. |
| Aporte 2                    | Cinco mil setecientos setenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro (\$5.775.468.404) Pesos del Mes de Referencia. | Dentro de los cinco (5) Días siguientes al transcurso de quinientos cuarenta (540) Días contados a partir de la Fecha de Inicio. |

Fuente: Elaboración Propia

#### 8.5 PAGOS GENERADOS SUBCUENTA DE REDES

En el periodo del mes de marzo 2025, esta Interventoría no realizó aval de ningún corte de obra, por concepto de traslado y/o reubicación de redes con cargo a la Subcuenta de Redes, los cortes avalados a la fecha se incluyen en el presente capítulo, en el que también se encontraran los históricos de los pagos avalados por la Interventoría Consorcio Intervías 4G.

##### 8.5.1 Histórico de Pagos Generados con cargo a la Subcuenta de Redes

Dada la información suministrada por el Consorcio Intervías 4G, en su Informe Final de Redes a 31 de octubre de 2022, se presenta el siguiente recuento de los cortes de obra a la fecha pagados con cargo a la Subcuenta de Redes, bajo la gestión del Consorcio Intervías 4G y los cortes de obra avalados por esta Interventoría.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 203 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 8.5.2 Estudios y Diseños de Redes Húmedas

La propuesta económica de los estudios y diseños de redes húmedas fue presentada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación CPOB-0899-2015 del 13 de octubre de 2015 y fue revisada por el Consorcio Intervías 4G mediante la comunicación CP-PER-313-2015 de fecha del 3 de noviembre de 2015 por un valor de quinientos sesenta y tres millones trescientos tres mil quinientos diecinueve pesos (\$563.303.519,00), incluyendo IVA, correspondientes a estudios y diseños fase III. El presupuesto verificado se presentó con las siguientes cantidades y valores:

**Tabla 142 Valores Estudios y Diseños de Redes Húmedas**

| No. | DESCRIPCIÓN                                                                                         | Unidad | Cantidad | Valor Unitario   | Valor Total       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------|
| 1   | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE DIAMETROS MAYORES A 12"           | m      | 1.088    | \$ 6.675,00      | \$ 7.262.400,00   |
| 2   | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE DIAMETROS MENORES O IGUALES A 12" | m      | 1.875    | \$ 5.860,00      | \$ 10.987.500,00  |
| 3   | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO DE DIAMETROS MAYORES A 6"                 | m      | 6.083    | \$ 12.658,00     | \$ 76.998.614,00  |
| 4   | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO DE DIAMETROS MENORES O IGUALES A 6"       | m      | 34.744   | \$ 9.422,00      | \$ 327.357.968,00 |
| 5   | APIQUES EXPLORATORIOS                                                                               | Un     | 48       | \$ 500.000,00    | \$ 24.000.000,00  |
| 6   | INSPECCIÓN DE POZOS, INCLUIDA LIMPIEZA, TOPOGRAFIA Y LEVANTAMIENTO DE NIVELES                       | Un     | 44       | \$ 450.000,00    | \$ 19.800.000,00  |
| 7   | INSPECCIÓN DE POZOS, INCLUIDA LIMPIEZA, TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTO DE NIVELES Y BUSQUEDA             | Un     | 4        | \$ 750.000,00    | \$ 3.000.000,00   |
| 8   | INSPECCIÓN POR CCTV, INCLUIDA LA LIMPIEZA DE LA TUBERÍA                                             | m      | 540      | \$ 30.000,00     | \$ 16.200.000,00  |
|     |                                                                                                     |        |          | <b>Sub-Total</b> | \$ 485.606.482,00 |
|     |                                                                                                     |        |          | <b>16% IVA</b>   | \$ 77.697.037,00  |
|     |                                                                                                     |        |          | <b>Total</b>     | \$ 563.303.519,00 |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

### 8.5.3 Estudios y Diseños de Redes Secas

La propuesta económica de los estudios y diseños de redes secas fueron presentados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación CPOB-0272-2016 del 16 de marzo de 2016 y fue revisada por el Consorcio Intervías 4G mediante la comunicación CP-PER-586-2016 del 30 de marzo de 2016 por un valor de ciento cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con cinco centavos (\$145.264.158,05), incluyendo IVA, correspondientes a estudios y diseños fase III. El presupuesto verificado se presentó con las siguientes cantidades y valores:

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>Agencia Nacional de Infraestructura</b> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 204 de 591</b>                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 143 Estudios y Diseños de Redes Secas**

| No.                   | DESCRIPCIÓN                                                                                     | U.F. | TRAMO               | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario  | Valor Total              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------|--------|-----------------|--------------------------|
| 1                     | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) | 1    | 3,30 KM             | 0,68         | KM     | \$ 4.160.064,00 | \$ 2.828.844,00          |
| 2                     | TOPOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA (REUBICACIÓN POSTES)                                                   |      |                     | 10           | Un     | \$ 192.341,40   | \$ 1.923.414,00          |
| <b>SUB-TOTAL UF-1</b> |                                                                                                 |      |                     |              |        |                 | <b>\$ 4.752.258,00</b>   |
| No.                   | DESCRIPCIÓN                                                                                     | U.F. | TRAMO               | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario  | Valor Total              |
| 3                     | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) | 2A   | Sopó - Salitre      | 6,609        | KM     | \$ 4.160.064,00 | \$ 27.493.865,00         |
| 4                     | TOPOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA (REUBICACIÓN POSTES)                                                   |      |                     | 156          | Un     | \$ 192.341,40   | \$ 30.005.258,00         |
| 5                     | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) | 2B   | Salitre - La Calera | 9,483        | KM     | \$ 4.160.064,00 | \$ 39.449.890,00         |
| 6                     | TOPOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA (REUBICACIÓN POSTES)                                                   |      |                     | 150          | Un     | \$ 192.341,40   | \$ 28.851.210,00         |
| <b>SUB-TOTAL UF-2</b> |                                                                                                 |      |                     |              |        |                 | <b>\$ 125.800.223,00</b> |
| No.                   | DESCRIPCIÓN                                                                                     | U.F. | TRAMO               | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario  | Valor Total              |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 205 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| No.            | DESCRIPCIÓN                                                                                           | U.F. | TRAMO                 | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario  | Valor Total     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|
| 7              | ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS DEFINITIVOS<br>FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) | 3A   | La Calera - Patios    | 0,469        | KM     | \$ 4.160.064,00 | \$ 1.951.070,00 |
| 8              | TOPOGRAFÍA Y<br>PLANIMETRÍA (REUBICACIÓN POSTES)                                                      |      |                       | 26           | Un     | \$ 192.341,40   | \$ 5.000.876,00 |
| 9              | ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS DEFINITIVOS<br>FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) | 3B   | Choachí - Lim. Bogotá | N/A          | KM     | \$ -            | \$ -            |
| 10             | TOPOGRAFÍA Y<br>PLANIMETRÍA (REUBICACIÓN POSTES)                                                      |      |                       | N/A          | Un     | \$ -            | \$ -            |
| SUB-TOTAL UF-3 |                                                                                                       |      |                       |              |        |                 | \$ 6.951.947,00 |
| No.            | DESCRIPCIÓN                                                                                           | U.F. | TRAMO                 | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario  | Valor Total     |
| 11             | ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS DEFINITIVOS<br>FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) | 4    | La Calera – Choachí   | 0,43         | KM     | \$ 4.160.064,00 | \$ 1.797.148,00 |
| 12             | TOPOGRAFÍA Y<br>PLANIMETRÍA (REUBICACIÓN POSTES)                                                      |      |                       | 31,00        | Un     | \$ 192.341,398  | \$ 5.962.583,00 |
| SUB-TOTAL UF-4 |                                                                                                       |      |                       |              |        |                 | \$ 7.759.731,00 |
| No.            | DESCRIPCIÓN                                                                                           | U.F. | TRAMO                 | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario  | Valor Total     |
| 13             | ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS                                                                                 | 5    |                       | N/A          | N/A    | \$ -            | \$ -            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 206 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| No.            | DESCRIPCIÓN                                                                  | U.F. | TRAMO             | Red Afectada | Unidad | Valor Unitario | Valor Total       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|--------|----------------|-------------------|
|                | DEFINITIVOS FASE III<br>TRASLADO REDES DE MT Y BT (INGENIERÍA Y PRESUPUESTO) |      | Choachí - Cáqueza |              |        |                |                   |
| 14             | TOPOGRAFIA Y PLANIMETRIA (REUBICACIÓN POSTES)                                |      |                   | N/A          | N/A    | \$ -           | \$ -              |
| SUB-TOTAL UF-5 |                                                                              |      |                   |              |        | \$ -           |                   |
| Total          |                                                                              |      |                   |              |        |                | \$ 145.264.158,05 |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

## 8.5.4 Cortes de Obra Redes Eléctricas Operador CODENSA

### 8.5.4.1 Corte No. 1 CODENSA

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-674-2019 con fecha del 28 de marzo de 2019, posteriormente, en virtud de la revisión efectuada por parte del Consorcio Intervías 4G, se presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CP-PER-5249-2019 con fecha del 29 de abril de 2019, por un valor de cuatro mil setecientos cuarenta y cinco millones trecientos cincuenta y dos mil sesenta y cinco pesos con setenta y un centavos (\$4.745.352.065,71). A continuación, se presenta el resumen de los costos

**Tabla 144 Valores Corte No. 1 CODENSA**

| Unidad Funcional | Valor Total                |
|------------------|----------------------------|
| UF-1A            | \$ 148.580.229,08          |
| UF-2A PARTE 1    | \$ 802.374.095,00          |
| UF-2A PARTE 2    | \$ 651.592.654,00          |
| UF-2B            | \$ 2.488.273.768,22        |
| Total, sin IVA   | \$ 4.090.820.746,30        |
| IVA 16%          | \$ 654.531.319,41          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 4.745.352.065,71</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 207 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 8.5.4.2 Corte No. 2 CODENSA

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1359-2020 con fecha del 06 de agosto de 2020, posteriormente una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se emitió pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-7721C-2020 con fecha del 20 de agosto de 2020, por un valor de mil ciento un millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos sesenta y cinco pesos (\$1.101.418.365). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 145 Valores Corte No. 2 CODENSA**

| Unidad Funcional | Valor Total                |
|------------------|----------------------------|
| UF-1A            | \$ 68.432.229,00           |
| UF-2A            | \$ 293.693.784,00          |
| UF-2B            | \$ 324.088.774,00          |
| UF-3A            | \$ 263.283.803,00          |
| Total, sin IVA   | \$ 949.498.590,00          |
| IVA 16%          | \$ 151.919.774,00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 1.101.418.365,00</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

#### 8.5.4.3 Corte No. 3 CODENSA

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-420-2022 con fecha del 25 de marzo de 2022, posteriormente una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se presentó el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-11227C-2022 con fecha del 6 de abril de 2022, por un valor de trescientos cuarenta y nueve millones seiscientos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos (\$349.600.446). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 146 Valores Corte No. 3 CODENSA**

| Unidad Funcional | Valor Total       |
|------------------|-------------------|
| UF-1A            | \$ 69.519.826,00  |
| UF-2A            | \$ 45.390.368,00  |
| UF-2B            | \$ 81.043.027,00  |
| UF-3A            | \$ 105.426.474,00 |
| Total, sin IVA   | \$ 301.379.695,00 |
| IVA 16%          | \$ 48.220.751,00  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 208 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Unidad Funcional | Valor Total       |
|------------------|-------------------|
| TOTAL            | \$ 349.600.446,00 |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

#### 8.5.4.4 Corte No. 4 CODENSA

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-716-2022 con fecha del 12 de mayo de 2022, posteriormente una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se presentó el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-11505C-2022 con fecha del 25 de mayo de 2022, por un valor de seiscientos diez millones setecientos tres mil ciento ochenta y siete pesos (\$610.703.187). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 147 Valores Corte No. 4 CODENSA**

| Unidad Funcional | Valor Total       |
|------------------|-------------------|
| UF-2A            | \$ 269.427.670,00 |
| UF-2B            | \$ 177.903.675,00 |
| UF-3A            | \$ 79.136.920,00  |
| Total, sin IVA   | \$ 526.468.265,00 |
| IVA 16%          | \$ 84.234.922,00  |
| TOTAL            | \$ 610.703.187,00 |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

#### 8.5.4.5 Corte No. 5 CODENSA

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-521-2022 con fecha del 3 de abril de 2023, una vez efectuada la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios previamente avalados por la Interventoría Consorcio Intervías 4G en su Informe Final, presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-1256-2023 con fecha del 25 de mayo de 2023, por un valor de ciento veinticinco millones doscientos sesenta mil ciento cuarenta y nueve pesos (\$125.260.149). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 148 Valores Corte No. 5 CODENSA**

| Unidad Funcional | Valor Total   |
|------------------|---------------|
| UF-2A            | \$ 43,804,931 |
| UF-2B            | \$ 43,515,774 |
| UF-3A            | \$ 20,662,182 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 209 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Unidad Funcional | Valor Total           |
|------------------|-----------------------|
| Total sin IVA    | \$ 107,982,887        |
| IVA 16%          | \$ 17,277,262         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 125,260,149</b> |

Fuente: Elaboración Propia

## 8.5.5 Cortes de Obra Redes de Alumbrado Operador Municipio de La Calera

### 8.5.5.1 Corte No. 1 Alumbrado Vial

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-267-2021 con fecha del 8 de febrero de 2021, ahora bien, una vez efectuada la respectiva revisión por parte del Consorcio Intervías 4G, se emitió el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-9142C-2021, con fecha del 31 de marzo de 2021, por un valor de doscientos veintidós millones doce mil doscientos diecinueve pesos (\$222.012.219). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 149 Valores Corte No. 1 Alumbrado Vial**

| Unidad Funcional        | Valor Total           |
|-------------------------|-----------------------|
| UF-3A (Red Alumbrado)   | \$ 183.906.741,83     |
| Sub Total Costo Directo | \$ 183.906.741,83     |
| Administración 10%      | \$ 18.390.674,18      |
| Imprevistos 5,5%        | \$ 10.114.870,80      |
| Utilidades 4,5%         | \$ 8.275.803,38       |
| IVA 16%                 | \$ 1.324.128,54       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 222.012.219</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

### 8.5.5.2 Corte No. 2 Alumbrado Vial

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1508-2023 con fecha del 11 de octubre de 2023, ahora bien, una vez efectuada la respectiva revisión por parte del Consorcio Interventor ERS, se emitió el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CERS-OP-3498-2023, con fecha del 5 de diciembre de 2023, por un valor de quinientos noventa y ocho millones, treinta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (\$598.034.838,00). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 210 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 150 Valores Corte No. 1 Alumbrado Vial**

| Unidad Funcional        | Valor Total              |
|-------------------------|--------------------------|
| UF-3A (Red Alumbrado)   | \$ 457.773.146,25        |
| Sub Total Costo Directo | \$ 457.773.146,25        |
| Administración 22%      | \$ 100.710.092,18        |
| Imprevistos 4%          | \$ 18.310.925,85         |
| Utilidades 4%           | \$ 18.310.925,85         |
| IVA 16%                 | \$ 2.929.748,14          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 598.034.838,00</b> |

Fuente: Elaboración propia

## 8.5.6 Cortes de Obra Redes de Acueducto y Alcantarillado

### 8.5.6.1 Corte No. 2 (Alcantarillado)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1175-2022 con fecha del 1 de agosto de 2022, ahora bien, una vez realizada la respectiva revisión por parte del Consorcio Intervías 4G, se remitió el respectivo pronunciamiento comunicación CP-PER-11939C-2022 con fecha del 5 de agosto de 2022, por un valor de setecientos ochenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil ciento treinta y un pesos (\$786.567.131). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 151 Valores Corte No. 2 Alcantarillado**

| Unidad Funcional           | Valor Total           |
|----------------------------|-----------------------|
| UF-2A (Red alcantarillado) | \$ 602.087.516,00     |
| Sub Total Costo Directo    | \$ 602.087.516,51     |
| Administración 22%         | \$ 132.459.253,57     |
| Imprevistos 4%             | \$ 24.083.500,65      |
| Utilidades 4%              | \$ 24.083.500,65      |
| IVA 16%                    | \$ 3.853.360,10       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 786.567.131</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

Los tramos intervenidos en el Corte No. 2 (Alcantarillado), fueron los siguientes:

**Tabla 152 Tramos Corte No. 2 Alcantarillado UF 2**

| UF | Red  | ABS. Inicial | Abs. Final | Diámetro | Costado | Ficha | Operador  |
|----|------|--------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| 2A | Alc. | K0+140       | -          | 8"       | CRUCE   | 117   | EMSERSOPO |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 211 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Red  | ABS. Inicial | Abs. Final | Diámetro | Costado | Ficha | Operador  |
|----|------|--------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| 2A | Alc. | K0+535       | -          | 30"      | CRUCE   | 119   | EMSERSOPO |
| 2A | Alc. | K1+750       | K1+792     | 8"       | CRUCE   | 920A  | EMSERSOPO |
| 2A | Alc. | K1+990       | K2+157     | 10"      | IZQ     | 124   | EMSERSOPO |
| 2A | Alc. | K5+774       | K6+028     | 8"       | DER     | 126   | EMSERSOPO |
| 2A | Alc. | K6+447       | K6+680     | 8"       | DER     | 127   | EMSERSOPO |
| 2A | Alc. | K6+670       | K7+005     | 12"      | DER     | 128A  | EMSERSOPO |

Elaboración: Fuente Consorcio Intervías 4G

### 8.5.6.2 Corte No. 3 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1414-2022 con fecha del 7 de septiembre de 2022, una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se presentó el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-12218C-2022 con fecha del 21 de septiembre de 2022, por un valor de mil ciento cuarenta y seis millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis pesos (\$1.146.159.726). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 153 Valores Corte No. 3 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total             |
|-------------------------|-------------------------|
| UF-2A (Red acueducto)   | \$ 877.342.105,00       |
| Sub Total Costo Directo | \$ 877.342.105,00       |
| Administración 22%      | \$ 193.015.263,10       |
| Imprevistos 4%          | \$ 35.093.684,20        |
| Utilidades 4%           | \$ 35.093.684,20        |
| IVA 16%                 | \$ 5.614.989,47         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 1.146.159.726</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

Los tramos Intervénidos en este Corte No. 3 (Acueducto), fueron los siguientes:

**Tabla 154 Tramos Corte No. 3 Acueducto UF 2A**

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro    | Costado | Ficha       | Operador  |
|----|-------|--------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| 2A | Acue. | K1+740       | K1+780     | 1"          | IZQ     | 108A        | CHUSCAL   |
| 2A | Acue. | K1+750       | K1+996     | 2", 3" y 4" | AMBOS   | 104-105-108 | EMSERSOPO |
| 2A | Acue. | K2+156       | K2+560     | 1" y 2"     | DER     | 108B y 111A | CHUSCAL   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 212 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro     | Costado | Ficha            | Operador  |
|----|-------|--------------|------------|--------------|---------|------------------|-----------|
| 2A | Acue. | K1+992       | K2+500     | 2", 4" y 12" | DER     | 109-110-111-111A | EMSERSOPO |
| 2A | Acue. | K2+500       | K4+692     | 4"           | DER     | 110              | EMSERSOPO |
| 2A | Acue. | K4+692       | K5+500     | 2" y 4"      | DER     | 100,2            | EMSERSOPO |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

### 8.5.6.3 Corte No. 4 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1412-2022 con fecha del 7 de septiembre de 2022, una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se remitió el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-12216C-2022 con fecha del 21 de septiembre de 2022, por un valor de trescientos catorce millones novecientos ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho pesos (\$314.983.978). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 155 Valores Corte No. 4 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total           |
|-------------------------|-----------------------|
| UF-2A (Red acueducto)   | \$ 241.108.373,00     |
| Sub Total Costo Directo | \$ 241.108.373,00     |
| Administración 22%      | \$ 53.043.842,06      |
| Imprevistos 4%          | \$ 9.644.334,92       |
| Utilidades 4%           | \$ 9.644.334,92       |
| IVA 16%                 | \$ 1.543.093,59       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 314.983.978</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

Los tramos intervenidos en el Corte No. 4 (Acueducto), fueron los siguientes:

**Tabla 156 Tramos Corte No. 4 Acueducto UF2A**

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro  | Costado | Ficha        | Operador                       |
|----|-------|--------------|------------|-----------|---------|--------------|--------------------------------|
| 2A | Acue. | K5+650       | K6+046     | 2"        | DER     | 110          | EMSERSOPO                      |
| 2A | Acue. | K6+049       | K6+295     | 3" y 4"   | AMBOS   | 100.5        | EMSERSOPO                      |
| 2A | Acue. | K6+437       | K7+250     | 2"        | AMBOS   | 110-115-116B | MEUSA Y<br>EMSERSOPO           |
| 2A | Acue. | K7+018       | K7+960     | 3/4" y 1" | IZQ     | 116A         | ACUEDUCTO<br>VEREDAL<br>FORERO |
| 2A | Acue. | K6+210       | K6+350     | 2" y 3"   | DER     | 1.1.13       | EMSERSOPO                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 213 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

#### 8.5.6.4 Corte No. 5 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1413-2022 con fecha del 7 de septiembre de 2022, una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se remitió el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-12217C-2022, con fecha del 21 de septiembre de 2022, por un valor de doscientos veinticuatro millones setenta y dos mil novecientos sesenta pesos (\$224.072.960). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 157 Valores Corte No. 5 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total           |
|-------------------------|-----------------------|
| UF-2A (Red acueducto)   | \$ 171.519.413,00     |
| Sub Total Costo Directo | \$ 171.519.413,00     |
| Administración 22%      | \$ 37.734.270,00      |
| Imprevistos 4%          | \$ 6.860.776,52       |
| Utilidades 4%           | \$ 6.860.776,52       |
| IVA 16%                 | \$ 1.097.724,24       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 224.072.960</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

Los tramos intervenidos en este Corte No. 5 (Acueducto), fueron los siguientes:

**Tabla 158 Tramos Corte No. 5 Acueducto UF2A**

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro | Costado | Ficha        | Operador  |
|----|-------|--------------|------------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2A | Acue. | K5+500       | K5+650     | 2" y 4"  | DER     | 110.2        | EMSERSOPO |
| 2A | Acue. | K6+350       | K6+445     | 2Ø2"     | DER     | 114          | EMSERSOPO |
| 2A | Acue. | K6+285       | K6+437     | 2"       | IZQ     | 110-115-116B | EMSERSOPO |
| 2A | Acue. | K9+432       | K10+562    | 3"       | DER     | 128          | PROGRESAR |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

#### 8.5.6.5 Corte No. 6 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-1654-2022 con fecha del 7 de octubre 2022, una vez efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se remitió la comunicación CP-PER-12393C-2022 con fecha del 24 de octubre de 2022, por un valor de mil ciento cuarenta y seis millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis pesos (\$1.146.159.726). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 214 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Tabla 159 Valores Corte No. 6 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total             |
|-------------------------|-------------------------|
| UF-2B (Red acueducto)   | \$ 1.094.512.970,80     |
| Sub Total Costo Directo | \$ 1.094.512.970,80     |
| Administración 22%      | \$ 240.792.853,58       |
| Imprevistos 4%          | \$ 43.780.518,83        |
| Utilidades 4%           | \$ 43.780.518,83        |
| IVA 16%                 | \$ 7.004.883,01         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 1.429.871.745</b> |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

Los tramos intervenidos en este Corte No. 6 (Acueducto), fueron los siguientes:

**Tabla 160 Valores Corte No. 6 Acueducto UF2B**

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro | Costado | Ficha | Operador  |
|----|-------|--------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| 2B | Acue. | K0+000       | K1+417     | 3"       | IZQ     | 229   | PROGRESAR |
| 2B | Acue. | K1+945       | K4+081     | 6"       | DER     | 242   | PROGRESAR |
| 2B | Acue. | K1+421       | K3+585     | 4"       | IZQ     | 243   | PROGRESAR |
| 2B | Acue. | K5+934       | K7+150     | 3" y 6"  | DER     | 253   | PROGRESAR |

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G

#### 8.5.6.6 Corte No. 7 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-367-2023 con fecha del 6 de marzo de 2023, una vez efectuada la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios previamente avalados por la Interventoría Consorcio Intervías 4G en su Informe Final, presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-704-2023 con fecha del 15 de marzo de 2023, por un valor de ciento cuarenta y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos (\$145.348.685). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 161 Valores Corte No. 7 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total    |
|-------------------------|----------------|
| UF-2B (Red acueducto)   | \$ 111,258,944 |
| Sub Total Costo Directo | \$ 111,258,944 |
| Administración 22%      | \$ 24,476,968  |
| Imprevistos 4%          | \$ 4,450,358   |
| Utilidades 4%           | \$ 4,450,358   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 215 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Unidad Funcional | Valor Total           |
|------------------|-----------------------|
| IVA 16%          | \$ 712,057            |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 145,348,685</b> |

Fuente: Elaboración propia

Los tramos Interventados en este Corte No. 7 (Acueducto), fueron los siguientes:

**Tabla 162 Valores Corte No. 7 Acueducto UF2B**

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro | Costado | Ficha | Operador |
|----|-------|--------------|------------|----------|---------|-------|----------|
| 2B | Acue. | K1+462       | K1+910     | 1"       | IZQ     | 193   | LA SELVA |
| 2B | Alc.  | K1+461       | K1+872     | 6"       | IZQ     | 920   | LA SELVA |

Fuente: Elaboración propia

#### 8.5.6.7 Corte No. 8 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-368-2023 con fecha del 6 de marzo de 2023, una vez efectuada la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios previamente avalados por la Interventoría Consorcio Intervías 4G en su Informe Final, presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-1028-2023 con fecha del 20 de abril de 2023, por un valor de ciento cuarenta y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos (\$145.348.685). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 163 Valores Corte No. 8 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total              |
|-------------------------|--------------------------|
| UF-2B (Red acueducto)   | \$ 392,820,511.00        |
| Sub Total Costo Directo | \$ 392,820,511.00        |
| Administración 22%      | \$ 86,420,512.00         |
| Imprevistos 4%          | \$ 15,712,820.00         |
| Utilidades 4%           | \$ 15,712,820.00         |
| IVA 16%                 | \$ 2,514,051.00          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 513,180,714.00</b> |

Fuente: Elaboración propia

Los tramos Interventados en este Corte No. 8 (Acueducto), fueron los siguientes:



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 216 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 164 Valores Corte No. 8 Acueducto UF2B**

| UF | Red   | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro              | Costado | Ficha | Operador       |
|----|-------|--------------|------------|-----------------------|---------|-------|----------------|
| 2B | Acue. | K9+294       | K9+738     | 6"                    | DER     | 262A  | TRES QUEBRADAS |
| 2B | Acue. | K9+690       | K10+595    | 3/4", 1", 2", 4" Y 6" | IZQ     | 262   | TRES QUEBRADAS |
| 2B | Acue. | K10+671      | K12+305    | 4"                    | IZQ     | 262A  | TRES QUEBRADAS |

Fuente: Elaboración propia

#### 8.5.6.8 Corte No. 9 (Acueducto)

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación D-617-2023 con fecha del 24 de abril de 2023, una vez efectuada la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios previamente avalados por la Interventoría Consorcio Intervías 4G en su Informe Final, presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-1523-2023 con fecha del 2 de junio de 2023, por un valor de ciento cincuenta y siete millones setecientos treinta y un mil ciento ochenta y siete pesos (\$157.731.187). A continuación, se presenta el resumen de los costos:

**Tabla 165 Valores Corte No. 9 Acueducto**

| Unidad Funcional        | Valor Total       |
|-------------------------|-------------------|
| Costo Directo           |                   |
| UF-3A (Red acueducto)   | \$ 120,737,283.56 |
| Sub Total Costo Directo | \$ 120,737,283.56 |
| Administración 22%      | \$ 26,562,202.38  |
| Imprevistos 4%          | \$ 4,829,491.34   |
| Utilidades 4%           | \$ 4,829,491.34   |
| IVA 16%                 | \$ 772,718.61     |
| TOTAL                   | \$ 157,731,187.24 |

Fuente: Elaboración propia

Los tramos Interventados en este Corte No. 9 (Acueducto), fueron los siguientes:

**Tabla 166 Valores Corte No. 9 Acueducto UF3A**

| UF | Red       | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro      | Costado | Operador      |
|----|-----------|--------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 3A | Acueducto | K1+128       | K2+130     | 1/2", 3" y 4" | DER     | ESPUCAL E.S.P |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 217 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Red       | Abs. Inicial | Abs. Final | Diámetro  | Costado   | Operador   |
|----|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3A | Acueducto | CRUCE        | K2+600     | 3"        | CRUCE     | CEMEX      |
| 3A | Acueducto | K8+500       | K9+700     | 1/2" y 1" | IZQ y DER | ACUALIBANO |

Fuente: Elaboración propia

## 8.6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Con el fin de evitar el mayor número de reprocesos en la elaboración de los productos de carácter contractual, exigidos en el Apéndice Técnico Interferencia Redes, a cargo de la Concesión Perimetral de Oriente; esta Interventoría realizara la solicitud para que paralelamente a la elaboración de dichos productos, se realicen mesas de trabajo, en las que se pueda ir realizando observaciones y acompañamiento.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 218 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 9 GESTIÓN AMBIENTAL

El desarrollo del proyecto de Concesión conlleva en sí una serie de impactos ambientales generados por las actividades técnicas; es por ello por lo que se requiere la implementación de una serie de estrategias de mitigación, prevención y compensación que ayuden a un manejo adecuado de los impactos.

El seguimiento de las actividades ambientales adelantado por la Interventoría se basa en la verificación del cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones ambientales relacionadas en el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002-2014, cuyo objeto es: LA FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA.

El informe mensual de GESTIÓN AMBIENTAL de la Interventoría se elaboró de acuerdo con lo requerido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo ítem 5.4.1. Informes.

En cumplimiento a estas funciones contractuales a continuación, se presenta el avance en los aspectos ambientales del proyecto y el seguimiento adelantado por esta Interventoría para verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de lo establecido contractualmente para la gestión ambiental, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2025.

### 9.1 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO DEL PAGA.

La Interventoría presenta estado de aprobación de los PAGA, actividades ambientales realizadas por el Concesionario, acciones de seguimiento por parte de la Interventoría y la trazabilidad de los permisos ambientales. A continuación, se presenta las actividades del periodo:

#### INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA - PERIODO MARZO 2025

Durante el mes de marzo de 2025, la interventoría presto gestión y dio respuesta a diversos comunicados oficiales relacionados con las obligaciones ambientales del concesionario. Se revisó el Informe Trimestral Ambiental No. 40, señalando que no incluía el marco lógico ni el contenido exigido, por lo que se solicitó el envío del documento completo. Asimismo, se respondió al PQRS radicado 20254090245062 sobre una mancha de aceite en áreas verdes en sector de monitoreo de arrayanes, requiriendo al concesionario registros preoperacionales, hoja de vida de la máquina, soporte de limpieza, gestión de residuos, y evidencia de control en planta. También se reiteró que la iluminación en el área de falla de Arrayanes es una medida esencial para el monitoreo nocturno y no puede ser reubicada.

En cuanto a los movimientos de la subcuenta ambiental, se respondieron los comunicados D-155, 156 y 202 del 2025, relacionados con las actividades de mantenimiento de árboles en distintas etapas del Plan Único de Compensación de la Resolución 0463. En todos los casos, la documentación aportada y las verificaciones en campo permitieron emitir conceptos de "sin observación", al evidenciar el cumplimiento de los compromisos

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 219 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

establecidos por la autoridad ambiental. Igualmente, se atendió el comunicado D-200 del 2025, verificando el cierre de la compensación por permisos de aprovechamiento forestal de la UF23A, periodo junio 2024 a enero 2025, también con concepto favorable.

En relación con obligaciones contractuales, se respondió al comunicado D-176-2025 sobre la cláusula de indemnidad de la parte general del contrato en su numeral 14.3, donde se requirió al concesionario atender las filtraciones de aguas servidas del pozo séptico con vertimientos hacia la vía, es de aclarar que la consecuencia del indebido uso tanque séptico por parte de los propietarios corresponde a la indebida gestión predial de la Concesión. En tal sentido, se reiteró la responsabilidad del concesionario de mantener indemne a la ANI frente a posibles sanciones ambientales. Asimismo, se instó a gestionar ante la CAR la modificación del permiso de cauce de la báscula en la UF2 EXP 64682, con base en el trámite administrativo informado desde agosto de 2023.

Finalmente, se solicitó al concesionario el cumplimiento del Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, incluyendo la recuperación de áreas verdes afectadas en las Unidades Funcionales 1 a 5, identificando puntos críticos como los campamentos de Teusacá y Curvas del Guarapo y la ocupación del cauce en Teusacá. En general, la interventoría dio seguimiento técnico y administrativo al cumplimiento ambiental, emitiendo conceptos, solicitando información complementaria y promoviendo la gestión oportuna de trámites y medidas correctivas, asegurando así el adecuado desarrollo del proyecto.

Ver anexo: CERS-03-2025

#### **9.1.1 Informe trimestral #35 - 38**

Se emitido el 19 de marzo de 2025 el comunicado CERS-OP-0468-2025, en el cual se reiteró al Concesionario que la presentación de los informes trimestrales ambientales. La interventoría exigió al Concesionario tomar las medidas necesarias para la entrega oportuna y con calidad de los informes faltantes, de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico. Adicionalmente, el área jurídica de la Interventoría está evaluando la exigibilidad de los mismo en la etapa de Reversión.

#### **9.1.2 IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PAGA.**

##### **9.1.2.1 UNIDAD FUNCIONAL 1**

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación de Unidad Funcional suscrita el día 1 de febrero de 2019. Mediante comunicado PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB- I-D-2207-2019 del 24 de septiembre de 2019, el Concesionario realiza entrega del

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 220 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA UF1 para la fase de Operación y Mantenimiento V1.

El Concesionario mediante comunicación D-2284-2019 del 03 de octubre de 2019, remitió a la Interventoría Intervías 4G el Informe de cierre ambiental de la Unidad Funcional 1, este no tuvo observaciones.

A continuación, se realiza el siguiente reporte de las actividades rutinarias identificadas por la interventoría, ver siguiente tabla:

**Tabla 167 Reporte de estado de avance Paga UF1.**

| PROGRAMA                                               | MEDIDA                                                                                              | FICHA          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental</b> | Conformación del grupo de gestión ambiental                                                         | DAGA<br>1.1-01 | Se propone profesionales que figuren como coordinadores con sus respectivos grupos de apoyo: Residente Ambiental, Residente Social y Residente de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y para este período se cumple con el personal propuesto.                                                                                                   |
|                                                        | Cumplimiento de requerimientos legales                                                              | DAGA<br>1.2-02 | En el periodo el MADS envió comunicado de asunto: Viabilidad jurídica consulta pública iniciativa normativa Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá" - Rad. 30002024E6000499, asociado al expediente No. 20243000900100025E                                                           |
| <b>Programas Actividades constructivas</b>             | Medidas de manejo de señalización frentes de obras y sitios temporales                              | PAC<br>2.1-03  | Durante este periodo se generaron actividades constructivas de O&M (limpieza de cunetas y podas). Información reporta por el área SST con la respectiva señalización.                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | Medidas de manejo y disposición final de escombros y lodos                                          | PAC<br>2.2-04  | Frente a las actividades de mantenimiento el Concesionario está pendiente de sus soportes de gestión en su próximo reporte.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | Medidas de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales, especiales y/o peligrosos | PAC<br>2.3-05  | Se evidencia que el Concesionario cuenta con estaciones de reciclaje en sus centros de operación los cuales son entregados a la empresa municipal de servicios públicos.                                                                                                                                                                                |
|                                                        | Medidas de manejo de protección y conservación de suelo                                             | PAC<br>2.4-06  | El Concesionario en el periodo no realizó actividades en zonas verde por actividades constructivas. Sin embargo, se mantiene sus actividades de operación y mantenimiento en lo referente a las podas. No obstante, el 30 de marzo se emitió el comunicado CERS-OP-0474-2025 en el cual se solicita mantenimiento de las actividades de recuperación de |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 221 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PROGRAMA                                                   | MEDIDA                                                            | FICHA          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                   |                | áreas verdes en la totalidad de las Unidades Funcionales.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | Medidas de manejo de emisiones atmosféricas y ruido               | PAC<br>2.5-07  | El Concesionario no cuenta permisos o actividades que requieran permisos de emisiones.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa de Gestión Hídrica</b>                         | Medidas de manejo de aguas superficiales                          | PGH<br>3.1-08  | El Concesionario garantiza cumplimiento de la legislación vigente en las actividades de O&M dado que el suministro de recurso se da por medio de la empresa públicas de servicios del corredor.<br><br>En el periodo no se generó actividades Constructivas, limitándose a actividades de mantenimiento. |
|                                                            | Medidas de manejo de residuos líquidos domésticos y no domésticos | PGH<br>3.2-09  | La estación de la UF 1 cuenta con servicio de tanque séptico y suministro de agua por medio de empresas públicas.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos</b> | Medidas de manejo del descapote y cobertura vegetal               | PBSE<br>4.1-10 | El Concesionario desarrollo actividades de mantenimiento mediante poda. Generando donación de la totalidad del material pendiente de soporte.                                                                                                                                                            |
|                                                            | Medidas de manejo de recuperación de áreas afectadas              | PBSE<br>4.2-11 | En contratista no ha realizado actividades en áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                              |

Fuente: Elaboración Propia.

#### 9.1.2.2 UNIDAD FUNCIONAL 2

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación de Unidad Funcional suscrita el día 31 de agosto de 2021, con un plazo de ciento ochenta (180) días contados desde la suscripción del Acta de Terminación para cumplir a cabalidad con los pendientes del comunicado CP-PER-5530-2019, plazo terminó el 27 de febrero de 2022 no se encuentra pendientes del área ambiental.

El informe de cierre ambiental de la UF2 tuvo concepto de sin observaciones mediante comunicado R-2566 CP-PER-11756C-2022 (Aprobación de Oficio D-950-2022).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 222 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

A continuación, se realiza el siguiente reporte de las actividades rutinarias identificadas por la interventoría, ver siguiente tabla:

**Tabla 168 Reporte de estado de avance Paga UF2.**

| PROGRAMA                                        | MEDIDA                                                                                              | FICHA          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental | Conformación del grupo de gestión ambiental                                                         | DAGA<br>1.1-01 | Se propone profesionales que figuren como coordinadores con sus respectivos grupos de apoyo: Residente Ambiental, Residente Social y Residente de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y para este período se cumple con el personal propuesto.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Cumplimiento de requerimientos legales                                                              | DAGA<br>1.2-02 | En el periodo el POB emitió los siguientes reportes hacia las CAR:<br><br>EXP 54696 ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 20251014177 RAD INTERNO D-183-2025 PLAN ÚNICO DE COMPENSACIONES PROPUESTA DEL PLAN DE COMPENSACIÓN PARCIAL ETAPA 4 PARA LA SIEMBRA DE 4 272 ARBOLES EN TRES 3 PREDIOS COMO PARTE DEL PLAN ÚNICO DE COMPENSACIONES RES DGEN NO 20227000463 DEL 25-AGO-2022.<br><br>EXP 54696 BANCO MUNICIPAL DE AGUA BAMA DESARROLLO VISITA DEL PASADO 7 DE MARZO DE 2025 REVISIÓN TERMINACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. |
| Programas Actividades constructivas             | Medidas de manejo de señalización frentes de obras y sitios temporales                              | PAC<br>2.1-03  | Durante este periodo, en las actividades de O&M se continua con el PMT y Señalización información reportada por SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | Medidas de manejo y disposición final de escombros y lodos                                          | PAC<br>2.2-04  | El Concesionario en el periodo continua con dando cumplimiento al plan de gestión rcds del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | Medidas de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales, especiales y/o peligrosos | PAC<br>2.3-05  | En cuanto a los residuos sólidos convencionales, el concesionario en el frente de obra cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos y puntos ecológicos en el campamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                     | PAC            | El Concesionario finalizo obras en la ampliación del Rio Teusacá En tal sentido, En el periodo de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 223 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PROGRAMA                                                   | MEDIDA                                                            | FICHA              | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Medidas de manejo de protección y conservación de suelo           | 2.4-06             | 2025 continúo con el desarrollando de las obras de estabilización del cauce. Ver registro fotográfico. Se está a la espera de la entrega de las obras hacia la autoridad ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | Medidas de manejo de emisiones atmosféricas y ruido               | PAC<br>2.5-07      | El Concesionario garantiza cumplimiento de la legislación vigente en las actividades de O&M. No cuenta con permisos de emisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programa de Gestión Hídrica</b>                         | Medidas de manejo de aguas superficiales                          | PGH-3.1-08         | En el periodo no se identificó contaminación de la fuente por otro tipo de actividad o maniobra. Ver registro topográfico.<br><br>El Concesionario en el periodo no requirió suministro en las obras adelantadas en el sector de Teusaca.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | Medidas de manejo de residuos líquidos domésticos y no domésticos | PGH<br>3.2-09      | El Concesionario no desarrollo actividades constructivas. se continua con las actividades de operación de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos</b> | Medidas de manejo del descapote y cobertura vegetal               | PBSE<br><br>4.1-10 | El Concesionario actualmente se encuentra trabajando en las adecuaciones de cauce, No obstante, los individuos arbóreos aledaños no ha sido objeto de intervención y las actividades de resiembra se mantienen. Ver registro fotográfico.<br><br>No obstante, el 30 de marzo se emitió el comunicado CERS-OP-0474-2025 en el cual se solicita mantenimiento de las actividades de recuperación de áreas verdes en la totalidad de las Unidades Funcionales. |
|                                                            | Medidas de manejo de recuperación de áreas afectadas              | PBSE<br><br>4.2-11 | El Concesionario presenta actividades de recuperación por medio de la implementación trinchos para el manejo de los taludes y reincorporación de material orgánico con semillas en estos. Se le solicito al Concesionario armonizar las actividades pendientes de la estabilización de los taludes para solucionar la problemática. Ver Registro Fotográfico.                                                                                               |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 224 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 9.1.2.3 UNIDAD FUNCIONAL 3A - 3B

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional suscrita el día 7 de noviembre de 2019. En el mes de febrero de 2022. El 8 de abril de 2022, se firmó el acta de terminación de la UF 03, dando inicio al periodo de los cientos ochenta (180), el cual finalizo el de 5 octubre de 2022 periodo en el cual no se encontró observaciones ambientales.

El informe de cierre ambiental de la UF 3 tuvo concepto de sin observaciones mediante comunicado CP-PER-12464C-2022 del 31 de octubre de 2022.

A continuación, se realiza el siguiente reporte de las actividades rutinarias identificadas por la interventoría, ver siguiente tabla:

**Tabla 169 Reporte de estado de avance Paga UF3A - 3B.**

| PROGRAMA                                        | MEDIDA                                                                 | FICHA          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental | Conformación del grupo de gestión ambiental                            | DAGA<br>1.1-01 | Se propone profesionales que figuren como coordinadores con sus respectivos grupos de apoyo: Residente Ambiental, Residente Social y Residente de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y para este período se cumple con el personal propuesto.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Cumplimiento de requerimientos legales                                 | DAGA<br>1.2-02 | En el periodo el POB emitió los siguientes reportes hacia las CAR:<br><br>EXP 54696 ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 20251014177 RAD INTERNO D-183-2025 PLAN ÚNICO DE COMPENSACIONES PROPUESTA DEL PLAN DE COMPENSACIÓN PARCIAL ETAPA 4 PARA LA SIEMBRA DE 4 272 ARBOLES EN TRES 3 PREDIOS COMO PARTE DEL PLAN ÚNICO DE COMPENSACIONES RES DGEN NO 20227000463 DEL 25-AGO-2022.<br><br>EXP 54696 BANCO MUNICIPAL DE AGUA BAMA DESARROLLO VISITA DEL PASADO 7 DE MARZO DE 2025 REVISIÓN TERMINACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. |
| Programas Actividades constructivas             | Medidas de manejo de señalización frentes de obras y sitios temporales | PAC<br>2.1-03  | Se desmonto el PMT utilizado en el Sector de Tilatá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | Medidas de manejo y disposición final de escombros y lodos             | PAC<br>2.2-04  | El Concesionario dio gestión Rcds en la obra de Tilatá y presento soporte de disposición final de 75 m3 entre enero y febrero de 2025 por medio del gestor de minersa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 225 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PROGRAMA                                                   | MEDIDA                                                                                               | FICHA          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Medidas de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales, especiales y/o peligrosos. | PAC<br>2.3-05  | En cuanto a los residuos sólidos convencionales, estos se realizan por medio del prestador de servicios públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | Medidas de manejo de protección y conservación de suelo                                              | PAC<br>2.4-06  | El Concesionario viene desarrollando actividades de revegetalización en el sector de curvas del guarapo. Pendiente de evolución para verificación.<br><br>No obstante, el 30 de marzo se emitió el comunicado CERS-OP-0474-2025 en el cual se solicita mantenimiento de las actividades de recuperación de áreas verdes en la totalidad de las Unidades Funcionales.                    |
|                                                            | Medidas de manejo de emisiones atmosféricas y ruido                                                  | PAC<br>2.5-07  | El Concesionario garantiza cumplimiento de la legislación vigente en las actividades de O&M. No cuenta con permisos de emisiones.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa de Gestión Hídrica</b>                         | Medidas de manejo de aguas superficiales                                                             | PGH<br>3.1-08  | El concesionario en el sector de Tilatá implemento dique sobre la canaleta del área de trabajo para proteger las alcantarillas del material de arrastre. No se evidencia afectaciones a los cuerpos de agua.<br><br>Por otra parte, se verifico la compra de agua industrial por 55 M3 en enero y de igual manera para febrero de 2025.                                                 |
|                                                            | Medidas de manejo de residuos líquidos domésticos y no domésticos                                    | PGH<br>3.2-09  | El Concesionario garantiza cumplimiento de la legislación vigente en las actividades de O&M dado que los residuos líquidos domésticos son vertidos al alcantarillado y el frente de obra se da por medio de baños portátiles. Se dio verificación de la disposición final de 112 kg de las baterías sanitarias en el sector de Tilatá.                                                  |
| <b>Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos</b> | Medidas de manejo del descapote y cobertura vegetal                                                  | PBSE<br>4.1-10 | El Concesionario viene adelantado actividades en el talud de Tilatá en la escarpa por tal razón no se han intervenido áreas verdes adicionales. En cuanto a las actividades de poda realizadas en el talud de las mismas estas se realizaron conforme al informe técnico de la CAR. Adicional el Concesionario comunico que las actividades de poda en el sector de Tilatá finalizaron. |
|                                                            | Medidas de manejo de recuperación de áreas afectadas                                                 | PBSE<br>4.2-11 | El concesionario viene desarrollando actividades de revegetalización en el sector de curvas del guarapo. A la fecha este no ha finalizado.                                                                                                                                                                                                                                              |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 226 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

#### 9.1.2.4 UNIDAD FUNCIONAL 4 - 5

Esta unidad funcional no cuenta con su PAGA, es de aclarar que, por los puntos de sensibilidad hídrica encontrados, se generó un Evento Eximente de Responsabilidad y las actividades técnicas y gestión ambiental, se encuentran suspendida, sin embargo, el Concesionario realiza intervenciones prioritarias para mantener la transitividad del corredor vial.

#### 9.1.2.5 INDICADORES

El lo correspondiente a los indicadores de la gestión PAGA de las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, es importante mencionar que el proyecto se encuentra en etapa de reversión siendo exigible las obligaciones propias de operación y mantenimiento.

### 9.1.3 ESTADO ACTUALIZACIÓN DE LOS PAGA

#### 9.1.3.1 PAGA UF- 1

Mediante comunicación CP-PER-6054-2019 del 18 de octubre de 2019, la anterior interventoría aprobó la actualización presentada por el Concesionario del PAGA de la UF1 correspondiente a la etapa de Operación y Mantenimiento.

#### 9.1.3.2 PAGA UF – 2

En el mes de agosto de 2022, de acuerdo con las mesas de trabajo desarrolladas entre el área ambiental de la anterior INTERVENTORÍA y el Concesionario, mediante comunicado D-1172-2022 (29/07/2022), el Concesionario remitió a la ANI y a la Interventoría la Versión 1 del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA de la Unidad Funcional 2 para la fase de Operación y Mantenimiento.

#### 9.1.3.3 PAGA UF- 3

El 24 de febrero 2023 el Concesionario presento la actualización del PAGA en su fase de Operación y Mantenimiento mediante comunicado D- 318 – 2023. Posteriormente; La Interventoría emite observaciones el 08 de marzo del 2023 mediante el comunicado CERS-OP- 587- 2023. Posteriormente, El Concesionario da respuesta el 08 de mayo de 2023 por medio del comunicado D-681-2023. Finalmente, el 23 de mayo 2023 la interventoría emite el comunicado CERS-OP-1365-2023 con el Concepto de No Objeción.

#### 9.1.3.4 PAGA UF- 4

Mediante comunicación CP-PER- 4068-2018 del 03 de octubre de 2018, la anterior Interventoría aprobó la actualización presentada por el Concesionario del PAGA de la UF4 versión No. 3. En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental – INVIAS (2011).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 227 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Evento EER a partir del 1ro de agosto de 2018.

#### 9.1.3.5 PAGA UF- 5

Mediante comunicación CP-PER-4068-2018 del 03 de octubre de 2018, la anterior Interventoría aprobó la actualización presentada por el Concesionario del PAGA de la UF5 versión No. 3. En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental – INVIAS (2011).

Evento EER a partir del 1ro de agosto de 2018.

#### 9.1.4 CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL – 1.

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación de Unidad Funcional suscrita el día 1 de febrero de 2019 y que a la fecha no se cuenta con los pendientes adicionales para el Área Ambiental. Sin embargo. En este apartado se enunciará las actividades del periodo en lo correspondiente a las gestiones ambientales de las compensaciones ambientales pendiente de cierre en la unidad funcional.

El Concesionario mediante comunicación D-2284-2019 del 03 de octubre de 2019, remitió a la Interventoría Intervías 4G el Informe de cierre ambiental de la Unidad Funcional 1, este no tuvo observaciones.

#### 9.1.5 CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL – 2.

Esta Unidad Funcional cuenta con acta de terminación parcial de Unidad Funcional suscrita el día 17 de octubre de 2019. Posteriormente, el 31 de agosto de 2021, se firmó el acta de terminación de la UF 02, iniciando los ciento ochenta (180) El plazo de ciento ochenta (180) días contados desde la suscripción del Acta de Terminación, se terminó el 27 de febrero de 2022; y no se identificaron pendiente del área ambiental.

El informe de cierre ambiental de la UF2 tuvo concepto de sin observaciones mediante comunicado R-2566 CP-PER-11756C-2022 (Aprobación de Oficio D-950-2022).

#### 9.1.6 CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL – 3.

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de terminación **parcial** de Unidad Funcional suscrita el día 7 de noviembre de 2019. Posteriormente El 8 de abril de 2022, se firmó el acta de terminación de la UF 03, iniciando los ciento ochenta (180), el cual se terminó el 5 de octubre de 2022. y no se identificaron pendiente del área ambiental.

El informe de cierre ambiental de la UF 3 tuvo concepto de sin observaciones mediante comunicado CP-PER-12464C-2022 del 31 de octubre de 2022.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 228 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

## 9.2 COMUNICACIONES AUTORIDADES AMBIENTALES.

Para el periodo de 2025, el Concesionario informó a esta Interventoría por medio de correo electrónico, memorias técnicas, acerca de cumplimientos a las obligaciones interpuestas por las Autoridades Ambientales y procedimientos de interés para realizar labores de seguimiento y control relacionadas a continuación:

**Tabla 170 Comunicaciones Autoridades Ambientales.**

| ORIGEN                                       | DESTINATARIO | REF              | FECHA      | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                      | U<br>F |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAR                                          | POB          | 1252001404       | 5/03/2025  | EXPEDIENTE 64692 CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL - "se ha proferido la RESOLUCIÓN No. 01247000240 del 3 de diciembre de 2024".                                                                                                               | 3      |
| CAR                                          | POB          | 1252001427       | 6/03/2025  | TRASLADO POR COMPETENCIA DEL RADICADO NO 20251017720 SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y QUEJA POR MANEJO INADECUADO DE ACEITES USADOS EN PLANTA ELÉCTRICA – VÍA 7 5 LA CALERA                                                                       | 3      |
| MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | POB          | 30002024E6000499 | 6/03/2025  | Viabilidad jurídica consulta pública iniciativa normativa Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá" - Rad. 30002024E6000499, asociado al expediente No. 20243000900100025E | 1      |
| CORPOGUAVIO                                  | POB          | 252100927        | 13/03/2025 | REUNIÓN VERTIMIENTOS CENTRO COMERCIAL LOS LAURELES                                                                                                                                                                                          | 2      |
| CAR                                          | POB          | 9252003639       | 13/03/2025 | RESPUESTA AL RADICADO 20251021675 SOLICITUD NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AUTO DRSC NO 09256000127 DEL 31 DE ENERO DE 2025 EXPEDIENTE 73080                                                                                                      | 3      |
| CAR                                          | POB          | 9252003861       | 20/03/2025 | RESPUESTA AL RADICADO 20251010069 D-124-2025 EXP 73080 REMISIÓN DE CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                            | 3      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 229 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| ORIGEN | DESTINATARIO | REF        | FECHA      | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U F |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |              |            |            | COMPENSION JUN-SEPT 2024 ARTICULO 4 DE LOS RESOLUCIÓN DRBC NO 0149 DEL 27 DE MARZO DE 2019 PREDIO ECONDominio MUSINGA VEREDA LA VIOLETA SOPO                                                                                                                                            |     |
| CAR    | POB          | 1252002111 | 20/03/2025 | EXPEDIENTE 54705 CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| CAR    | POB          | 1252002135 | 20/03/2025 | RESPUESTA AL RADICADO 20251032728 D-317-2025 EXP REF 54696 PROPUESTA DEL PLAN DE COMPENSACIÓN PARCIAL ETAPA 4 PARA LA SIEMBRA DE 4 272 ARBOLES EN 3 PREDIOS COMO PARTE DEL PLAN ÚNICO DE COMPENSACIONES RES DGEN NO 0463 DEL 25-AGO-22 ALCANCE A LA COMUNICACIÓN 20251014177 D-183-2025 | 3   |

Fuente Elaboración Propia.

### 9.3 PERMISOS AMBIENTALES.

A la fecha el contrato se encuentra en **etapa de reversión**. En tal sentido y de acuerdo con el Manual de Reversiones de la ANI, la gestión ambiental en el proceso de reversión se enfoca en verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del concesionario, ya sean contractuales o derivadas de actos administrativos de las autoridades competentes. Esta revisión busca evidenciar una ejecución responsable del proyecto desde su inicio hasta su finalización, identificar obligaciones pendientes y formular estrategias de manejo según el escenario de cierre del proyecto.

En este contexto, se aclara que el avance y gestión para la obtención de los cierres de expedientes ambientales se enmarca en la estrategia establecida.

En el periodo correspondiente, la Interventoría revisó el comunicados del Concesionario D-289 de asunto: 5143.051ANI CERS-OP-0151-2025 (R-326-2025) y 5143.051ANI CERS-OP-0152-2025 (R-328-2025), En consecuencia, se emitió el comunicado CERS-OP-0509-2025, informando que no se recibió el informe de reversión, documento esencial para iniciar el análisis del componente ambiental en la etapa.

En resumen, se cuenta con ciento cuarenta y siete (147) permisos otorgados en sus cinco unidades funcionales, entre levantamiento de veda, aprovechamiento forestal, ocupación



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 230 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

de cauce, emisiones atmosféricas, concesiones de agua, vertimientos y ocupación de cauce, sustracción, plan de manejo para Zodme y una licencia ambiental.

En el periodo no se dio cambio alguno; a continuación, se presenta el siguiente cuadro indicativo se reporta los permisos ambientales. Ver:

**Tabla 171 Permisos otorgados**

| UF           | Levantamiento de veda | Aprovechamiento forestal | Ocupación de cauce | Emisiones atmosféricas | Concesión de agua | Vertimientos y ocupación de cauce | Sustracción | ZODME     | Licencia Ambiental |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| UF 1         | 1                     | 1                        | 1                  | 1                      | NA                | NA                                | NA          | NA        | NA                 |
| UF2          | 3                     | 10                       | 34                 | NA                     | 2                 | 1                                 | NA          | NA        | NA                 |
| UF3          | 2                     | 7                        | 16                 | NA                     | 1                 | NA                                | NA          | 2         | NA                 |
| UF 4 Y 5     | 3                     | 3                        | 42                 | 1                      | 4                 | 1                                 | 1           | 9         | 1                  |
| <b>Total</b> | <b>9</b>              | <b>21</b>                | <b>93</b>          | <b>2</b>               | <b>7</b>          | <b>2</b>                          | <b>1</b>    | <b>11</b> | <b>1</b>           |

Fuente: Elaboración Propia.

Frente a las Unidades Funcionales 4 y 5, se cuenta con 19 permisos suspendidos (10 UF4 y 09 UF5) y 42 desistidos en la UF4 y 5.

El detalle de los estados de los permisos otorgado se encuentra en la matriz de permisos ambientales adjunta en los Anexos (Matriz Permisos Ambientales UF 1,2 y 3 – 0325.xlm).

Por otra parte, se indica que de los 147 permisos obtenidos 71 se encuentran abiertos, 53 cerrados y 23 suspendidos. A continuación, se muestran en el siguiente cuadro resumen:

**Tabla 172 Relación de Permisos Obtenidos, Cerrados y Suspendidos.**


| ESTADO            | UF 1 2 Y 3 | UF 4 Y 5 | TOTAL |
|-------------------|------------|----------|-------|
| <b>ABIERTOS</b>   | 67         | 4        | 71    |
| <b>CERRADO</b>    | 11         | 42       | 53    |
| <b>SUSPENDIDO</b> | 4          | 19       | 23    |

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se presenta el apartado grafico:


|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 231 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Gráfico 1 Relación de la Unidad funcional 1 2 y 3**

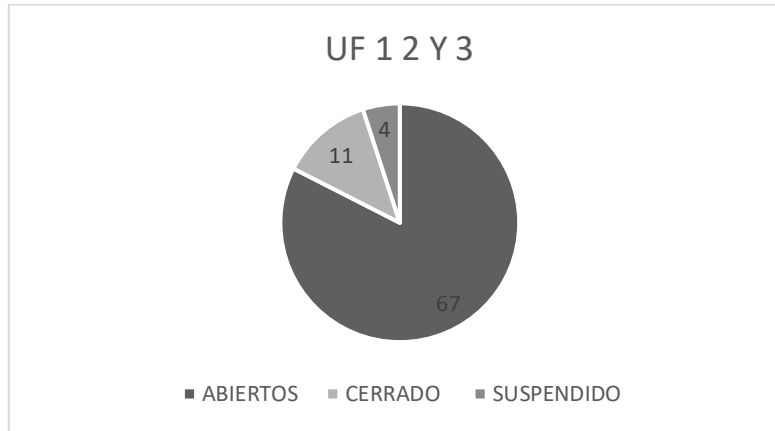

Fuente: Elaboración Propia.


**Gráfico 2 Relación de la Unidad funcional 4 y 5.**

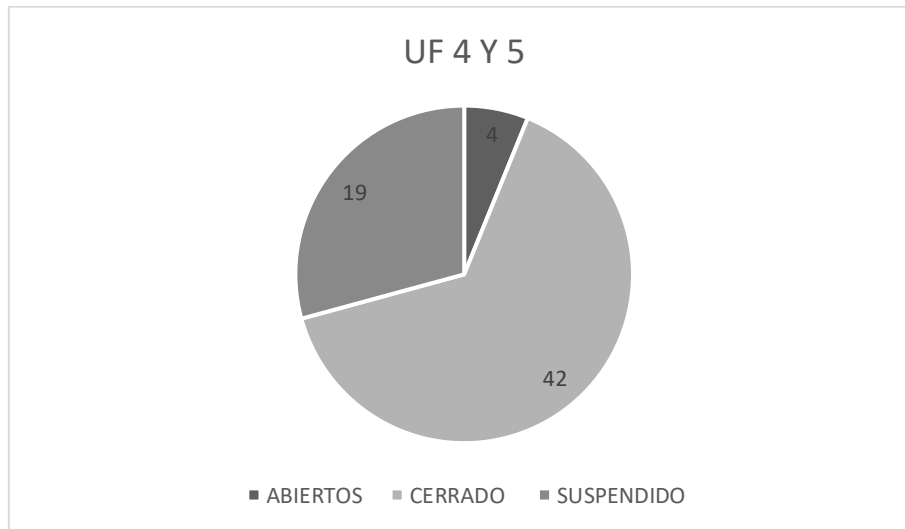

Fuente: Elaboración Propia.

**Gráfico 3 Relación de Permiso Totales.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 232 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

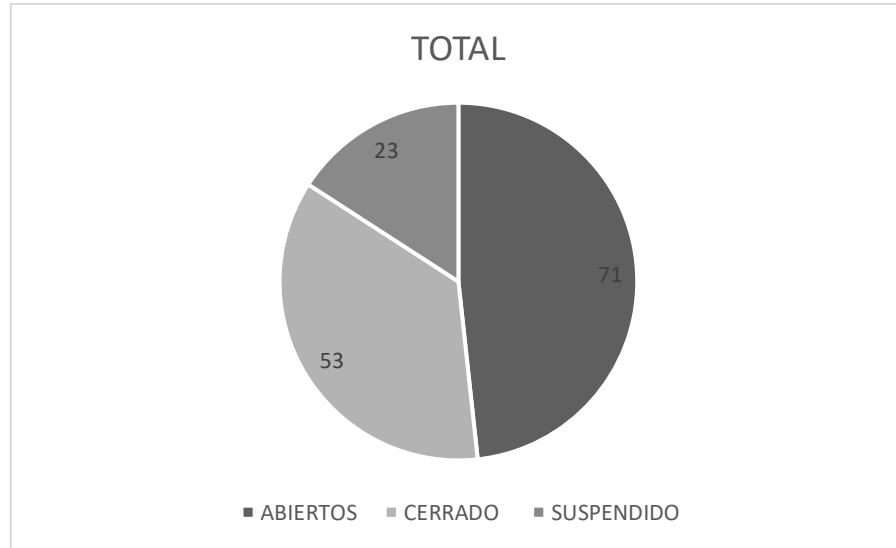

Fuente: Elaboración Propia.

### 9.3.1 LICENCIA AMBIENTAL VARIANTE CHOACHÍ UNIDAD FUNCIONAL 5

A la fecha el contrato se encuentra en etapa de reversión. En tal sentido y de acuerdo con el Manual de Reversiones de la ANI, la gestión ambiental en el proceso de reversión se enfoca en verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del concesionario, ya sean contractuales o derivadas de actos administrativos de las autoridades competentes. Esta revisión busca evidenciar una ejecución responsable del proyecto desde su inicio hasta su finalización, identificar obligaciones pendientes y formular estrategias de manejo según el escenario de cierre del proyecto.

En este contexto, se aclara que el avance y gestión para la obtención de los cierres de expedientes ambientales se enmarca dentro de la estrategia establecida.

En el periodo correspondiente, la Interventoría revisó los comunicados del Concesionario D-289 de asunto: 5143.051ANI CERS-OP-0151-2025 (R-326-2025) y 5143.051ANI CERS-OP-0152-2025 (R-328-2025), En consecuencia, se emitió el comunicado CERS-OP-0509-2025, informando que no se recibió el informe de reversión, documento esencial para iniciar el análisis del componente ambiental en la etapa.

En cuanto a las ultimas actuaciones frente a la Licencia ambiental se tiene las siguiente:

El ANLA el 09 de octubre de 2023 mediante comunicado # 20234500493591 con asunto: Solicitud Información inicio de actividades proyecto denominado "Construcción variante Choachí", ubicado en jurisdicción del municipio de Choachí en el departamento de Cundinamarca. Solicitando lo siguiente:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 233 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

(...)

“Siendo entonces necesario requerir a la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. para que informe a esta Autoridad Nacional dentro del término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la presente comunicación, las razones por las que no ha dado inicio al proyecto denominado “Construcción variante Choachí”; vencidos los cuales, se verificará el recibo de la información en el expediente LAV0087-00-2015 y se dará curso a la actuación administrativa a que haya lugar.”

(...)

Posteriormente el Concesionario mediante comunicado POB D-1579 DEL 20 de octubre del 2023 comunica lo siguiente:

(...)

POB resalta que justamente dicha situación es objeto del arbitraje internacional identificado con radicado ICDR No. 01-20- 0015-3123 (el "Arbitraje"), incumplimientos que son los que impiden que se ejecuten las Intervenciones en las Unidades Funcionales 4 y 5, incluyendo la variante de Choachí en la Unidad Funcional 5.

6. Adicionalmente, a la fecha de este comunicado el Concesionario se encuentra pendiente de Laudo que definirá el arbitraje en curso.

(...)

Adicional, en el mismo comunicado solicita hacia el ANLA lo siguiente:

(...)

Por todo lo anterior, solicitamos comedidamente se tengan en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, las cuales como bien se indica son un evento de fuerza mayor irresistible para POB, previo a cualquier decisión que por parte de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ~ ANLA, ha de tomarse respecto de la vigencia de la Licencia Ambiental proferida para la construcción de la Variante del Municipio de Choachí del expediente No Expediente: LAV0087-00-2015.

(...)

A la fecha no se cuenta con pronunciamiento de la Autoridad Ambiental ANLA, ni gestión por parte del Concesionario en lo correspondiente a la estrategia establecida para la reversión del contrato.

### 9.3.2 TRÁMITES CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES

En la siguiente tabla se relacionan los trámites que se tienen con las Autoridades Ambientales que tienen jurisdicción en el proyecto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 234 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 173 Trámites en proceso Autoridades Ambientales**

| U<br>F | Tip<br>o* | Autorida<br>d<br>Ambient<br>al | Acto<br>Admin<br>istrati<br>vo<br><br>Exped<br>iente | Trámite<br>ante<br>Autoridad<br>Ambiental                  | Radicado                          | Fec<br>ha                 | Estado                        | Cambios en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |                                |                                                      |                                                            | Autoridad<br>Ambiental<br>Interno | (dd<br>-<br>m<br>-<br>yy) |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2      | OC        | CAR DRBC                       | EXP 64682 Resolución No. 0682 del 08-MAR-18          | Solicitud de modificación de permiso de ocupación de cauce | 20221041671<br>D-777-2022         | 23/05/2022                | Pendiente Pronunciamiento CAR | <p>1. La CAR expidió el Auto DRBC No. 01226001682 del 09-SEP-22 mediante el cual se declara iniciado el trámite de modificación del permiso de ocupación de cauce programando la visita para el martes 20 de septiembre de 2022. La visita fue llevada a cabo por parte de funcionarios de la CAR. #09232018977 24-08-23 La CAR informa que se da actualmente trámite al acto administrativo correspondiente de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la corporación para este fin.</p> <p>Hasta la fecha, no se cuenta con pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental.</p> |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 235 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 9.3.2.1 COMPENSACIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO

A la fecha el contrato se encuentra en etapa de reversión. En tal sentido y de acuerdo con el Manual de Reversiones de la ANI, la gestión ambiental en el proceso de reversión se enfoca en verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del concesionario, ya sean contractuales o derivadas de actos administrativos de las autoridades competentes. Esta revisión busca evidenciar una ejecución responsable del proyecto desde su inicio hasta su finalización, identificar obligaciones pendientes y formular estrategias de manejo según el escenario de cierre del proyecto.

En este contexto, se aclara que el avance y gestión para la obtención de los cierres de expedientes ambientales y cesiones de obligaciones de los pendientes, se enmarca dentro de la estrategia establecida.

En el periodo correspondiente, la Interventoría revisó el comunicado del Concesionario D-289 en el cual se remitió los formatos propios de la etapa. En consecuencia, se emitió el comunicado CERS-OP-0509-2025, informando que no se recibió el informe de reversión, documento esencial para iniciar el análisis del componente ambiental en la etapa.

A continuación, se presenta los actos administrativos por parte de las Corporaciones para Compensar el uso de los recursos naturales. En cuanto al tipo de compensación tenemos veinte seis planes forestales con plantación de individuos arbóreos, una la construcción y/o la implementación del Banco Municipal de Agua – BAMA los cuales reúnen cuarenta y ocho Permisos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y un Convenio con Corporinoquia finalizado. A continuación, el cuadro resume del tipo de compensación que se encuentran abiertas:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 236 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 174 Tipo de Compensación**

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD           | ACTO ADM                               | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN           | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                     |                                        | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                      |          |                                                                                                                                                                            |
| 1  | LV              | MADS / Corpoguvavio | Res. 2604 del 18-DIC-15                | X                    |      |                | Finca María Antonia  | 100%     | El Concesionario remitió como adjunto el noveno y décimo informe de seguimiento semestral de la Resolución No. 2604 del 18 de diciembre de 2015 mediante comunicado D-945. |
| 2  | AF              | CAR                 | Res. 0107 del 11-AGO-16                | X                    |      |                | PLAN DE COMPENSACION | 70%      | En el periodo, se cuenta con un establecimiento de 34629 para un 70% de avance general de 48964.                                                                           |
| 2  | AF              | CAR                 | Res. 0149 del 27-MAR-19                | X                    |      |                | Econdominio Musinga  | 100%     | El Concesionario ejecuto el 3 mantenimiento, no se indica la cantidad de mantenimiento, solo altura de 1,50, aun la medida no esta cumplida.                               |
| 2  | AF              | CAR                 | Autorización 09219000110 del 28-OCT-21 | X                    |      |                | Hacienda El Portete  | 0%       | AUTO DRSC No. 09246002422 de 5 NOV. 2024 - Por medio del cual se                                                                                                           |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 237 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD         | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                                     | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                |
|----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                   |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                                                |          |                                                                                                                                            |
|    |                 |                   |                         |                      |      |                |                                                |          | aprueba un sitio de siembra y se adoptan otras determinaciones                                                                             |
| 2  | LV              | MADS / Corpoguvio | Res. 0232 del 16-FEB-18 | X                    |      |                | Finca María Antonia                            | 100%     | El Concesionario remitió el octavo informe de seguimiento semestral mediante comunicado D-928.                                             |
| 2  | LV              | MADS / Corpoguvio | Res. 2648 del 29-DIC-15 | X                    |      |                | Finca María Antonia                            | 100%     | El Concesionario remitió mediante comunicado D.959 el informe de seguimiento, mantenimiento y monitoreo del periodo Enero - Mayo del 2024, |
| 2  | LV              | MADS / Corpoguvio | Res. 1211 del 18-JUL-16 | X                    |      |                | Finca María Antonia - Parque Ecológico Pionono | 100%     | El Concesionario remitió mediante comunicado D.959 el informe de seguimiento, mantenimiento y monitoreo del periodo Enero - Mayo del 2024, |
| 2  | CA              | CAR               | Res. 161 del 10/09/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón                   | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 238 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                             |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1050 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se está al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notificó a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1052 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del                                                 |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>Agencia Nacional de Infraestructura</b> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 239 de 591</b>                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                                                |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1051 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notificó a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1059 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1035 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 240 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                 |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1053 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se está al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1049 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 241 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                                  |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1039 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1042 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1043 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 242 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                    |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1060 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1057 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 243 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                     |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1062 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1056 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 244 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1037 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1063 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 0682 del 18-MAR-18 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 245 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                     | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                                |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                                |          | 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1034 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potrereros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1038 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potrereros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notificó a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 246 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | de operación por parte del POB)                                                                                                                                                                                |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1036 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1046 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1045 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 247 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                             |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1044 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1047 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporación el inicio de la operación del                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 248 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                                                |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1041 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se está al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notificó a la Corporación el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1040 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se está al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notificó a la Corporación el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1058 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 249 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                 |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1048 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 2  | OC              | CAR       | Res. 1054 del 11-AGO-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 250 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD  | ACTO ADM                               | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN           | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |            |                                        | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                 |            |                                        |                      |      |                |                      |          | operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                                                            |
| 3ª | LV              | MADS / CAR | Res. 2633 del 22-DIC-15                | X                    |      |                | Predio La Riviera    | 100%     | Pendiente de Exp Cierre.                                                                                                                                                                                                                 |
| 3ª | AF              | CAR        | Res. 0102 del 29-JUL-16                | X                    |      |                | PLAN DE COMPENSACION | 70%      | En el periodo, se cuenta con un establecimiento de 34629 para un 70% de avance general.                                                                                                                                                  |
| 3ª | AF              | CAR        | Res. 0147 del 19-SEP-18                | X                    |      |                | Quebrada La Marmaja  | 100%     | La Autoridad Ambiental realizó visita técnica el 23 de septiembre de 2024 con el fin de adelantar el recibo de la compensación ambiental a lo cual el Concesionario está en espera de la emisión del correspondiente Acto Administrativo |
| 3ª | AF              | CAR        | Autorización 01209100011 del 27-NOV-20 | X                    |      |                | Quebrada La Marmaja  | 100%     | La Autoridad Ambiental realizó visita técnica el 23 de septiembre de 2024 con el fin de adelantar el recibo                                                                                                                              |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 251 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD       | ACTO ADM                    | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                 |                             | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |                 |                             |                      |      |                |                              |          | de la compensación ambiental a lo cual el Concesionario está en espera de la emisión del correspondiente Acto Administrativo que declare el cumplimiento y recibo de la compensación ambiental.                |
| 3ª | AF              | CMGRD La Calera | CMGRD No. 167 del 24-JUL-20 | X                    |      |                | Quebrada La Marmaja          | 100%     | Pendiente de Exp Cierre.                                                                                                                                                                                       |
| 3ª | OC              | CAR             | Res. 0681 del 08-MAR-18     |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3ª | OC              | CAR             | Res. 970 del 2/05/2016      |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 252 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM               | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                        | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                        |                      |      |                |                              |          | actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                 |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 967 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 959 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 253 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                                  |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 957 del 2/05/2016  |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 966 del 2/05/2016  |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 1447 del 5/07/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 254 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                         |                      |      |                |                              |          | ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                    |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 1446 del 5/07/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 968 del 2/05/2016  |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 255 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM               | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                        | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |           |                        |                      |      |                |                              |          | inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                                                     |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 965 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3ª | OC              | CAR       | Res. 969 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 256 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF             | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM               | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |           |                        | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
| 3 <sup>a</sup> | OC              | CAR       | Res. 962 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3 <sup>a</sup> | OC              | CAR       | Res. 964 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3 <sup>a</sup> | OC              | CAR       | Res. 963 del 2/05/2016 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 257 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF             | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD     | ACTO ADM                          | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                     | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------|----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |               |                                   | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                                |          |                                                                                                                                                                                                                |
|                |                 |               |                                   |                      |      |                |                                |          | 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB)                                                                                                |
| 3 <sup>a</sup> | OC              | CAR           | Res. 958 del 2/05/2016            |                      | X    |                | BAMA - Potreritos del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 3B             | CA              | Corporinoquia | Res. 500.41.16-0621 del 20-MAY-16 |                      |      | X              | Convenio ejecutado             | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                                                                                                                           |
| 3B             | ZD              | Corporinoquia | Res. 500.41.17.0436 del 24-MAR-17 |                      |      | X              | Convenio ejecutado             | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                                                                                                                           |
| 3B             | ZD              | Corporinoquia | Res. 500.41.17.0091 del 17-ENE-17 |                      |      | X              | Convenio ejecutado             | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                                                                                                                           |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 258 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF              | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD            | ACTO ADM                                        | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN           | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                      |                                                 | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                      |          |                                                                                                                                               |
| 3B              | AF              | Corporinoquia        | Auto 800.5.1.18.003 de 11 de septiembre de 2018 | X                    |      |                | RN Bague             | 100%     | Se realizo el quinto (5/6) mantenimiento correspondiente a 891 árboles nativos sembrados en el predio Bague, Ubicado en Choachí Cundinamarca. |
| 3B              | AF              | Corporinoquia        | Autorización 900.03.17.02 de 17 de mayo de 2017 | X                    |      |                | RN Bague             | 100%     | Se realizo el quinto (5/6) mantenimiento correspondiente a 891 árboles nativos sembrados en el predio Bague, Ubicado en Choachí Cundinamarca. |
| 3B - ZD K20+200 | LV              | MADS / Corporinoquia | Res. No. 1647 del 10-AGO-17                     | X                    |      |                |                      | 0%       | NO EJECUTADO - LICENCIA                                                                                                                       |
| 4               | LV              | MADS / Corporinoquia | Res. 0405 del 8/03/2016                         | X                    |      |                |                      | 0%       | NO EJECUTADO                                                                                                                                  |
| 4               | SRF             | MADS                 | Res. 0453 del 16-MAR-18                         | X                    |      |                |                      | 0%       | NO EJECUTADO                                                                                                                                  |
| 4               | AF              | CAR                  | Res. 0137 del 20-AGO-16                         | X                    |      |                | PLAN DE COMPENSACION | 70%      | En el periodo, se cuenta con un establecimiento de 34629 para un 70% de avance general.                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 259 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD | ACTO ADM                | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN                   | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           |                         | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                              |          |                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | OC              | CAR       | Res. 1239 del 02-SEP-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 4  | OC              | CAR       | Res. 1215 del 02-SEP-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 4  | OC              | CAR       | Res. 1208 del 02-SEP-16 |                      | X    |                | BAMA - Potreros del Boquerón | 100%     | Para el periodo se esta al 100% de ejecución de actividades constructivas. A partir de febrero                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 260 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD            | ACTO ADM                          | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN         | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                                                                                     |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                      |                                   | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                    |          |                                                                                                                 |
|    |                 |                      |                                   |                      |      |                |                    |          | 2025 se notifico a la Corporacion el inicio de la operación del mismo (12 meses de operación por parte del POB) |
| 4  | CA              | Corporinoquia        | Res. 500.41.16-0621 del 20-MAY-16 |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                            |
| 4  | EA, V, CA       | Corporinoquia        | Res. 500.41.17-0539 del 20-JUL-17 |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                            |
| 4  | ZD              | Corporinoquia        | Res. 500.41.17.0436 del 24-MAR-17 |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                            |
| 4  | AF, OC          | Corporinoquia        | Res.500.41-16-0661 del 07-SEP-16  |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                            |
| 5  | LV              | MADS / Corporinoquia | Res. 0383 del 03-MAR-16           | X                    |      |                |                    | 0%       | NO EJECUTADO                                                                                                    |
| 5  | AF, OC          | Corporinoquia        | Res. 500.41.16-0599 del 19-MAY-16 |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022                                                            |
| 5  | CA              | Corporinoquia        | Res.500.41.16-0621 del 20-MAY-16  |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 261 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF         | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD            | ACTO ADM                          | TIPO DE COMPENSACIÓN |      |                | OBLIGACIÓN         | % AVANCE | OBSERVACIÓN                                          |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------|
|            |                 |                      |                                   | ARBOLES              | BAMA | PAGO SERVICIOS |                    |          |                                                      |
|            |                 |                      |                                   |                      |      |                |                    |          | 30036221254 31 AGOS 2022                             |
| Variante   | LA              | ANLA                 | Res. 0248 del 10-MAR-16           |                      |      |                |                    | 0%       | NO EJECUTADO - LICENCIA                              |
| Variante   | LV              | MADS/ANLA            | Res. 2607 del 18-DIC-15           |                      |      |                |                    | 0%       | NO EJECUTADO - LICENCIA                              |
| 3B y 5     | ZD              | Corporinoquia        | Res. 500.41.17.0091 del 17-ENE-17 |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022 |
| 3B, 4 y 5  | ZD              | Corporinoquia        | Res. 500.41.17.0436 del 24-MAR-17 |                      |      | X              | Convenio ejecutado | 100%     | Concepto de Cumplimiento RS 30036221254 31 AGOS 2022 |
| ZD K42+000 | LV              | MADS / Corporinoquia | Res. No. 1084 del 08-AGO-17       | X                    |      |                |                    | 0%       | NO EJECUTADO - LICENCIA                              |

Fuente: Elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 262 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

El detalle del estado de la compensación se encuentra en matriz de estado de cumplimiento en el ANEXO (Resumen Ejecución Compensaciones Ambientales 0325.xlm).

A continuación, se presenta el detalle de la Resolución 0463 2022.

### 9.3.2.2 Resolución 0463 2022 BAMA – Plan de Compensación

El Concesionario recibió la notificación el 26 de agosto de 2022 de la Resolución DGEN No. 20227000463 del 25 de agosto de 2022 (Ver anexo: Res. DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22) donde la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, establece como medida compensatoria los siguiente:

**Tabla 175 Obligación y estado del BAMA.**

| Artículo | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segundo  | <p>Diseñar, construir, operar, poner en ejecución y entregar a la Corporación y al municipio de La Calera, el Banco Municipal de Agua (BAMA) bajo los Términos de Referencia establecidos por parte de la CAR con un volumen mínimo de dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos mil puntos ochenta y uno metros cúbicos (18.432,81 m3).</p> <p>Pendiente (98% Etapa Constructiva).</p> | <p>A la fecha el Concesionario se encuentra desarrollando actividades en el establecimiento del BAMA.</p> <p>El 20 de junio 2024 la CAR por medio del Comunicado# 1242004393 se da una prórroga de 6 meses y 23 días para la etapa 2 del Bama.</p> <p>El Concesionario remitió la comunicación con Radicado CAR 20251010060 (Rad. Interno D-123-2025) el tres (3) de febrero de 2025. En esta comunicación, se demostró el cumplimiento de las actividades de construcción del BAMA y se presentaron los argumentos sobre el inicio de la Etapa 3</p> |
| Tercero  | <p>Adelantar los trámites correspondientes para la adquisición de un área de dos puntos cuatro hectáreas (2,4 ha.) del predio denominado "Potreros del Boquerón" identificado con FMI 50N-328382 y Cédula Catastral 253770000000000090240000000000 a nombre de la Alcaldía Municipal de La Calera.</p>                                                                                  | <p>Esta obligación ya se cumplió por parte del Concesionario y este ya cuenta con respuesta CAR el 16 de junio de 2023.</p> <p>En la cual corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR informa la recepción de la información (Adquisición del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 263 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Artículo | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Cumpliendo.                                                                                                                                                                                                                                                  | predio) y procederá anexas a los expedientes- dicha notificación." - Art. 3 Res 20227000463 del 25 deAGO-22. |
| Cuarto   | Realizar el establecimiento como compensación arbórea de cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro (48.964) individuos arbóreos, dando cumplimiento a los criterios y parámetros técnicos establecidos por parte de la Corporación.<br><br>Pendiente. | Frente al establecimiento al momento se cuenta con 34.629 SEMBRADOS de un total de 48.964.                   |

Fuente: Elaboración Propia.

Se presenta el último reporte de las siguientes actuaciones en lo correspondiente al cumplimiento de la Resolución DGEN No. 20227000463 del 25 de agosto de 2022:

**Tabla 176 Compensación con CAR**

| Fecha      | Tipo | Registro   | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/02/2025  | E    | D-123-2025 | EI POB REMITIO EXP 54696 BANCO MUNICIPAL DE AGUA BAMA NOTIFICACION DE FINALIZACION DE CONSTRUCCION DEL BAMA COMO MEDIDA DE COMPENSACION PUESTA A DISPOSICION DE LAS OBRAS INICIO DE OPERACION PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DEL SISTEMA RES DGEN NO 0463 DEL 25-AGO-22                                  |
| 20/03/2025 | E    | 1252002135 | LA CAR DA RESPUESTA AL RADICADO 20251032728 D-317-2025 EXP REF 54696 PROPUESTA DEL PLAN DE COMPENSACION PARCIAL ETAPA 4 PARA LA SIEMBRA DE 4 272 ARBOLES EN 3 PREDIOS COMO PARTE DEL PLAN UNICO DE COMPENSACIONES RES DGEN NO 0463 DEL 25-AGO-22 ALCANCE A LA COMUNICACION 20251014177 D-183-2025           |
| 12/03/2025 | E    | D-317      | EL POB REMITE EXP 54696 ALCANCE A LA COMUNICACION 20251014177 RAD INTERNO D-183-2025 PLAN UNICO DE COMPENSACIONES PROPUESTA DEL PLAN DE COMPENSACION PARCIAL ETAPA 4 PARA LA SIEMBRA DE 4 272 ARBOLES EN TRES 3 PREDIOS COMO PARTE DEL PLAN UNICO DE COMPENSACIONES RES DGEN NO 20227000463 DEL 25-AGO-2022 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 264 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

R: Resolución

MT: Mesa de Trabajo

E: Comunicados

S: Socialización

**Nota:** La totalidad de la trazabilidad el proyecto se puede consultar en el anexo: Trazabilidad BAMA RES 463 250822.

Fuente: Elaboración Propia.

### 9.3.3 SEGUIMIENTO INFORMES DE LEVANTAMIENTO DE VEDA

A continuación, se relaciona la Resolución de Levantamiento de Veda del proyecto, con las fechas y radicados de los informes remitidos a la Autoridad Ambiental, Estado de las medidas de manejo y auto con el cual se dio traslado. Ver el siguiente cuadro resumen:

**Tabla 177 Resumen de las RS de Levantamiento de Veda.**

| UNIDAD FUNCIONAL | RESOLUCIÓN              | INFORME                                                                                     | ESTADO                                       | TRASLADO MADS                                                                                                             |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF 1             | RS 2604 DE 2015         | Informe de mantenimiento # 10 Entregado mediante comunicación POB del 9/11/2023 D-1738-2023 | Ejecutado el 100% de la Obligación (675 und) | El 20 de septiembre del 2022 MADS emitió el AUTO No. 4315 de 20 SEPT. 2022 en cual se adopta la medida de manejo          |
| UF 2             | RS 2648 DE 2015         | Informe de mantenimiento #7 Entregado mediante comunicación POB del /11/2023 D-1734-2023    | Ejecutado el 100% de la Obligación (30 und)  | El 20 de diciembre 2020 MADS emitió el AUTO No 2427                                                                       |
| UF 2             | RESOLUCIÓN 1211 DE 2016 | Informe de mantenimiento #10 Entregado mediante comunicación POB del 8/11/2023 D-1735-2023. | Ejecutado el 100% de la Obligación (15 und)  | el cual contiene el trámite administrativo ambiental de aprovechamiento forestal MADS 2102-2-5109-R-5026-2021-23-12-2021. |
| UF 2             | RESOLUCIÓN 0232 DE 2015 | Informe de mantenimiento #05 Entregado mediante comunicación POB del -01/11/2023con         | Ejecutado el 100 de la Obligación (390 und)  | Traslado a la CAR por competencia de expedientes                                                                          |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 265 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UNIDAD FUNCIONAL | RESOLUCIÓN              | INFORME                                                                                                         | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRASLADO MADS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                         | numero de radicado 232103942.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | administrativos ATV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UF 3             | RESOLUCIÓN 2633 DE 2015 | Informe de mantenimiento #06 Entregado mediante comunicación POB del - 22/11/2023 con numero de radicado D-1879 | Ejecutado el 100% de la Obligación (10 und)                                                                                                                                                                                                                                 | El 21 de abril de 2022 MADS emitió el Auto 2102-E2-2022-02106.En el cual se dio Traslado por competencia de expedientes administrativos: ATV 0291, ATV 0689, ATV 0843 y ATV 0937 a CORPOGUAVIO.- AUTO No. 4316 de 20 de Septiembre. 2022 ATV 689 MADS"                                                              |
| UF 4             | RESOLUCIÓN 0405 DE 2016 | Informe de Cierre con fecha 30/04/2019 SELLO MADS 5682                                                          | Mediante comunicación E1-2018-033662 (Rad. Interno D-2429-2018) del 13-NOV-2018 se notificó al MADS la suspensión de actividades por el EER, por tal razón, el Concesionario no ha adelantado ninguna gestión relacionada con la compensación toda vez que a la fecha sigue | El 23 de diciembre de 2021 el MADS emitió el auto 2102-2-5109 R-5026-2021, correspondiente al traslado a la CAR por competencia de expedientes administrativos ATV - levantamiento parcial de veda de flora silvestre de orden nacional, de acuerdo con las disposiciones de artículo 125 del Decreto 2106 de 2019. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 266 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UNIDAD FUNCIONAL                   | RESOLUCIÓN              | INFORME                                                                                                                 | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRASLADO MADS                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                         |                                                                                                                         | vigente el EER de UF4 y UF5.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| UF 5                               | RESOLUCIÓN 0383 DE 2016 | Informe de Cierre con fecha 16/05/2019 con numero de radicado E1-2019-16057416                                          | Mediante comunicación E1-2018-033662 (Rad. Interno D-2429-2018) del 13-NOV-2018 se notificó al MADS la suspensión de actividades por el EER, por tal razón, el Concesionario no ha adelantado ninguna gestión relacionada con la compensación toda vez que a la fecha sigue vigente el EER de UF4 y UF5. | <p>EL 09 de diciembre de 2021 MADS emitió el auto 2102-2-4627-R-4746-2021</p> <p>Traslado a Corporinoquia por competencia de expedientes administrativos ATV - levantamiento parcial de veda de flora silvestre de orden nacional.</p> |
| UNIDAD FUNCIONAL 4 / ZODME K20+200 | RESOLUCIÓN 1647 DE 2017 | Informe de Cierre con fecha 04/02/2020 con numero de radicado Radicado vital 3500090076165720001 1-2020-0718 D-208-2020 | Mediante comunicación E1-2018-033662 (Rad. Interno D-2429-2018) del 13-NOV-2018 se notificó al MADS la suspensión de actividades por el EER, por tal razón, el Concesionario no ha adelantado                                                                                                            | <p>El 09 de diciembre de 2021 MADS emitió 2102-2-4627</p> <p>R-4746-2021</p> <p>Se dios Traslado a Corporinoquia por competencia de expedientes administrativos ATV - levantamiento</p>                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 267 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UNIDAD FUNCIONAL                  | RESOLUCIÓN              | INFORME                                                             | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRASLADO MADS                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                         |                                                                     | ninguna gestión relacionada con la compensación toda vez que a la fecha sigue vigente el EER de UF4 y UF5.                                                                                                                                                                                               | parcial de veda de flora silvestre.<br><br>El 09 de diciembre de 2021 MADS 2102-2-4627<br><br>R-4746-2021                      |
| UNIDAD FUNCIONAL 5 / ZODME 42+000 | RESOLUCIÓN 1084 DE 2017 | Informe de Cierre 21/03/2019 con numero de radicado SELLO MADS-2269 | Mediante comunicación E1-2018-033662 (Rad. Interno D-2429-2018) del 13-NOV-2018 se notificó al MADS la suspensión de actividades por el EER, por tal razón, el Concesionario no ha adelantado ninguna gestión relacionada con la compensación toda vez que a la fecha sigue vigente el EER de UF4 y UF5. | Traslado a Corporinoquia por competencia de expedientes administrativos ATV - levantamiento parcial de veda de flora silvestre |
| VARIANTE                          | Res. 2607 del 18-DIC-15 | Licencia ambiental suspendida.                                      | No se ha generado Informes debido al EER.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente. El MADS en respuesta al radicado No E1-2022-01466 DEL 21-01-2022 - ATV0311 informar lo siguiente:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 268 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

El expediente fue remitido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a la Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio, dado que ambas autoridades tienen jurisdicción en municipios donde se desarrolla el proyecto y este expediente de veda se debe correlacionar con los premisos de aprovechamiento forestal que se tiene en cada jurisdicción. Razón por el cual esta cartera hizo remisión del expediente a las dos autoridades ambientales basado en las jurisdicciones donde se desarrolla el proyecto, siendo claro que cada autoridad deberá realizar sus acciones de gestión y control ambiental solo en el área de jurisdicción que le corresponde y para este expediente existe competencia de las dos autoridades ambientales indicadas.

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a la Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio son las competentes de continuar el respectivo seguimiento y control ambiental de las medidas establecidas en los actos administrativos de levantamiento parcial de veda, dentro de sus áreas de jurisdicción, en concordancia con los actos administrativos permisivos respectivos que se hayan elevado ante estas autoridades ambientales, sin que esto genere un conflicto de intereses.

#### 9.4 OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ADELANTADA POR LA INTERVENTORÍA

##### 9.4.1 PROCESOS SANCIONATORIOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se resumen los procesos de actos administrativos del proyecto.

**Tabla 178 Procesos Actos Administrativos**

| UF | Actos Administrativos                                   | Autoridad Ambiental   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Auto DRAG No. 1151 de 2017<br><br>10 de octubre de 2017 | CAR<br><br>EXP. 64930 | <b>BÁSCULA</b><br><br>Se da inicio un trámite administrativo de carácter sancionatorio por: i) el aprovechamiento de 161 árboles en el área de báscula (dentro de la ronda hídrica) sin contar con la respectiva autorización, y (ii) la construcción de ocupación de cauce sin el respectivo permiso. | El 15 MAY. 2023 mediante el AUTO DRAG No. 02236000944 de<br><br>Por el cual se ordena la apertura de una etapa probatoria y se dictan otras Disposiciones<br><br>El 18 AGOSTO 2023 mediante el Auto DRAG No. 02236001819 del 15 de mayo de 2023 se corrige acto administrativo generado por la Corporación. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 269 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Actos Administrativos                                                  | Autoridad Ambiental   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A la fecha no se ha obtenido información de la etapa probatoria.<br><br>Expediente 64930.<br><br>En el periodo no se generó actuaciones.                                                                                                                  |
| 2  | AUTO DRBC No. 01246001574 de 16 DIC. 2024                              | Exp 103871            | Declarar formalmente iniciado el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de La Agencia Nacional De Infraestructura – ANI con NIT 830.125.996-9, por la descarga de aguas residuales domésticas provenientes del predio EL MIRADOR DE LA VÍA identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-1054017, las cuales están siendo evacuadas por las tuberías de drenaje de aguas de infiltración del macizo del talud y descargadas de forma directa sobre la vía nacional en las coordenadas E 4890173, N 2075485 Altura 2853 msnm, infringiendo el numeral 6 del Artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como se menciona en la parte motiva del presente acto administrativo. | Apertura - En el periodo no se generó actuaciones.                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Resolución DRSC No. 121 de 2018<br><br>18 de abril de 2018 – (CERRADO) | CAR<br><br>EXP. 68310 | DURAZNOS<br><br>Se impone medida preventiva, consistente en la suspensión inmediata por las actividades realizadas en la ronda del nacimiento localizado en el sector conocido como Tres Esquinas – Los Durazos en la vereda el Chuscal del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUTO DRSC No. 09246003229 de 19 DIC. 2024<br><br>ARTÍCULO 1.- Declarar cerrado el periodo probatorio en el procedimiento sancionatorio adelantado contra a la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S con NIT No. 900761657-8, de conformidad con lo |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 270 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | Actos Administrativos               | Autoridad Ambiental | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                     | Municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3A | Predio UF3A-156- A-D. 7+800 y 7+840 | CAR 62140           | Proceso administrativo sancionatorio ambiental en contra de la Sra. Liliana Stella Pérez Díaz por la tala de árboles para construcción de carretera interna en el predio. Se vincula a PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB por anotación en certificado de libertad y tradición donde vende una franja del predio a PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB.                                                                                                                      | <p>Ultimo acto administrativo expedido por la Autoridad Ambiental, Resolución No. 0171 de 8-MAR-21, la CAR ordena la evaluación de la documentación allegada, a fin de que el área técnica se pronuncie frente a los argumentos técnicos expuestos en los escritos que solicitan cesación de procedimiento sancionatorio ambiental, por parte de los investigados.</p> <p>En espera de que se evalué el escrito presentando por este Concesionario en donde se solicita la cesación del procedimiento.</p> <p>En el periodo no se generó actuaciones.</p> |
| 3A | AUTO DRBC No. 01236000209           | CAR EXP. No. 98027. | <p>Queja ambiental afectación recurso suelo y riesgo</p> <p>ARTÍCULO 1: Ordenar la apertura de una indagación preliminar, con el fin de determinar si las actividades evidenciadas al interior del predio denominado Lote 4 la Pradera identificado con número predial 253770000000000250761000 000000</p> <p>Ubicado en límites con la parte alta del predio cruza la vía principal que conduce de Bogotá al municipio de La Calera son constitutivas de una infracción ambiental, y</p> | Apertura - En el periodo no se generó actuaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 271 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | Actos Administrativos                                | Autoridad Ambiental           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |                               | <p>verificar la información del mencionado predio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.</p> <p>PARÁGRAFO. Para continuar con el presente trámite administrativo ordénese la apertura del expediente No. 98027.</p>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3B | Auto<br>900.57.17-1531<br><br>19 de octubre de 2017. | Corporinoquía<br>900.38.17-61 | MATARREDONDA<br>KM 0+800 – UF 3B – Entrada del parque Ecológico Matarredonda para estacionamiento de maquinaria, disposición de baños portátiles y depósito de materiales pétreos.                                                                                                                                                                                                                                                                  | El 04 de junio la Autoridad emitió auto 200 6 24 0805 en el cual se dispuso:<br>ARTÍCULO PRIMERO - Ordenar el término de 10 días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para que la parte investigada presente sus alegatos de conclusión Parágrafo.- De conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, el ente territorial podrá remitir sus escritos, al correo electrónico <a href="mailto:atencionusuarios@corporinoquia.gov.co">atencionusuarios@corporinoquia.gov.co</a> . |
| 3B | Auto 800-13.24-0010<br><br>21 febrero 2024           | Corporinoquía                 | Se decreta de oficio la práctica de la prueba concerniente a realizar monitoreo de calidad de aire en la vía que conduce de Bogotá a Choachí (Paramo Cruz Verde) sobre las coordenadas geográficas WGS84 Latitud 4°33'49.6" N Longitud 73°59'24.6", vereda San Francisco, municipio de Choachi, Departamento de Cundinamarca, por ser necesarias, conducentes, pertinentes y útiles para conocer el estado actual de la contaminación atmosférica y | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 272 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | Actos Administrativos                               | Autoridad Ambiental                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                      | generar una línea base que permita tomar medidas de control y seguimiento a futuras actividades. desarrolla sobre esta área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Auto 900.57.17-4052<br><br>14 de noviembre de 2017. | Corporinoquía<br><br>500.33.1.16-033 | ZODME K20+200<br><br>Se legaliza una medida preventiva por la disposición de material en el ZODME 20+200 de la UF4, por incumplimiento de las obligaciones de la resolución 500.41-17-0436 del 24 de marzo de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El 30 de octubre de 2024 el Concesionario mediante comunicado D-1440-2024 presenta derecho de petición solicitud de pronunciamiento frente al informe de finalización de obras de bioingeniería del zodme k20 más 200 radicado con oficio d-524-2024 del 11 de abril de 2024 expediente 500.33.1.16-033.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Auto 200.6-19.3564<br><br>12 de diciembre de 2019   | Corporinoquía<br><br>200.32.7.19.264 | ZODME K42+000<br><br>AUTO 200.6-19.3564 (12/12/2019) "Por medio del cual se dispone la apertura de una investigación administrativa de carácter ambiental". Iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra de la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. por el inadecuado manejo de la zona durante la fase constructiva y operacional de las ZODMES K20+200 y K42+000 incumpliendo con algunas de las obligaciones establecidas en la Resol. 500.41.17.0436 del 24 de marzo de 2017 y la Resol. 500.41.17.0091 del 17 de enero de 2017.<br><br>Auto No. 200.6.20-0809 del 25 de agosto de 2020 "Por medio del cual se ordena el levantamiento de una medida preventiva" Referente a la | AUTO 200.6-21-2924 del 27/12/2021 "Por medio del cual se formulan cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental". • CARGO, ÚNICO: De conformidad con el Concepto Técnico No.500.8.2.18.2348 del 17 de diciembre de 2018 (fls.4-34), por incumplimiento a lo establecido en los numerales 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14 y 15 del artículo décimo primero de la Resolución No.500.41.17-0436 del 24 de marzo de 2017 y los numerales 1,4, 6,12 y 13 del. Artículo tercero de la Resolución 500.41.17-0091 del 17 de enero de 2017, al realizar un inadecuado manejo de la fase constructiva y operacional de las ZODMES localizadas en las abscisas K20+200, localizada en la vereda Potrero Grande, municipio de , específicamente en las coordenadas geográficas Datum WGS84 Latitud N 04 36 14,9" Longitud W 73°55'42,3"; y K42+000, localiza en la vereda San Agustín del municipio de Ubaque, específicamente en las coordenadas geográficas Datum |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 273 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Actos Administrativos                            | Autoridad Ambiental                 | Descripción                                                                                                                                                                                         | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                     | realización de las sobras planteadas en el estudio geológico y geotécnico el ZODME K20+200.                                                                                                         | <p>WGS84 Latitud N04 28" 14,36" Longitud W 73°55'5,74.(R-637-2022).</p> <p>Descargos al Auto No. 200.6-21-2924 (Rad. Interno R-637-2022) del 27 de diciembre de 2021 "Por medio del cual se formulan cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental" EXPEDIENTE: No. 200.32 .7.19.264 en contra de la PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S. EXONERAR a la empresa PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S, del cargo único endilgado mediante Auto No. 200.6-21-2924 del 27 de diciembre de 2021, y en consecuencia se sirva CERRAR y ARCHIVAR el expediente No. 200.32.7.19.264, por encontrarse probado que la investigada ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en las Resoluciones No. 500.41.17-0091 del 17 de enero de 2017 y 500.41 .17-0436 del 24 de marzo de 2017. (D-336-2022).</p> <p>Apertura - En el periodo no se generó actuaciones.</p> |
| 5  | Auto No. 800.6.18.0516<br><br>17 de mayo de 2018 | Corporinoquía<br><br>800.32.7.18.44 | PREDIO LA LAGUNA<br><br>Corporinoquía abre investigación sancionatoria por tala de individuos en ronda de 100 metros de un nacimiento de agua en el predio UF5-430-DI (K50+500 Tala Girón de Moya). | La autoridad ambiental CORPORINOQUIA EL 26 de Octubre de 2023 emite comunicado con numero de radicado CA-2023-02444 en la cual se indica lo siguiente: "por medio de la cual se da traslado para alegatos de conclusión" anexados al exp 800.832.7.18-0044.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 274 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF | Actos Administrativos                     | Autoridad Ambiental | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado actual/ Consideraciones legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En espera de pronunciamiento. Descargos.<br><br>En el periodo no se generó actuaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | AUTO DRBC No. 01226000581 de 26 ABR. 2022 | CAR 84644           | Por el cual se inicia proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras determinaciones (...)<br><br>ARTÍCULO 1: Declarar formalmente iniciado el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la Sociedad CORREA RIVAS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE, con NIT No. 60354468 y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI (PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.) con NIT. 9007616578, en calidad de propietarios del predio denominado LA LOMITA, identificado con cédula catastral 25377000000070113 y matrícula inmobiliaria No. 50N-1072136, ubicado en la Vereda El Volcán del municipio La Calera, Cundinamarca en las coordenadas E: 1012729, N: 1020792, A: 2593, en donde se evidencia captación del recurso hídrico del Río Teusacá (bombeo), en coordenadas N:1012482, N:1020870, 2586 m.s.n.m., y ocupación de cauce (estructura de retención del caudal o dique) en | El 05 de septiembre 2022 se emitió comunicado R-3457-2022 de Solicitud de cesación de trámite administrativo de carácter sancionatorio. Auto DRBC No. 01226000581 del 26-ABR-22. Exp. 84644.<br><br>De acuerdo con los fundamentos jurídicos relacionados, damos respuesta a su requerimiento, radicado CAR No 20221073394 de fecha 31 de agosto de 2022. Mediante el cual solicita la cesación del trámite administrativo de carácter sancionatorio por concurrir la existencia de la causal prevista en el artículo 9º, numeral 3º de la Ley 1333 de 2009. Acorde a lo solicitado, respetuosamente le informamos que su requerimiento se encuentra en estudio, por parte del área jurídica de la Regional.<br><br>En espera de desvinculación de proceso.<br><br>En el periodo no se generó actuaciones. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 275 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Actos Administrativos | Autoridad Ambiental | Descripción                                                                                                                                                                                                                 | Estado actual/ Consideraciones legales |
|----|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                       |                     | coordenadas N:1012482, N:1020870, asnm: 2586., acorde con lo conceptuado en el Informe Técnico DRBC No. 0623 del 4 de diciembre de 2020 y las razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo. |                                        |

Fuente: elaboración Propia.

#### 9.4.2 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

A continuación, se relacionan los Eventos Eximentes de Responsabilidad con relación al Área Ambiental.

**Tabla 179 Eventos Eximentes de Responsabilidad Ambiental**

| Quien Notifica el EER             | Documento por el cual se Notifica el Evento Eximente de Responsabilidad. | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADMISIÓN / RECHAZO                                              | OBSERVACIONES                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-485-2018 del 01-03- 2018.                                              | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Existencia de fuente hídrica y orden de la Alcaldía del Municipio de La Calera en la Unidad Funcional 3 (sector La Calera Patios) – Suspensión inmediata de las Intervenciones. <b>PK 6+230 y PK 6+430<sup>a</sup></b> | <b>ACEPTADO (Duración: 16-02-2018 al 16-03-2018) – SUPERADO</b> | Se suscribe Acta de reconocimiento de EER el día 01 de agosto de 2018, entre la ANI, Interventoría y el Concesionario. |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-916-2018 del 27-04- 2018.                                              | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5.                                                                                                                                          | <b>ACEPTADO – Desde el 31 de octubre de 2017. VIGENTE</b>       | Se suscribe Acta de declaratoria de EER el día 01 de agosto de 2018 entre la ANI y el Concesionario.                   |

Fuente: elaboración Propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 276 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Frente a los hechos que generaron el Evento de responsabilidad Eximente con Acta de reconocimiento 01 de agosto de 2023, se indica que estos se dieron por la identificación de los puntos de interés hídrico entre los cuales se evidencio Nacimiento. A continuación, se relacionan los Puntos de Interés Hídrico que fueron reportados a la anterior Interventoría mediante las comunicaciones D-1323 del 25 de junio de 2018 y D-1466 del 25 de agosto de 2020, resultado de los estudios de la Javeriana, SIAM y los estudios de isotopía que fueron realizados sobre nueve (9) puntos analizados en el laboratorio Hydrosys Labor LTD en Budapest, Hungría:

**Tabla 180 Identificación nacederos UF 4 - UF5**

| CLASIFICACIÓN                                                            | UF 4     |           |          | UF 5     |           |          | Variante |          |          | TOTAL POR INFORME |           |          | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
|                                                                          | J        | S         | I        | J        | S         | I        | J        | S        | I        | J                 | S         | I        |            |
| Manantiales<br>(Agua de origen subterráneo)                              | 1        | 11        | 4        | 3        | 47        | 2        | 2        | 2        | 0        | 6                 | 60        | 6        | 72         |
| Aguas Superficiales                                                      | 7        | 13        | 1        | 0        | 3         | 0        | 0        | 1        | 0        | 7                 | 17        | 1        | 25         |
| Escorrentía de Ladera (Agua de mezcla escorrentía y flujos subterráneos) | 1        | 11        | 1        | 2        | 4         | 0        | 5        | 1        | 0        | 8                 | 16        | 1        | 25         |
| <b>Total</b>                                                             | <b>9</b> | <b>35</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>54</b> | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>21</b>         | <b>93</b> | <b>8</b> | <b>122</b> |

Javeriana, S: SIAM, I: Isotopía

Fuente: elaboración Propia.

Frente a estos puntos hídricos, el Concesionario presentó a las autoridades ambientales CAR y Corporinoquía las medidas de mitigación tipo para que estas se pronunciaron sobre la posibilidad de implementarlas. Lo anterior en el marco de las actividades establecidas en el Acta de Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad y Consecuente Suspensión de las obras y actividades de Intervención de las Unidades Funcionales No. 4 y 5.

A continuación, se presenta los hechos más relevantes del EER, el cual no ha sido resuelto entre las partes, ver:

En el mes de enero de 2019 se recibió pronunciamiento por parte del MADS respecto a la solicitud de pronunciamiento respecto a la determinación y aplicación de la ronda de protección de nacimientos o manantiales mediante número de radicado DGI-8230-E2-2018-038118 (Rad. Interno R-27-2019) del 4 de enero de 2019.

El pasado 27 de noviembre de 2020 mediante oficios D-2067-2020, D-2068-2020, D-2069-2020, D-2070-2020, el Concesionario remitió a esta Interventoría y al Concejo Municipal de la Gestión del Riesgo (CMGRD) del Municipio de la Calera, del Municipio de Cáqueza, del Municipio de Choachí y del Municipio de Ubaque, comunicación sobre los reportes de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Calera – Choachí Unidad Funcional 4. Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y se notificó a las

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 277 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Autoridades Ambientales CAR y Corporinoquía sobre los Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Calera – Choachí (UF4) y Choachí – Cáqueza (UF5). Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante los oficios D-2081-2020 y D-2082-2020.

Mediante el comunicado D-1353-2021 (Rad. 20211082403), *alcance al comunicado D2067-2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Calera – Choachí Unidad Funcional 4, Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. La Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB S.A.S*, allegada a esta Interventoría el día 27 de agosto de 2021, donde se informa al Concejo Municipal de la Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de La Calera, que se ha realizado monitoreos en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se encuentran activos 66 puntos críticos de los cuales 19 se encuentran en su jurisdicción y así mismo 3 se encuentran dentro de la ronda de manantial (100m).

Así mismo por medio del comunicado D-1354-2021 (Rad. YO-2021-10074), *alcance al comunicado D2068-2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Choachí – Cáqueza (Unidad Funcional 5), Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. La Sociedad Concesionaria POB S.A.S.*, se informa al Concejo Municipal de la Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de Cáqueza, que se ha realizado monitoreos en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se encuentran activos 66 puntos críticos de los cuales 4 se encuentran en su jurisdicción y así mismo 2 se encuentran dentro de la ronda de manantial (100m).

Mediante comunicado D-1356-2021 (Rad. YO-2021-10075), *alcance al comunicado D2069-2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Calera - Choachí (Unidad Funcional 4) y Choachí – Cáqueza (Unidad Funcional 5), Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.*, se informa al Concejo Municipal de la Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de Choachí, que se ha realizado monitoreos en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se encuentran activos 66 puntos críticos de los cuales 31 se encuentran en su jurisdicción y así mismo 6 se encuentran dentro de la ronda de manantial (100m).

El 27 de agosto de 2021, por medio de oficio D-1359-2021 (Rad. YO-2021-10076), *alcance al comunicado D2070-2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Choachí - Cáqueza (Unidad Funcional 5), Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. La Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB S.A.S.*, se informa al Concejo Municipal de la Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de Choachí, que se ha realizado monitoreos en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se encuentran activos 66 puntos críticos de los cuales 12 se encuentran en su jurisdicción.

Mediante comunicado 2021-605-019202-1, la ANI puso en conocimiento la mesa de trabajo interinstitucional de articulación y coordinación, convocada por la procuraduría general de la nación, que se llevó a cabo el miércoles 16 de junio de 2021, relacionada con el proceso



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 278 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

para la obtención de las autorizaciones, de orden ambiental, requeridas para el desarrollo del proyecto perimetral de oriente de Cundinamarca.

Durante este espacio, se presentaron los temas ambientales que a la fecha, han impedido el desarrollo de las obras y actividades relacionadas con la construcción de las Unidades Funcionales 4 y 5, puntualmente, los relacionados con la intervención en rondas hídricas de manantiales, y con las intervenciones en sitios identificados como puntos críticos localizados en la ronda hídrica de nacederos de estas unidades funcionales del proyecto.

Como parte de los resultados de esta mesa y dentro de los compromisos institucionales fijados, se determinó que las Autoridades Ambientales Regionales adelantarán una mesa de trabajo con la ANLA, en la que esta última, presentará el sustento jurídico y técnico que ha adoptado para autorizar intervenciones de similares características en proyectos que han sido objeto de licenciamiento ambiental. Esta mesa de trabajo se deberá llevar a cabo en el curso del mes de junio.

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, manifestó que se asentarán todas las Gestiones a su alcance para que el Concesionario presente a CORPORINOQUÍA y a la CAR Cundinamarca, en un plazo no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de la mesa de trabajo del asunto, esto es, a partir 16 de junio del 2021, las medidas de manejo ambientales para garantizar la viabilidad de intervención en las rondas hídricas de los manantiales presentes en las Unidades Funcionales 4 y 5, con lo que se exige a nivel técnico – ambiental y jurídico para este tipo de trámites.

Según la mesa de trabajo llevada a cabo el 14 de julio del 2021 con la ANI, Interventoría y el Concesionario en la que se compartió la experiencia en trámites ambientales ante la ANLA de la Concesión BBY en zonas con presencia de manantiales y de acuerdo con la solicitud de la ANI, el Concesionario remitió las fichas técnicas de las medidas de manejo tipo puestas a consideración en el año 2018 a la CAR y a Corporinoquía con ocasión al EER que impacta las Unidades Funcionales 4 y 5 de proyecto, las cuales fueron revisadas por la Interventoría y se remitieron las respectivas observaciones, para así ser remitidas según el compromiso adquirido en la mesa de trabajo del 16 de junio de 2021.

Durante este periodo, el 25 de agosto de 2021, se realizó mesa de trabajo con la participación de la ANI, Concesionario, Procuraduría, Corporinoquia, en la cual la Corporación entregó el siguiente listado de documentos requeridos de análisis técnico – Ambiental en manantiales, nacederos sobre el trazado de la vía perimetral Choachí - La Calera:

Identificar a una escala de detalle adecuada los manantiales, nacederos en el área de influencia de la vía perimetral.

Establecer para cada uno de los manantiales y nacederos identificados, sus características morfológicas, su ubicación en referencia con trazado de la vía, estableciendo exactamente la distancia entre la vía y la periferia del manantial.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 279 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Identificar los usos actuales y usos potenciales del recurso hídrico en función de la oferta del recurso hídrico y demanda del recurso hídrico.

Falta: Usos potenciales del recurso hídrico en función de la oferta del recurso hídrico y demanda del recurso hídrico.

Determinar el estado de la faja forestal protectora de cada uno de los nacimientos identificados, de acuerdo con el anterior literal.

Identificar y realizar el análisis de los conflictos y problemáticas por el uso del recurso, fuentes potenciales de contaminación y condiciones de desabastecimiento en zonas donde se hayan detectado, dentro del área de estudio.

Realizar un balance hídrico de las fuentes superficiales más importantes del área de estudio.

Aplicar en las fuentes hídricas superficiales presentes en el área de estudio, un modelo para estimar el componente de recarga potencial al sistema acuífero somero.

Desarrollar trabajo de campo a escala detallada, en el cual se debe realizar la caracterización, litológica, mineralógica, estratigráfica, estructural y definir la porosidad primaria o secundaria de cada una de las unidades identificadas. Este documento permite verificar los tipos de suelo y verificar la porosidad en el área de estudio.

Identificar rocas, sedimentos y estructuras geológicas (continuidad área y espesor) que permiten el flujo de las aguas subterráneas.

Realizar el muestreo y análisis (laboratorios acreditados por el IDEAM) de parámetros fisicoquímicos in-situ (pH, temperatura, conductividad, sólidos en suspensión) y de iones mayoritarios de aguas subterránea (Na, Ca, Mg, K, HCO<sub>3</sub>, Cl, SO<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, Si).

Realizar sondeos geoelectrónicos verticales SEV en el área de estudio, la densidad de los sondeos a analizar debe corresponder a escala detallada.

Realizar la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación, en la cual se debe definir:

- Régimen hidráulico del acuífero
- Espesor de zona no saturada
- Profundidad del agua subterránea
- Características litológicas
- Transporte de contaminantes
- Definición del método de evaluación, de acuerdo a la información obtenida para el estudio.
- Mapa de vulnerabilidad intrínseca del acuífero

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 280 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Realizar los análisis isotópicos, mediante los cuales es posible identificar el origen de las aguas subterráneas, determinación de su edad y de la velocidad y dirección del flujo, relación entre las aguas superficiales y las subterráneas, posibles conexiones entre diversos acuíferos, y porosidad, transmisividad y dispersividad locales de un acuífero.

Conclusiones y recomendaciones en función de lo encontrado técnicamente en armonía con lo establecido normativamente (Artículo 2.2.1.1.18.2 decreto 1076 de 2015)

El 27 de agosto de 2021 mediante reunión virtual el Concesionario presento ante la ANI y la Interventoría el resultado del análisis de la información presentada en los estudios de la Javeriana y SIAM con respecto a los documentos requeridos por la Corporación Autónoma de la Orinoquía. En conclusión, se entregará a Corporinoquía la información que a la fecha se tiene de cada uno de los nacederos identificados y al corte de este informe se estaba a la espera de la reunión de presentación de información a Corporinoquía por parte del Concesionario.

El 8 de abril de 2022, la Interventoría fue invitada por la PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS con el fin de atender queja, puesta por el Concejo Municipal de Choachí en sesión llevada a cabo el 18 de febrero de 2022, se convoca a la ANLA, al Consorcio Perimetral de Oriente, a la ANI, a Corporinoquía, a la Alcaldía de Choachí, a una visita técnica en el municipio de Choachí para verificar las condiciones técnicas actuales denunciadas por la comunidad como constitutivas de presunta amenaza, riesgo o vulnerabilidad, de los bienes, infraestructura física e integridad de los ciudadanos, en el marco de las obras de la variante Perimetral de Oriente de Cundinamarca.

De otro modo, en virtud de las mesas de trabajo, el 07 de abril de 2022, por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, se emitió un concepto frente a la situación de las Unidades Funcionales 4 y 5 del Proyecto, concluyendo lo siguiente:

*"En virtud de lo expuesto, esta Delegada les hace un llamado de advertencia en orden a que no se exijan requisitos, condiciones, estudios, permisos o trámites ambientales, que no estén contemplados en la normatividad para el adelantamiento de las obras de mejoramiento y rehabilitación que se requieren adelantar en las unidades funcionales 4 y 5 del proyecto perimetral de Oriente de Cundinamarca, y de otra parte, a que continúen ejerciendo sus unciones como autoridad ambiental en materia de seguimiento y control en torno a este proyecto, para evitar afectaciones e impactos no mitigados o compensados adecuadamente en los nacederos identificados, y si se llegan a presentar ejercer su autoridad en materia sancionatoria en el marco de las competencias de las cuales se encuentran investidos legalmente.*

*Esta Procuraduría en ejercicio de nuestras funciones en materia preventiva, intervención y control a la gestión pública, continuará atenta a que en todas las actuaciones administrativas derivadas de este proyecto de utilidad social, se*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 281 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

*garanticen los principios de seguridad jurídica, eficiencia administrativa, celeridad, protección del patrimonio público, transparencia, coordinación interinstitucional, presunción de buen fe y legalidad; recordándoles que el incumplimiento de los funcionarios públicos a sus deberes funcionales, a la normatividad y a los principios que orientan las actuaciones administrativas, les genera responsabilidad disciplinaria."*

Sobre el particular, la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios convocó a una mesa de trabajo a desarrollarse el día 17 de mayo de 2022, misma que tuvo participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANI, el Concesionario, Corporinoquía y esta Interventoría, faltando la CAR a la misma.

Ahora bien, en dicha mesa de trabajo la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios socializó el concepto emitido el 7 de abril de 2022, y le cuestionó a las Autoridades Ambientales intervinientes su posición al respecto. En tal sentido, y de manera concluyente, en el Acta de la mesa de trabajo remitida se incluyeron las siguientes consideraciones:

*"se presentó la posición oficial de la Procuraduría, después de realizar el correspondiente análisis jurídico y técnico, frente a la problemática que nos concierne dentro de esta actuación preventiva, concluyéndose que no podrían las autoridades ambientales imponer o exigir obligaciones, condiciones o prohibiciones distintas al cumplimiento normativo de las medidas de manejo ambiental contempladas dentro del PAGA para la protección, conservación y restauración de estos cuerpos de agua.*

*Interviene el Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor José Francisco Cruz, quien señala que esa cartera comparte y acoge plenamente el criterio de la Procuraduría, y advierte que la ausencia de la vía genera una mayor contaminación y afectación a la calidad del aire de la población ubicada en el sur de Bogotá por las emisiones de material particulado, en el tráfico pesado que diariamente transita en la vía Bogotá- Villavicencio, y aclara que el tema ambiental hay que verlo integralmente. Que se acata y asume por lo tanto la posición de la Procuraduría, por ello se envió comunicaciones dirigidas a la CAR, a Corporinoquía, y a sus consejos directivos, con el fin de que se asuma en su integridad dicha posición. Interviene la directora de Corporinoquía, doctora Doris Bernal, quien señala que como Corporación acatan la directriz de la Procuraduría, que revisadas las actuaciones no observan ninguna solicitud de permiso ambiental en trámite, por cuanto los permisos que estaban en curso se suspendieron, por solicitud del Consorcio Perimetral. Interviene la Procuraduría para aclarar que dentro del PAGA deben quedar contempladas las medidas de protección adecuadas y eficientes para proteger dichos cuerpos de agua, motivo por el cual se requiere que el Consorcio lo actualice e incluya dichas medidas, teniendo en cuenta las explicaciones técnicas que sobre el particular ha presentado la ANLA dentro de estas mesas de trabajo. También deben presentar nuevamente las solicitudes de permisos ambientales o en*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 282 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

*su defecto, pedir la reactivación de dichos trámites, que están suspendidos. Interviene el Consorcio Perimetral para manifestar que requieren que se aclare o precise por parte de la Corporación, un artículo que han incluido en unos actos administrativos, referidos a la necesidad de no intervenir los 100 metros a la redonda de los nacederos. Señala la directora de Corporinoquía que ellos no podrían pronunciarse, si el consorcio no presenta la solicitud, lo cual es reiterado por el Viceministro de Ambiente y por la Procuraduría, ya que las actuaciones ambientales son a solicitud de parte."*

(...)

Lo anterior es objeto de discusión en el Tribunal de Arbitramento Internacional el cual lleva en su encargo la resolución de las diferencias y/o los hechos objeto de discusión.

Finalmente, con fecha de 19 de diciembre 2024, el Laudo profirió, de manera parcial, resuelve, en el cual enuncio en su numeral 9 lo siguiente:

**"Estima fundada** la pretensión subsidiaria de la ANI sobre Terminación Anticipada y declara la terminación del Contrato. **La Terminación Anticipada es acogida** en virtud de lo dispuesto en la Sección 14.1(e) del Contrato de Concesión, pero sobre la base de una causa imputable a la ANI al no haber detectado oportunamente los manantiales. Asimismo, la mala fe de la ANI implicó que transcurrieran los 730 días sin llegar a acuerdos para la superación del EER de las UFs 4 y 5, y que el Proyecto resultara inviable. Se declara la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la fecha de la notificación de este Laudo;"

Conforme a lo anterior, se declara la terminación anticipada del Contrato de Concesión; En tal sentido será la ultima vez objeto de reporte en el informe del área ambiental.

Ver Anexo: EER 01082018

#### 9.4.3 SEGUIMIENTO ATROPELLAMIENTO DE FAUNA.

En el periodo de marzo de 2025 el concesionario no reporto eventos, se han reporta nueve accidentes desde enero 2024 a la fecha así: dos en el mes de marzo, tres en el mes de abril, cuatro en el mes junio, dos en el mes de julio, uno de octubre y uno de noviembre 2024.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 283 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 9.4.4 SEGUIMIENTO POR MEDIO DE REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO

A continuación, se relacionan las mesas de trabajo, reuniones y visitas de obra en las cuales el Área Ambiental de la Interventoría participó:

**Tabla 181 Reuniones y/o Mesas de Trabajo**

| FECHA    | ACTIVIDAD                                           | PARTICIPANTES |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 27-03-25 | Coordinación de mesa de trabajo Etapa de Reversión. | ERS-POB       |

Fuente: Elaboración Propia

#### 9.5 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AMBIENTAL TRAMITADA EN EL PERIODO

A continuación, se relaciona las comunicaciones emitidas por la interventoría durante el periodo. Ver a continuación:

**Tabla 182 Comunicaciones ambientales emitidas por la interventoría.**

| FECHA      | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                | DESTINATARIO |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5/03/2025  | CERS-OP-0376-2025  | Respuesta al PQRS – Manejo inadecuado de aceites – Rad 20254090245062. Monitoreo Derecho de vía Talud Arrayanes                                                                                                                                       | ANI          |
| 12/03/2025 | CERS-OP-0422- 2025 | Respuesta al Comunicado Alcance D-155-2025 de Asunto: Notificación movimiento subcuenta ambiental – Actividades de mantenimiento de 6.242 árboles correspondientes a la Etapa 2 del Plan Único de Compensaciones. Res. DJUR No. 0463 del 25-AGO-2022  | POB          |
| 12/03/2025 | CERS-OP-0423- 2025 | Respuesta al Comunicado Alcance D-156-2025 de Asunto: Notificación movimiento subcuenta ambiental – Actividades de mantenimiento de 20.310 árboles correspondientes a la Etapa 1 del Plan Único de Compensaciones. Res. DJUR No. 0463 del 25-AGO-2022 | POB          |
| 12/03/2025 | CERS-OP-0424- 2025 | Respuesta al Comunicado Alcance D-202-2025 de Asunto: Notificación movimiento subcuenta ambiental – Establecimiento de 2.103 árboles correspondientes a la Etapa 2 del Plan Único de Compensaciones. Res. DJUR No. 0463 del 25-AGO-2022               | POB          |
| 12/03/2025 | CERS-OP-0425- 2026 | Respuesta al Comunicado Alcance D-200-2025 de Asunto: Notificación movimiento subcuenta ambiental – Actividades de mantenimiento de compensaciones ambientales por                                                                                    | POB          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 284 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| FECHA      | CONSECUTIVO        | ASUNTO                                                                                                                                                       | DESTINATARIO |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |                    | permisos de aprovechamiento forestal de las UF2 y UF3A en el periodo Junio de 2024 a Enero de 2025 y recibo/cierre de compensación Corpoguavio UF2           |              |
| 19/03/2025 | CERS-OP-0426- 2026 | Respuesta al D-176-2025 Asunto: (...) Solicitud de Cumplimiento de la Cláusula 2.6 "Indemnidad" del Apéndice Técnico 6 del Contrato de Concesión 002 de 2014 | POB          |
| 18/03/2025 | CERS-OP-0453- 2026 | Solicitud de Mayor Gestión ante la CAR para Modificación de Permiso de Ocupación de Cauce – Teusacá - EXP 64682                                              | POB          |

Fuente: Elaboración Propia

Anexo: CERS-02-2025

## 9.6 COSTOS ASOCIADOS A LA SUBCUENTA AMBIENTAL

En cuanto a los costos asociados a la subcuenta de las compensaciones ambientales, se han realizado 26 movimientos: A continuación, el detalle:

**Tabla 215 Movimientos de la subcuenta ambiental.**

| Numero | UF        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                            | FECHA  | TOTAL            |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1      | 3B, 4 y 5 | Es el resultado del convenio suscrito entre CORPORINOQUÍA y el Concesionario mediante acta de concertación del 09 de noviembre de 2017 y del cual se generó pago el pago el 18 de diciembre/18. <b>Ver nota 1</b>        | 2017   | \$ 2.533.090.084 |
| 2      | 1 y 2     | Pago a terceros por servicio de reforestación.                                                                                                                                                                           | abr-19 | \$ 217.531.749   |
| 3      | 1, 2 y 3A | Plantación, mantenimientos e informes de seguimiento Res. 1004/2015, Res 2604/2015, Res 1003/2015, Res 1003/2015, Res 1211/2016, Res 2648/2015, Res 250/2018, Res 232/2018, Res 0720/2018, Res 1211/2016, Res 2633/2015. | jun-21 | \$ 37.547.142    |
| 4      | 2 y 3A    | Pago a terceros por servicio de reforestación.                                                                                                                                                                           | feb-22 | \$ 13.923.928    |
| 5      | 3B        | Establecimiento, seguimiento y monitoreo de las compensaciones ambientales en la UF3B. Autorización 900.03.17.02 de 17 de mayo de 2017 y Autorización 800.5.1.18.003 de 11 de septiembre de 2018                         | mar-22 | \$ 29.662.308    |
| 6      | 1, 2 y 3  | Devolución pagos por medidas de manejo de resoluciones de levantamiento de veda                                                                                                                                          |        | \$ 84.222.026,00 |
| 7      | 2 y 3A    | Pago a terceros por servicio de reforestación.                                                                                                                                                                           | ago-22 | \$ 44.384.512    |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 285 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Numero | UF       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA  | TOTAL              |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 8      | 2 y 3    | Banco Municipal de Agua Res. DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22 (Art. 1 y Art. 2) - Mantenimiento y siembra de compensaciones por permisos de aprovechamiento forestal.                                                                           | dic-22 | 183.307.900,00     |
| 9      | 1,2 y 3  | Banco Municipal de Agua Res. DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22 (Art. 1 y Art. 2) Pago de predio adquirido 1 y 2 - Estudios y Diseños Etapa 3 y 4.                                                                                                | mar-23 | \$ 589.924.358,07  |
| 10     | 1, 2 y 3 | Mantenimiento de las Resoluciones 0250 de 2018, Resolución 0720 de 2018, Resolución 0545 de 2018, Resolución 1055 de 2021, Resolución 0149 de 2019 Resolución 0147 de 2018, IT 01091000011 de 2020, CMGRD 0167 de 2020 y Resolución 0033 de 2022. | jul-23 | \$ 26.875.268,00   |
| 11     | 1, 2 y 3 | Siembra individuos arbóreos Nativos Resolución DGEN No.20227000463 del 25 AGO 22                                                                                                                                                                  | oct-23 | \$ 390.133.861,00  |
| 12     | 1,2 Y 3  | Banco Municipal de Agua Res DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22 HITO 1                                                                                                                                                                             | nov-23 | \$ 364.855.564,00  |
| 13     | 1,2 Y 3  | Banco Municipal de Agua Res DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22 HITO 2                                                                                                                                                                             | nov-23 | \$ 743.389.826,00  |
| 14     | 1,2 Y 3  | SIEMBRA INDIVIDUOS ARBOREOS NATIVOS RESOLUCION DGEN No. 20227000463 DEL 25-AGOS-22                                                                                                                                                                | dic-23 | \$ 776.353.675,00  |
| 15     | 1,2 Y 3  | Banco Municipal de Agua Res DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22 HITO 3                                                                                                                                                                             | ene-24 | \$1.366.658.578,92 |
| 16     | 3        | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACION DE 891 ARBOLES EN LA UF3                                                                                                                                                                                  | jul-23 | \$1.521.144        |
| 17     | 1 2 3    | Reembolso gastos notariales predio del BAMA                                                                                                                                                                                                       | Abr-23 | \$4.175.100,00     |
| 18     | 1 2 3    | Plan de compensaciones etapa 1 - aprobado mediante rad. Car 01232018215 del 28-sep-2023 - res. Djur 0034 del 12-mar-2024 lote 1 - macadamia, lote a - la selva                                                                                    | May-24 | \$139.537.125,25   |
| 19     | 1 2 3    | Mantenimiento #1 cuatrimestral por arbol - bosques de granada y cayundá, la calera, cundinamarca                                                                                                                                                  | May-24 | \$ 11.475.200,00   |
| 20     | 1 2 3    | Siembra individual arboreos nativos resolución dgen no. 20227000463 del 25-ago-22- acta 4 - unidad funcional 2.                                                                                                                                   | Jun-24 | \$211.227.230,00   |
| 21     | 1 2 3    | Establecimiento. Siembra de 5.789 árboles en los predios El Dintal, Piedragrande, Familia Venegas y Macadamia (Fase 2). Etapa 1                                                                                                                   | Jul-24 | \$ 476.853.724,00  |
| 22     | 1 2 3    | Cjv-700-2023-contrato llave en mano que incluye la construcción, llenado, puesta en marcha y entrega de las obras al municipio de                                                                                                                 | Jun-24 | \$ 193.546.414,70  |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 286 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Numero       | UF    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA    | TOTAL                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|              |       | la calera y la corporación autónoma regional de cundinamarca (car) de acuerdo con los términos de referencia bamas de la car. acta numero 4                                                                                                                                   |          |                             |
| 23           | 1 2 3 | Cjv-700-2023-contrato llave en mano que incluye la construcción, llenado, puesta en marcha y entrega de las obras al municipio de la calera y la corporación autónoma regional de cundinamarca (car) de acuerdo con los términos de referencia bamas de la car. acta numero 5 | Jun-24   | \$ 799.321.304,92           |
| 24           | 1 2 3 | Siembra de individuos arbóreos por compensación servicio ambiental etapa 3 fase 1                                                                                                                                                                                             | Sep-2024 | \$ 152.624.896,00           |
| 25           |       | Reintegro de costos y gastos gestión predial - BAMA correspondientes al periodo Enero, en virtud del acuerdo de mandato sin representación, fondo rotatorio.                                                                                                                  | Mar-2024 | \$ 825.457,00               |
| 26           |       | Siembra de individuos arbóreos por compensación por Establecimiento de 8.077 árboles)                                                                                                                                                                                         | Ene-2025 | \$ 291.191.953,00           |
| 27           |       | Notificación movimiento subcuenta ambiental – SEXTO HITO DE PAGO de la Etapa de Construcción del BAMA – Res. DGEN No. 0463 del 25-AGO-22 (Aprobado mediante Radicado CAR 20232005578 (Rad. Interno R-403-2023) del 08 de febrero de 2023)                                     | Feb-2025 | \$ 340.116.238,84           |
| <b>TOTAL</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>\$ 10.024.276.567,70</b> |

Fuente: elaboración Propia.

**Nota 1 :** El Convenio con Corporinoquia, correspondiente al movimiento 1, se suscribió mediante #100-15-17-044 en el 2017, el cual tiene concepto de cabal cumplimiento mediante RS 300.36.22.1254 del 31 de agosto 2022 en su artículo 5 – a la fecha se encuentra cerrado.

En el periodo se dio la notificación de la fiducia del movimiento de febrero de conformidad al movimiento 27. En lo referente al porcentaje de ejecución de los recursos, el presupuesto contractual constante con corte de diciembre de 2012 es de \$30.545.176.956; y utilizando en mismo método de referencia (12-2012) al momento se han ejecutado \$ 6.253.066.818,34 correspondiente al 20.472% de avance en la ejecución presupuestal. Se adjunta el Ejercicio en el anexo: cuadro de control del porcentaje de avance.

La trazabilidad se encuentra en el anexo: Relación de movimientos subcuenta 0325.xlsx

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 287 de 591</b>                   |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 9.7 CONCLUSIONES

- La interventoría ejerció un seguimiento riguroso a las obligaciones ambientales del concesionario, destacándose la revisión del Informe Trimestral Ambiental, la atención a PQRS, y la verificación de actividades relacionadas con compensaciones ambientales, asegurando el cumplimiento normativo y contractual del proyecto.
- La interventoría impulsó el cumplimiento del Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con énfasis en la recuperación de áreas verdes impactadas, especialmente en sectores sensibles como Teusacá y Curvas del Guarapo, reafirmando su rol como garante del componente ambiental en el desarrollo del proyecto.
- Frente al incumplimiento en la entrega de los registros de calidad asociados a los en los Informes Trimestrales #35 al #40, la interventoría ha mantenido una labor constante de requerimiento al concesionario. En este sentido, de cara a la etapa de reversión del proyecto, se solicitará el cumplimiento contractual de esta obligación como parte de la liquidación, asegurando que no se trasladen pasivos o vacíos de información que comprometan la trazabilidad y evaluación del desempeño ambiental del proyecto.
- El Laudo el 19 de diciembre de 2024, declaró la terminación anticipada del Contrato de Concesión, fundamentada en no haber detectado oportunamente los manantiales, lo que imposibilitó alcanzar la ejecución del proyecto en las UF4 Y 5 y posteriormente obtener un acuerdos para superar el Evento eximente de Responsabilidad (EER) de las Unidades Funcionales 4 y 5. Ante este escenario, el Área Ambiental de la Interventoría se encuentra atenta a las disposiciones contractuales para garantizar el adecuado cierre del proyecto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 288 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 9.8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 9.8.1 OBJETIVO

Construcción - 6.4.2. Interventoría Etapa de Operación y Mantenimiento: Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario del programa de higiene y seguridad industrial e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST- la ejecución del Contrato de Concesión. Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo por los contratistas y Concesionario.

### 9.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decreto, resoluciones, normas, manuales y guías de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
- Verificar el cumplimiento en los pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas, Concesionario y la Interventoría.
- Describir las actividades de SST que desarrollaron durante el periodo evaluado; las cuales se encuentran divididas por componentes y programas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción SST de la Interventoría y de los contratistas, junto con lo establecido en el programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del Concesionario, contratistas y el seguimiento a estas por parte de la Interventoría.

### 9.8.3 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE 2025

Los soportes de las planillas de pago seguridad social integral como (EPS, AFP, ARP, CCF).

Se verificaron en las fechas establecidas, de acuerdo con la ley Decreto 1990 de 2016.

Para el personal de la Interventoría como también de los contratistas se revisa la seguridad social que se encuentre vigente a la fecha del presente informe y de la gestión realizada en las fechas establecidas. En los casos de inspecciones rutinarias en las unidades funcionales la Interventoría ha solicitado los comprobantes de seguridad social a la Concesión cuando se presenta personal nuevo en los frentes de obra.

### 9.8.4 ACTIVIDADES Y RECORRIDO RUTINARIO DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

En el presente periodo del informe, esta Interventoría realizó recorrido, donde se revisaron áreas de trabajo, vehículos, documentos, procedimientos que se encontraban realizando los trabajadores y contratistas en las distintas unidades funcionales de la perimetral oriental de Bogotá a cargo de la Concesión.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 289 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- **Lunes 03 de marzo de 2025:** Se realiza recorrido rutinario de inspección de seguridad para revisar trabajos en las unidades funcionales UF2B, Sector Puente Teusacá, Talud Tilat y UF5.
- **Lunes 10 de marzo de 2025:** Se realiza recorrido rutinario de inspección de seguridad para revisar trabajos en las unidades funcionales UF2B, Sector Puente Teusacá y Talud Tilatá. En la tarde se realiza pausas activas, estiramiento de miembros superiores e inferiores con el personal que se encuentra en la oficina.
- **Miércoles 12 de marzo de 2024:** Se realiza recorrido de inspección de seguridad rutinario para revisar trabajos en las unidades, Sector Choachí, y UF5 Cáqueza. Se verifican condiciones de seguridad actos y condiciones en el área del Centró de Control por la Concesión en Choachí se revisan vehículos como son botiquín de primeros auxilios, extintores, kit para atención de derrames, kit de herramientas.
- **Viernes 14 de marzo de 2025:** Se realiza recorrido de inspección de seguridad rutinario para revisar trabajos en las unidades, Sector Choachí, y UF5 Cáqueza.
- **Miércoles 19 de marzo de 2025:** Se realiza una mesa de trabajo con la profesional de Seguridad y Salude en el Trabajo de la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogota para revisar hallazgos y observaciones, dejando como acta #8.
- **Viernes 20 y 21 de marzo de 2025:** Se realiza mediciones higiénicas por parte de la ARL Bolívar en la oficina y parte operativa.
- **Viernes 21 de marzo de 2025:** Se realiza recorrido rutinario de inspección de seguridad para revisar trabajos en las unidades funcionales UF3B Choachí y UF5 Cáqueza. Se verifican condiciones de seguridad actos y condiciones en el área del Centró de Control por la Concesión en Choachí se revisan vehículos como son botiquín de primeros auxilios, extintores, kit para atención de derrames, kit de herramientas.
- **Jueves 27 de marzo de 2025:** Se realiza recorrido rutinario de inspección de seguridad para revisar trabajos en las unidades funcionales 1B y UF2B.
- **Viernes 28 de marzo de 2025:** En la tarde se realiza pausas activas, estiramiento

#### **Otras actividades.**

- Se enviaron comunicados vía correo y cartas de forma digital a la Concesión, cuando se evidencian hallazgos para que emitan los respectivos cierres a las observaciones si hay reportes por esta Interventoría.
- Se inspecciona actividades ejecutadas en las Unidades Funcionales como son; Macadamia, Talud Tilatá, Lucky Bamboo, Arrayanes y otras actividades temporales sobre las vías.

Se realizaron inspecciones como:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 290 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                                                         |                                                        |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Reporte diario inspecciones y actividades diarias en la plataforma Dash board - CRONOS                  | ¿ Otro ?<br>Especifique en la sección de "ACTIVIDADES" | 1-31 Mar 2025                  | oficina sopo                  |
| Inspección de vehículos Consorcio Interventor ERS LNN069 Y LNN942                                       | Seguridad vial                                         | 1-31 Mar 2025                  | oficina sopo                  |
| Inspección de extintores de la oficina Sopo y camionetas.                                               | Emergencias                                            | 27-mar-25                      | oficina sopo                  |
| Inspección recorrido de seguridad sectores Unidades Funcionales Perimetral Oriental de Bogota           | ¿ Otro ?<br>Especifique en la sección de "ACTIVIDADES" | 3,6,10,12,14,21,27,28 mar 2025 | Tilatá, Lucky Bamboo,Choachi. |
| Envío mantenimiento a los dos vehículos por hallazgo en las ruedas.                                     | Seguridad vial                                         | 11-mar-25                      | Taller mecánico               |
| Generación de hallazgo de los recorridos realizados en el formato OI-F-34-01                            | ¿ Otro ?<br>Especifique en la sección de "ACTIVIDADES" | 25-mar-25                      | Unidades Funcionales          |
| Generación de informe mensual para ANI                                                                  | ¿ Otro ?<br>Especifique en la sección de "ACTIVIDADES" | 7-mar-25                       | oficina sopo                  |
| Mediciones Higiénicas en la oficina y parte operativa sobre, luz, iluminación, ruido y partículas.      | Actividades ejecutadas por ARL                         | 21-mar-25                      | oficina sopo                  |
| inspección de botiquines y suministro de elementos a los botiquines de las dos camionetas de la empresa | Emergencias                                            | 27-mar-25                      | oficina sopo                  |
| Masajes de relajación muscular al personal de la Interventoria                                          | Actividades ejecutadas por ARL                         | 27-mar-25                      | oficina sopo                  |
| Pausa activa estiramiento de miembros superiores e inferiores                                           | ¿ Otro ?<br>Especifique en la sección de "ACTIVIDADES" | 13,25 marzo 2025               | oficina sopo                  |

- Se realiza recorridos a las instalaciones del Concesionario como son la Base sur (Choachí), Centro de Control de Operaciones (CCO), Área de Servicio (ADS). Básculas y Peajes.
- Seguimiento a las normas de seguridad vial y cumplimiento de los planes de manejo de tránsito en las actividades de operación y mantenimiento en algunas Unidades Funcionales ejecutadas por la Concesión y sus contratistas.
- Se supervisa la actividad en trabajo en alturas por el contratista como Mantenimiento Vial del meta en el área de Arrayanes., actividad de instalación de plástico en el talud con uso de maquina Man Lift.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p>                                                                     |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p> <p align="center"><b>Página 291 de 591</b></p> <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p> |

- Se realiza mesa de trabajo junto con el área de seguridad industrial de la Concesión, donde a la fecha se cuenta con las actas:

Acta numero 1 con fecha 10 de mayo de 2023.  
Acta número 2 con fecha 20 de junio de 2023.  
Acta número 3 con fecha 04 de julio de 2023.  
Acta número 4 con fecha 23 de octubre de 2023.  
Acta numero 5 con fecha 6 de febrero de 2024.  
Acta numero 6 con fecha 4 de abril de 2024.  
Acta numero 7 con fecha 25 de junio de 2024.  
Acta numero 8 con fecha 19 de marzo de 2025.

Se tiene programado próxima mesa de trabajo para el día 19 de junio de 2025.

- Se Inspecciono vehículos como ambulancias, carro taller, vehículo de vigilancia, camión grúa con plataforma, cama baja, vehículos de operación y mantenimiento de la Concesión y maquinaria amarilla.
- Se verifican los informes remitidos a esta Interventoría por la Concesión de los respectivos meses de la gestión realizada en SG SST para validación verificación y seguimiento.
- Se participa o se ejecuta capacitaciones o charlas en temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

### 9.8.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO HSE.

**Imágenes 9. Gestion de seguridad del mes.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 292 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |



Fuente. Elaboración Propia

#### 9.8.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR COVID-19

Para prevención de la propagación del Covid-19 Consorcio Interventor ERS, se anexan copia de los carnés de vacunas, se realiza los protocolos de bioseguridad dentro y fuera de lugar de trabajo.

Para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad Interventoría ha realizado visitas a grupos de trabajo donde se revisa el cumplimiento de las medidas preventivas frente a Covid 19, verificando los siguientes:

- A. Lineamientos para el uso adecuado del tapabocas en lugares donde hay agrupación de personas.
- B. Lineamientos para el lavado de manos (Desinfección).
- C. Ingreso y salida del personal, lavado de manos, desinfección de ropa, Distanciamiento social, cuando el personal se encuentre con síntomas de gripa y disposición final de los elementos de bioseguridad.

En el informe se evidencia que el Concesionario realiza cumplimiento al protocolo de bioseguridad establecido normativamente para minimizar la propagación del Covid-19, realizando actividades de desinfección, lavado de manos, control de vacunas, capacitación en temas de prevención de riesgo biológico.

Actualmente se tiene vigente la **Resolución 555 del año 2023** fecha publicada (05 abril 2023), donde menciona que se tendrá vigente la aplicación de las medidas de seguridad frente a Covid-19 en Instituciones prestadores de servicio de salud y hogares geriátricos.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 293 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Figura 60 . Norma de Alcaldía Mayor de Bogotá**

| RESUELVE                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artículo 1. Uso del tapabocas.</b> El uso del tapabocas será obligatorio para ingresar a instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriátricos.                                                           |
| Se recomienda el uso de tapabocas para las personas de 60 años en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresión, así como las que presentan síntomas respiratorios.                                               |
| <b>Artículo 2. Medidas de autocuidado.</b> Corresponde a cada persona propender por el cuidado de sí mismo, evitando el contacto con quienes pudieren estar en situaciones de riesgo para la transmisión del virus COVID 19. |
| <b>Artículo 3: Vigencia y derogatoria.</b> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 1238 de 2022.                                                                           |
| PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE                                                                                                                                                                                                        |
| Dada en Bogotá, D.C., a los <b>05 ABR 2023</b>                                                                                                                                                                               |
| Fuente. Página Alcaldía Mayor de Bogota<br><a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=139697">https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=139697</a>                             |

En el comunicado anexo en la carpeta (- Anexo 5. Protocolo de bioseguridad), radicado a esta Interventoría por la numero radicado ANI 20236030000254, fecha 30 de mayo de 2023, asunto; Modulo Covid en ANISCOPIO. Menciona lo siguiente;

*“ Dado que el Gobierno Nacional, a través de la Resolución 666 del 2022, dispuso el fin de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica nacional a partir del 30 de junio del 2022, desde esta Agencia se manifiesta que **no se continuará solicitando el reporte del módulo “Reportar Covid-19” en Aniscopio**” (se resalta con negrilla).*

Por parte de la Interventoría se seguirá implementando medidas para la mitigar eventos de enfermedades respiratorias, por lo que se entrega a los trabajadores, información correspondiente y capacitaciones para evitar la propagación del virus.

## 9.8.7 LISTADO DE RADICADOS HSE

**Tabla 183 Lista de radicados por el area HSE**

| N° | LISTADO DE RADICADOS HSE                                                                            | FECHA DE COMUNICADO | DIRIGIDA A: | CON COPIA: |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1  | CERS-OP- 259-2023 POB Hallazgos y oportunidades de mejora Gestión HSE Concesionario POB (1)         | 27-ene-23           | POB         | ANI        |
| 2  | CERS-OP -337-2023 POB Observaciones informe HSE Diciembre POB                                       | 6-feb-23            | POB         |            |
| 5  | CERS-OP- 470- 2023 POB Observaciones informe HSE enero POB                                          | 23-feb-23           | POB         | ANI        |
| 3  | CERS-OP- 517- 2023 POB Hallazgos y oportunidades de mejora Gestión HSE Concesionario POB, visita de | 28-feb-23           | POB         | ANI        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 294 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| N° | LISTADO DE RADICADOS HSE                                                                                                                                         | FECHA DE COMUNICADO | DIRIGIDA A: | CON COPIA: |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|    | inspección realizada 20-02-2.023 y 21-02-2.023 en UF2B – CCO y UF3B-Base Sur                                                                                     |                     |             |            |
| 4  | CERS-OP-534- 2023 POB Novedades recorrido inspección HSE PR 7+500 ruta nacional 5009 UF3A Curva el Guarapo y Centro de Control Operacional POB                   | 2-mar-23            | POB         | ANI        |
| 6  | CERS-OP-813-2023 POB Respuesta hallazgos y oportunidades de mejora Gestión HSE Concesionario POB, al comunicado D-453-2023 del CERS-OP- 517-2023. _              | 29-mar-23           | POB         | ANI        |
| 7  | CERS-OP-822-2023 POB Hallazgos incumplimiento normas de Seguridad Industrial y Plan de Manejo de Tráfico (PMT) - trabajadores POB – UF2B 15+350 Sector Macadamia | 29-mar-23           | POB         | ANI        |
| 8  | CERS-OP-911-2023 POB Hallazgos Maquinaria - Contratista AYC– UF4 PR32                                                                                            | 12-abr-23           | POB         | ANI        |
| 9  | CERS-OP-1449-2023 POB Hallazgos Inspección de vehículos POB, Contratistas Serijima, CJV Señalización y Seguridad Vial S.A.S. PMT de UF2                          | 30-may-23           | POB         | ANI        |
| 10 | CERS-OP-1459-2023 POB Nuevamente Observaciones al comunicado D-757-2023 POB novedad Sector Macadamia                                                             | 30-may-23           | POB         | ANI        |
| 11 | CERS-OP- 1522- 2023 POB Hallazgos Contratista A&C de UF5, PR25 Sector Kendall                                                                                    | 2-jun-23            | POB         | ANI        |
| 12 | CERS-OP- 1555-2023 ANI ERS. Respuesta al Plazo de Cura otorgado mediante ANI 20233060155861 MPG jf WFPG060623 compilado-                                         | 6-jun-23            | POB         | ANI        |
| 13 | CERS-OP-1687-2023 POB Hallazgos HSE Peajes y Basculas Concesionario                                                                                              | 20-jun-23           | POB         | ANI        |
| 14 | CERS-OP-1738-2023 POB Hallazgos Inspección de vehículos Perimetral Oriente de Bogotá- S.A.S., 21 y 23 de junio2023                                               | 27-jun-23           | POB         | ANI        |
| 15 | CERS-OP-1790-2023 ANI ERS. Gest validación información doc anexos remitido POB a CI4G RespcomCP-PER-10952C-2022 -                                                | 30-jun-23           | POB         | ANI        |
| 16 | CERS-OP-2060-2023 POB Hallazgos Inspección de seguridad, Área de Servicio, Centro de Control de Operación y Base Sur Choachí - julio2023                         | 27-jul-23           | POB         | ANI        |
| 17 | CERS-OP-2131-2023 POB Hallazgos Inspección de seguridad, 28 jul Área de Servicio                                                                                 | 28-jul-23           | POB         | ANI        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 295 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| N° | LISTADO DE RADICADOS HSE                                                                                                                                              | FECHA DE COMUNICADO | DIRIGIDA A: | CON COPIA: |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 18 | CERS-OP-2308-2023 POB Pendiente respuesta observaciones por hallazgos HSE Concesión                                                                                   | 17-ago-23           | POB         | ANI        |
| 19 | CERS-OP-2606-2023 POB Observaciones Informe mensual SST Concesión POB N°99, del 25 de julio al 25 de agosto de 2.023, del oficio D-1263-2023 wfp_d5bb84c02f55d057cf4c | 14-sep-23           | POB         | ANI        |
| 20 | CERS-OP-2675-2023 POB Verificación de Memorias Técnicas UF2 V2, UF3 V3 del año 2022 -                                                                                 | 20-sep-23           | POB         | ANI        |
| 21 | CERS-OP- 2683-2023 POB Hallazgos SST Inspección recorrido UF2B y UF3A jueves 14 de septiembre WFPG 21 09                                                              | 21-sep-23           | POB         | ANI        |
| 22 | CERS-OP-2811-2023 POB Observaciones Informe mensual SST 03 10 WFP-                                                                                                    | 3-oct-23            | POB         | ANI        |
| 23 | CERS-OP-3258-2023 POB HALLAZGOS SST 9 NOV 2023                                                                                                                        | 10-nov-23           | POB         | ANI        |
| 24 | CERS-OP-3399-2023 POB Curvas del Guarapo PR7+500 UF3A TEKMAN líneas eléctrica                                                                                         | 29-nov-23           | POB         | ANI        |
| 25 | CERS-OP-3400-2023 POB Respuesta D-1727-2023 Memoria Técnica agosto de 2023. 291123. nov                                                                               | 28-nov-23           | POB         | ANI        |
| 26 | CERS-OP-3497-2023 POB Hallazgo Insp seguridad Curvas el Guarapo, BAMA y Puente Teusacá, TEKMAN                                                                        | 5-dic-23            | POB         | ANI        |
| 27 | CERS-OP-065-2024 POB Hallazgos sector Puente Teusacá PR11+300                                                                                                         | 5-ene-24            | POB         | ANI        |
| 28 | CERS-OP-338-2024 POB Hallazgo Insp seguridad UF2B y UF3A - 05 Feb 2024                                                                                                | 6-feb-24            | POB         | ANI        |
| 29 | CERS-OP-1069-2024 POB Hallazgo SST Curvas el Guarapo UF3A                                                                                                             | 23-abr-24           | POB         | ANI        |
| 30 | CERS-OP-1218-2024 POB Pendiente respuesta por hallazgo SST Curvas el Guarapo UF3A-                                                                                    | 14/05/2024          | POB         | ANI        |
| 31 | CERS-OP-1129-2024 POB Requerimiento hallazgo suceso lunes 13.05 sector Peaje la Cabaña                                                                                | 21/05/2024          | POB         | ANI        |
| 32 | CERS -OP-1553-2024 POB Pendiente respuesta a la investigación y medidas correctivas de acuerdo comunicado D-759-2024                                                  | 19/06/2024          | POB         | ANI        |
| 33 | CERS-OP-2081-2024 POB Incumplimiento normas de seguridad sector Tilatá                                                                                                | 15/08/2024          | POB         | ANI        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 296 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| N° | LISTADO DE RADICADOS HSE                                                                                                                            | FECHA DE COMUNICADO | DIRIGIDA A: | CON COPIA: |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 34 | CERS-OP-2245-2024 POB hallazgos condiciones de seguridad sector Tilatá contratista Civitech                                                         | 12-sep-24           | POB         | ANI        |
| 35 | CERS-OP-2427-2024 Hallazgos contratista CTU – UF1B. Actividad de micro fresado y aplicación de asfalto                                              | 12-oct-24           | POB         | ANI        |
| 36 | CERS-OP-2459-2024 Hallazgos UF3A. Sec Tilatá Actividad de perforación y excavación de zanjas de coronación. Campamento                              | 17-oct-24           | POB         | ANI        |
| 37 | CERS-OP-2527-2024 Hallazgos recorrido Base Sur, CCO inspección vehículos, UF1B octubre                                                              | 30-oct-24           | POB         | ANI        |
| 38 | CERS-OP-2677-2024 Reporte Hallazgos y Comunicados pendientes por respuesta VISITA base SUR SST                                                      | 26- nov-2024        | POB         | ANI        |
| 39 | CERS-OP-2810-2024 Reporte hallazgos SST, pendientes por cierre. sector Talud Tilatá, Puente Teusacá II -19 diciembre 2024                           | 20- dic-2024        | POB         | ANI        |
| 40 | CERS-OP-0121-2025 Reporte hallazgos SST, Hallazgo Trabajos LUCKY BAMBOO - PR1+200 - UF3A -24 enero de 2025                                          | 24-ene-25           | POB         | ANI        |
| 41 | CERS-OP-0174-2025 Novedad Talud Tilatá- PR2+700 - UF3A -03 febrero de 2025                                                                          | 3-feb-25            | POB         | ANI        |
| 42 | CERS-OP-0216-2024 Pendiente entrega informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N°116 - periodo 25 Diciembre 2024 al 25 de Enero de 2025. | 10-feb-25           | POB         | ANI        |
| 43 | CERS-OP-2459-2024 POB Hallazgos SST UF3A. Sec Talud Tilatá                                                                                          | 17-feb-25           | POB         | ANI        |
| 44 | CERS-OP-0216-2024 POB Pendiente Entrega Informe Gestión Seguridad y Salud Trabajo N°116 Diciembre 2024                                              | 10-feb-25           | POB         | ANI        |
| 45 | CERS-OP-0345-2025 Posible contaminación en zona verde, sector Arrayanes. Queja por ciudadana                                                        | 28-feb-25           | POB         | ANI        |
| 46 | CERS-OP-0348-2025 Hallazgo novedad actos inseguros por trabajador, incumplimiento a normas de Seguridad Industrial, sector Talud Tilatá.            | 28-feb-25           | POB         | ANI        |
| 47 | CERS-OP-0396-2025 Pendiente entrega informe de Gestión de SST N°116 y N°117 – POB., periodo Ene-Feb 2025                                            | 17-mar-2025         | POB         | ANI        |

Fuente. Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 297 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 9.8.8 HALLAZGOS

Se anexa en la carpeta **(- Anexo 6. Hallazgos POB)** los hallazgos evidenciados en las actividades de mejoramiento, rehabilitación y construcción desarrollados por la concesionaria y contratistas durante el recorrido rutinario de inspección de seguridad en las distintas Unidades Funcionales de la Perimetral Oriental de Bogotá, esta Interventoría, durante el periodo del presente informe a generado distintos comunicados a la concesión para que generen los respectivas acciones correctivas y sean reportadas en su momento para el cierre de los casos.

Lista de anexos de hallazgos ABIERTOS hasta la fecha del presente informe por la Concesionaria Perimetral Oriente de Bogotá y Contratistas:

**Tabla 184 Lista hallazgos pendientes por respuesta de la Concesión**

| N° | HALLAZGOS PENDIENTES POR RESPUESTA DE LA CONCESIÓN                                                                                                                                  | OBSERVACIÓN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 22 | 337 CERS-OP-2308-2023 POB Pendiente respuesta observaciones por hallazgos HSE Concesión (17agosto2023)                                                                              | ABIERTO     |
| 49 | Hallazgos recorrido Base Sur, CCO inspección vehículos, UF1B octubre (CERS-OP-2527-2024 Hallazgos recorrido Base Sur, CCO inspección vehículos, UF1B octubre 2024) (31octubre2024). | ABIERTO     |
| 50 | Verificación de Memorias Técnicas agosto 2024 (CERS OP 2530 Verificación de Memorias Técnicas agosto 2024) (31octubre2024).                                                         | ABIERTO     |

Fuente. Elaboración Propia

La Concesión debe reportar a la Interventoría, las acciones correctivas mencionadas en el comunicado remitido por esta Interventoría, en el tiempo establecido y evitar que se sigan presentado observaciones en la ejecución de las actividades por personal directo o contratistas.

### 9.8.9 CAPACITACIONES, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE SEGURIDAD, INDUCCIONES Y CHARLAS DURANTE EL MES.

Para el presente informe se realizaron las siguientes socializaciones al grupo de Interventoría Consorcio Interventor ERS bajo el programa de Momentos de Seguridad por medio de la APP WhatsApp donde se encuentra todo el personal de Interventoría como también Capacitaciones de forma virtual con sus respectivas evaluaciones.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 298 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 185 Lista capacitaciones, inducciones y charlas**

| Nº  | FECHA     | BOLETIN | CAPACITACION | INDUCCION - | ACTIVIDAD | PAUSAS | TIEMPO DE DURACION | CAPACITACIÓN                                                                      |
|-----|-----------|---------|--------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 221 | 7-mar-25  | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 227. PREVENCIÓN LESIONES OSTEOMUSCULARE                                           |
| 222 | 11-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 228. Tarea de alto riesgo SCBA Aparato de respiración autónomo                    |
| 223 | 13-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 229. Tropiezo y caída al bajar escaleras                                          |
| 224 | 14-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 230. Prevención de la fatiga en la conducción                                     |
| 225 | 19-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 231. Generalidades del cáncer ( MDS - MARZO)                                      |
| 226 | 20-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 232. HS weekly case 10032025 Fractura pierna derecha                              |
| 227 | 27-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 233. HS weekly case 28022025                                                      |
| 228 | 27-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 234. momento de seguridad Obstrucción de la vía aérea por un Cuerpo Extraño OVACE |
| 229 | 28-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 235. Prevención riesgo biológico por mordeduras y picaduras (MDS - MARZO)         |
| 230 | 31-mar-25 | X       |              |             |           |        | 15 MIN             | 236. Riesgo Eléctrico                                                             |
| 231 | 20-mar-25 |         | X            |             |           |        | 1 HORA             | causas de siniestralidad en Colombia                                              |
| 232 | 19-mar-25 |         |              |             | X         |        | 1 HORA             | mesa de trabajo#9                                                                 |
| 233 | 17-mar-25 | X       |              |             |           |        | 1 HORA             | socialización estabilización talud Tilatá                                         |
| 234 | 19-mar-25 |         | X            |             |           |        | 1 HORA             | prevención de riesgo psicosocial                                                  |
| 235 | 6-mar-25  |         |              | X           |           |        | 1 HORA             | reinducción HSE Corporativa                                                       |
| 236 | 11-mar-25 |         | X            |             |           |        | 1 HORA             | Trabajos en espacios confinados                                                   |
| 237 | 13-mar-25 |         | X            |             |           |        | 1 HORA             | proyección de partículas - cuidado de los ojos.                                   |
| 238 | 13-mar-25 |         |              |             |           | x      | 15 MIN             | Pausa activa estiramiento de miembros superiores e inferiores                     |
| 239 | 25-mar-25 |         |              |             |           | x      | 15 MIN             | Pausa activa estiramiento de miembros superiores e inferiores                     |

Fuente. Elaboración Propia



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 299 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 9.8.10 CANTIDAD DE TRABAJADORES EN LA CONCESIÓN.

Para el siguiente periodo no se cuenta con los datos respecto a la cantidad de trabajadores que participaron en las actividades de trabajo con la Concesión como también los contratistas, por lo que no fue suministrado el informe de Gestión por la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá.

#### 9.8.11 INFRACCIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante las inspecciones de seguridad realizadas por esta Interventoría, se verifican las condiciones del lugar de trabajo, las actividades de los trabajadores, el uso de elementos de protección personal y la documentación requerida, incluyendo permisos de trabajo, ATS, preoperacionales, asistencia a charlas y capacitaciones. Se revisa minuciosamente el cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En el transcurso del año anterior y del presente, se han detectado infracciones a las normas de seguridad industrial. En consecuencia, esta Interventoría ha solicitado a la Concesión que se tomen las medidas correctivas necesarias y se emitan llamados de atención a las personas responsables. Los soportes documentales de estas infracciones se encuentran en la carpeta Anexo 13 (Infracciones en SST).

**Tabla 186 Listado de personal con infraccion a normas de seguridad industrial**

| TRABAJADORES QUE INFRINGIERON LAS NORMAS DE SEGURIDAD |                            |                            |                  |         |                        |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                                                    | NOMBRE COMPLETO            | CARGO                      | NUMERO DE CEDULA | EMPRESA | FECHA DE LA INFRACCIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                               |
| 1                                                     | JORGE LUIS GRIMALDO        | Ingeniero Residente        | 1024571308       | TEKMAN  | 1-feb-23               | No usar los elementos de protección personal                                                                                                                              |
| 2                                                     | SEBASTIÁN MARTÍNEZ CARMONA | Subdirector de obra        | 1053829979       | CJV     | 27-mar-23              | Por permitir que los trabajadores se expongan en actividades que generen riesgos para su salud                                                                            |
| 3                                                     | EDWIN SICHACA JIMÉNEZ      | Cadenero II                | 1015410949       | A&C     | 1-mar-23               | Dentro de la obra sin casco ni carné de identificación, ni botas de seguridad.                                                                                            |
| 4                                                     | SERGIO FELIPE CRUZ ÁVILA   | Residente de Mantenimiento | 1071168225       | POB     | 1-mar-23               | Dentro de la obra sin casco de seguridad                                                                                                                                  |
| 5                                                     | JAROL DAVID NAVEO          | Ayudante de Obra           | 119511913        | TEKMAN  | 4-dic-23               | Trabajador realizando mantenimiento a planta eléctrica hora 9:30am sin diligenciar ATS, ni asistir a charlas de seguridad, no contaba con el preoperacional de la maquina |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 300 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| TRABAJADORES QUE INFRINGIERON LAS NORMAS DE SEGURIDAD |                               |                        |                  |                       |                        |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                                                    | NOMBRE COMPLETO               | CARGO                  | NUMERO DE CEDULA | EMPRESA               | FECHA DE LA INFRACCIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                 |
| 6                                                     | JOAN PUCHE FLÓREZ             | Ayudante               | 5856659          | TEKMAN                | 4-dic-23               | Trabajador realizando actividades en obra hora 12:30am sin diligenciar ATS, ni asistir a charlas de seguridad,                              |
| 7                                                     | GIOVANNY HERNÁNDEZ            | Operario de Maquinaria | 1057410954       | TEKMAN                | 4-dic-23               | Trabajador realizando actividades en obra hora 12:30am sin diligenciar ATS, ni asistir a charlas de seguridad,                              |
| 8                                                     | VARGAS ARAYON LEONARDO        | Ingeniero de Proyectos | 1118534531       | CARCAVA               | 7-feb-24               | TRABAJADOR SIN EL USO DE EPP BOTAS DE SEGURIDAD, CHAQUETA REFLECTIVA.                                                                       |
| 9                                                     | YEFRINZO CRUZ FALLA           | SOLDADOR               | 86060233         | TEKMAN                | 5-mar-24               | Por no firmar los permisos de trabajo antes de iniciar sus labores.                                                                         |
| 10                                                    | BLADIMIR URBIÑA GARRIDO       | AYUDANTE DE OBRA       | 19619129         | TEKMAN                | 5-mar-24               | Por no firmar los permisos de trabajo antes de iniciar sus labores.                                                                         |
| 11                                                    | EZEQUIEL BALLESTA DÍAS        | OFICIAL DE OBRA        | 8829064          | A&C                   | 26-jul-24              | Dotación de otra empresa no de la concesión, ni epp, uso de escalera no certificada trabajos dentro de una cuneta sector curvas el Guarapo. |
| 12                                                    | RAFAEL MEDRANO ASPRILLA       | AYUDANTE               | 1045490143       | SOILING - CIVILTECH   | 10-sep-24              | Trabajador realizando actividades en alturas sin los epcc en la canasta en el talud de Tilatá                                               |
| 13                                                    | SANTIAGO VALENCIA ÁVILA       | AUXILIAR DE OBRA       | 1070327250       | SOILING - CIVILTECH   | 10-sep-24              | Trabajador con aretes y piercing durante la jornada de trabajo                                                                              |
| 14                                                    | MANUEL ANTONIO MURILLO GARZÓN | CONDUCTOR VOLQUETA     | 80432188         | INDUSTRIA URBA S.A.S. | 19-sep-24              | Conductor de volqueta no acato orden por la profesional SST, lo cual por poco ocasiona accidente vial vía Choachí.                          |

Fuente. Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 301 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

#### 9.8.12 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN EL MES.

El informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no cuenta con datos exactos sobre los eventos, ya que el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá no ha suministrado la información requerida, a pesar de las solicitudes realizadas por esta Interventoría en varios comunicados.

El primer comunicado (CERS-OP-0216-2024), radicado el 10 de febrero de 2025, se solicitó la entrega del informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N°116, correspondiente al periodo del 25 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025 y el 7 de marzo de 2025 se radicó el CERS-OP-0396-2025, insistiendo en la entrega de los informes N°116 y N°117, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025.

Esta Interventoría está trabajando para intervenir los hallazgos evidenciados durante las inspecciones rutinarias, tanto para el Concesionario como para los contratistas, con el objetivo de generar un compromiso en el cumplimiento normativo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Tabla 187. Estadística de accidentalidad Personal Interventoria año 2023**

| MES          | ACCIDENTES PRESENTADOS | INCIDENTES PRESENTADOS | TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD | Nº TOTAL TRABAJADORES PERIODO |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| dic-22       | 0                      | 0                      | 0                         | 13                            |
| ene-23       | 0                      | 1                      | 0                         | 13                            |
| feb-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 15                            |
| mar-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 15                            |
| abr-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 15                            |
| may-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 15                            |
| jun-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 15                            |
| jul-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 15                            |
| ago-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 16                            |
| sep-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 16                            |
| oct-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 16                            |
| nov-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| dic-23       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| ene-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b>               | <b>1</b>               | <b>0</b>                  |                               |

**Tabla 188. Estadística de accidentalidad Personal Interventoria año 2024**

| MES    | ACCIDENTES PRESENTADOS | INCIDENTES PRESENTADOS | TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD | Nº TOTAL TRABAJADORES PERIODO |
|--------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ene-24 | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| feb-24 | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| mar-24 | 0                      | 0                      | 0                         | 16                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 302 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| MES          | ACCIDENTES PRESENTADOS | INCIDENTES PRESENTADOS | TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD | Nº TOTAL TRABAJADORES PERIODO |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| abr-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| may-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| jun-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| jul-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| ago-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| sep-24       | 0                      | 1                      | 0                         | 17                            |
| oct-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| nov-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| dic-24       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| <b>TOTAL</b> | 0                      | 1                      | 0                         |                               |

**Tabla 189. Estadística de accidentalidad Personal Interventoria año 2025**

| MES          | ACCIDENTES PRESENTADOS | INCIDENTES PRESENTADOS | TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD | Nº TOTAL TRABAJADORES PERIODO |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ene-25       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| Feb-25       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| Mar-25       | 0                      | 0                      | 0                         | 17                            |
| <b>TOTAL</b> | 0                      | 0                      | 0                         |                               |

Fuente. Elaboración Propia

En cuanto a las intervenciones realizadas por el Consorcio Interventor ERS en las distintas unidades funcionales durante los meses del presente informe, se presenta la siguiente tabla de accidentalidad, que muestra que:

No se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales que generaran incapacidades para el grupo de la Interventoría.

Esta información destaca la importancia de mantener un enfoque preventivo en materia de seguridad laboral y de continuar trabajando para minimizar los riesgos asociados con las actividades de operación y mantenimiento de la malla vial.

## 9.9 CONCLUSIONES

- El Concesionario ejecuta las exigencias y recomendaciones emitidas por esta Interventoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y siempre que se realicen las correcciones necesarias de manera oportuna

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 303 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

- Se concluye, que la concesión no ha remitido la totalidad de documentos hasta el momento del presente informe, no se tiene los datos exactos de los eventos por lo que no fue suministrada la información por la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogota. pese a que se radico comunicado con el consecutivo (CERS-OP-0216-2024 Pendiente entrega informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N°116 - periodo 25 Diciembre 2024 al 25 de Enero de 2025)., radicado el día 10 de febrero de 2025. Y (CERS-OP-0396-2025 Pendiente entrega informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N°116 y N°117 – Concesionaria Perimetral Oriental de Bogota., periodo enero y febrero de 2025). Con fecha de radicado 07 marzo de 2025.
- Los tiempos de respuesta del Concesionario para cerrar los hallazgos son excesivamente largos. Por lo tanto, se les ha informado que, como medida correctiva inmediata, deben revisar y controlar de manera urgente las observaciones realizadas por esta Interventoría en campo, y responder oportunamente a los comunicados para evitar incidentes en las operaciones.
- Durante el período objeto de este informe, se han enviado reportes y comunicaciones a la Concesión mediante cartas y correo electrónico, solicitando el cumplimiento obligatorio de las acciones correctivas relacionadas con los hallazgos evidenciados durante los recorridos realizados por esta Interventoría en las unidades funcionales. Sin embargo, hasta la fecha de este informe, algunos de estos comunicados siguen pendientes de respuesta, como se detalla en el Anexo 6 (Hallazgos POB) que se adjunta.
- En relación con las actividades realizadas por la Concesión, esta Interventoría se encarga de verificar su cumplimiento en campo. Los hallazgos y observaciones realizados por el contratista o los trabajadores de la Concesión son corregidos de inmediato por el profesional de seguridad a cargo de cada frente, quien prioriza la salud y seguridad de los trabajadores, así como el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 304 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 10 GESTIÓN SOCIAL

Durante el presente reporte, se relacionan dos capítulos en consideración a 1. Capitulo etapa de revisión y 2 Capitulo PGSC vigencia 2024, dado que se continúan enviando documentos de la etapa de operación y mantenimiento para la debida revisión, en ese caso se relacionan las actuaciones sociales en el marco de la mitigación de los impactos ocasionados en la ejecución de las obras de infraestructura, en razón que estas generan situaciones que de manera directa o indirecta pueden afectar a las comunidades residentes en las zonas de influencia, lo que hace necesario se dé continuidad en la atención a la comunidad en los términos del apéndice técnico No. 2. Y en el desarrollo en términos vinculantes tanto para las entidades involucradas (ANI, El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S, Interventoría) como para la comunidad, y así atender aquellos impactos que puedan afectar a la población.

Esta etapa Inició una vez haya terminado la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Se da inicio de manera anticipada, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el “Laudo en Final” y el “Arbitraje”, respectivamente) - (compartido desde la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, el 20 de diciembre de 2024).

En ese sentido el capítulo social se describen las actuaciones sociales de acompañamiento, verificación, seguimiento y control realizadas por el área social de esta Interventoría, en procura de constatar y requerir el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S (POB), que responden a cada uno de los instrumentos relacionados en la etapa de reversión que fueron objeto de la Gestión Social, a saber con la documentación contractual:

- Anexo Técnico No. 2. Se deberá implementar dicho anexo acorde a lo establecido en su disposición contractual.
- Manual de reversión: ...”7.5. **CAPÍTULO SOCIAL: La gestión social en el proceso de reversión corresponde a la verificación del cumplimiento de las obligaciones sociales del Concesionario ya sean derivadas de los instrumentos de gestión Social establecidos en el contrato de concesión, los instrumentos de control y seguimiento ambiental, acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el marco del proceso de consulta previa, acuerdos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones derivadas de mandatos judiciales, con el fin de evidenciar que el desarrollo del proyecto se efectuó con criterios de sostenibilidad social, desde el inicio del proyecto hasta su finalización. La terminación del contrato no implica el cierre o el archivo de las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de control y seguimiento ambiental, los mismos no pierden su vigencia hasta tanto no se dé cumplimiento a todas las obligaciones allí establecidas.** 7.5.1. **SOLICITUD AL CONCESIONARIO DE LA ENTREGA DE ACTIVIDADES A REALIZAR** Una vez

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 305 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

*notificado el proceso de reversión, el profesional social asignado al proyecto deberá requerir de manera oficial al concesionario:*

- *Informe general del desarrollo del contrato a nivel social que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones sociales derivadas de los instrumentos de gestión Social establecidas en el contrato de concesión, los instrumentos de control y seguimiento ambiental, acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el marco del proceso de consulta previa, acuerdos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones derivadas de mandatos judiciales, las particulares del proyecto y las dificultades para su ejecución. Con independencia de la terminación del contrato, el informe deberá contener recomendaciones de las acciones y estrategias a implementar para atender las situaciones de orden social que se presenten en el proyecto. Adicionalmente, el concesionario deberá diligenciar los siguientes formatos:*
- *Formato Cumplimiento de Obligaciones Sociales (GCSP-F-115): Formato donde se consignan cada uno de los ítems para el cumplimiento de las obligaciones sociales derivadas de los instrumentos de gestión Social establecidas en el contrato de concesión, los instrumentos de control y seguimiento ambiental, acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el marco del proceso de consulta previa, acuerdos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones derivadas de mandatos judiciales.*
- *Formato Pendientes Sociales (GCSP-F-305): Formato donde se consignan las obligaciones pendientes de cumplimiento derivadas de los instrumentos de gestión Social establecidas en el contrato de concesión, los instrumentos de control y seguimiento ambiental, acuerdos suscritos con comunidades étnicas en el marco del proceso de consulta previa, acuerdos con terceros con participación de la Agencia y las obligaciones derivadas de mandatos judiciales. Se consignan:*
  - *El tipo de pendiente social.*
  - *El origen del Pendiente* - *el sitio de ubicación dentro del proyecto*
  - *Estimación en cantidad y costo de los pendientes sociales.*
- *Formato de Inventario de pagos de compensaciones socioeconómicas (GCSP-F-306), realizados en los procesos de adquisición predial mediante enajenación voluntaria o expropiación judicial, según sea el caso; cotejados contra informe de fiducia en el que se vea reflejado el soporte idóneo de la relación directa entre las obligaciones contractuales por concepto de compensaciones socioeconómicas y su destinación específica para el predio. La Interventoría revisará y emitirá concepto del informe y de los formatos presentados por el Concesionario, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su entrega, e informará en caso de que aplique, las observaciones y/o recomendaciones. En todo caso, la Agencia Nacional de Infraestructura y/o la Interventoría del proyecto podrán requerir al Concesionario información adicional o la ampliación de la misma.*



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 306 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- PGSC 2024. Respecto al Plan de Gestión Social Contractual vigencia etapa de operación y mantenimiento se han generado algunas revisiones documentales respecto a informes correspondientes a dicha vigencia.

En el caso de las actuaciones de la Interventoría Social se mencionan las acciones ejecutadas en el cumplimiento de las obligaciones de verificación y supervisión; estas orientadas en asegurar el cumplimiento por parte Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S de las obligaciones sociales contenidas en los documentos contractuales.

En ese sentido, esta Interventoría realizó los seguimientos, validaciones y/o verificación a través de diversas estrategias, como acompañamiento a las actividades, revisión documental, permanencia en campo y recorridos de obra para identificación de problemáticas o afectaciones sociales en ocasión a la ejecución de las actividades del periodo.

A continuación, se informa acerca de las actividades generadas y los respectivos cumplimientos de las obligaciones contractuales en función de la etapa en la cual se encuentra cada Unidad Funcional.

### 10.1 OBJETIVO GENERAL – ETAPA DE REVERSION

En cumplimiento en lo establecido en la documentación contractual, esta Interventoría orienta su gestión en velar por el cumplimiento, por parte del área social del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S, de cada una de las actividades contempladas en los documentos contractuales que hacen parte de la etapa de reversión, con principios de calidad y oportunidad, de manera que se minimice, en cuanto sea posible, los impactos hacia la comunidad.

### 10.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

Los principales objetivos de la Gestión Social de Interventoría son:

- Revisar el estado de las obligaciones Sociales del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S, verificando el cumplimiento de los requerimientos contemplados en los documentos contractuales que hacen parte de la etapa de reversión.
- Determinar acciones a seguir con base en los resultados del acompañamiento y supervisión de Interventoría a cada una de las actividades de la Gestión Social efectuadas por el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.
- Definir la cuantificación de las acciones ejecutadas y el establecimiento de indicadores de gestión.
- Realizar los acompañamientos a las acciones sociales propuestas por el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. que hacen parte del presente periodo.
- Presentar las acciones concernientes al desarrollo del proceso social, dentro del periodo del **1 al 30 marzo de 2025**, acorde a la directriz de la supervisión social de la ANI.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 307 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 10.3 PERSONAL A CARGO DE LA GESTION SOCIAL

#### 10.3.1 PERSONAL SOCIAL DEL CONCESIONARIO PERIMETRAL ORIENTE DE BOGOTA. S.A.S

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. está facultado el personal que sea competente para la etapa en cuestión. Para el presente caso, el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S decidió ejecutar directamente las obligaciones sociales, para lo cual se han evidenciado los siguientes profesionales en el presente proceso así; no sin antes aclarar que no se es de manera contractual los profesionales acá señalados:

**Tabla 190 Personal de Gestión Social del Concesionario**

| Profesionales                    | Programa                                                                                                | Profesión           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Katherine Mejía Ortiz.           | Coordinadora Social                                                                                     | Comunicadora Social |
| Nicolás Ortiz Bolívar            | Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto. Oficina Satélite de Atención al Usuario UF4 | Trabajador Social   |
| Martha Lucia Gómez               | Oficina Satélite de Atención al Usuario UF5                                                             | Trabajadora Social  |
| Katherine Corredor Villarreal    | Vinculación de Mano de Obra Oficina Satélite de Atención al Usuario UF2                                 | Trabajadora Social  |
| Andrés Camilo Castro             | Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad Aledaña al Proyecto.                          | Trabajadora Social  |
| John Alexander González Larrotta | Arqueología Preventiva                                                                                  | Arqueólogo          |

Fuente: Elaboración Propia

#### 10.3.2 PERSONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Con el fin de realizar las actividades de supervisión y seguimiento propias de la Interventoría, durante la etapa de reversión, se continúa con la relación del personal que se presenta a continuación:

**Tabla 191 Personal de Gestión Social de la Interventoría**

| PERSONAL                                            | PERFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APROBACIONES                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RESIDENTE SOCIAL (1)</b><br>T. S. CLAUDIA YANETH | Título de Sociólogo y/o Antropólogo y/o Trabajador Social y/o comunicador social y/o psicólogo. Experiencia General no menor de setenta y dos (72) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión. Experiencia específica no menor a cuarenta y ocho (48) meses. Dedicación para la fase de Operación: 50% | Hoja de vida radicada ante la entidad. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 308 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PERSONAL          | PERFIL | APROBACIONES |
|-------------------|--------|--------------|
| MERCHÁN<br>RIVERA |        |              |

Fuente: Elaboración Propia

## 10.4 CAPITULO No. 1

### 10.4.1 SEGUIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DURANTE LA ETAPA DE REVERSION

Respecto a la gestión social adelantada por el área social tanto de la interventoría como del Concesionario en materia de la gestión social del presente periodo, se puede mencionar que el Plan de Gestión Social Contractual (PGSC) el Apéndice Técnico 8 – Social no se implementa, en razón que se adelantan actividades correspondientes al anexo técnico No. 2, por lo tanto, se adelantan acciones para el seguimiento de las actividades que solo reporta el POB refiere a PQRS.

### 10.4.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Se trabaja dentro de los objetivos principales:

- Mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, personal, vía web o telefónicamente con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del proyecto.
- Atender oportunamente las situaciones que se generen con los vecinos.

Seguidamente se menciona el seguimiento de Interventoría al desarrollo de las actividades del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S, las cuales se encuentran en el Sistema de Atención al Ciudadano y los medios de atención.

El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S mantiene el sistema de atención al usuario en el que define la atención y resolución de las PQRS, tal como se menciona a continuación:

**Tabla 192 Seguimiento Sistema de información al usuario.**

| SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto evaluado                                                   | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uso de formatos para la atención de las manifestaciones ciudadanas | Periodicidad permanente. El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S continúa empleando los formatos contractuales para el registro de las manifestaciones, cumpliendo el requerimiento; tal como se ha validado en la información presentada por el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 309 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto evaluado                                         | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recepción y trámite de manifestaciones ciudadanas (PQRS) | Periodicidad permanente. Aunque el Concesionario tramite los requerimientos para la canalización y gestión de las manifestaciones ciudadanas, se evidencia en una menor proporción que algunas respuestas no siempre contienen alcance definitivo, solo respuestas parciales. De otra parte, se ha evidenciado a través del SICC que se observan atenciones y se avanza de manera satisfactoria en cierres. |

Fuente: Elaboración Propia

#### 10.4.3 MANIFESTACIONES DE LA COMUNIDAD (PQRS)

Para el presente informe se relacionan el estado de las PQRS así:

Recibidas: 19 PQRS (Desde la 4831-4848)

Abiertas: 14


Atendidas para cierre: 13

Cerradas por interventoría: 5

**Tabla 193 Seguimiento Programa de Atención al usuario – Manifestaciones de la comunidad.**

| SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO |            |        |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Manifestaciones de la comunidad   |            |        |
| Tipología de la manifestación     |            |        |
| Tipología                         | Frecuencia | %      |
| Petición                          | 14         | 73.68% |
| Queja                             | 3          | 15.78% |
| Reclamación                       | 1          | 5.26%  |
| Sugerencias                       | 1          | 5.26%  |
| Otro                              | 0          | 21.05% |
| Total                             | 19         | 100%   |

**PQRS DEL PERIODO**

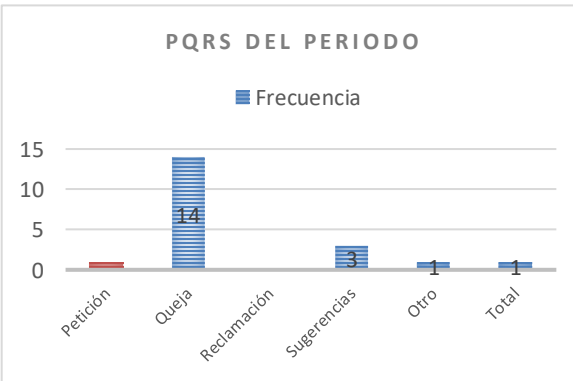


■ Frecuencia

Frente a la tipología de las PQRS recibidas para el presente periodo, predominan las peticiones con 73.68% y con un 15.78% Quejas


Estado de las solicitudes

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 310 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

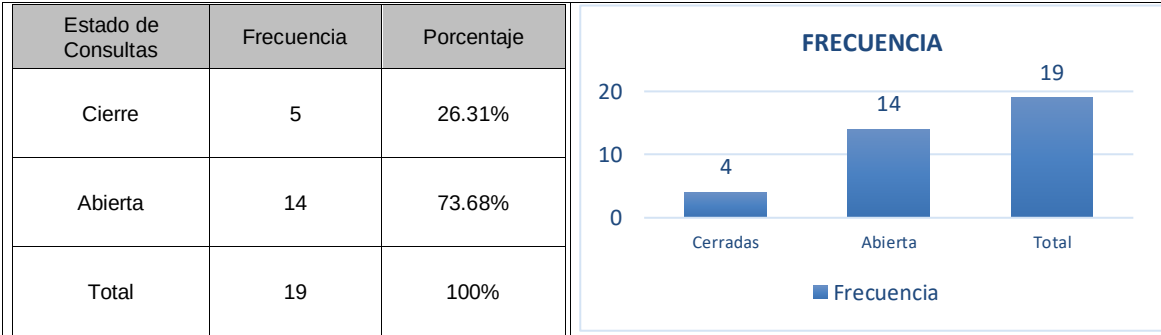

Las consultas recibidas en el presente periodo que se encuentran en seguimiento corresponden al 100% y hacen referencia a las manifestaciones de los peticionarios en concordancia a los conceptos técnicos, jurídicos y sociales. Con el fin de contar con información más precisa de las PQRS que cuentan con avance, las PQRS abiertas fueron divididas en dos categorías, aquellas que presentan avance reciente se agrupan en la categoría "Seguimiento" y las que no cuentan con gestión reciente corresponden a la categoría "Abierta". Así las cosas, se presenta un total de 14 consultas abiertas con seguimiento, porcentaje que corresponde a un total de 73. 68%.

El porcentaje de consultas cerradas presenta un declive importante, en relación con el periodo anterior. Es importante recalcar que los datos anteriormente presentados corresponden a las PQRS recibidas durante el periodo del presente informe y su respectivo estado; los datos consolidados del proyecto presentan un total de 4848 consultas recibidas de las cuales 99.89% se encuentran cerradas, 0.10% se encuentran abiertas correspondiente a 4853.

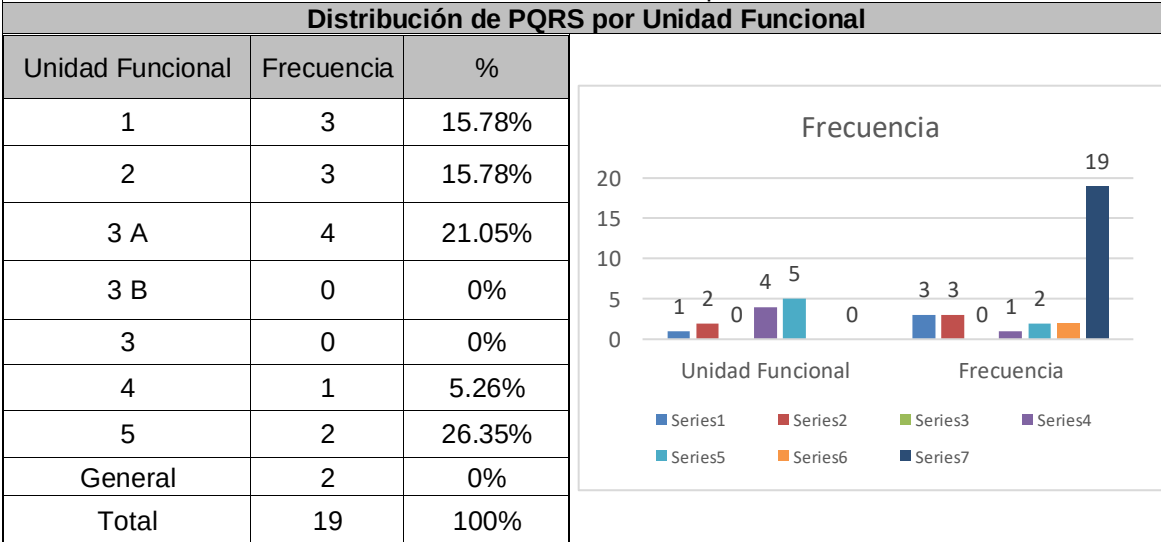


Respecto a la distribución de PQRS por UF, para el presente periodo se cuenta con una prevalencia de la UF1, UF2, UF 3A y UF4 debido a derecho de vía, tarifas preferenciales, solicitud de información, adquisición predial, Consulta pautas publicitarias en infraestructura vial, seguridad en la vía y Solicitud reunión mantenimiento UF4 post fallo Concejo La Calera

Medio de recepción

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 311 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| Medio de Recepción     | Frecuencia | %           |
|------------------------|------------|-------------|
| Personal               | 2          | 10.52%      |
| Telefónico             | 1          | 5.26%       |
| Buzón                  | 0          | 0%          |
| Electrónico            | 15         | 78.94%      |
| Correspondencia física | 0          | 0%          |
| Otra- traslado         | 1          | 5.26%       |
| <b>Total</b>           | <b>19</b>  | <b>100%</b> |

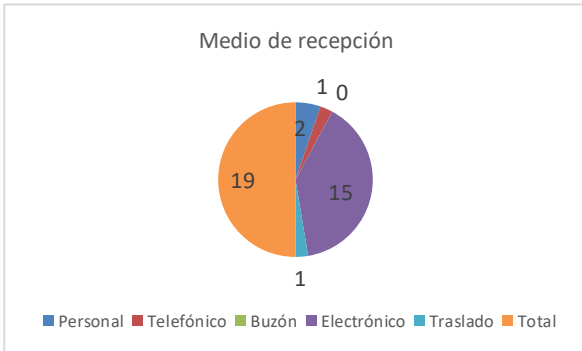

El medio de recepción que predomina en el presente periodo con un 78.94% es recepción de peticiones de manera electrónica, y con las solicitudes realizadas por medio presencial un 10.52% y telefónico de un 5.26%

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se presenta la relación de consultas recibidas cada mes, con el fin de establecer el progreso en la recepción de PQRS.

**Tabla 194 Discriminado número de Manifestaciones recibidas del 2015 a 2022**

| Mes          | Consultas Recibidas |            |            |             |            |            |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 2015                | 2016       | 2017       | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| Enero        | 0                   | 9          | 26         | 61          | 68         | 33         | 28         | 19         |
| Febrero      | 3                   | 21         | 40         | 76          | 67         | 44         | 35         | 29         |
| Marzo        | 5                   | 17         | 39         | 80          | 89         | 29         | 49         | 49         |
| Abril        | 7                   | 29         | 26         | 101         | 71         | 3          | 36         | 30         |
| Mayo         | 24                  | 14         | 43         | 108         | 92         | 17         | 38         | 20         |
| Junio        | 9                   | 26         | 50         | 117         | 45         | 23         | 39         | 22         |
| Julio        | 16                  | 38         | 62         | 113         | 67         | 31         | 51         | 27         |
| Agosto       | 23                  | 47         | 95         | 113         | 63         | 19         | 44         | 33         |
| Septiembre   | 12                  | 47         | 51         | 107         | 65         | 40         | 49         | N.A.       |
| Octubre      | 12                  | 45         | 55         | 92          | 45         | 35         | 31         | N.A.       |
| Noviembre    | 7                   | 35         | 61         | 86          | 42         | 39         | 43         | 54         |
| Diciembre    | 7                   | 35         | 55         | 57          | 12         | 18         | 23         | 37         |
| <b>TOTAL</b> | <b>125</b>          | <b>363</b> | <b>603</b> | <b>1111</b> | <b>726</b> | <b>331</b> | <b>466</b> | <b>320</b> |

Fuente: Elaboración Propia

**Tabla 195 Discriminado número de Manifestaciones recibidas por mes 2023 – 2024 - 2025**

| Mes     | Consultas Recibidas |      |      |
|---------|---------------------|------|------|
|         | 2023                | 2024 | 2025 |
| Enero   | 32                  | 18   | 28   |
| Febrero | 29                  | 20   | 29   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 312 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| Mes          | Consultas Recibidas |            |           |
|--------------|---------------------|------------|-----------|
|              | 2023                | 2024       | 2025      |
| Marzo        | 42                  | 19         | 19        |
| Abril        | 24                  | 25         |           |
| Mayo         | 31                  | 24         |           |
| Junio        | 22                  | 35         |           |
| Julio        | 24                  | 28         |           |
| Agosto       | 25                  | 15         |           |
| Septiembre   | 31                  | 28         |           |
| Octubre      | 29                  | 27         |           |
| Noviembre    | 18                  | 20         |           |
| Diciembre    | 15                  | 30         |           |
| <b>TOTAL</b> | <b>293</b>          | <b>289</b> | <b>76</b> |


Fuente: Elaboración Propia

Tabla 196 Discriminado número de Manifestaciones recibidas por mes marzo 2025

| Mes          | Consultas Recibidas |
|--------------|---------------------|
|              | 2025                |
| Marzo        | 19                  |
| <b>TOTAL</b> | <b>19</b>           |

Fuente: Elaboración Propia

Figura 61 Número de Manifestaciones recibidas por 2024 - 2025.

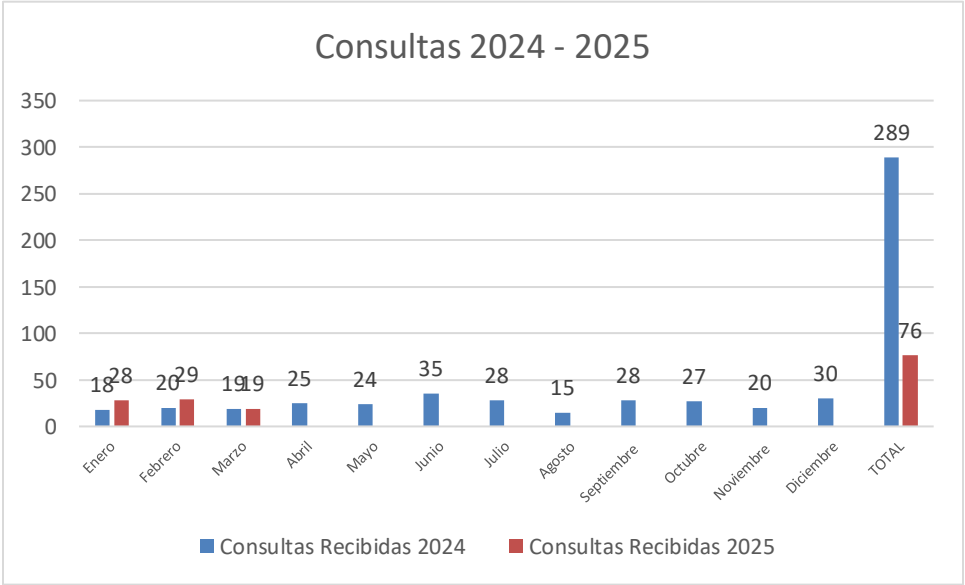

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 313 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Entre los últimos días del 1 a 31 de marzo de 2025, se recepcionaron un total de 19 pqr's con una disminución respecto al último periodo.


Se presenta a continuación la evaluación y autoevaluación de la atención de la comunidad en cada unidad y su respectiva gráfica.

**Tabla 197 Evaluación y Autoevaluación Oficina**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Oficina Móvil 1 (tramo sur)  | 3         |
| Oficina Fija La Calera (CCO) | 16        |
| <b>Total</b>                 | <b>19</b> |

Fuente: Elaboración Propia

**Figura 62 Número de Manifestaciones recibidas por UF**



Fuente: Elaboración Propia

#### 10.4.4 MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S atiende a la comunidad a través de la atención al usuario en el que define:

**Tabla 198 Seguimiento Atención al usuario – Medios de Atención.**

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto evaluado                                                   | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                            |
| Uso de formatos para la atención de las manifestaciones ciudadanas | Periodicidad permanente. El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S continúa empleando los formatos contractuales para el registro de las manifestaciones, cumpliendo el requerimiento. |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 314 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto evaluado                                         | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recepción y trámite de manifestaciones ciudadanas (PQRS) | Periodicidad No permanente. Aunque el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S tramite los requerimientos para la canalización y trámite de las manifestaciones ciudadanas, no en todos los casos las respuestas contienen alcance definitivo, solo respuestas parciales. De otra parte, se ha evidenciado a través del SICC se observa disminución en las atenciones y se avanza en cierres. |

Fuente: Elaboración Propia

#### 10.4.5 DERECHOS DE PETICIÓN INTERPUESTOS POR LA COMUNIDAD

Dado que el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S no incluye en su consolidado general del proyecto de los Derechos de Petición no se cuenta a la fecha la manera de llevar a cabo la debida revisión y de seguimiento de estos.

Sin embargo, durante el periodo del presente informe correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2025 se recibieron y atendieron diez (10) Derechos de Petición. Estos se adjuntan al presente informe.

#### 10.4.6 MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con el fin de facilitar el contacto de la comunidad con el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S, este debe disponer de medios físicos y electrónicos para recibir las peticiones que los usuarios y la comunidad en general requieran hacer sobre el Proyecto. Para el caso del presente reporte, se menciona a continuación el avance, así:

**Tabla 199 Seguimiento Sistema de Atención al usuario – Medios de Atención.**

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de atención al Usuario      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEDIOS FÍSICOS                     | Aspecto evaluado                                            | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Punto Fijo de atención                                      | Cuenta con una (1) oficina fija de atención al usuario.                                                                                                                                                                                                         |
| Punto Fijo de atención al usuario. | Cumplimiento de especificaciones del punto fijo de atención |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Aspecto evaluado                                            | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                          |
| Periodicidad Permanente            | Ubicación                                                   | El punto fijo de atención al usuario se encuentra localizado en el CCO de la Cabaña PR 17+900 de la Ruta 5009 en el municipio de La Calera (lugar equidistante del trayecto total del corredor) para las Unidades Funcionales 2 y 3A, cumpliendo la obligación. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 315 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de atención al Usuario                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | Horario de atención                                                 | La oficina de atención al usuario funciona de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y sábados de 8 a.m. a 2 p.m. cumpliendo el horario contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                     | Aviso Punto de atención al usuario                                  | La oficina principal de atención al usuario No cuenta con aviso visible con el nombre de "OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIO", nombre del proyecto, unidad funcional, número del contrato, dirección, horario, línea celular de atención, correo electrónico, página web, entidades involucradas y el lema "Equidad es mejores vías para todos", por tanto, no cumple con el requerimiento. Se genera solicitud al respecto                                     |
|                                                                                                     | Espacio y Mobiliario                                                | La oficina de atención al usuario fue ubicada en las instalaciones del CCO, cuenta con espacio para la realización de actividades asociadas a la atención al usuario, iluminación, ventilación, accesibilidad y equipos necesarios. Adicionalmente el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S dispuso de mesa y sillas para dotar la oficina, la cual se encuentra en condiciones óptimas de orden y aseo, cumpliendo el requerimiento.          |
|                                                                                                     | Personal encargado de la oficina de atención al usuario             | La atención de la oficina es liderada por la profesional Social, quien coordina la recepción y trámite de las PQRS. En todo caso, la Interventoría ha verificado que la oficina cuente con personal profesional permanente para la atención de la comunidad, el cual debe contar con la información general del proceso de recepción de consultas que permita orientar a visitantes que deseen información general del proyecto, cumpliendo la obligación. |
| <b>MEDIOS FÍSICOS</b><br><br>Puntos Satélites de atención al usuario<br><br>Periodicidad Permanente | Aspecto evaluado                                                    | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                     | Punto Satélite de atención                                          | Para la UF 4:<br>El 22 de diciembre de 2020, el Concesionario Perimetral del Oriente S.A.S dispuso la oficina satélite de atención.<br>Y a la fecha del presente periodo continuo activa.<br>Para la UF 5:<br>Durante el mes de agosto de 2023, el Concesionario Perimetral S.A.S instala la oficina, la cual se encuentra en funcionamiento.<br>Y a la fecha del presente periodo continua activa.                                                        |
|                                                                                                     | Cumplimiento de especificaciones de los puntos satélite de atención |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | Aspecto evaluado                                                    | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                     | Horario de atención                                                 | Las oficinas de las UF 4 y 5 se encuentran en funcionando de manera oportuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     | Aviso Punto de atención al usuario                                  | Las oficinas: (CCO), UF 4 y UF cuentan con avisos de identificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | Espacio y Mobiliario                                                | La oficina satélite de atención al usuario de la UF 4 cuenta con el espacio y mobiliario necesario. La oficina de la UF 5 se encuentra en funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 316 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Medios de atención al Usuario                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
|                                                                    | Personal encargado      | A continuación, se relaciona el personal que la Interventoría permanentemente identifica atendiendo las oficinas satélites, quienes cumplen el perfil requerido y solicitado por medio de comunicado.                                                   |                        |                      |
|                                                                    |                         | Unidad Funcional                                                                                                                                                                                                                                        | Municipio              | Profesional Social   |
|                                                                    |                         | UF 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Choachí                | Nicolás Ortiz        |
|                                                                    |                         | UF 5                                                                                                                                                                                                                                                    | Ubaque-Cáqueza         | Martha Lucia Gómez   |
|                                                                    |                         | En la tabla anterior se relacionan las UF 1, 2, 3 que se encuentran en etapa de O&M. En la UF 4 y UF 5 cuentan con oficinas satélite                                                                                                                    |                        |                      |
|                                                                    | Ubicación               | La ubicación de la oficina satélite de atención al usuario se ha divulgado en cada una de las piezas informativas, permitiendo que la comunidad acceda de forma fácil y permanente:                                                                     |                        |                      |
|                                                                    |                         | Unidad Funcional                                                                                                                                                                                                                                        | Municipio              | Localización         |
|                                                                    |                         | UF 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Choachí                | Calle 2 sur No. 4-85 |
|                                                                    |                         | UF 5                                                                                                                                                                                                                                                    | Ubaque-Cáqueza         | Calle 3 No. 3ª 33    |
|                                                                    | MEDIOS FÍSICOS          | Aspecto evaluado                                                                                                                                                                                                                                        | Estado de cumplimiento |                      |
| Puntos Móviles de atención al usuario                              |                         | Cumple con las especificaciones (dos oficinas móviles para la totalidad del trayecto durante la etapa preoperativa y una para la etapa operativa) es decir una estructura móvil tipo remolque, incluyendo el vehículo necesario para su desplazamiento. |                        |                      |
| Cumplimiento de especificaciones de los puntos móviles de atención |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
| Aspecto evaluado                                                   |                         | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |
| Divulgación de la Ubicación                                        |                         | La divulgación de la ubicación de los puntos móviles se realiza a través de página web, redes sociales, publicación en carteleras de Oficinas y Alcaldías cumpliendo la divulgación requerida.                                                          |                        |                      |
| Horario de atención                                                |                         | Las oficinas móviles funcionan de acuerdo con el cronograma que es remitido mensualmente a Interventoría.                                                                                                                                               |                        |                      |
| Aviso Punto de atención al usuario                                 |                         | Se observa publicado                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |
| Espacio y Mobiliario                                               |                         | La única oficina que está en funcionamiento fue dotada de equipo de cómputo y comunicaciones necesarios para prestar idénticos servicios a los que proveen las oficinas fijas, lo cual incluye PC, scanner, cámara, papelería y teléfono.               |                        |                      |
| MEDIOS ELECTRÓNICOS                                                | Aspecto evaluado        | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |
|                                                                    | Correo electrónico para | Para efectos de implementar un mecanismo de interacción entre la Concesionario Perimetral de Oriente de Bogotá S.A.S, los usuarios de la vía y pobladores de comunidades cercanas, el Concesionario                                                     |                        |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 317 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de atención al Usuario     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | recepción de PQRS              | <p>Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S continua atendiendo a través de correo electrónico <a href="mailto:atencionalusuario@pob.com.co">atencionalusuario@pob.com.co</a> con el fin de recibir y responder peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.</p> <p>Dicho correo es informado a la comunidad a través de página web, redes y vallas informativos.</p>                                                                                                                                                   |
|                                   | Aspecto evaluado               | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEDIOS ELECTRÓNICOS<br>Página web | Página web                     | <p>La página web <a href="http://www.pob.com.co">www.pob.com.co</a> cuenta con un espacio para que el lector interponga sus PQRS. Se trata de una pestaña denominada Atención al Usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | Aspecto evaluado               | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEDIOS TELEFÓNICOS<br>Call Center | Líneas de atención al usuario. | <p>La Concesionaria habilitó las siguientes líneas:<br/>           Para eventos en la vía: Líneas: +57(310) 2399451 y +57(316) 2340275<br/>           Gestión Social: Línea de Atención al Usuario: 3135495204<br/>           Línea gratuita con código corto (#762)<br/>           Línea 018000181762<br/>           Estas líneas son difundidas mediante vallas, tiquetes de peajes, Publi-POB, volantes informativos y página web; la Interventoría ha realizado seguimiento a su correcto funcionamiento.</p> |
|                                   | Aspecto evaluado               | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fuente: Elaboración Propia

### Observaciones de Interventoría:

Para el presente periodo, se mencionan las acciones al respecto de los requerimientos por parte de la interventoría y atención del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S así:

- A la fecha la atención a la comunidad se ha generado de manera asertiva, recepcionando las PQRS de manera presencial y correo electrónico.
- Las oficinas de atención a la comunidad se mantienen tal como se encuentra plasmado en el PGSC vigencia 2024, sin ninguna novedad a la fecha reportada por parte del Concesionario.
- Se observa que la identificación de carteleras y pendones informativos que se publican se encuentran debidamente instalados.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 318 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | revisión de expedientes PQRS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | CCO<br>Punto físico de atención a la comunidad |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Fuente: Elaboración Propia

Los sistemas de información al usuario concernientes a página web. De otra parte y respecto a los paneles LED, Interventoría permanentemente realiza verificación de su correcto funcionamiento, cuando se identifica que se encuentran encendidos. Para el caso que estos no funcionen, se identifica y se reporta, de inmediato el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S efectúa el ajuste.

A continuación, se relaciona la ubicación de los paneles LED, en las UF 1, 2 y 3.

**Tabla 200 Ubicación Paneles LED o Paneles de Mensajería Variable (PMV)**

| UF1   | TRAMO                                                                  | ABSCISA | COSTADO  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| UF1   | SALITRE - GUASCA K00+000 K10+<br>4 ESQUINAS - SESQUILÉ K00+000 K27+216 | K09+640 | CI       |
|       |                                                                        | K07+240 | CD       |
|       |                                                                        | K27+120 | CD       |
| UF 2A | SOPÓ - SALITRE K00+000 K10+507                                         | K00+625 | CD       |
|       |                                                                        | K08+015 | CD Peaje |
|       |                                                                        | K08+590 | CD Peaje |
| UF 2B | SALITRE - CALERA K00+000 K13+600                                       | K00+450 | CI       |
|       |                                                                        | K01+935 | CD Peaje |
|       |                                                                        | K02+250 | CI Peaje |
| UF 3A | CALERA - PATIOS K00+000 K09+934                                        | K09+755 | CI Peaje |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 319 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UF1   | TRAMO                                       | ABSCISA | COSTADO  |
|-------|---------------------------------------------|---------|----------|
|       |                                             | K09+932 | CD Peaje |
| UF 3B | LIMITES BOGOTÁ - CHOACHÍ K00+000<br>K22+710 | K00+065 | CD       |
|       |                                             | K01+950 | CI Peaje |
|       |                                             | K02+370 | CI Peaje |
|       |                                             | K21+815 | CI       |

Fuente: Elaboración Propia

Para el caso de la presente etapa, se relacionan en el SICC mas no se cuenta con la certeza de los debidos avances.

Se deja como trazabilidad y seguimiento a los comunicados de periodos anteriores y el que corresponde al presente así:

#### Trazabilidad:

5143.051ANI CERS-OP-0002-2025 3 de enero de 2025 Rta D-1639-2024. No objeción perturbaciones diciembre 2024. Su asunto: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de diciembre de 2024.

5143.051ANI CERS-OP-0182-2025, 4 de febrero de 2025. Traslado: Remisión Instructivo TPSC-I-004 en cumplimiento al memorando ANI No. 20254000020283 del 28 de enero 2025 – "Evaluación de percepción usuarios de la infraestructura vigencia 2024 y pauta 2025" - Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014 – Proyecto Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca. Para contestar cite: Radicado ANI No.: 20253060035051 \*20253060035051\*

5143.051ANI CERS-OP-0185-2025 05 de febrero de 2025. Requerimiento ANI Traslado, Solicitud información para ejercer la defensa de la entidad en un trámite prejudicial. Convocante: Asociación Gremial de Usuarios del Acueducto Veredal de San Rafael Salitre del municipio de la Calera.

5143.051ANI CERS-OP-0254-2025, 17 de febrero de 2025 17 de febrero de 2025. Respuesta a su oficio D-141-2025 con asunto "Traslado de solicitud (PQRS C-4799-2025) - Laudo Parcial Final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños emitido el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente)."

5143.051ANI CERS-OP-0254-2025 17 de febrero de 2025 Respuesta a su oficio D-141-2025 con asunto "Traslado de solicitud (PQRS C-4799-2025) - Laudo Parcial Final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños emitido el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente)." ..... que el traslado de la PQRS C-4799-2025 del señor Josué Frías Cruz, desde el concesionario hacia la ANI, no está en línea con el cumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento que el concesionario debe seguir ejecutando durante la etapa reversión; por lo cual esta interventoría le solicita atender las inquietudes y trámites que surjan durante la etapa de reversión en relación con el objeto de la



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 320 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

*Resolución ANI N° 716 de 2015, lo anterior dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 2207 de 2022; en especial lo relacionado a permisos de uso de la vía concesionada a su cargo.”.*

En cuanto a la entrega de resultados de encuesta de satisfacción a atención al usuario segundo semestre 2024, el Concesionario presento el reporte, y a través de este se puede concluir:

En general, se observa mantenimiento de la tendencia en la percepción y satisfacción de los usuarios con el sistema de PQRS implementado por la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá para el primer semestre de 2024.

- 72% de las personas evidencia cambios en la vía. Entre ellas el 67% se siente muy satisfecho con los mismos.
- Mejora la percepción de la señalización pasando de 10% en el primer semestre a 21% en el segundo semestre.
  - Aunque desciende 6 puntos porcentuales, se mantiene el arreglo de la vía como lo más visible para las personas encuestadas.
- Sigue mejorando la satisfacción de los usuarios con el tiempo de respuesta a las PQRS, pasando de 69% en primer semestre a 74% en el segundo semestre la mejora es de 5 puntos porcentuales.
- Altos niveles de satisfacción con la cordialidad del personal: El 87% de los usuarios calificó como excelente o buena la cordialidad del personal que los atendió, manteniéndose por encima del 80%.
- Mejora en la facilidad para presentar PQRS: El 76% de los usuarios considera que el proceso es fácil, un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.
  - Los canales más utilizados son las oficinas fijas y la línea telefónica: El 49% de los usuarios recibió respuesta a sus PQRS vía correo electrónico y el 24% a través de llamada telefónica.
- Principales sugerencias: Agilidad en las respuestas, brindar un buen trato al usuario y contar con más canales de comunicación.

Según el análisis del informe, no se identifican calificaciones o indicadores que hayan desmejorado significativamente en este período. Por el contrario, la mayoría de los aspectos evaluados muestran mejoras en la percepción y satisfacción de los usuarios, en términos generales, el informe refleja una tendencia positiva en los indicadores de satisfacción y percepción de los usuarios sobre el sistema de PQRS implementado por la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá; Sin embargo, algunos aspectos a resaltar:

- La percepción positiva de mejoras en la vía bajó cuatro puntos porcentuales de 76% en 2024-I a 72%.
- Los usuarios que no han visto mejoras en la vía aumentan de 24% en 2024-I a 28% en 2024.
- Si bien estos aspectos han disminuido con respecto a mediciones anteriores, algunos usuarios aún consideran que el proceso para presentar PQRS tiene "mucho trámite" y "falta de información clara y oportuna “.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 321 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 201 Seguimiento – Estrategia de Comunicación.**

| HERRAMIENTAS Y CANALES DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S debe diseñar y utilizar los medios de comunicación escritos, radiales y audiovisuales necesarios para el proceso de información, participación, posicionamiento y manejo de imagen del proyecto, la ANI y el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S con las siguientes herramientas:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aspecto evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Página Web</b><br>Información del Concesionario Perimetral de Oriente de Bogotá S.A.S, estado de la vía, desarrollo de las Intervenciones, información de la publicación informativa.                                                                                                                                                                                   | Con el fin de mantener informada a la comunidad a nivel local y nacional, la página web del proyecto, <a href="http://www.pob.com.co">www.pob.com.co</a> , así como en las redes sociales del Concesionario, durante el mes de febrero, se realizó la publicación de (1) oficina móvil, (5) volantes de prevención en seguridad vial para el puente festivo y plan retorno y vacantes laborales y (2) programas radiales. En la siguiente tabla se reporta la información publicada con la respectiva fecha de publicación                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Volantes</b><br>Podrá desarrollar folletos, insertos, pendones, volantes, boletines, cartillas juegos, cuentos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodicidad cuando se requiere, no obstante, si hacen parte de las obligaciones del anexo técnico No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BOLETÍN TRIMESTRAL</b><br>Teniendo en cuenta lo descrito en el Apéndice Técnico 2, numeral 3.3.3.2.2 Boletín Trimestral "(...) el Concesionario deberá producir y editar un boletín trimestral, con la misma información esencial para el Usuario de la Pagina Web, la publicación deberá ser distribuida gratuitamente a todo aquel Usuario que lo solicite            | Se realizó la distribución de la edición No. 38 del PUBLIPOB y fueron entregados un total de 1.213 ejemplares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EMISORA DE RADIO</b><br>Teniendo en cuenta lo descrito en el Apéndice Técnico 2, numeral 3.3.3.2.3 Emisora de Radio y lo dispuesto en el Otrosí 7 del contrato de Concesión, durante el mes en reporte, se emitieron (2) programas radiales y 120 cuñas radiales en casa una de las emisoras del AID del proyecto: La Calera FM, Guatavita FM y Ángelus Stereo Sesquilé | Se emitieron (7) programas radiales y 120 cuñas radiales en casa una de las emisoras del AID del proyecto: La Calera FM, Guatavita FM y Ángelus Stereo Sesquilé Los temas abordados en cada uno de los Programas Radiales que fueron emitidos los días jueves desde el 06 al 27 de febrero de 2025. Todos los programas emitidos puede consultarlos en: <a href="https://pob.com.co/social-y-ambiental/radio/">https://pob.com.co/social-y-ambiental/radio/</a> Programa 341 – 06 de marzo de 2025 • Programa 342 - 13 de marzo de 2025 Respecto a las cuñas radiales presentadas en este periodo, se desarrollaron temas como: Seguridad Vial, manejo de la velocidad, uso del caso en motociclistas, posicionamiento de las UF 1, 2 y 3. |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 322 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S cuenta con la página web (<http://pob.com.co>), en la cual se ha incluido información de interés para los navegantes.

El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S ha implementado una cuenta de Facebook y línea de difusión de WhatsApp, para informar eventualidades de obra. Estas herramientas han servido para mantener un contacto más expedito con los usuarios de la vía.

La página de Facebook además de difundir información relacionada con cierres de vía ha promovido los municipios del área de influencia directa, sus atractivos turísticos, se ha divulgado información relacionada con la gestión ambiental y social y frecuentemente. La página de Facebook del Concesionario cuenta actualmente con 10.553 seguidores.

Se mantuvo actualizada la página web con información de interés para los usuarios y comunidad en general.

**Tabla 202 Seguimiento– Estrategia de Información**

| SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S debe desarrollar un plan de utilización de medios de comunicación masiva para difundir información relevante del Proyecto, el cual, en todo caso, deberá contemplar la constante difusión de mensajes que generen recordación.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aspecto evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Radio</b><br>El Concesionario Perimetral de Oriente de Bogotá S.A.S deberá identificar las emisoras de mayor rating en el Área de Influencia Indirecta y en el Área de Influencia Directa del Proyecto y definirá un espacio permanente de información del proyecto. Toda información que se difunda respecto al proyecto debe buscar posicionar el mismo, la imagen de la ANI y del Concesionario, así como el slogan del gobierno nacional. | Periodicidad una cuña trimestral.<br>Periodicidad una emisión semestral.<br>No se publicaron, no se informo acerca de las actuaciones del presente ítem., no obstante, si hacen parte de las obligaciones del anexo técnico No. 2 |

Fuente: Elaboración propia

#### 10.4.7 CAPACITACIONES CON COMUNIDAD ALEDAÑA

El Concesionario realiza las capacitaciones con base en la metodología establecida en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad Vial que establece el desarrollo de la capacitación en cuatro momentos:

Momento

1: Actividades para compartir experiencias, ideas y conocimientos en torno al tema a desarrollar en la sesión. Esta actividad se realizó por medio de una lluvia de ideas con los estudiantes para medir las conductas de entrada. Momento

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 323 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

2: Desarrollo de contenidos, para contrastar lo conocido con lo nuevo por aprender, incluye presentación de videos. Para este caso, se trabajaron temas relacionados con los cinco actores viales, la señalización y el tránsito seguro de peatones y ciclistas, según el grado al cual fuese dirigida la actividad. Momento

3: Actividades orientadas a la aplicación del aprendizaje, con el fin de fortalecer las habilidades aprendidas. Correspondiente a una actividad lúdica con los estudiantes. Momento

4: Actividades para evaluar los aprendizajes, identificando lo logrado y reforzando aquello en que se tiene mayor dificultad. Para el periodo del presente informe se realizaron dos sesiones del proyecto de Seguridad Vial, dirigidas a los estudiantes de últimos grados del centro educativo PIO XII del municipio de Guatavita.

A. Campañas de Prevención siniestralidad vial Durante todo marzo de 2025, en conjunto con la Policía Nacional, se realizaron 10 campañas de prevención de la siniestralidad vial dirigida a motociclistas y acompañantes, ciclistas, conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, conductores, pasajeros y peatones en la que se trataron los siguientes temas: • Uso adecuado del casco de protección Res 1080 del 2019 • Ley 1696 del año 2013 • Ley 769 del 2002 • Respeto por las normas y señales de tránsito • No adelantar por la berma, cuneta, andén o donde la señalización lo indique • No realizar maniobras peligrosas ni exceder los límites de velocidad • Señales manuales de ciclistas • Uso del cinturón de seguridad • Sistemas de retención infantil • Conductas correctas para viajar • Estado mecánico de motocicletas • Implicaciones de la conducción Accidentes de Tránsito • Señales de Tránsito • Revisión del estado mecánico del vehículo • Revisión documental • Constitución política Art 6, 90, 95 • Recomendaciones de una adecuada conducción. • Recomendaciones para cruzar la vía • Factores de riesgo en la vía como peatón • Infracciones de tránsito a los diferentes actores viales • Buenas prácticas de conducción • Pasos seguros para peatones • Uso de puentes peatonales.

**Tabla 203 Capacitaciones comunidad**

| No.              | Fecha      | Escuela                    | Temáticas                      | Participantes  |
|------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                | 13/03/2025 | IED PIO XII, UF1 Guatavita | Capacitación de Seguridad Vial | 39 estudiantes |
| 2                | 28/03/2025 | IED PIO XII, UF1 Guatavita | Capacitación de Seguridad Vial | 34 estudiantes |
| <b>Total: 73</b> |            |                            |                                |                |

Fuente: Elaboración propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 324 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 10.4.8 PERTURBACIONES

Dando alcance a las Obligaciones especificadas en el numeral 3.3.11 “Sistemas de Guardia y Vigilancia. Explotación del Corredor del Proyecto” durante el periodo de reporte, este Concesionario continuó avanzando con la Obligación de vigilar el Corredor del Proyecto detectar invasiones y salvaguardar con la propiedad del Estado. Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, se identificó un total de cuatro (4) ocupaciones ilegales en las cinco Unidades Funcionales, las cuales se detallan en el formato GCSP-F-145, “Registro Consolidado de Recuperación de Espacio Público”.

**Tabla 204 Seguimiento– Perturbaciones**

| Municipio    | Perturbaciones evidencias | Perturbaciones reportadas |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Sesquilé     | 0                         | 0                         |
| Guatavita    | 0                         | 0                         |
| Guasca       | 1                         | 1                         |
| Sopo         | 0                         | 0                         |
| La calera    | 1                         | 1                         |
| Choachí      | 2                         | 2                         |
| Ubaque       | 0                         | 0                         |
| Cáqueza      | 0                         | 0                         |
| <b>Total</b> | <b>4</b>                  | <b>4</b>                  |

Fuente: Elaboración propia

#### 10.5 CAPITULO No. 2

##### 10.5.1 TRAZABILIDAD PGSC VIGENCIA 2024 – ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se genera de alguna manera la atención desde la interventoría a las situaciones documentarles que contractualmente fueron objeto de la etapa de operación y mantenimiento, las cuales corresponden a informes mensuales, trimestrales y semestrales previos al inicio de la etapa de revisión, entre ellos se relacionan:

##### 10.5.2 PROGRAMA ATENCIÓN AL USUARIO

###### Trazabilidad de la gestión:

CERS-OP-1639-2024 02 de julio de 2024 Reiteración comunicado CERS-OP-591-2024, Solicitud ajuste Plan de mejora, Encuestas de percepción de la vía que se aplicaron para el año 2023. reiterar la solitud de entrega de lo contenido en nuestro comunicado CERS-OP-591-2024 de fecha 1 de marzo de 2024, en respuesta a sus comunicados “Respuesta a sus oficios D292-2024 y D-299-2024, referentes a las encuestas de percepción de la vía I y II del 2023 y plan de mejora”.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 325 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

5143.051ANI CERS-OP-2230-2024 9 de septiembre de 2024 Rta comunicado: D-1151-2024 Evaluación de Percepción del Usuario de la Vía. I semestre 2024A su comunicado D-1014-2024-2024, de fecha 19-07-2024, mediante asunto: Respuesta a comunicación Radicado ANI No.: 20243050241401 (R-2374-2024). Reiteración de la comunicación No. CERS-OP-1639- 2024 con radicado ANI No.20244090794512 del 02 de julio de 2024 "Solicitud ajuste Plan de mejora, Encuestas de percepción de la vía que se aplicaron para el año 2023. Indicamos que la solicitud de la interventoría mediante comunicado: CERS-OP-1787- 2024 de fecha 16-07-2024 fue: ... "consideramos pertinente reiterar que necesitamos conocer la metodología para determinar el porcentaje de satisfacción en el Formato GCSP-F-04 Consolidado evaluación satisfacción uso de la vía en el formato versión 007 del 01/02/2021"... , con este requerimiento su contestación fue: ..."Así mismo, informamos que la Interventoría nos contestó el día 16 de julio de 2024, mediante la comunicación No. CERS-OP-1787-2024 (R-2354-2024) manifestando estar acuerdo con el plan de mejoramiento implementado y nos recomiendan aplicarlo para las próximas encuestas de percepción de la vía que realice". No obstante, se remite comunicado CERS-OP-1800-2024 17 de julio de 2024, con observación: ...- Aclarar la metodología para la obtención del valor del tamaño de la muestra".... - 5%) en todos los puntos donde se va a realizar la encuesta. Con dicho contexto, a la fecha no se ha generado la entrega de lo solicitado (metodología para determinar el porcentaje de satisfacción en el Formato GCSP-F-04), la cual fue solicitada por la interventoría en su momento. - Para el caso de su comunicado D-1151-2024, con asunto: Evaluación de Percepción del Usuario de la Vía, radicada el 26-08-2024, se evidencia: Desde el año 2020, no se cumple con el 67% de la satisfacción, tal como lo indica el formato GCSP-F-204, en la pregunta ¿Ha recibido información de la vía sobre: Cierres, Teléfonos de contacto en caso de emergencia, etc.?, ¿Usted ha visitado la Oficina de Atención al Usuario?, ¿Usted ha visitado la Oficina de Atención al Usuario?, ¿Cómo evalúa su experiencia en cuanto a la atención recibida en la Oficina de atención al usuario?, ¿Por qué razón califica como "Regular" o "Mala" en la experiencia del Corredor Perimetral Oriental de Cundinamarca en cuanto a Atención en los peajes?. En ese sentido, nos encontramos alineados con las recomendaciones y sugerencias dadas por el Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S.A. en cuando a:

- Aumentar la difusión de información sobre servicios y números de emergencia
- Mejorar la veracidad y oportunidad de la información proporcionada.
- Incrementar el mantenimiento preventivo de la vía.
- Mejorar la iluminación en la vía, especialmente en áreas de servicio.
- Mejorar la señalización, especialmente relacionada con la presencia de ciclistas.
- Instalar más reductores de velocidad en zonas peligrosas.
- Aumentar la capacitación del personal para mejorar la atención al usuario.
- Utilizar más las redes sociales y otros medios digitales para difundir información oportuna sobre el estado de la vía.
- Implementar una aplicación móvil para proporcionar información en tiempo real y permitir reportes de incidentes.

Así las cosas, se otorga un plazo máximo de ocho (8) días hábiles para la entrega de la metodología a emplearse en la encuesta del siguiente semestre julio – diciembre de 2024 para ser analizada y generar los debidos aportes previo a su aplicación.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 326 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

5143.051ANI CERS-OP- 2374-2024 1 de octubre de 2024 Rta correo electrónico. Asunto: "Entrega de resultados de encuesta de satisfacción a atención al usuario primer semestre 2024" informar los siguientes aspectos y atender las sugerencias y/o recomendaciones dadas por los usuarios como parte del resultado de la aplicación de la encuesta, así: - Agilidad en las respuestas, disminución de la tramitología y brindar un buen trato al usuario. Si bien estos aspectos han disminuido con respecto a mediciones anteriores, algunos usuarios aún consideran que el proceso para presentar PQRS tiene "mucho tramitología" y "falta de información clara y oportuna ". - El uso de la línea telefónica y la oficina móvil de atención sigue siendo uno de los canales menos utilizados por los usuarios para presentar PQRS. En necesario recordar lo solicitado mediante comunicación CERS-OP-317-2024 5 de febrero de 2024, acerca de la entrega de un Plan de Acción de Mitigación o Estrategia de Gestión, en ese sentido, se solicita presentar a esta interventoría en un plazo máximo de ocho (8) días calendario contados a partir del recibo de la presente comunicación, un Plan de Acción de Mitigación o Estrategia de Gestión a lo mencionado anteriormente, el cual deberá ser implementado por el Concesionario como criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados y actividad en mención.

5143.051ANI CERS-OP-0519-2025 27 de marzo de 2025 Respuesta al radicado ANI No.: 20253060035051 (R-354-2025) y al radicado 5143.051ANI CERS-OP- 0182-2025 (R-376-2025). Remisión Instructivo TPSCI-004 en cumplimiento al memorando ANI No. 20254000020283 del 28 de enero 2025 – "Evaluación de percepción usuarios de la infraestructura vigencia 2024 y pauta 2025" - Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014 – Proyecto Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca.

Se hace necesario presentar un plan de mejora para incrementar el nivel de satisfacción del usuario a la pregunta: "Ha recibido información de la vía sobre: Cierres, Teléfonos de contacto en caso de emergencia, entre otros. ", lo anterior, como primera medida teniendo en cuenta lo solicitado a través de comunicado 5143.051ANI CERS-OP-2230-2024 de fecha 9 de septiembre de 2024 mediante asunto: Rta comunicado: D-1151-2024 Evaluación de Percepción del Usuario de la Vía I semestre 2024.

En segunda medida. Es importante destacar que, durante la Etapa de Reversión, es obligatorio y exigible que el Concesionario continúe con las actividades y labores de Operación y Mantenimiento del Proyecto para asegurar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y conservación del mismo hasta que se complete este proceso.

En ese caso, dicho plan de mejora obedece a la debida implementación de la atención al usuario. Por otro lado, las actividades de mantenimiento también siguen siendo exigibles en esta etapa.

La Sección 6.2 del Apéndice Técnico 2 establece los Tipos de Actuaciones de Mantenimiento; entre ellas: Actividades de Mantenimiento de Emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dañados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible....



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 327 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Este aspecto se menciona en torno a la adecuada información que debe tener el usuario en el momento de hacer uso en la vía. Asimismo, la Sección 6.3 del Apéndice Técnico 2 desglosa las Actividades Particulares del Mantenimiento. En concordancia con lo anterior, en materia de gestión social, el Concesionario está obligado a ejecutar no solo las actividades de la Tabla No. 1 de la comunicación D-84- 2025: (i) Página WEB, (ii) Boletín trimestral, (iii) Emisora de Radio, (iv) Atención al usuario, (v) Plan de capacitación de las comunidades aledañas al corredor, (vi) Gestión de perturbaciones, sino también todas aquellas actividades previstas en el Manual de Operación y Mantenimiento, en el Contrato y Apéndices, así como el resto de las establecidas en el Apéndice Técnico 2 que mantienen su carácter obligatorio E

s de aclarar, que la encuesta presentada corresponde a la gestión efectuada de las actividades correspondientes la etapa de Operación y Mantenimiento del año 2024, las cuales están enmarcadas en el apéndice técnico social No.8 con la vigencia desde el inicio de la ejecución del PGSC hasta la terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento.

### 10.5.3 PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

A continuación, se relaciona el seguimiento de Interventoría a las actividades realizadas en el Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

**Tabla 205 Seguimiento Programa de Apoyo a la capacidad de gestión Institucional**

| PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Aspecto evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estado de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación de espacio público                           | Protección Derecho de Vía: El Concesionario debe vigilar y reaccionar frente a posibles ocupaciones, solicitando el desalojo a los ocupantes sin uso de fuerza y notificar a la policía de carreteras, interventoría, autoridades municipales si existen ocupaciones que no se puedan desalojar por diálogo. | Periodicidad mensual.<br><br>Durante el mes en curso, no se llevaron a cabo actividades con la comunidad. No son reportadas por el Concesionario. No obstante, dicho subprograma se debe relacionar y mencionar las actuaciones del periodo y a la fecha, no se cuenta con el debido soporte. Es de aclar que estas hacen parte del proceso de reversión. |

Fuente: Elaboración Propia

#### Trazabilidad:

5143.051ANI CERS-OP-2211-2024 10 de septiembre de 2024 Respuesta D-1167-2024. No objeción perturbaciones agosto 2024. Asunto de su comunicado: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de agosto de 2024. en cumplimiento de nuestras obligaciones, se da alcance a su comunicado mediante consecutivo D-1167- 2024 de fecha 30 de agosto de 2024, generando la no objeción al reporte presentado en relación



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 328 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

con las perturbaciones correspondientes al mes de agosto de 2024. Así las cosas, se remiten debidamente firmados los formatos ANI GCSP-F-144 y GCSP-F-145

5143.051ANI CERS-OP-0002-2025 3 de enero de 2025. Rta D-1639-2024. No objeción perturbaciones diciembre 2024. Su asunto: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de diciembre de 2024.

5143.051ANI CERS-OP-0271-2025 20 de febrero de 2025 Objeción Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional. Rta a su asunto: D-158-2025. Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

#### **A la fecha:**

5143.051ANI CERS-OP-0408-2025, 10 de marzo de 2025 No Objeción Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional. Rta a su asunto: D-282-2025. Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

### **10.5.4 PERTURBACIONES**

Como parte de la gestión se adelantó por parte de la interventoría las siguientes actuaciones así:

#### **Acciones de recuperación del Espacio Público**

Para lograr el adecuado saneamiento de las áreas ocupadas ilegalmente y propender por la protección del espacio público, se adoptaron acciones encaminadas a la recuperación de las áreas perturbadas, informando a las autoridades competentes en cada municipio donde se identificó la perturbación. Anexo formato ANI GCSP-F-144 "Identificación de ocupaciones ilegales.

#### **Trazabilidad:**

De igual manera se deja trazabilidad así:

5143.051ANI CERS-OP-2211-2024, 10 de septiembre de 2024. Respuesta D-1167-2024. No objeción perturbaciones agosto 2024. Asunto de su comunicado: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de agosto de 2024.

5143.051ANI CERS-OP-2135-2024, 27 de agosto de 2024 Alcance al radicado 5143.051ANI CERS-OP-2118-2024 con referencia al asunto: Respuesta D-1115-2024. No objeción perturbaciones Julio 2024. Asunto de su comunicado: CERS-OP-1924-2024 (R-2478-2024) "Objeción perturbaciones Julio de 2024. Respuesta comunicado D-1044-2024" No objeción perturbaciones Julio 2024 a Asunto de su comunicado: CERS-OP1924-2024 (R-2478-2024) "Objeción perturbaciones Julio de 2024. Respetuosamente solicitamos hacer caso omiso debido a que se presentó un error al momento de codificar el consecutivo

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 329 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

interno de la comunicación, por lo cual se presentara una nueva carta con el consecutivo correcto, sin variar su contenido.

5143.051ANI CERS-OP- 2468-2024 21 de octubre de 2024 Rta D-1292-2024. No objeción perturbaciones septiembre 2024. Su asunto: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de septiembre de 2024.

5143.051ANI CERS-OP- 2618-2024 18 de noviembre de 2024 Rta D-1461-2024. No objeción perturbaciones octubre 2024. Su asunto: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de octubre de 2024.

5143.051ANI CERS-OP- 2752-2024 10 de diciembre de 2024 Rta D-1546-2024. No objeción perturbaciones noviembre 2024. Su asunto: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de noviembre de 2024.

#### **10.5.5 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL -PREDIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

##### **Trazabilidad:**

5143.051ANI CERS-OP-2701-2024 29 noviembre de 2024 Reiteración CERS-OP-385-2024: "Estado actual de información y soportes del cierre del 100% de las actas de vecindad", reitera comunicado CERS-OP-385-2024 de fecha 12 de febrero de 2024, donde se solicita se remitan los soportes de los cierres del 100% de las actas de vecindad de los predios que fueron objeto de las Actas de Vecindad Inicial; correspondientes a las Unidades Funcionales UF 1, 2, 3A y 3B.

##### **A la fecha:**

5143.051ANI CERS-OP- 0035-2025 13 de enero de 2025. Coordinación mesa de trabajo Sociopredial. Criterio entrega de informes Socioprediales. Rta a sus asuntos: D-1638-2024 de fecha 24 de diciembre de 2024 y D-14-2025 de fecha 8 de enero de 2025.

5143.051ANI CERS-OP-0078-2025 21 de enero de 2025 Respuesta a su oficio 20256040011661 del 15 de enero de 2025 con asunto "Proyecto Perimetral de Oriente de Bogotá - solicitud de información requerida dentro de la Investigación Disciplinaria IUS-E-2023-364452 - IUC-2023- 3024564 Procuraduría delegada Disciplinaria de Instrucción 9."

Los indicadores de cumplimiento de las actividades desarrolladas Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

#### **10.5.6 COMITES DE SEGUIMIENTO SOCIAL**

No se llevaron a cabo reuniones de seguimiento

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 330 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 10.5.7 INFORMES

Se establece la siguiente gestión en torno a los documentos informes dejando así la presente trazabilidad:

#### Trazabilidad:

CERS-OP-1002-2024 17 de abril de 2024 Reiteración comunicados CERS-OP-2393-2023 - CERS-OP-762-2024. se reitera lo solicitado en los comunicados CERS-OP-2393-2023 de fecha 8 de septiembre de 2023 y CERS-OP-762-2024 de fecha 18 de marzo de 2024; esto en razón que a la fecha no se ha remitido a esta interventoría los ajustes a la documentación relaciona en su comunicado D-1006 de 2023 del 10 de julio de 2023, relacionada con: "Informe semestral de acompañamiento a la gestión socio predial enero - junio 2023". De otra parte, me permito mencionar que no se ha entregado el informe semestral correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2023.

CERS-OP-1589-2024 24 de junio de 2024 Respuesta D-795-2024. Respuesta a su comunicación R-1634-2024 – CERSOP-1224-2024 "Respuesta a su D-.623-2024 Informe trimestral PGSC enero – marzo 2024 V0". Objeción informe trimestral enero a marzo 2024. En cumplimiento de nuestras obligaciones, dando alcance a su comunicado D-795-2024 de fecha 6 de junio de 2024, me permito mencionar que una vez revisadas las observaciones solicitadas mediante comunicado CERS-OP-1224-2024, se observa que estas no fueron subsanadas, por tanto, se adjunta el informe nuevamente para su respectivo ajuste.

5143.051ANI CERS-OP-1961-2024 05 de agosto de 2024 Respuesta D-930-2024. "Informes semestrales de la Gestión Social Contractual.". Objeción. alcance a su comunicado mediante consecutivo D-930-2024 de fecha 8 de julio de 2024, generando la objeción a los informes: Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional y Programa de Educación y Capacitación a la Comunidad Aledaña al Proyecto. Por lo cual, se adjuntan los informes con las observaciones identificadas con el fin de ser subsanadas para revisión y debida aprobación. Para el caso del informe Programa de Cultura Vial, no se adjuntan observaciones, debido que este cumple con lo requerido. No obstante, para generar la debida no objeción del comunicado del asunto, quedaremos atentos al ajuste de los dos programas y si, dar una respuesta integral de cumplido a lo presentado en el comunicado D-930-2024.

5143.051ANI CERS-OP-2004-2024 12 de agosto de 2024 Respuesta. D-1000-2024" Informe trimestral PGSC enero-marzo 2024" Respuesta a su comunicación (R-2117-2024) CERS-OP-1589-2024 "Respuesta D-795-2024. Respuesta a su comunicación (R-1634-2024) CERSOP-1224- 2024 "Respuesta a su D-623-2024 Informe trimestral PGSC Enero – Marzo 2024 V0". Objeción informe trimestral enero a marzo 2024.

5143.051ANI CERS-OP-2161-2024 3 de septiembre de 2024 Respuesta. D-1134-2024. Objeción informe trimestral enero a marzo 2024. Su asunto: Respuesta a su comunicación (R-2608-2024) – CERS-OP-2004- 2024 "Respuesta. D-1000-2024 Informe trimestral PGSC

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 331 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

enero-marzo 2024 Respuesta a su comunicación (R-2117-2024) CERS-OP-1589-2024 Respuesta D-795-2024. Respuesta a su comunicación (R-1634-2024) CERS-OP-1224-2024 Respuesta a su D-623-2024 Informe trimestral PGSC Enero – Marzo 2024 V0. Objeción informe trimestral enero a marzo 2024".

5143.051ANI CERS-OP-2329-2024 25 de septiembre de 2024 Respuesta solicitud Contraloría - Estado del Evento Eximente de Responsabilidad correspondiente a las UF 4 y 5 cuyo alcance corresponde a la "Financiación, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del corredor Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato" por medio del presente el Consorcio ERS ("Interventoría") según solicitud efectuada vía mail del día 23 de septiembre de 2024 por del equipo de supervisión, nos permitimos presentar el informe sobre el estado y avance del evento eximente de responsabilidad declarado en las unidades funcionales 4 y 5 del corredor vial

5143.051ANI CERS-OP-2372-2024 1 de octubre de 2024, Rta comunicado: D-1160-2024 Asunto: informe Atención a observaciones comunicado CERS-OP-1961-2024; R-2535-2024; "Respuesta D-930-2024. "Informes semestrales de la Gestión Social Contractual." No objeción.

5143.051ANI CERS-OP- 2466-2024 18 de octubre de 2024 Complementación comunicado: 5143.051ANI CERS-OP-2157-2024. Su asunto: Respuesta D-1122-2024, al oficio CERS-OP-1569-2024 (R-2107- 2024) Alcance al oficio D-791-2024. Verificación Memorias Técnicas correspondientes a mes de abril del año 2024; Respuesta a su oficio CERS OP 762 – 2024 (R-1033–2024). "Se adjuntan las observaciones del informe semestral I 2023 e informe semestral II 2023 para su revisión D-1453-2024. "Objeción al semestral de acompañamiento a la gestión socio predial enero - junio 2023, de fecha 6 de octubre de 2024. Me permito mencionar que, una vez validadas las observaciones y claridades en su comunicación, se genera la no objeción del informe socio predial correspondiente al periodo enero a junio del año 2023. Es de aclarar que el presente comunicado, está inmerso en el D-1122-2024, donde se generan las entregas de los informes socio prediales (I y II semestre 2023). D-1122-2024. Respuesta al oficio CERS-OP-1569-2024 (R-2107-2024) Alcance al oficio D791-2024. Verificación Memorias Técnicas correspondientes a mes de abril del año 2024; Respuesta a su oficio CERS OP 762 – 2024 (R-1033–2024), con anotación final: ..."informe semestral II 2023 para su revisión" .... A lo anteriormente relacionado, se adjuntan al presente comunicado, las debidas observaciones las cuales se encuentran en el documento PDF. En ese sentido, se otorga un tiempo perentorio de cinco (5) días hábiles luego del recibo de la presente para subsanar los hallazgos evidenciados. De otra parte, es necesario mencionar que no se ha entregado el informe semestral correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2024. De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar la falta de atención a este aspecto, generando retraso al cumplimiento de las obligaciones del contrato tal como se señala parte general del contrato.... ..."9.2. Obligaciones principales del Concesionario durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, (c) Presentar los informes exigidos en este contrato, (v) el Concesionario deberá además cumplir con las demás obligaciones correspondientes a esta Etapa de

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 332 de 591</b>                   |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Operación y Mantenimiento que se encuentren incluidas en los diferentes apéndices, y en las demás secciones y capítulos del contrato".

5143.051ANI CERS-OP- 2649-2024 21 noviembre de 2024 Objeción informe trimestral social periodo Julio a septiembre de 2024. Su asunto: Respuesta D-1425-2024. "Informe trimestral PGSC Julio - septiembre 2024."

5143.051ANI CERS-OP-2869-2024, 30 de diciembre de 2024. Respuesta al Comunicado D-1609-2024. Objeción informe trimestral Abril – junio 2024. "Respuesta a su comunicado CERS-OP-2005-2024 Rad Interno R-2610- 2024 "Respuesta D-1012-2024 informe trimestral PGSC abril-mayo-junio V0 2024, objeción informe trimestral"

5143.051ANI CERS-OP- 0002-2025, 3 de enero de 2025 Rta D-1639-2024. No objeción perturbaciones diciembre 2024. Su asunto: Informe Mensual de Espacio Público, contiene la información del mes de diciembre de 2024.

5143.051ANI CERS-OP- 0123-2025 27 de enero de 2025 No objeción a informes semestrales: Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al proyecto y Programa de cultura vial. Rta a su asunto: D-365-2023 de fecha marzo 2023. Informes semestrales del periodo comprendido entre julio – diciembre de 2022, correspondiente a los programas de capacitación a la comunidad aledaña al proyecto y cultura vial.

5143.051ANI CERS-OP-0258-2025, 17 de febrero de 2025. No objeción a informe Semestral II – 2024. Programa de Cultura Vial. Rta a su asunto: D-157-2025. Informe semestral II – 2024 Programa de cultura vial.

5143.051ANI CERS-OP-0271-2025 20 de febrero de 2025 Objeción Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional. Rta a su asunto: D-158-2025. Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

5143.051ANI CERS-OP-0316-2025, 25 de febrero de 2025. Objeción Informe trimestral octubre a diciembre 2024. Rta a su asunto: D-160-2025. Informe trimestral contractual, octubre – diciembre 2024 Vo.

5143.051ANI CERS-OP-0035-2025 13 de enero de 2025. Coordinación mesa de trabajo Sociopredial. Criterio entrega de informes Socioprediales. Rta a sus asuntos: D-1638-2024 de fecha 24 de diciembre de 2024 y D-14-2025 de fecha 8 de enero de 2025

5143.051ANI CERS-OP-0258-2025 17 de febrero de 2025 No objeción a informe Semestral II – 2024. Programa de Cultura Vial. Rta a su asunto: D-157-2025. Informe semestral II – 2024 Programa de cultura vial.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 333 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

#### A la fecha:

5143.051ANI CERS-OP-0408-2025, 10 de marzo de 2025. No Objeción Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional. Rta a su asunto: D-282-2025. Informe semestral II – 2024 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional.

### 10.6 CONCLUSIONES

Como parte de las conclusiones se menciona:

Se valida la atención a las PQRS y Derechos de petición por parte del Concesionario, evidenciando el cumplimiento de los tiempos de atención al corte 19 de diciembre de 2024. Para el corte de etapa de revisión no se han generado mesas de trabajo en torno a dicha etapa, por consiguiente no se conoce el estado de las pqrs y los tramites que se adelantan.

Se remite por parte del Concesionario los formatos sociales que corresponden a la etapa de revisión y el informe social y de arqueología para revisión de esta interventoría. Dicha documentación será objeto de primera revisión. Para el caso se relaciona:

5143.051ANI CERS-OP-0509-2025 26 de marzo de 2025 Respuesta a sus comunicaciones D-289-2025. Respuesta a sus comunicados 5143.051ANI CERS-OP-0151-2025 (R-326-2025) Solicitud de diligenciamiento y envió de los formatos de inventarios dispuestos en el Manual de Reversiones GCSP-M-001, comunicado 5143.051ANI CERS-OP0152-2025 (R-328-2025) Solicitud del inventario para revisión, comparación y Vo. Bo. con el inventario inicial anexo al contrato, en cumplimiento al procedimiento GCSP-P-018 Definición Estrategia De Reversiones, Manejo Operativo De Reversiones y Terminación De Los Contratos De Concesión, comunicado 5143.051ANI CERS-OP-0186-2025 (R-402-2025) Solicitud de presentación Programación de Recorridos para dar cumplimiento a lo descrito en el Parte General del Contrato, numeral 9.7, Etapa de Reversión, parte d, romanito (ii), comunicado 5143.051ANI CERS-OP-0371-2025 (R705-2025) Reiteración de nuestra solicitud con oficio 5143.051ANI CERSOP 0151-20025 del 31 de enero de 2025, Solicitud de diligenciamiento y envió de los formatos de inventarios dispuestos en el Manual de Reversiones GCSP-M-001 y el comunicado 5143.051ANI CERS-OP-0186-2025 (R-715-2025) Solicitud de presentación Programación de Recorridos para dar cumplimiento a lo descrito en el Parte General del Contrato, numeral 9.7, Etapa de Reversión, parte d, romanito (ii).

Se validan las actividades que fueron ejecutadas por el Concesionario en relación con lo concerniente a la gestión social y los lineamientos de la etapa de revisión. Para lo cual, el concesionario remite informes mensuales a partir del mes de enero de 2025 a la fecha del presente informe. Es de aclarar que los informes correspondientes a enero de 2025 y febrero de 2025 cuentan con las debidas revisiones al área social, las cuales deberán ser ajustas por el Concesionario.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 334 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 11 GESTIÓN PREDIAL

### 11.1 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

La Interventoría en cumplimiento de su labor, presenta a la ANI el informe mensual de Gestión Predial, el cual contempla entre otros, el resumen de las Etapas de Gestión Predial,

análisis y reporte de estado de predios en expropiación, predios solicitados a la ANT, informe general de correspondencia recibida y enviada, compromisos del Concesionario, relación de comités y hallazgos. El presente informe se elabora con base en la información disponible y registrada en la sabana predial, la tira topográfica, el informe del concesionario y los comités de seguimiento mensual a corte del 31 de marzo de 2025.

### 11.2 GENERALIDADES

Este informe contempla los avances obtenidos en la gestión predial desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2025, para el Contrato de interventoría VEJ 542 DE 2022, suscrito el 03 de noviembre del 2022 con un término de 4 años, el cual finaliza el 03 de noviembre de 2026.

### 11.3 AVANCE Y ESTADO DE LA GESTION PREDIAL

**Tabla 206 Resumen etapas de la gestión predial**

| UNIDAD FUNCIONAL                                        | UF1                                   | UF2                                   | UF 3A                                                 | UF 3B | UF4  | UF5   | UF 5V |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Fecha inicio de obra                                    | 15/12/2015                            |                                       |                                                       |       |      |       |       |
| Fecha fin de obra (entrega de UF)                       | 01/02/2019<br>(suscripción<br>acta de | 31/08/2021<br>(suscripción<br>acta de | 08/04/2022<br>(suscripción<br>acta de<br>terminación) | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   |
| Longitud Proyecto (Km)                                  | 38.42                                 | 24.08                                 | 32.62                                                 |       | 31   | 21.27 | 4.85  |
| Longitud efectiva predial total (Km)                    | 3.3                                   | 21                                    | 8.8                                                   | 0.07  | 29.7 | 21.27 | 4.85  |
| Pedios requeridos                                       | 38                                    | 225                                   | 228                                                   | 1     | 414  | 476   | 107   |
| Pedios con Oferta notificada e inscrita                 | 38                                    | 225                                   | 228                                                   | 0     | 177  | 135   | 0     |
| Pedios disponibles                                      | 38                                    | 225                                   | 228                                                   | 0     | --   | --    | --    |
| Longitud efectiva predial disponible (Km)               | 3.3                                   | 21                                    | 8.8                                                   | 0     | 21.4 | 17.8  | 0     |
| Pedios adquiridos por enajenación voluntaria            | 37                                    | 201                                   | 216                                                   | 0     | 61   | 20    | --    |
| Pedios adquiridos por expropiación judicial             | 0                                     | 9                                     | 5                                                     | --    | --   | --    | --    |
| Pedios en expropiación                                  | 0                                     | 9                                     | 9                                                     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| Total, pedios adquiridos                                | 37                                    | 214                                   | 219                                                   | 0     | 61   | 20    | --    |
| Pedios faltantes por adquirir                           | 1                                     | 11                                    | 9                                                     | 1     | 353  | 456   | 107   |
| Número de solicitudes de desenglobe catastral radicados | 33                                    | 185                                   | 193                                                   | -     | -    | -     | -     |
| Número de expedientes prediales archivados              | 20                                    | 0                                     | 0                                                     | 0     | 0    | 0     | 0     |

Fuente: Tabla resumen etapas de la gestión predial, instructivo GCSP-I-025 versión 002.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 335 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Se tiene un acumulado de las 3 unidades funcionales de 22 predios pendientes por adquirir, de la UF1 falta 1 predio, de la UF2 faltan 11 predios (9 en expropiación, 2 en adjudicación de baldíos) y de la UF 3 faltan 9 predios (9 en expropiación).

Se cuenta con 411 solicitudes de desenglobe catastral registrados a la fecha de noviembre de 2024 para las unidades funcionales 1, 2 y 3.

A continuación, se da un detallado de la gestión predial del mes de marzo, para cada Unidad Funcional.

### 11.3.1 UNIDAD FUNCIONAL 1

**Tabla 207 Consolidado de gestión predial unidad funcional 1**

| CONSOLIDADO DE GESTIÓN PREDIAL UNIDAD FUNCIONAL 1 |                                     |                                        |           |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Predios requeridos                                | Cesión gratuita (a favor de la ANI) | Baldíos y/o clarificación de propiedad | FOLIO ANI | EXPEDIENTES RADICADOS EN ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ANI |
| 38                                                | 4*                                  | 1                                      | 37        | 20                                                    |

Fuente: Elaboración propia en base a los informes entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental Bogotá S.A.S.

\*En la Unidad funcional 1 se reportan 38 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales uno (1) está pendiente por clarificarse su naturaleza jurídica (posible baldío) y cuatros (4) predios que fueron cedidos por sus propietarios a título gratuito, los cuales están identificados con las siguientes fichas prediales y ya cuentan con folio a favor de la ANI:

- Predio UF-1-005A-D: Folio de Matricula Segregado 50N-20872071.
- Predio UF-1-015A-I: Folio de Matricula Segregado 50N-20852707.
- Predio UF-1-017A-D: Folio de Matricula Segregado 50N-20852822.
- Predio UF-1-018A-D: Folio de Matricula Segregado 50N-20857743.

De los 38 predios, 37 predios cuentan ya con folio ANI según la sabana de avance predial en su versión 113 correspondiente al mes de marzo de 2025, la cual es suministrada por el concesionario.

La Unidad Funcional 1, cuenta con seis predios con solicitud de desenglobe, 32 predios con resolución de desenglobe, para un total de 38 predios con solicitud y resolución expedida; por último, se cuenta con 28 certificados catastrales del área segregada, es decir, solo faltan 9 predios con dicho certificado.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 336 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

### Estado Actual Predio Pendiente Por Adquirir UF-1

#### UF-1-050-D – Proceso de clarificación de la propiedad – Solicitud Adjudicación Baldío

Mediante comunicación D-1605 del 12 de diciembre de 2024, el concesionario informa que la Agencia Nacional de Tierras "ANT" el 28 de noviembre del 2024 expidió las Resoluciones 02443006055686, 202443006055676 y 202443006055706 por las cuales se adjudicó las áreas de terreno como predios Baldíos.

### 11.3.2 UNIDAD FUNCIONAL 2

**Tabla 208 Consolidado de gestión predial unidad funcional 2**

| CONSOLIDADO DE GESTIÓN PREDIAL UNIDAD FUNCIONAL 2 |                                 |                        |                                    |                       |             |           |                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Pedios requeridos                                 | Tramite adjudicación de baldíos | Expropiación Sentencia | Etapas administrativa expropiación | Expropiación juzgados | Enajenación | FOLIO ANI | EXPEDIENTES RADICADOS EN ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ANI |
| 225                                               | 2                               | 3                      | 0                                  | 6                     | 0           | 214       | 0                                                     |

Fuente: Elaboración propia en base a los informes entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental Bogotá S.A.S.

Consolidado de gestión predial unidad funcional 2:

1. Expropiación con sentencia: Son predios los cuales ya tienen sentencia a favor de la ANI, pero por algún motivo no se ha registrado la sentencia.
2. Etapa administrativa: Son predios que están empezando el proceso de expropiación y se encuentran en revisión de la resolución de expropiación por la ANI o por la Interventoría.
3. Expropiación en juzgados: Son predios que tienen demanda admitida, sin embargo, aún no cuentan con sentencia a favor de la ANI.

Para el mes de marzo de 2025, en la Unidad funcional 2 se reportan 225 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales se cuenta con doscientos catorce (214) predios con folio ANI, 9 predios se encuentran en proceso de expropiación y 2 predios en adjudicación de baldíos, para un total once (11) predios pendientes por adquirir a favor de la ANI, para el mes en mención.

#### PREDIO UF-2-087-I:

Mediante comunicación D-1605 del 12 de diciembre de 2024, el concesionario informa que la Agencia Nacional de Tierras "ANT" el 28 de noviembre del 2024 expidió las Resoluciones 02443006055686, 202443006055676 y 202443006055706 por las cuales se adjudicó las áreas de terreno como predios Baldíos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 337 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**PREDIO UF-2-062A-I:**

Mediante comunicación D-1605 del 12 de diciembre de 2024, el concesionario informa que la Agencia Nacional de Tierras “ANT” el 28 de noviembre del 2024 expidió las Resoluciones 02443006055686, 202443006055676 y 202443006055706 por las cuales se adjudicó las áreas de terreno como predios Baldíos.

**Tabla 209 Gestión realizada de la UF 2 para el corte de marzo de 2025 desde su última actuación. (Pendiente por confirmar algunos predios con El Concesionario)**

| PREDIO     | ETAPA    | PROPIETARIOS                                                                                                   | GESTIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF-2-017-D | JUDICIAL | FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDUBOGOTA - HOGAR NIÑOS POR UN NUEVO PLANETA | SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI – ENTREGA DEFINITIVA: 21-11-2024: Se pago arancel judicial.                                                                                                                    |
| UF-2-027-I | JUDICIAL | MINERAL WORLD S.A. EN LIQUIDACIÓN                                                                              | AUDIENCIA FIJADA – ENTREGA ANTICIPADA: 25-09-2024: Mediante Auto de fecha 24 de septiembre de 2024 Juez fijó fecha para audiencia el 21 de enero de 2025. //26-09-2024: Allegan acta de entrega anticipada |
| UF-2-046-D | JUDICIAL | ANGELA ADRIANA AROCHA PEDRAZA Y OTROS                                                                          | SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO: 12-11-2024: Se radicó memorial con solicitud de impulso procesal referente a la solicitud de emplazamiento.                                                                    |
| UF-2-082-D | JUDICIAL | CAMILO ARTURO ZAPATA VÁSQUEZ                                                                                   | DEMANDA ADMITIDA: 12-11-2024: Se radicó memorial con solicitud de impulso procesal referente a los oficios para inscribir demanda en FMI                                                                   |
| UF-2-090-D | JUDICIAL | MARÍA MERCEDES RAMOS SANDOVAL Y OTROS                                                                          | SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI – ENTREGA DEFINITIVA: 8-11-2024: Se radicó impulso procesal solicitando Secretaria expida los oficios para registrar la Sentencia.                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 338 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PREDIO      | ETAPA    | PROPIETARIOS                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF-2-099-I  | JUDICIAL | BOBILLIER ROJAS Y CIA S. EN C EN LIQUIDACIÓN                               | SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI- ENTREGA DEFINITIVA: 07-11-2024: Mediante Auto de fecha 6 de noviembre Juez subcomisionó Entrega Anticipada a la Alcaldía Municipal de Sopo.                                                                                                   |
| UF-2-112-D  | JUDICIAL | PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE SOCIEDADES Y CIA S.A. "PROADSO & CIA S.C.A." | PARA DICTAR SENTENCIA: 12-11-2024: Se radicó segundo impulso procesal solicitando proferir Sentencia                                                                                                                                                                       |
| UF-2-125-D  | JUDICIAL | HACIENDA TIMANA LTDA (EN LIQUIDACIÓN)                                      | SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI: 23-10-2024: Se radicó ante la ORIP Bogotá Zona Norte Oficio de registro de la Sentencia bajo el turno No. 2024-68065, al igual que oficio que cancela inscripción de la demanda turno 2024-68060 y oficio cancelación Oferta turno 2024-68057 |
| UF-2-199A-I | JUDICIAL | INCOVAR S.A.S. e INVERSIONES MACADAMIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN               | SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI: 12-11-2024: Se radicó memorial con solicitud de impulso procesal referente a la solicitud de corrección y adición de la Sentencia                                                                                                             |

Fuente: Elaboración propia en base a los informes entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental Bogotá S.A.S.

Se actualiza la información relacionada de la Unidad Funcional 2 y 3, con base en la información aportada en el último informe de Gestión predial aportado por el Concesionario (marzo 2025 – Ver. 113).

## Expropiaciones Unidad Funcional 2

**Tabla 210 Gestión de expropiaciones unidad funcional 2**

| PREDIO      | Proceso judicial de expropiación |                  |                  |                         |                             |                     |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
|             | Para Dictar Sentencia            | Demanda Admitida | Audiencia Fijada | Solicitud Emplazamiento | Sentencia a favor de la ANI | Subsanación Demanda |
| UF-2-017- D |                                  |                  |                  |                         | X                           |                     |
| UF-2-027-I  |                                  |                  | X                |                         |                             |                     |
| UF-2-046-D  |                                  |                  |                  | X                       |                             |                     |
| UF-2-082-D  |                                  | X                |                  |                         |                             |                     |
| UF-2-090-D  |                                  |                  |                  |                         | X                           |                     |
| UF-2-099-I  |                                  |                  |                  |                         | X                           |                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 339 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PREDIO      | Proceso judicial de expropiación |                  |                  |                         |                             |                     |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
|             | Para Dictar Sentencia            | Demanda Admitida | Audiencia Fijada | Solicitud Emplazamiento | Sentencia a favor de la ANI | Subsanación Demanda |
| UF-2-112-D  | X                                |                  |                  |                         |                             |                     |
| UF-2-125-D  |                                  |                  |                  |                         | X                           |                     |
| UF-2-199A-I |                                  |                  |                  |                         | X                           |                     |

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla de expropiaciones de la unidad funcional 2 para noviembre se tienen 9 predios se encuentran en proceso de expropiación y 2 predios en adjudicación de baldíos.

### 11.3.3 UNIDAD FUNCIONAL 3

**Tabla 211 Consolidado de gestión predial unidad funcional 3**  
**CONSOLIDADO DE GESTIÓN PREDIAL UNIDAD FUNCIONAL 3A**

| Predios requeridos | Expropiación Sentencia | Etapa administrativa expropiación | Expropiación juzgados | Proceso de enajenación voluntaria | Predios de adquisición especial | FOLIO ANI | EXPEDIENTES RADICADOS EN ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ANI |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 228                | 1                      | 1                                 | 7                     | 1*                                | 0                               | 219       | 0                                                     |

Fuente: Elaboración propia en base a los informes entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental Bogotá S.A.S.

De 228 Predios requeridos para la UF-3, se cuenta con 219 predios a favor de la ANI, 9 Predios en proceso de expropiación con demanda admitida.

**Tabla 212 Gestión realizada de la UF 3 para el corte de diciembre de 2024 desde su última actuación. (Pendiente por confirmar algunos predios con El Concesionario)**

| PREDIO      | ETAPA    | PROPIETARIOS                                                                                        | GESTIÓN                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF-3A-016-I | JUDICIAL | INSTITUTO DE ESTUDIOS POR LA DEMOCRACIA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA EN COLOMBIA DE PAZ – EN LIQUIDACIÓN | NOTIFICACIÓN –ENTREGA ANTICIPADA: 21-10-2024: Se radicó impulso procesal solicitando información de correos para notificar a las partes                                  |
| UF-3A-020-I | JUDICIAL | LUIS ANDRÉS SENDOYA ZAMUDIO Y OTROS                                                                 | DEMANDA ADMITIDA: 12-11-2024: Se radicó memorial allegando pago del saldo restante del avalúo solicitando fijar fecha para entrega anticipada. //18-11-2024: AL DESPACHO |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 340 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PREDIO        | ETAPA    | PROPIETARIOS                                                                                                        | GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF-3A-022A-DI | JUDICIAL | PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ARENERAS DE SANTA ROSA cuyo vocero es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A | CONTESTACIÓN DEMANDA – SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA: 12-11-2024: Se radicó tercer impulso procesal respecto de solicitud de aclaración Auto de fecha 19 de julio de 2024.                                                                                                                                                                                                                        |
| UF-3A-024-D   | JUDICIAL | JUAN BERNARDO SANINT GUTIÉRREZ; JOSÉ LUIS NAVALLAS VALLESPIN                                                        | SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA – NOTIFICACIÓN DEMANDADOS: 22-10-2024: Juzgado remite Oficios a entidades consultando datos para notificación //25-10-2024: Mediante Auto de fecha 24 de octubre de 2024, Juez fijó fecha para entrega anticipada el 22 de noviembre de 2024 a las 2.30pm //31-10-2024: Respuesta Nueva EPS // 22 de noviembre de 2024 se realizó diligencia de entrega anticipada. |
| UF-3A-028B-I  | JUDICIAL | JOSE DOSITEO RAMÍREZ Y OTROS                                                                                        | NOTIFICACIÓN CURADOR: 12/11/2024: Se radicó memorial con segundo impulso procesal solicitando a secretaria notificar a la Curadora Ad Litem.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UF-3A-077A-I  | JUDICIAL | INVERALVA S.A.S                                                                                                     | AVALÚO IGAC: 25-10-2024: AL DESPACHO //05-11-2024 IGAC envía al Juzgado cotización actualizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UF-3A-111A-D  | JUDICIAL | LEONOR ROA DE GARCÍA                                                                                                | 10-09-2024: AL DESPACHO PARA SENTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UF-3A-122-D   | JUDICIAL | GREEN PARK                                                                                                          | ENTREGA ANTICIPADA- CONTESTACIÓN DEMANDA: 14-11-2024: Mediante Auto de fecha 13 de noviembre de 2024, Juez ordena notificar la demanda a Banco Colpatria                                                                                                                                                                                                                                            |
| UF-3A-159-I   | JUDICIAL | CARLOS F GONZÁLEZ CUELLAR                                                                                           | SENTENCIA A FAVOR DE LA ANI: 12-11-2024: Se radicó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>VERSIÓN: 1</b>                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 341 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". |                                                       |

| PREDIO | ETAPA | PROPIETARIOS                  | GESTIÓN                                                       |
|--------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        |       | Y CIA S EN C - EN LIQUIDACIÓN | impulso procesal solicitando oficios para registrar Sentencia |

Fuente: Elaboración propia en base a los informes entregados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental Bogotá S.A.S.

Para los predios que aún no tienen folio a favor de la ANI de la unidad funcional 3 se evidencia para el mes de marzo de 2025 la gestión por parte del concesionario ha sido constante para todos los predios, ya que ninguno supera 19 días hábiles sin presentar impulsos en su proceso de expropiación o enajenación, por parte de la Interventoría se realiza un seguimiento a estos lapsos de tiempo con el fin de cumplir con su labor de vigilancia y control.

#### 11.3.4 Expropiaciones Unidad Funcional 3

**Tabla 213 Expropiaciones unidad funcional 3**

| PREDIO        | Concesionario | Interventoría | Radicación ANI | notificación de resolución | En la ANI para expedir poder y ejecutoria | Proceso judicial |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| UF-3A-016-I   |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-020-I   |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-022A-DI |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-024-D   |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-028B-I  |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-077A-I  |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-111A-D  |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-122-D   |               |               |                |                            |                                           | X                |
| UF-3A-159-I   |               |               |                |                            |                                           | X                |

Fuente: Elaboración propia.

Para el corte del mes de marzo de 2025 se cuenta con 9 predios en proceso de expropiación de la unidad funcional 3, los cuales, nueve (9) predios en proceso judicial.

**Tabla 214 Gestión de expropiaciones unidad funcional 3**

| PREDIO        | Proceso judicial de expropiación |                            |                  |             |                             |                |                          |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
|               | Notificación de la demanda       | Contestación de la demanda | Demanda admitida | Avalúo IGAC | Sentencia a favor de la ANI | Para Sentencia | Registro de la sentencia |
| UF-3A-016-I   | X                                |                            |                  |             |                             |                |                          |
| UF-3A-020-I   |                                  |                            | X                |             |                             |                |                          |
| UF-3A-022A-DI |                                  | X                          |                  |             |                             |                |                          |
| UF-3A-024-D   | X                                |                            |                  |             |                             |                |                          |
| UF-3A-028B-I  | X                                |                            |                  |             |                             |                |                          |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 342 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| PREDIO       | Proceso judicial de expropiación |                            |                  |             |                             |                | Registro de la sentencia |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
|              | Notificación de la demanda       | Contestación de la demanda | Demanda admitida | Avalúo IGAC | Sentencia a favor de la ANI | Para Sentencia |                          |
| UF-3A-077A-I |                                  |                            |                  | X           |                             |                |                          |
| UF-3A-122-D  |                                  | X                          |                  |             |                             |                |                          |
| UF-3A-111A-D |                                  |                            |                  |             |                             | X              |                          |
| UF-3A-159-I  |                                  |                            |                  |             | X                           |                |                          |

Fuente: Elaboración propia.

Los predios en expropiación que se encuentran en etapa judicial para el corte del 31 de marzo de 2025 se subdividen en:

1. Tres en notificación de la demanda.
2. Dos en contestación de la demanda.
3. Un predio con demanda admitida
4. Un predio con Sentencia a favor de la ANI.

#### 11.4 PREDIOS PARA PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEVUELTOS POR LA INTERVENTORIA

Sin observaciones en este ítem.

#### 11.5 INDICADORES DE LA GESTION PREDIAL

**Tabla 215 Indicadores de la gestión predial Marzo 2025**

| Indicador                              | Formula                                                                                 | UF 1  | UF 2 | UF 3 | UF 4 | UF 5 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                        |                                                                                         | R     | R    | R    | R    | R    |
| Disponibilidad predial KM              | (km de longitud disponible) / (km longitud requerida)                                   | 100%  | 100% | 100% | N/A  | N/A  |
| Disponibilidad predial N°              | Numero de predios disponibles / número de predios requeridos                            | 100%  | 100% | 100% | N/A  | N/A  |
| Adquisición predial                    | Numero de predios adquiridos / número de predios requeridos                             | 97,4% | 93%  | 94%  | 15%  | 3%   |
| Revisión expropiaciones                | Numero de predios radicados para expropiación / número de predios requeridos            | 0%    | 5%   | 4%   | N/A  | N/A  |
| Eficiencia en el des englobé catastral | Número de solicitudes de des englobé catastral radicados / número de predios adquiridos | 97%   | 89%  | 87%  | N/A  | N/A  |
| Expediente predial archivo             | Número de expedientes predial archivado / número de predios adquiridos                  | 53%   | 0%   | 0%   | N/A  | N/A  |

Fuente: Elaboración propia en base al instructivo GSCP-I-025.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 343 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

## 11.6 SEGUIMIENTO A PREDIOS ESPECIALES (BALDIOS)

**Tabla 216 Predios Baldíos**

| Cantidad procesos | Unidad funcional | N° Ficha predial | Área requerida | Longitud | Radicado ante ANT | Fecha del radicado | ESTADO                      |                    |                |                             |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
|                   |                  |                  | (m2)           | (m)      |                   |                    | En revisión y/o complemento | Desistido o negado | En trámite ANT | Fecha de entrega anticipada |
| 1                 | 1                | 1-050-D          | 491,57         | 88,72    | 20236040362451    | 6/10/2023          |                             |                    | X              | 15/11/2018                  |
| 2                 | 2                | 2-062A-I         | 334,29         | 71,04    | 20236040362451    | 6/10/2023          |                             |                    | X              | -                           |
| 3                 | 2                | 2-087-I          | 27,07          | 20,93    | 20234090327152    | 23/03/2023         |                             |                    | X              | -                           |

Fuente: Elaboración propia en base al instructivo GSCP-I-025.

De los 3 predios pendientes por adquirir que se encuentran en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras, 2 de ellos (UF-1-050-D y UF-2-062A-I).

Para el predio UF-2-062A-I Mediante comunicación D-1605 del 12 de diciembre de 2024, el concesionario informa que la Agencia Nacional de Tierras "ANT" el 28 de noviembre del 2024 expidió las Resoluciones 02443006055686, 202443006055676 y 202443006055706 por las cuales se adjudicó las áreas de terreno como predios Baldíos

Por otra parte, el predio UF-2-087-I, Mediante comunicación D-1605 del 12 de diciembre de 2024, el concesionario informa que la Agencia Nacional de Tierras "ANT" el 28 de noviembre del 2024 expidió las Resoluciones 02443006055686, 202443006055676 y 202443006055706 por las cuales se adjudicó las áreas de terreno como predios Baldíos.

## 11.7 COMITÉ PREDIAL

**Tabla 217 Compromisos comité predial**

| Comité predial No. | Fecha      | Compromisos                                                                            | Tema                                                                                                        | Responsable   | Fecha programada | Fecha Cumplimiento | Observaciones                                                      |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14                 |            | PARA EL MES DE ENERO DE 2024 NO SE REALIZÓ COMITÉ PREDIAL POR AUSENCIA DE CONVOCATORIA |                                                                                                             |               |                  |                    |                                                                    |
| 15                 | 28/02/2024 | 1                                                                                      | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 31/03/2024       |                    | Se programa reunión con el Contratista para el 12 de abril de 2024 |
|                    |            | 2                                                                                      | Respuesta a la visita al predio UF-3A-045-I "manantial"                                                     | Interventoría | 31/03/2024       |                    | Sin observaciones                                                  |
|                    |            | 3                                                                                      | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 31/03/2024       |                    |                                                                    |
|                    |            | 4                                                                                      | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 31/03/2024       |                    | Sin observaciones                                                  |
| 16                 | 03/04/2024 | 1                                                                                      | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 30/04/2024       |                    | Se programa reunión con el Contratista para el 12 de abril de 2024 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 344 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Comité predial No. | Fecha      | Compromisos | Tema                                                                                                        | Responsable   | Fecha programada | Fecha Cumplimiento | Observaciones                                                 |
|--------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    |            | 2           | Mesa de trabajo Predio UF-3A-045-I "manantial"                                                              | Interventoría | 08/04/2024       | 08/04/2024         | Mesa de trabajo programada Para el 8 de abril de 2024         |
|                    |            | 3           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 30/04/2024       |                    | Sin observaciones                                             |
|                    |            | 4           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 30/04/2024       |                    |                                                               |
|                    |            | 5           | Predio UF-3A-198-D: Concepto por parte de la Interventoría.                                                 | interventoría | 15/04/2024       | 17/04/2024         | Sin observaciones                                             |
| 17                 | 29/04/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 30/05/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador |
|                    |            | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 30/05/2024       |                    | Sin observaciones                                             |
|                    |            | 3           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 30/05/2024       |                    | Se revisará actas de retribución.                             |
| 18                 | 28/05/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 30/06/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador |
|                    | 28/05/2024 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 30/06/2024       |                    | Sin observaciones                                             |
|                    | 28/05/2024 | 3           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 30/06/2024       |                    | Se revisará actas de retribución.                             |
| 19                 | 21/07/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 31/07/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador |
|                    | 21/07/2024 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 31/07/2024       |                    | Sin observaciones                                             |
|                    | 21/07/2024 | 3           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 31/07/2024       |                    | Se revisará actas de retribución.                             |
| 20                 | 31/07/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 30/09/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 345 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Comité predial No. | Fecha      | Compromisos | Tema                                                                                                        | Responsable   | Fecha programada | Fecha Cumplimiento | Observaciones                                                                                                                         |
|--------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 31/07/2024 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 30/09/2024       |                    | Sin observaciones                                                                                                                     |
|                    | 31/07/2024 | 3           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 31/08/2024       |                    | Se revisará actas de retribución.                                                                                                     |
| 21                 | 28/08/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 30/09/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador                                                                         |
|                    | 28/08/2024 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 30/09/2024       |                    | Sin observaciones                                                                                                                     |
|                    | 28/08/2024 | 3           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 30/09/2024       |                    | Se revisará actas de retribución.                                                                                                     |
| 22                 | 30/09/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 30/09/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador                                                                         |
|                    | 30/09/2024 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                                                                                      | Concesionario | 30/09/2024       |                    | Sin observaciones                                                                                                                     |
|                    | 30/09/2024 | 3           | Indicadores de cumplimiento predial incorporados en el Otrosí N°12 (revisión por parte de la interventoría) | interventoría | 30/09/2024       |                    | Se revisará actas de retribución.                                                                                                     |
| 23                 | 30/10/2024 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024.                                                             | Concesionario | 13/12/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador Concesionario da nuevas fechas para subsanar al 13 de diciembre de 2024 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 346 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Comité predial No. | Fecha                                                                                      | Compromisos | Tema                                            | Responsable   | Fecha programada | Fecha Cumplimiento | Observaciones                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 30/10/2024                                                                                 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                          | Concesionario | -                |                    | Se va a esperar hasta la definición del Laudo Arbitral. Con ello, las ofertas seguirán inscritas y sin culminar gestión predial, hasta nueva instrucción                             |
| 24                 | 26/11/2024                                                                                 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024. | Concesionario | 13/12/2024       |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador Concesionario da nuevas fechas para subsanar al 13 de diciembre de 2024                                                |
|                    | 26/11/2024                                                                                 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                          | Concesionario | -                |                    | Se va a esperar hasta la definición del Laudo Arbitral. Con ello, las ofertas seguirán inscritas y sin culminar gestión predial, hasta nueva instrucción                             |
|                    | 26/11/2024                                                                                 | 3           | Normas NIIF                                     | Concesionario | 6-12-2024        |                    | Se realizará mesa de trabajo entre la interventoría y el concesionario con el fin de revisar la incorporación de los predios pendientes a presentar en el reporte de las normas NIIF |
| 25                 | PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE REALIZÓ COMITÉ PREDIAL POR AUSENCIA DE CONVOCATORIA |             |                                                 |               |                  |                    |                                                                                                                                                                                      |
| 26                 | PARA EL MES DE ENERO DE 2025 NO SE REALIZÓ COMITÉ PREDIAL POR AUSENCIA DE CONVOCATORIA     |             |                                                 |               |                  |                    |                                                                                                                                                                                      |
| 27                 | 18/02/2025                                                                                 | 1           | Demoliciones UF 4 y 5 primer trimestre de 2024. | Concesionario | -                |                    | Pendiente demolición predios el Galpón y traslado de contador Concesionario da nuevas fechas para subsanar al 13 de diciembre de 2024                                                |
|                    | 18/02/2025                                                                                 | 2           | Resolver PQRS UF 4 y 5                          | Concesionario | -                |                    | Se va a esperar hasta la definición del Laudo Arbitral. Con ello, las ofertas seguirán inscritas y sin culminar gestión predial, hasta nueva instrucción                             |
| 28                 | PARA EL MES DE ENERO DE 2025 NO SE REALIZÓ COMITÉ PREDIAL POR AUSENCIA DE CONVOCATORIA     |             |                                                 |               |                  |                    |                                                                                                                                                                                      |

Fuente: Elaboración propia en base al instructivo GSCP-I-025.

11.8 CASO ESPECIAL DE OFERTAS FORMALES DE COMPRA INSCRITAS EN FOLIO DE MATRICULA EN PREDIOS DE LAS UF 4 Y 5

La evaluación estadística de las Ofertas Formales de Compra registradas en cada uno de los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria de los predios afectos al proyecto vial en sus UF 4 y UF 5, genera la siguiente tabla y conclusiones:

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 347 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

**Tabla 218 Caso Especial Unidades UF 4 y 5**

| RESUMEN CONSOLIDADO OFERTAS FORMALES DE COMPRA<br>UNIDADES FUNCIONALES 4 Y 5 |                    |                               |                             |                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| UNIDAD FUNCIONAL /TRAMO/ TRAYECTO                                            | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA | PREDIOS CON OFERTA INSCRITA | TOTAL, PREDIOS ADQUIRIDOS | PREDIOS CON OFERTA INSCRITA SIN FOLIO ANI |
| UF 4 La Calera - Choachí                                                     | 414                | 208                           | 188                         | 61                        | 116                                       |
| UF 5 Choachí - PR 26+3060                                                    | 476                | 186                           | 189                         | 20                        | 115                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>889</b>         | <b>394</b>                    | <b>354</b>                  | <b>81</b>                 | <b>231</b>                                |

Fuente: Elaboración propia

Se puede concluir que a la fecha se registra un total de 231 Ofertas Formales de Compra inscritas en cada uno de los folios de matrícula inmobiliarias sin culminar la Gestión Predial, por lo que se insiste: actualmente sobre estos inmuebles sus titulares del derecho de dominio no puedan ejercer los elementos del derecho de propiedad, como el de la facultad de disponer libremente de sus bienes.

**Tabla 219 UTILIZACIÓN DE LA SUBCUENTA DE PREDIOS EN PESOS CORRIENTES FEBRERO 2025**

| Fondeo Subcuenta Predial Fiducia más rendimientos febrero 2025-Pesos Corrientes | Valor pagado a febrero 2025 Pesos Corrientes | % De ejecución | Rendimientos a febrero 2025 Reporte Fiducia |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| \$ 79.223.142.280,57                                                            | \$ 77.287.365.000,55                         | 97.60%         | \$ 12.672.789.507,19                        |

Fuente: Elaboración propia en base a la información Sabanas Prediales y Fiducia con corte al mes de **febrero** de 2025.

### 11.9 SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL- REPORTE DE FIDUCIA

**Tabla 220 Reporte subcuenta predial (Fiducia)**



Bancolombia



Fogafin

Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

PA POB GEN PREDIOS

KR 48 26 85

MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2025/01/31

HASTA 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 31-336549-16

031

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

|                |    |                  |                  |    |               |
|----------------|----|------------------|------------------|----|---------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 2,917,969,718.34 | SALDO PROMEDIO   | \$ | 2,093,747,064 |
| TOTAL ABONOS   | \$ | 13,498,154.12    | CUENTAS X COBRAR | \$ | .00           |
| TOTAL CARGOS   | \$ | 1,007,343,176.65 | VALOR INTERESES  | \$ | 13,498,154.12 |
| SALDO ACTUAL   | \$ | 1,924,124,695.81 | RETEFUENTE       | \$ | .00           |

| FECHA | DESCRIPCIÓN                   | SUCURSAL | DCTO | VALOR           | SALDO            |
|-------|-------------------------------|----------|------|-----------------|------------------|
| 5/02  | ABONO INTERESES AHORROS       |          |      | 3,394,808.57    | 2,921,324,526.91 |
| 6/02  | IMPOTO GOBIERNO 4X1000        |          |      | -4,013,218.42   | 2,917,311,308.49 |
| 6/02  | PAGO A PROVEE PERIMETRAL ORIE |          |      | -14,873,521.00  | 2,902,437,886.49 |
| 6/02  | PAGO A PROVEE ESCOBAR DE MUN  |          |      | -888,496,336.23 | 1,913,941,550.26 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS       |          |      | 10,143,345.55   | 1,924,124,695.81 |
|       | FIN ESTADO CUENTA             |          |      |                 |                  |

Fuente: Información mensual financiera Fiducia con corte al mes de **febrero** de 2025.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 348 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Considerando que la Fiducia entrega la información con un mes de retraso, el saldo mostrado por la FIDUCIA de \$ 1,924,124,695.81 corresponde a corte del mes de febrero de 2025, este valor es el reportado por la fiducia referente a la utilización de los fondos de la subcuenta predial recibido en el mes de febrero 2025.

**Tabla 221 Reporte subcuenta predial Pagos reportados en febrero de 2025**

| Valor base<br>(Fondeo Inicial) | Valor pagado a febrero 2025<br>Pesos Constantes | % De<br>ejecución |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| \$ 59.899.835.500              | \$ 59.586.621.169,00                            | 99.48%            |

Fuente: Elaboración propia en base a la información Sabanas Prediales con corte al mes de febrero de 2025.

Los valores tomados en tabla 221, son los reportados versión 115 e incluyen gastos de Escrituración, registro, beneficencia, lucro cesante, daño emergente y compensaciones sociales, el porcentaje de ejecución es del 99.48 % en pesos constantes, para el periodo se conserva, pues no hubo pagos para este periodo.

Adicionalmente se debe aclarar que los valores acá presentados deberán ser cotejados con los reportes de la Fiducia mes a mes conforme al numeral 7 de la guía de CONTROL Y SEGUIMIENTO PREDIAL DE INTERVENTORÍA EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ANI que dice: **7. SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL**. Para la Agencia Nacional Infraestructura el manejo de los recursos prediales debe ser revisado continuamente y **comparados contra los reportes de fiducia** para lograr resultados transparentes, eficientes a través de un control y seguimiento estricto (negrilla nuestro).

Adicionalmente se elabora un cuadro que fue solicitado por la supervisión donde se muestran los valores ofertados vs los valores pagados a febrero de 2025, con base en la información aportada de pagos a predios por la Fiducia.

| UNIDAD FUNCIONAL | TOTAL PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS OFERTADOS Y REGISTRADOS | VALOR OFERTADO A PREDIOS OFERTADOS + REGISTRADOS | PREDIOS ADQUIRIDOS | VALOR PAGADO A PREDIOS -INCLUYE ADQUIRIDOS | VALOR PAGADO A COMPENSACIONES SOCIALES | PAGADO POR DAÑO EMERGENTE | PAGADO POR LUCRO CESANTE | TOTAL PAGADO          |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| UF1              | 38                       | 31                              | 1.853.629.709                                    | 37                 | 1.853.629.712                              | 33.656.184                             | 39.692.701                | 16.641.000               | 1.943.619.597         |
| UF2              | 225                      | 224                             | 24.376.743.149                                   | 214                | 24.285.197.594                             | 200.044.365                            | 525.036.574               | 64.158.083               | 25.074.436.616        |
| UF3A             | 228                      | 221                             | 42.728.281.982                                   | 219                | 42.686.109.821                             | 198.646.926                            | 740.427.518               | 636.505.095              | 44.261.689.360        |
| UF3B             | 1                        | 1                               | -                                                | -                  | -                                          | -                                      | -                         | -                        | -                     |
| UF4*             | 414                      | 177                             | 5.906.327.005                                    | 61                 | 4.901.197.916                              | 68.347.267                             | 73.553.749                | -                        | 5.043.098.932         |
| UF5*             | 476                      | 135                             | 1.282.619.670                                    | 20                 | 858.882.616                                | 81.769.258                             | 23.868.623                | -                        | 964.520.497           |
| UF5V             | 107                      | 0                               | -                                                | -                  | -                                          | -                                      | -                         | -                        | -                     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1.489</b>             | <b>789</b>                      | <b>76.147.601.516</b>                            | <b>551</b>         | <b>74.585.017.658</b>                      | <b>582.464.000</b>                     | <b>1.402.579.165</b>      | <b>717.304.178</b>       | <b>77.287.365.001</b> |

Fuente: Elaboración propia en base a la información de pagos con corte al mes de febrero de 2024.

**Ilustración 1 Seguimiento a las normas NIIF con corte al mes de febrero 2024**

|                  | SABANA PREDIAL                                   | REPORTES NIIF                |              |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| UNIDAD FUNCIONAL | ADQUIRIDOS A SEPTIEMBRE 30-2023<br>con folio ANI | REPORTADOS A SEPTIEMBRE 2023 | POR REPORTAR |
| 1                | 37                                               | 37                           | 0            |
| 2                | 207                                              | 203                          | 4            |
| 3                | 215                                              | 203                          | 12           |
| 4                | 61                                               | 54                           | 7            |
| 5                | 20                                               | 20                           | 0            |
| <b>TOTALES</b>   | <b>540</b>                                       | <b>517</b>                   | <b>23</b>    |

Fuente: Elaboración propia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 349 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 11.10 PAGOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA SUBCUENTA PREDIAL.

Para el periodo de febrero de 2025, según reporte de la Fiducia, hubo 2 pagos a predios:

| FECHA     | CONCEPTO                                                         | NOMBRE                         | VALOR             |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 6/02/2025 | OP 8557 ULTIMO PAGO ADQUISICION DE PREDIO 50N-20048918 UF 3A-215 | PERIMETRAL ORIENTAL BOGOTA SAS | \$ 14.873.521,00  |
| 6/02/2025 | OP 8557 ULTIMO PAGO ADQUISICION DE PREDIO 50N-20048918 UF 3A-215 | ESCOBAR DE MUNOZ EMMA ALICIA   | \$ 988.456.336,23 |


### ESTADO DE ÁREAS REMANENTES DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS

Tabla 222 Áreas remanentes y sobrantes

| UNIDAD FUNCIONAL | AREA REMAMENTE   | AREA SOBRANTE        |
|------------------|------------------|----------------------|
| UF-1             | 141,31           | 1.397.077,63         |
| UF-2             | 2.210,05         | 17.749.345,01        |
| UF-3             | 13.272,82        | 4.004.364,83         |
| UF-4             | 5.676,24         | 22.811,43            |
| UF-5             | 135,91           | 3.018.146,15         |
| UF-5V            | -                | -                    |
| <b>TOTALES</b>   | <b>21.436,33</b> | <b>26.191.745,05</b> |

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 2 Áreas remanentes y sobrantes (consolidado de todas las UF)

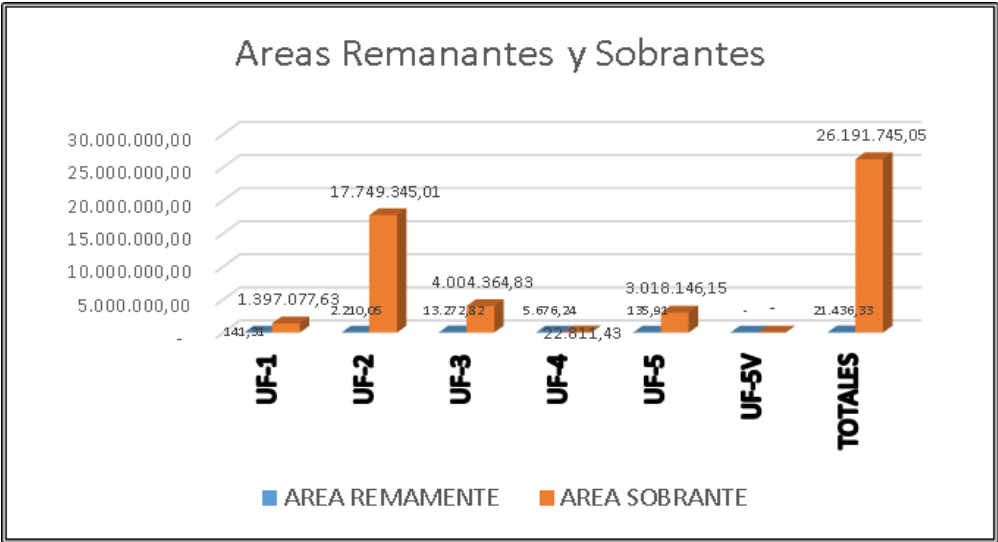

Fuente: Elaboración propia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 350 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 11.11 HALLAZGOS

**Tabla 223 Hallazgos enero 2025**

| Hallazgo No. | Tema                                          | Rad ANI de interventoría | Asunto                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha programa da | Fecha cumplimiento | Remisión      | Destinatario  |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1            | Aclaraciones líneas de compra Tilatá          | 2023409127<br>2102       | La interventoría solicita al Concesionario unas aclaraciones referentes a la línea de compra de Tilatá, dando respuesta al oficio D-1583-2023                                                                                           | N/A               | 3/11/2023          | interventoría | Concesionario |
| 2            | Demoliciones y limpieza de vegetación UF4 y 5 | 2023409137<br>1272       | solicitud de ejecución de las demoliciones de infraestructura, mejoras existentes y limpieza de vegetación o rocería de los predios adquiridos en las uf 4 y 5 para el proyecto vial y el correspondiente informe de estas actuaciones. | 30/05/20<br>23    | 13/12/2024         | interventoría | Concesionario |

Fuente: Elaboración propia en base al instructivo GSCP-I-015.

Se realizó recorrido de verificación por parte de la Interventoría el 7 de febrero de 2025, donde se evidencia que algunos predios de las unidades 4 y 5 aún se encuentran pendientes por culminar demoliciones, la delimitación de los predios con el trazado del diseño de la vía y se evidencia el mal estado de la cerca.

- Notificación de situación excepcional sobre ofertas formales de compra (medida cautelar) registradas en folios de matrícula inmobiliarias de los predios afectos a la UF4 y UF5.
- La unidad funcional 5 a la fecha ya está terminada, sin embargo, se continua con demoliciones pendientes en la unidad funcional 4, específicamente en predios con medidores de energía instalados (el retiro de los medidores depende de la empresa prestadora del servicio). pendiente por culminar esta unidad funcional.
- Se recibe de parte del Concesionario el informe con fecha 10 de julio correspondiente a la revisión de cercados de las UF 4 y UF 5. El día 31 de julio de 2023, se efectúa recorrido conjunto con el Concesionario a las unidades funcionales 4 y 5 con el objeto de verificar la instalación de los cercados de los predios observados por la anterior Interventoría. De la revisión se elabora acta donde constan los predios visitados dando así por terminado el esquema de apremio de estas unidades funcionales.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        |  |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 351 de 591</b>                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                                                           |

## 11.12 COMUNICADOS Y ACTAS DE COMITÉ

**Tabla 224 Comunicados enviados y recibidos por parte de la interventoría**

| E | R | No. | FECHA DE RADICACIÓN | NÚMERO DE COMUNICACIÓN EXTERNA | ERS       | REMITENTE                     | CONTENIDO / ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. | Fecha | ASUNTO                |
|---|---|-----|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|
|   |   | 355 | 3/3/2025            | D-233-2025                     | 0355-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Traslado de solicitud (PQRS C-4811-2025) - Laudo Parcial Final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños emitido el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 381 | 6/3/2025            | D-255                          | 0381-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Informe sobre el desarrollo del EER Unidad Funcional 1 – Semanas del 2 al 27 de diciembre de 2024 - Semanas del 30 de diciembre al 31 de enero de 2025 - Semanas del 3 al 7 de febrero de 2025 - Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión No. 002 de 2014, parte general, sección 14.2, literal (d) (vi) "Durante el Periodo Especial, la parte Afecta suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir los efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, están se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible." - Solicitud de cumplimiento de la obligación contenida en el contrato de Concesión No. 002 | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 352 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| E | R | No. | FECHA DE RADICACIÓN | NÚMERO DE COMUNICACIÓN EXTERNA | ERS       | REMITENTE                     | CONTENIDO / ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. | Fecha | ASUNTO                |
|---|---|-----|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|
|   |   |     |                     |                                |           |                               | de 2014, Parte General, Sección 14.2., Literal (d) (vi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                       |
|   |   | 382 | 6/3/2025            | D-261-2025                     | 0382-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Fase de reversión - Entrega de expedientes prediales - Remisión de las Hojas de Control y Listas de Chequeo de los expedientes prediales revisados y aprobados por la Interventoría y la ANI. (26 expedientes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 390 | 7/3/2025            | D-266-2025                     | 0390-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Respuesta oficio CERS-OP-0169-2025 (Radicado interno R-351-2025): Incumplimiento de obligaciones contractuales prediales. Solicitud de demolición de construcciones y mejoras hoy propiedad de la ANI en el predio UF3A-045-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 398 | 7/3/2025            | D-273-2025                     | 0398-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Respuesta a su comunicado ANI 20254090183842 y 20254090218062, Traslado de solicitud (PQRS-C-4793-2025) - "Laudo Parcial Final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños emitido el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente) Y RADICACIÓN POR WEB - OFICIO: D-181-2025 TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN UFF'S 4 Y 5 - LAUDO PARCIAL FINAL DE JURISDICCIÓN, RESPONSABILIDAD Y DAÑOS EMITIDO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL No. 01-20-0015-3123 (EL LAUDO PARCIAL FINAL Y EL ARBITRAJE, RESPECTIVAMENTE)?" (SIC). | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        |  |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 353 de 591</b>                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>                                                    |

| E | R | No. | FECHA DE RADICACIÓN | NÚMERO DE COMUNICACIÓN EXTERNA | ERS       | REMITENTE                     | CONTENIDO / ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. | Fecha | ASUNTO                |
|---|---|-----|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|
|   |   | 401 | 7/3/2025            | D-268-2025                     | 0401-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Puesta en conocimiento y traslado de la comunicación CERS-OP-0194-2025 (R-404-2025) enviada por parte de la Interventoría Consorcio ERS que tiene como asunto (...) Incumplimiento de obligaciones contractuales prediales. Solicitud de demolición de construcciones y mejoras hoy propiedad de la ANI en el predio UF3A-078-I. (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 419 | 12/3/2025           | D-287-2025                     | 0419-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Entrega Informe Ejecutivo Predial de fecha 01 de diciembre del 2024 al 19 de diciembre del 2024. Documento N° CPOB-IEP-VER 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 489 | 21/3/2025           | D-319-2025                     | 0489-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Informe sobre el desarrollo del EER Unidad Funcional 1 – Semana del 10 al 14 de febrero de 2025 - Semana del 17 al 21 de febrero de 2025 - Semana del 24 al 28 de febrero de 2025 - Semana del 3 al 7 de marzo de 2025 - Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión No. 002 de 2014, parte general, sección 14.2, literal (d) (vi) "Durante el Periodo Especial, la parte Afecta suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir los efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, están se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible." - Solicitud de cumplimiento de la obligación contenida en el | N/A | N/A   | MO REQUIERE RESPUESTA |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 354 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| E | R | No. | FECHA DE RADICACIÓN | NÚMERO DE COMUNICACIÓN EXTERNA | ERS       | REMITENTE                     | CONTENIDO / ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. | Fecha | ASUNTO                |
|---|---|-----|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|
|   |   |     |                     |                                |           |                               | contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 14.2., Literal (d) (vi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                       |
|   |   | 492 | 21/3/2025           | D-325-2025                     | 0492-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Reiteración Oficio 20244090502012 del 18 de abril de 2024 (Radicado interno D-551-2024) – "Solicitud mesa de trabajo para revisión de expedientes prediales con gestión culminada para entrega a Archivo ANI."                                                                                                                                                                                                                                                | N/A | N/A   | MO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 495 | 21/3/2025           | D-305-2025                     | 0495-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Fase de reversión - Entrega de expedientes prediales - Remisión de las Hojas de Control y Listas de Chequeo de los expedientes prediales revisados y aprobados por la Interventoría y la ANI. (29 expedientes).                                                                                                                                                                                                                                               | N/A | N/A   | MO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 496 | 21/3/2025           | D-328-2025                     | 0496-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Respuesta a comunicación PQRS-C-4818-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A | N/A   | MO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 497 | 21/3/2025           | D-329-2025                     | 0497-2025 | PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA | Respuesta a comunicación PQRS-C-4811-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A | N/A   | MO REQUIERE RESPUESTA |
|   |   | 516 | 26/3/2025           | 2,02561E+13                    | 0516-2025 | ANI                           | Traslado de solicitud (PQRS C-4811-2025) - Laudo Parcial Final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños emitido el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente). Y Traslado de solicitud (PQRS C-4788-2025) - Laudo Parcial Final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños emitido el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el | N/A | N/A   | NO REQUIERE RESPUESTA |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 355 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| E | R | No. | FECHA DE RADICACIÓN | NÚMERO DE COMUNICACIÓN EXTERNA | ERS | REMITENTE | CONTENIDO / ASUNTO                                        | No. | Fecha | ASUNTO |
|---|---|-----|---------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
|   |   |     |                     |                                |     |           | "Laudo Parcial Final" y el "Arbitraje", respectivamente). |     |       |        |


Fuente: Elaboración propia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 356 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

### 11.13 AVANCE EN EL SISTEMA OLYMPUS O EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR LA ANI

Ilustración 3 Avance ANISCOPIO Avance Marzo de 2025

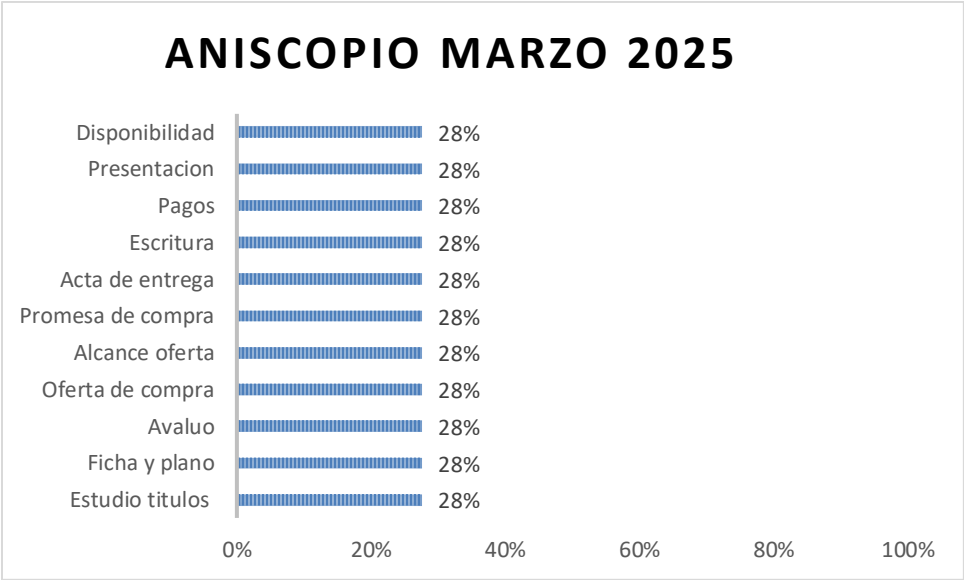

Fuente: elaboración propia.

A partir del corte del 31 de noviembre de 2023 se realiza el análisis del avance en Aniscopio, teniendo en cuenta que dentro de los informes se tiene en cuenta la información de las UF 1, 2 y 3A, esto debido a la declaratorio de EER de las unidades funcionales 4 y 5, la cual tuvo como consecuencia en estas unidades una pausa en la gestión predial, por ello la Interventoría únicamente se encargara de verificar cercados, cuidado, custodia y demoliciones de los predios adquiridos de las unidades funcionales 4 y 5.

Por lo anterior, se toman los 38 predios requeridos de la UF1, los 225 predios de la UF 2, y los 228 predios de la UF 3A, para un total de 491 predios, sin embargo, el Concesionario entrego en conjunto con la anterior interventoría 20 expedientes para archivo definitivo ante la ANI, por lo que solo quedarían 471 predios pendientes por terminar de subsanar las observaciones dadas por la anterior interventoría, y posteriormente ser objeto de revisión por parte del Consorcio Interventor ERS.

Así las cosas, de estos 471 predios pendientes por verificar en Aniscopio, 95 de ellos ya han sido validados en la herramienta y aprobados desde el mes de mayo hasta el corte del 30 de noviembre de 2023, los cuales corresponden al 20% de la gestión predial en Aniscopio, no se generó avance en el mes de noviembre de 2023 ya que no se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el Concesionario, sin embargo, para el día 01 de noviembre de 2023 se pretenden retomar dichas mesas con el fin de dar continuidad a la gestión predial (para el mes de noviembre de 2023 no se tiene avance).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 357 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

El Concesionario remitió a la interventoría 51 listas de chequeo y hojas de control correspondientes a 51 predios que ya cuentan con su gestión predial culminada, estos fueron objeto de revisión en diferentes mesas de trabajo, con el fin de ser firmadas por el ente Interventor (representante legal) y así culminar su archivo definitivo ante la ANI.

Quedan pendientes 21 predios, los cuales se encuentran en trámite para firma con el representante legal o director del proyecto. (Para el corte de noviembre de 2023, las 21 listas de chequeo faltantes por firmas de Representante Legal que hacían parte de la primera entrega por parte del Concesionario fueron entregadas el día 30 de noviembre de 2023)

En el mes de marzo no se revisaron expedientes de gestión terminada (carpetas blancas), por lo tanto, el avance continúa en 28% del total de predios requeridos a la fecha.

#### **11.14 PLAZOS DE CURA, EVENTOS EXIMENTES, TRIBUNALES, FUERZA MAYOR PREDIAL.**

El 01 de agosto de 2018, se había suscrito el acta de declaratoria de un EER y consecuente suspensión de la ejecución de obras y actividades prediales, entre otras, a partir del 31 de noviembre de 2017, para las correspondientes intervenciones para las UF 4 y 5 en el desarrollo del Proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca,

Pero, con base en el Resuelve 9 del Laudo Arbitral que estimó fundada la pretensión subsidiaria de la ANI sobre la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión, a partir de la fecha de la fecha de notificación de esta providencia, es decir del 19 de diciembre 2024, cesan los efectos jurídicos del citado EER, materializando así lo estipulado en la Sección 17.2 de la Parte General del citado Contrato.

Teniendo en cuenta la decisión adoptada en el LAUDO PARCIAL FINAL SOBRE JURISDICCIÓN, RESPONSABILIDAD Y DAÑOS de fecha 19 de diciembre de 2024, y el resultado de la reunión convocada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, desarrollada el pasado miércoles 19 de febrero de 2025, con asistencia del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. e Interventoría Consorcio ERS; y en la cual las Partes del Contrato (ANI y Concesionario) acordaron verbalmente entre otros:

- La ANI y el Concesionario **realizarán mesas de trabajo encaminadas a determinar alternativas para dar continuidad al Contrato de Concesión del asunto** a pesar de lo establecido en el LAUDO PARCIAL FINAL SOBRE JURISDICCIÓN, RESPONSABILIDAD Y DAÑOS. **Para tal fin, las Partes trabajarán en la elaboración de un Acuerdo de Entendimiento**, con apoyo de la Interventoría.
- Teniendo en consideración lo anterior y bajo el supuesto que el Contrato de Concesión pueda continuar, **las Partes acordaron que por ahora no se entenderá**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 358 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**terminado anticipadamente y por ende la Etapa de reversión no se encuentra activa.**

- Durante el tiempo que duren las mesas de trabajo antes mencionadas, la **Interventoría continuará con el desarrollo de sus funciones de seguimiento, control y vigilancia** a la Operación y Mantenimiento del proyecto concesionado, como lo ha venido haciendo, hasta que se determine: (i) si se va a iniciar la reversión y liquidación el Contrato de Concesión o (ii) si hay alguna alternativa para continuar con el mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior ya dentro del avance planteado en los acuerdos verbales de las partes (ANI y Concesionario), la Agencia Nacional de Infraestructura, vía correo electrónico del lunes 24 de febrero 2025, realizó el envío a Interventoría del primer borrador de Acta de Entendimiento – Perimetral del Oriente, del cual el 28 de febrero de 2025 la ANI vía correo electrónico envió al Concesionario versión ajustada para su consideración.

Como consecuencia de lo anterior, la Interventoría resalta la urgente necesidad de toma de decisión por cuenta de la Agencia sobre procedimientos a seguir para los siguientes casos:

- Cancelación de las medidas cautelares, consistente en las ofertas formales de compra, registradas sobre los folios de matrícula inmobiliaria de los fundos afectos a las UF 4 y 5, para evitar seguir causando inconvenientes a los propietarios de estos inmuebles, para lo cual mediante comunicado CERS-OP-0537-2025 radicado ANI 20254090423072 fecha 3 de abril de 2025, se pone de presente a la Agencia la sugerencia sobre la necesidad de informar a los interesados los procedimientos establecidos en la ley para solicitar ante las ORIP la cancelación de las OFC.
- Definir las directrices para continuar con los procesos de expropiación judicial de los inmuebles inmersos en este trámite de las UF 2 y 3, dado que al contarse con PIV o Entrega Anticipadas para ejecución de obras, los propietarios de estos inmuebles deben contar con el correspondiente reconocimiento de la indemnización del caso.
- Definir las directrices para continuar verificar si se continua con el (los) proceso(s) de expropiación judicial de los inmuebles inmersos en este trámite de las UF 4 y 5, verificándose previamente si se cuenta con PIV o Entrega Anticipadas para ejecución de obras y si estas ya se hicieron, por cuanto de lo anteriormente enunciado, existe la posibilidad de que a los propietarios de estos inmuebles se les deba reconocer la indemnización del caso.

Se hace la acotación que se debe evaluar cómo será el manejo por implementar en la continuación de la gestión predial de estas unidades funcionales, teniendo en cuenta que ya existen unos compromisos con terceros y que ante esa alternativa se sigue manteniendo la asignación de riesgos pactada en el contrato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 359 de 591</b></p>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

Otrosí 12 al Contrato de Concesión bajo el esquema de APP 002 de 2014, Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, que trata de la modificación de la Sección 4.17 de la Parte General del citado convenio, respecto al procedimiento de verificación de las unidades funcionales, suscrito en agosto de 2021.

Respecto a los demás EER presentados con anterioridad al mes de abril de 2023 se debe tener en cuenta que estos fueron rechazados en su totalidad por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y por lo tanto no hay ningún periodo especial otorgado con base en el reconocimiento del evento eximente de responsabilidad.

Con respeto a los EER de las UF1 (1 predio) y UF 2 (2 predios) se tienen con que hoy las resoluciones de adjudicación por parte de la ANT ya fueron emitidas y, se encuentran en trámite de notificación y registro ante la ORIP para apertura o saneamiento del FMI.

Es importante continuar con el seguimiento de este trámite, por cuanto en las resoluciones de adjudicación de los baldíos rurales se incorpora una cláusula de condición de resolutoria, consistente en que cumplido un plazo legalmente determinado y si no se han ejecutado las obras estas áreas revertirán a la Nación, conforme lo señalado en el artículo 68 de la Ley 160 de 1994.

En el mes de marzo de 2025, el concesionario ha iniciado la demolición del predio 3A-045-I, el cual fue adquirido desde el pasado mes de agosto de 2024.





|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 360 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |


De igual forma sobre las demoliciones, se ha requerido al concesionario para que adelante las actividades tendientes al sellamiento del pozo séptico adquirido y pagado como mejora en el predio 3 A-078-I.

A la fecha de cierre del presente informe no se había cumplido con dicha obligación como se verifica en el informe de campo del área técnica y operativa de la Interventoría.

*Luego de visita realizada al sector el día de hoy (1 de abril) y verificada la situación en el sector indicado, el Inspector de la Interventoría, reporta al respecto:*

*"...Se llevó a cabo una visita al predio 3A- 078- I (sin acceso al mismo). Durante esta inspección y en los diferentes recorridos frecuentes por la zona, no se han observado obras de demolición ni el sellado respectivo del pozo en mención. Además, el talud sigue drenando agua, presumiblemente proveniente de dicho pozo."*

*Se adjunta registro fotográfico del sector referido:*

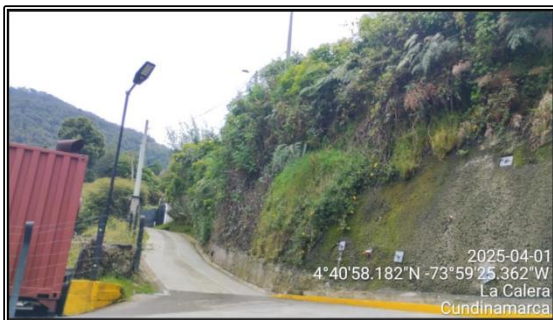

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 361 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

## 12 GESTIÓN FINANCIERA FEBRERO – MARZO 2025

El presente capítulo describirá las actividades de seguimiento de la Gestión Financiera de acuerdo con los requerimientos contractuales establecidos en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato de Concesión.

En el caso financiero se analizará en estos informes mensuales la información de actividades del Patrimonio Autónomo de dos meses atrás, dado que la información reportada por Fiduciaria Bancolombia es entregada con fecha posterior a la entrega de este informe. En el caso del tráfico, seguimiento de obligaciones contractuales y de las demás actividades financieras relacionadas, se presentan con corte al mes inmediatamente anterior.

### 12.1 CONTRATO DE FIDUCIA

El contrato de administración de los recursos provenientes del contrato de concesión se encuentra a cargo de Fiduciaria Bancolombia, que maneja los dineros del proyecto. Los comités fiduciarios se celebrarán mensualmente, al cual asisten los representantes del Concesionario, de la Fiduciaria, Interventoría y ANI.

- **Fecha de constitución del patrimonio autónomo:** 11 de noviembre de 2014.
- **Duración:** Tendrá una duración igual a la del contrato de Concesión y permanecerá vigente hasta su liquidación.

### 12.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO CONCESIONARIO

Esta Interventoría realizó las siguientes verificaciones de las obligaciones del Concesionario, tomando como referencia el informe mensual entregado por Bancolombia con corte a febrero de 2025.

#### 12.2.1 APORTES EQUITY

De acuerdo con las verificaciones realizadas por esta Interventoría, el Concesionario ya cumplió con el valor de los aportes mínimos contractuales. En este mes no se realizaron aportes equity.

#### Tabla 225 Aportes Equity – Concesionario

A continuación, se detalla el estado de aportes desde el inicio del contrato de concesión al mes de marzo de 2025, de acuerdo con las certificaciones emitidas por la fiducia:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 362 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                               |                   |                  |                             |                           |            |                        |                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|
| GIROS EQUITY                              |                                 |                                               |                   |                  |                             |                           |            |                        |                  |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contractual Máxima del Aporte           |                   | Aportes          |                             |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento     |
|                                           |                                 | Descripción                                   | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | Valor Aporte (\$corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Fecha            |
| Giro 1                                    | \$ 23.462.169.592               | Fecha de constitución del Patrimonio Autonomo | 11/11/2014        | 11/11/2014       | \$ 21.128.694.654           | \$ 20.076.568.968         | 0 días     | \$ (3.385.600.624)     | <b>Incumplió</b> |
|                                           |                                 |                                               |                   | 22/01/2015       | \$ 1.564.460.498            | \$ 1.480.643.020          | N/A        | \$ (2.254.957.603)     | <b>Incumplió</b> |

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                                                                                                       |                   |                  |                             |                           |            |                        |                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|
| GIROS EQUITY                              |                                 |                                                                                                                                       |                   |                  |                             |                           |            |                        |                  |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contractual Máxima del Aporte                                                                                                   |                   | Aportes          |                             |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento     |
|                                           |                                 | Descripción                                                                                                                           | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | Valor Aporte (\$corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Fecha            |
| Giro 2                                    | \$ 35.023.409.014               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de inicio            | 22/06/2015        | 22/06/2015       | \$ 36.555.618.730           | \$ 33.519.059.339         | 0 días     | \$ (3.759.307.278)     | <b>Incumplió</b> |
|                                           |                                 |                                                                                                                                       |                   | 26/10/2015       | \$ 1.351.429.916            | \$ 1.220.850.648          | N/A        | \$ (2.538.456.630)     | <b>Incumplió</b> |
| Giro 3                                    | \$ 56.483.088.460               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha de inicio       | 19/12/2015        | 21/12/2015       | \$ 89.202.180.462           | \$ 79.561.201.398         | 2 días     | \$ 20.539.656.308      | <b>Incumplió</b> |
|                                           |                                 |                                                                                                                                       |                   | 17/03/2016       | \$ 7.874.937.000            | \$ 6.804.539.490          | N/A        | \$ 27.344.195.798      | <b>N/A</b>       |
| Giro 4                                    | \$ 18.661.296.646               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de mil doscientos sesenta (1260) días contados a partir de la fecha de inicio   | 06/06/2018        | 15/06/2016       | \$ 10.727.940.400           | \$ 9.091.309.553          | -721 días  | \$ 17.774.208.705      | <b>Cumplió</b>   |
|                                           |                                 |                                                                                                                                       |                   | 27/07/2016       | \$ 1.374.013.930            | \$ 1.158.864.366          | N/A        | \$ 18.933.073.071      | <b>N/A</b>       |
|                                           |                                 |                                                                                                                                       |                   | 09/12/2016       | \$ 75.000.000               | \$ 63.127.588             | -544 días  | \$ 18.996.200.659      | <b>N/A</b>       |
| Giro 5                                    | \$ 21.265.072.840               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de mil setecientos veinte (1720) días contados a partir de la fecha de inicio   | 09/09/2019        | 22/05/2018       | \$ 23.647.878.150           | \$ 18.661.296.646         | -475 días  | \$ 16.392.424.465      | <b>Cumplió</b>   |
| Giro 6                                    | \$ 10.239.831.271               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de mil ochocientos cuarenta (1840) días contados a partir de la fecha de inicio | 07/01/2020        | 26/09/2018       | \$ 4.504.439.940            | \$ 3.540.356.183          | -468 días  | \$ 9.692.949.377       | <b>Cumplió</b>   |
| Giro 7                                    | \$ 10.239.831.271               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de mil ochocientos cuarenta (1840) días contados a partir de la fecha de inicio | 07/01/2020        | 07/11/2018       | \$ 102.499.495.000          | \$ 80.335.694.476         | -426 días  | \$ 79.788.812.582      | <b>Cumplió</b>   |
| Giro 8                                    | \$ 10.239.831.271               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de mil ochocientos cuarenta (1840) días contados a partir de la fecha de inicio | 07/01/2020        | N/A              | \$ -                        | \$ -                      | N/A        | \$ 69.548.981.311      | <b>N/A</b>       |
| Total                                     | \$ 185.614.530.365              |                                                                                                                                       |                   |                  | \$ 300.506.088.679          | \$ 255.513.511.674        |            |                        |                  |

Con el giro realizado desde noviembre de 2018, el análisis realizado por esta Interventoría, el Concesionario superó los aportes exigidos contractualmente, siendo equivalentes a \$255.513.511.674 (\$dic 2012).

## 12.2.2 FONDEOS

De acuerdo con las certificaciones emitidas por la fiducia el Concesionario ha realizado los siguientes fondeos:



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 363 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- **Subcuenta Predios**

A continuación, se presenta el control de cumplimiento de fondeos en pesos del mes de referencia:

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                                  |                               |            |                        |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| SUBCUENTA PREDIOS                         |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                                  |                               |            |                        |              |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contract Max del Aporte                                                                                                    |                   | Aportes          |        |            |                                  |                               | Diferencia |                        | Cumplimiento |
|                                           |                                 | Descripción                                                                                                                      | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor del Aporte (\$ corrientes) | Valor del Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Valor        |
| Aporte 1                                  | \$ 3.573.647.275                | Fecha de constitución del Patrimonio autonomo                                                                                    | 11/11/2014        | 11/11/2014       | 117,68 | 0,95020    | \$ 3.760.926.590                 | \$ 3.573.647.275              | 0 días     | \$ -                   | Cumplió      |
| Aporte 2                                  | \$ 11.878.252.825               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de inicio.      | 22/06/2015        | 24/06/2015       | 121,95 | 0,91693    | \$ 12.954.422.531                | \$ 11.878.339.708             | 2 días     | \$ 86.883              | Cumplió      |
| Aporte 3                                  | \$ 44.447.935.400               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha de inicio. | 19/12/2015        | 22/12/2015       | 125,37 | 0,89192    | \$ 49.835.003.652                | \$ 44.448.832.323             | 3 días     | \$ 983.806             | Cumplió      |
| Total                                     | \$ 59.899.835.500               |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            | \$ 66.550.352.773                | \$ 59.900.819.307             |            |                        |              |

Desde diciembre de 2015, el Concesionario cumplió con los fondeos contractuales establecidos en la parte especial del contrato de concesión. De acuerdo con los cálculos de la Interventoría, los fondeos superaron lo requerido contractualmente en \$983.806 (\$ dic 2012).

- **Subcuenta Redes**

A continuación, se presenta el control de cumplimiento de fondeos en pesos del mes de referencia:

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|
| SUBCUENTA REDES                           |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contractual Máxima del Aporte                                                                                              |                   | Aportes          |        |            |                              |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento |
|                                           |                                 | Descripción                                                                                                                      | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor Aporte (\$ corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Valor        |
| Aporte 1                                  | \$ 5.775.468.404                | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha de inicio. | 19/12/2015        | 21/12/2015       | 125,37 | 0,89192    | \$ 6.475.455.175             | \$ 5.775.587.442          | 2 días     | \$ 119.038             | Cumplió      |
| Aporte 2                                  | \$ 5.775.468.404                | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de quinientos cuarenta (540) días contados a partir de la fecha de inicio. | 16/06/2016        | 16/06/2016       | 131,95 | 0,84744    | \$ 6.815.176.676             | \$ 5.775.468.404          | 0 días     | \$ 119.038             | Cumplió      |
| Total                                     | \$ 11.550.936.808               |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            | \$ 13.290.631.851            | \$ 11.551.055.846         |            |                        |              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 364 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Desde junio de 2016, el Concesionario cumplió con los fondeos contractuales establecidos en la parte especial del contrato de concesión. De acuerdo con los cálculos de la Interventoría, los fondeos superaron lo requerido contractualmente en \$119.038 (\$ dic 2012).

### • Subcuenta Compensaciones Ambientales

A continuación, se presenta el control de cumplimiento de fondeos en pesos del mes de referencia:

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|
| SUBCUENTA COMPENSACIONES AMBIENTALES      |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |  |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contractual Máxima del Aporte                                                                                              |                   | Aportes          |        |            |                              |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento |  |
|                                           |                                 | Descripción                                                                                                                      | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor Aporte (\$ corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Valor        |  |
| Aporte 1                                  | \$ 610.903.539                  | Fecha de inicio                                                                                                                  | 19/12/2014        | 23/12/2014       | 117,84 | 0,94891    | \$ 643.790.522,50            | \$ 610.901.699,13         | 4 días     | \$ (1.840)             | Incumplió    |  |
| Aporte 2                                  | \$ 2.443.614.156                | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de inicio.      | 22/06/2015        | 24/06/2015       | 121,95 | 0,91693    | \$ 2.665.005.598,53          | \$ 2.443.632.029,75       | 2 días     | \$ 16.034              | Cumplió      |  |
| Aporte 3                                  | \$ 27.490.659.261               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha de inicio. | 19/12/2015        | 22/12/2015       | 125,37 | 0,89192    | \$ 30.821.594.281,23         | \$ 27.490.393.814,53      | 3 días     | \$ (249.412)           | Incumplió    |  |
| Total                                     | \$ 30.545.176.956               |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            | \$ 34.130.390.402            | \$ 30.544.927.543         |            |                        |              |  |

Al corte de marzo de 2025, el Concesionario realizó los fondeos contractuales establecidos en la parte especial del contrato de concesión. La subcuenta se fondeó en un valor inferior a \$249.412 (\$ dic 2012) respecto al total acumulado; en este sentido se remitió a la ANI mediante comunicación No. 20234090793342 del 17 de julio de 2023, la solicitud de no objeción al periodo de cura, para que el Concesionario cumpla la obligación incluyendo los intereses de mora.

La ANI a través de comunicación No. 20233060271711 del 02 de agosto de 2023, solicitó a la Interventoría la aclaración sobre el cálculo detallado del valor pendiente del fondeo, los intereses causados a la fecha y el inicio del incumplimiento de la obligación, con el fin de revisar la procedencia de la solicitud y otorgar el plazo correspondiente. En este sentido, la Interventoría envió a la ANI mediante comunicación 20234090922832 del 16 de agosto de 2023 el detalle de la cuantificación.

El 29 de agosto se llevó a cabo comité con la ANI, en el cual, la entidad solicitó dar un alcance a las comunicaciones remitidas, dado que el área de sancionatorios pide no tener los soportes en archivos entregados como anexos (en este caso el cálculo se entregó en Excel), unificando el contenido jurídico y el cuadro resumen financiero con los valores de referencia del incumplimiento.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 365 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

En respuesta a la solicitud, la Interventoría mediante comunicación ANI 20234091042332 del 13 de septiembre de 2023, remitió los conceptos jurídicos y financieros unificados, en el cual se reiteró la cuantificación descrita anteriormente.

Mediante comunicación 20233060344761 del 25 de septiembre de 2023, la ANI emitió la no objeción al plazo de cura de tres días hábiles para el cumplimiento de la obligación por parte del Concesionario, posterior a su notificación. En ese sentido, el 06 de octubre de 2023, mediante comunicación CERS-OP-2859-2023, la Interventoría notificó al Concesionario sobre el presunto incumplimiento y el tiempo de subsanación para su saneamiento.

En la última actualización de los cálculos de los valores adeudados por el privado, entregada a la Agencia con corte al 08 de octubre, se tiene:

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor pendiente fondear (corrientes) al 22/12/2015</b> | <b>43.428.165</b>       |
| <b>fecha de corte del ejercicio</b>                       | <b>8/10/2023</b>        |
| <b>(6) Intereses mora 23/12/2015 al 08/10/2023</b>        | <b>\$ 54.846.135,00</b> |
| <b>Total por pagar a 08/10/2023 en \$ corrientes</b>      | <b>\$ 98.274.300</b>    |

Mediante comunicación 20244090005982 del 04 de enero de 2024, la Interventoría remitió a la ANI el informe de incumplimiento en el cual se determinaron los siguientes cálculos:

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor pendiente fondear (corrientes) al 22/12/2015</b> | <b>43.428.165</b>       |
| <b>fecha de corte del ejercicio</b>                       | <b>31/12/2023</b>       |
| <b>(6) Intereses mora 23/12/2015 al 28/12/2023</b>        | <b>\$ 57.131.399,00</b> |
| <b>Total por pagar a 28/12/2023 en \$ corrientes</b>      | <b>\$ 100.559.564</b>   |

Se realizó la actualización del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2024 en el que se determinó lo siguiente:

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor pendiente fondear (corrientes) al 22/12/2015</b> | <b>43.428.165</b>       |
| <b>fecha de corte del ejercicio</b>                       | <b>31/12/2024</b>       |
| <b>(6) Intereses mora 23/12/2015 al 31/12/2024</b>        | <b>\$ 66.023.574,00</b> |
| <b>Total por pagar a 28/12/2023 en \$ corrientes</b>      | <b>\$ 109.451.739</b>   |

En este sentido, con el último ejercicio realizado con corte al 31 de diciembre de 2024, el Concesionario tiene un valor pendiente por pagar a la subcuenta de Compensaciones Ambientales equivalente a \$109.451.739, de los cuales \$43.428.165 corresponden a valor pendiente de fondeo de la subcuenta y \$66.023.574 corresponden a intereses. Adicionalmente, se tasó una multa equivalente a \$ 38.557.067.920.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 366 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

• **Subcuenta Interventoría y Supervisión**

A continuación, se presenta el control de cumplimiento de fondeos en pesos del mes de referencia:

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|
| SUBCUENTA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aporte                                                        | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contractual Máxima del Aporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Aportes          |        |            |                              |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento |
|                                                               |                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor Aporte (\$ corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Fecha        |
| Aportes Preconstrucción                                       | \$ 2.923.117.956                | Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo, y, de ser el caso dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de cada periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días contados desde la fecha de inicio. En el caso en el que el ultimo periodo tenga una duración menor a trescientos sesenta y cinco (365) días, el aporte respectivo será proporcional a su duración. |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aportes Construcción                                          | \$ 10.160.367.351               | Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la fase de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
|                                                               |                                 | Dentro de los cinco (5) días siguientes a al inicio de cada periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días contados desde las fecha de inicio de la Fase de Construcción.                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aportes anuales durante la etapa de Operación y Mantenimiento | \$ 3.446.637.624                | Dentro de los cinco días siguientes al inicio de cada periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días contados desde la suscripción de la ultima Acta de Terminación de Unidad Funcional. En el caso que el ultimo periodo tenga una duración menos a trescientos sesenta y cinco (365) días, el aporte respectivo será proporcional a su duración.                           |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aporte Preconstrucción 1                                      | \$ 2.923.117.956                | Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/11/2014        | 11/11/2014       | 117,68 | 0,95020    | \$ 3.076.305.858             | \$ 2.923.117.956          | 0 días     | \$ -                   | Cumplió      |
| Aporte Construcción 1                                         | \$ 10.160.367.351               | Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la fase de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/12/2015        | 21/01/2016       | 126,15 | 0,88641    | \$ 11.463.222.072            | \$ 10.161.058.201         | 32 días    | \$ 690.850             | Incumplió    |

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                    |                                                                                                         |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|
| SUBCUENTA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN     |                                    |                                                                                                         |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aporte                                    | Monto Contractual<br>(\$ dic 2012) | Fecha Contractual Máxima del Aporte                                                                     |                   | Aportes          |        |            |                              |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento |
|                                           |                                    | Descripción                                                                                             | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor Aporte (\$ corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Valor        |
| Aporte Construcción 1                     | \$ 10.160.367.351                  | Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la fase de construcción. | 20/12/2015        | 21/01/2016       | 126,15 | 0,88641    | \$ 11.463.222.072            | \$ 10.161.058.201         | 32 días    | \$ 690.850             | Cumplió      |
| Aporte Construcción 2                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         | 19/12/2016        | 22/12/2016       | 132,85 | 0,84170    | \$ 12.071.532.450            | \$ 10.160.622.947         | 3 días     | \$ 946.446             | Cumplió      |
| Aporte Construcción 3                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         | 19/12/2017        | 18/12/2017       | 138,32 | 0,80842    | \$ 11.895.198.816            | \$ 9.616.260.350          | -1 días    | \$ (543.160.555)       | Incumplió    |
|                                           |                                    |                                                                                                         |                   | 19/12/2017       | 138,32 | 0,80842    | \$ 642.918.000               | \$ 519.744.728            | 0 días     | \$ (23.415.827)        | Incumplió    |
| Aporte Construcción 4                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         | 19/12/2018        | 20/12/2017       | 138,32 | 0,80842    | \$ 30.257.597                | \$ 24.460.704             | 1 días     | \$ 1.044.877           | Cumplió      |
|                                           |                                    |                                                                                                         |                   | 12/04/2019       | 101,62 | 0,76806    | \$ 4.402.734.901             | \$ 3.381.553.425          | 114 días   | \$ (6.777.769.049)     | Incumplió    |
| Aporte Construcción 5                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         | 19/12/2019        | 14/10/2020       | 105,29 | 0,74129    | \$ 4.572.309.472             | \$ 3.389.388.872          | 665 días   | \$ (3.388.380.177)     | Incumplió    |
|                                           |                                    |                                                                                                         |                   | 7/12/2020        | 105,08 | 0,74277    | \$ 8.576.118.353             | \$ 6.370.061.263          | 719 días   | \$ 2.981.681.086       | Cumplió      |
| Aporte Construcción 6                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         | 18/12/2020        | 3/02/2022        | 113,26 | 0,68912    | \$ 4.640.208.233             | \$ 3.197.671.310          | 777 días   | \$ (3.981.014.955)     | Incumplió    |
|                                           |                                    |                                                                                                         |                   | 19/10/2023       | 136,11 | 0,57343    | \$ 10.380.097.885            | \$ 5.952.293.291          | 1400 días  | \$ 1.971.278.336       | Cumplió      |
|                                           |                                    |                                                                                                         |                   | 19/12/2023       | 137,09 | 0,56933    | \$ 6.053.805.918             | \$ 3.446.637.624          | 1096 días  | \$ (4.742.451.391)     | Incumplió    |
| Aporte Construcción 7                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         | 18/12/2021        | 30/04/2024       | 141,48 | 0,55167    | \$ 6.053.805.918             | \$ 3.339.691.489          | 1229 días  | \$ (1.402.759.902)     | Incumplió    |
|                                           |                                    |                                                                                                         |                   | 19/12/2024       | 144,22 | 0,54119    | \$ 6.638.662.116             | \$ 3.592.758.134          | 1462 días  | \$ 2.189.998.232       | Cumplió      |
| Aporte Construcción 8                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         |                   | 18/12/2021       |        |            | \$ -                         |                           |            | \$ (7.970.369.119)     | Incumplió    |
| Aporte Construcción 9                     | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         |                   | 18/12/2022       |        |            | \$ -                         |                           |            | \$ (18.130.736.470)    | Incumplió    |
| Aporte Construcción 10                    | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         |                   | 18/12/2023       |        |            | \$ -                         |                           |            | \$ (28.291.103.821)    | Incumplió    |
| Aporte Construcción 10                    | \$ 10.160.367.351                  |                                                                                                         |                   | 17/12/2024       |        |            | \$ -                         |                           |            | \$ (38.451.471.172)    | Incumplió    |
| Total                                     | \$ 104.526.791.466                 |                                                                                                         |                   |                  |        |            | \$ 90.497.177.588            | \$ 66.075.320.294         |            |                        |              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 367 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Frente al estado de fondeos de la subcuenta Interventoría y Supervisión, el Concesionario no ha cumplido con la totalidad de fondeos establecidos contractualmente; la diferencia es equivalente a \$29.169.747.526 (\$ dic 2012) respecto a lo contractualmente requerido, sin incluir los intereses de mora.

En línea con lo anterior, esta Interventoría procedió a actualizar el proceso sancionatorio que cursa por el incumplimiento de los fondeos anuales de la etapa de construcción de los años 2019, 2020 y 2021 y al inicio de los procesos de incumplimiento dentro de la entidad para los fondeos anuales de los años 2022 y 2023, tal y como se presenta a continuación.

En el 2024, el 17 de diciembre de 2024 el Concesionario debió realizar el aporte 10 por un total de \$10.160.367.351 (\$dic 2012). Durante el 2024 realizó dos aportes uno el 30 de abril por \$3.339.691.489 (\$dic 2012) y un segundo el 19 de diciembre por un valor equivalente a \$3.592.758.134 (\$dic 2012); no obstante, en el control de interventoría estos valores financieramente son abonados al total adeudado por el Concesionario incluyendo intereses, al valor más antiguo.

Sin embargo, dado lo dispuesto por el laudo arbitral y comunicado el 19 de diciembre, estas obligaciones contractuales del fondeo de la subcuenta de interventoría no aplican, dado la condición real del contrato de concesión por lo que estas deudas pendientes no son reclamables, por lo que se tendrán que revisar de parte de agencia e interventoría al momento de liquidar el contrato de concesión.

### • Subcuenta Soporte Contractual

A continuación, se presenta el control de cumplimiento de fondeos en pesos del mes de referencia:

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                     |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|
| SUBCUENTA SOPORTE CONTRACTUAL             |                                 |                                                     |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contrac Máx del Aporte                        |                   | Aportes          |        |            |                              |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento |
|                                           |                                 | Descripción                                         | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor Aporte (\$ corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) |              |
| Aporte Inicial                            | \$ 350.000.000                  | En la fecha de constitución del Patrimonio Autonomo | 11/11/2014        | 11/11/2014       | 117,68 | 0,95020    | \$ 368.341.978               | \$ 350.000.000            | 0 días     | \$ -                   | Cumplió      |
| Aporte Anual 1                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 1                                           | 11/12/2015        | 11/12/2015       | 125,37 | 0,89192    | \$ 392.420.000               | \$ 350.007.214            | 0 días     | \$ 7.214               | Cumplió      |
| Aporte Anual 2                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 2                                           | 10/12/2016        | 23/12/2016       | 132,85 | 0,84170    | \$ 415.835.000               | \$ 350.008.805            | 13 días    | \$ 16.019              | Cumplió      |
| Aporte Anual 3                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 3                                           | 10/12/2017        | 11/12/2017       | 138,32 | 0,80842    | \$ 432.950.000               | \$ 350.003.391            | 1 días     | \$ 19.410              | Cumplió      |
| Aporte Anual 4                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 4                                           | 10/12/2018        | 11/12/2018       | 142,84 | 0,78283    | \$ 447.090.000               | \$ 349.997.226            | 1 días     | \$ 16.636              | Cumplió      |
| Aporte Anual 5                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 5                                           | 10/12/2019        | 10/01/2020       | 103,80 | 0,75193    | \$ 464.610.000               | \$ 349.352.702            | 31 días    | \$ (630.662)           | Incumplió    |
|                                           |                                 |                                                     |                   | 10/03/2020       | 104,94 | 0,74376    | \$ 865.000                   | \$ 643.351                | N/A        | \$ 12.689              | Cumplió      |
| Aporte Anual 6                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 6                                           | 9/12/2020         | 7/12/2020        | 105,08 | 0,74277    | \$ 471.205.000               | \$ 349.995.720            | N/A        | \$ 8.409               | Cumplió      |
| Aporte Anual 7                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 7                                           | 9/12/2021         | 13/12/2021       | 110,60 | 0,70570    | \$ 495.964.126               | \$ 350.000.000            | 4 días     | \$ 8.409               | Cumplió      |
| Aporte Anual 8                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 8                                           | 9/12/2022         | 2/06/2023        | 133,38 | 0,58517    | \$ 613.767.114               | \$ 359.158.219            | 175 días   | \$ 9.166.628           | Cumplió      |
| Aporte Anual 9                            | \$ 350.000.000                  | Periodo 9                                           | 9/12/2023         | 12/12/2023       | 137,09 | 0,56933    | \$ 614.753.363               | \$ 350.000.000            | 3 días     | \$ 9.166.628           | Cumplió      |
| Fondeo Adicional                          |                                 |                                                     |                   | 22/02/2024       | 138,98 | 0,56159    | \$ 7.780.148                 | \$ 4.369.266              | N/A        | \$ 13.535.894          | Cumplió      |
| Aporte Anual 10                           | \$ 350.000.000                  | Periodo 10                                          | 8/12/2024         | 10/12/2024       | 144,22 | 0,54119    | \$ 646.726.500               | \$ 350.000.023            | 2 días     | \$ 13.535.917          | Cumplió      |
| Total                                     | \$ 3.850.000.000                |                                                     |                   |                  |        |            | \$ 5.372.308.229             | \$ 3.863.535.917          |            |                        |              |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 368 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

De esta subcuenta como se ve en el cuadro anterior el concesionario ha cumplido con la cantidad de aportes y valores en pesos del mes de referencia establecido en el contrato, mas no así con las fechas máximas establecidas en el mismo documento. Lo que ha hecho que al entrar esta interventoría y de acuerdo a lo establecido por la Agencia, estos días de atraso generaron unos intereses que el concesionario debe pagar.

Por lo anterior, cada vez que el concesionario hace un aporte completa es el anterior que se encontraba pendiente tanto en un valor pequeño a capital como a intereses, abriendo un incumplimiento, a este último al que estaba aportando.

Es por eso que ya se han abierto procesos de incumplimiento a las obligaciones de 2022 y 2023 que debieron cerrarse, una vez el concesionario realizaba nuevos aportes, a continuación muestro para mayor entendimiento el ultimo ejercicio compartido

El 12 de diciembre de 2023 el Concesionario realizó un fondeo a la subcuenta por valor de \$614.753.363, por lo cual financieramente, se abonan priorizando a las obligaciones de intereses y a las de capital más antiguas que están sin cumplir; es decir en este caso se cubrieron los intereses que al 12 de diciembre se habían acumulado, luego el valor a capital pendiente por fondear del aporte 8 anual del año 2022. Con la suma de estos dos, levantando el incumplimiento que había y el valor restante abonado se tomó como un primer pago del aporte 9 que venció en plazo el 09 de diciembre, a continuación, se muestra detalle:

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fecha de corte</b>                            | <b>12/12/2023</b>         |
| Interes mora a la fecha de corte                 | 816.729,00                |
| <b>Total adeudado por pagar a 12/12/2023</b>     | <b>\$ 7.490.509,05</b>    |
| <b>Valor transferido 12 de diciembre 2023</b>    | <b>614.753.363,23</b>     |
| uso del valor transferido                        |                           |
| pago intereses                                   | 816.729,00                |
| abono al valor fondeo                            | 613.936.634,23            |
| <b>Valor a favor abono fondeo anual 9 - 2023</b> | <b>-\$ 607.262.854,18</b> |

Sin embargo, con estos cargos realizados y al tener en cuenta que el privado postergó el fondeo en tres días de la fecha máxima contractual establecida para el aporte 9, generando también unos valores de intereses, dio finalmente como resultado un saldo a fondear pendiente, el cual genera intereses, y que tuvo un segundo abono el 22 de febrero de 2024, día que el Concesionario realizó un fondeo por un valor de \$7.780.148 m/cte, al cual le hizo falta un saldo a capital de \$1.236.090,66 que así mismo generaron intereses.

El ejercicio completo se muestra a continuación:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 369 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Valor fondeo anual 9 \$ dic 2023                                            | \$ 350.000.000         |
| IPC MES REFERENCIA                                                          | 78,05                  |
| Plazo máximo para realizar fondeo                                           | 09/12/2023             |
| IPC nov 2023                                                                | 137,09                 |
| Valor fondeo \$ dic 09 2023                                                 | \$ 614.753.363         |
| Fecha de Abono                                                              | 12/12/2023             |
| Intereses mora al 12 dic 2023                                               | 1.151.028              |
| <b>Total adeudado por pagar a 12-12-2023</b>                                | <b>615.904.391,00</b>  |
| Valor transferido 12 de diciembre 2023 - (descontando deuda de fondeo 2022) | 607.262.854,18         |
| uso del valor transferido                                                   |                        |
| pago intereses                                                              | 1.151.028,00           |
| abono al valor fondeo                                                       | 606.111.826,18         |
| Valor pendiente por fondear al 12/12/2023                                   | 8.641.536,82           |
| Fecha de Abono                                                              | <b>22/02/2024</b>      |
| Interes mora a 22/02/2024                                                   | 374.702,00             |
| <b>Total adeudado por pagar a 22/02/2023</b>                                | <b>9.016.238,82</b>    |
| Valor transferido 22 de febrero 2024                                        | 7.780.148,16           |
| uso del valor transferido                                                   |                        |
| pago intereses                                                              | 374.702,00             |
| abono al valor fondeo                                                       | 7.405.446,16           |
| <b>Valor pendiente por fondear al 22/02/2024</b>                            | <b>\$ 1.236.090,66</b> |

El 08 de diciembre de 2024, el Concesionario tenía la obligación contractual de realizar el fondeo anual 10 a la subcuenta. En este sentido, realizó un aporte el 10 de diciembre de 2024, por \$646.726.500 (\$dic 2012). Por el valor aportado se puede decir que la obligación 09 de diciembre de 2023 quedo cumplida, pero así mismo, como el valor aportado era el valor exacto del monto contractual establecido para el 2024, como aporte 10, también se queda corto y este último al que le queda un valor pendiente por pagarse por parte del POB, el cual desde el 10 de diciembre está generando intereses y como obligación esta incumplida.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                        | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/><b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 370 de 591</b></p>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b></p>            |

• **Subcuenta MASC**

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|
| SUBCUENTA AMIGABLE COMPONEDOR             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |           |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contrac Máx del Aporte                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Aportes          |        |            |                              |                           | Diferencia |                        | Cumplimiento |           |
|                                           |                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor Aporte (\$ corrientes) | Valor Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) | Fecha        | Valor     |
| Aporte Semestral                          | \$ 60.000.000                   | Un aporte a los cinco (5) primeros días del mes de enero y julio de cada año de ejecución del contrato. El valor del primer aporte sera proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de constitución del Patrimonio Autonomo y el inicio del mes de enero o julio siguientes, el que ocurra primero. |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |           |
| Aporte Anual                              | \$ 252.000.000                  | Dentro de los primeros 30 días de cada año de ejecución del contrato, contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo                                                                                                                                                                         |                   |                  |        |            |                              |                           |            |                        |              |           |
| Aporte Anual 1                            | \$ 252.000.000                  | Primer año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/12/2014        | 10/12/2014       | 117,84 | 0,94891    | \$ 328.796.005               | \$ 311.999.060            | -1 días    | \$ 59.999.060          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 1                        | \$ 18.333.333                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2015         | N/A              | 118,15 | 0,94642    | \$ -                         | \$ -                      | N/A        | \$ 41.665.727          | N/A          | Cumplió   |
| Aporte Semestral 2                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2015                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/07/2015         | 7/07/2015        | 122,08 | 0,91596    | \$ 65.442.000                | \$ 59.942.042             | 2 días     | \$ 41.607.769          | Incumplió    | Cumplió   |
| Aporte Anual 2                            | \$ 252.000.000                  | Segundo año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/11/2015        | 11/12/2015       | 125,37 | 0,89192    | \$ 282.542.400               | \$ 252.005.194            | 30 días    | \$ 41.612.963          | Incumplió    | Cumplió   |
| Aporte Semestral 3                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2016                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2016         | 5/01/2016        | 126,15 | 0,88641    | \$ 67.272.000                | \$ 59.630.242             | 0 días     | \$ 41.243.205          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 4                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2016                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/07/2016         | 7/07/2016        | 132,58 | 0,84342    | \$ 71.139.331                | \$ 60.000.000             | 1 días     | \$ 41.243.205          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 3                            | \$ 252.000.000                  | Tercer año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/11/2016        | 22/12/2016       | 132,85 | 0,84170    | \$ 299.401.200               | \$ 252.006.339            | 42 días    | \$ 41.249.544          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 5                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2017         | 5/01/2017        | 133,40 | 0,83823    | \$ 71.286.000                | \$ 59.754.127             | 0 días     | \$ 41.003.671          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 6                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/07/2017         | 5/07/2017        | 134,77 | 0,82971    | \$ 1.000.000                 | \$ 829.710                | N/A        | \$ 41.833.381          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 4                            | \$ 252.000.000                  | Cuarto año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/11/2017        | 22/12/2017       | 137,87 | 0,81105    | \$ 75.000.000                | \$ 60.829.042             | -1 días    | \$ 42.662.423          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 7                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2018                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/11/2017        | 22/12/2017       | 138,32 | 0,80842    | \$ 311.724.000               | \$ 252.002.441            | 42 días    | \$ 42.664.864          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 8                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2018                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2018         | 5/01/2018        | 138,85 | 0,80533    | \$ 75.000.000                | \$ 60.399.712             | 0 días     | \$ 43.064.576          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 5                            | \$ 252.000.000                  | Quinto año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/07/2018         | 6/07/2018        | 142,28 | 0,78592    | \$ 77.000.000                | \$ 60.515.462             | 1 días     | \$ 43.580.038          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 7                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2019                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/11/2018        | 2/01/2019        | 100,00 | 0,78050    | \$ 321.904.800               | \$ 251.246.696            | 53 días    | \$ 42.826.734          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 8                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2019                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2019         | 9/01/2019        | 100,00 | 0,78050    | \$ 76.875.336                | \$ 60.001.200             | 4 días     | \$ 42.827.934          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 6                            | \$ 252.000.000                  | Sexto año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/07/2019         | 9/07/2019        | 102,71 | 0,75991    | \$ 78.957.079                | \$ 60.000.000             | 4 días     | \$ 42.827.934          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 9                        | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2020                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/11/2019        | 11/12/2019       | 103,54 | 0,75381    | \$ 334.303.200               | \$ 252.002.750            | 31 días    | \$ 42.830.684          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 10                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2020                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2020         | 10/01/2020       | 103,80 | 0,75193    | \$ 79.796.000                | \$ 60.000.750             | 5 días     | \$ 42.831.434          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 7                            | \$ 252.000.000                  | Séptimo año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/07/2020         | 16/07/2020       | 104,97 | 0,74355    | \$ 80.695.000                | \$ 60.000.426             | 11 días    | \$ 42.831.860          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 11                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/11/2020         | N/A              | 105,23 | 0,74171    | \$ -                         | \$ -                      | N/A        | \$ (209.168.140)       | Incumplió    | Incumplió |
| Aporte Semestral 12                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2021         | 14/01/2021       | 105,48 | 0,73995    | \$ 81.086.500                | \$ 60.000.013             | 9 días     | \$ (209.168.127)       | Incumplió    | Incumplió |
| Aporte Anual 8                            | \$ 252.000.000                  | Octavo año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/07/2021         | 12/07/2021       | 108,78 | 0,71750    | \$ 422.890.918               | \$ 303.425.595            | 7 días     | \$ 34.257.468          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 13                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2022                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/11/2021         | 13/12/2021       | 110,60 | 0,70570    | \$ 357.094.140               | \$ 251.999.979            | 34 días    | \$ 34.257.447          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 14                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2022                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/01/2022         | 12/01/2022       | 111,41 | 0,70057    | \$ 85.645.099                | \$ 60.000.000             | 7 días     | \$ 34.257.447          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 9                            | \$ 252.000.000                  | Noveno año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/07/2022         | 7/07/2022        | 119,31 | 0,65418    | \$ 91.750.000                | \$ 60.020.849             | 2 días     | \$ 34.278.296          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 15                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/11/2022         | 13/12/2022       | 124,46 | 0,62711    | \$ 300.000.000               | \$ 188.132.733            | 34 días    | \$ (29.588.971)        | Incumplió    | Incumplió |
| Aporte Semestral 16                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 17/03/2023        | 30/03/2023       | 130,40 | 0,59854    | \$ 101.843.946               | \$ 60.957.975             | 71 días    | \$ (28.630.996)        | Incumplió    | Incumplió |
| Aporte Anual 10                           | \$ 252.000.000                  | Decimo año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/07/2023         | 28/06/2023       | 130,40 | 0,59854    | \$ 96.885.000                | \$ 57.989.833             | 84 días    | \$ 29.358.837          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 17                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de enero 2024                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/07/2023         | 28/06/2023       | 133,38 | 0,58517    | \$ 102.534.273               | \$ 60.000.000             | -7 días    | \$ 29.358.837          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Semestral 18                       | \$ 60.000.000                   | Cinco (5) primeros días del mes de julio 2024                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/11/2023         | 4/12/2023        | 137,09 | 0,56933    | \$ 440.557.000               | \$ 250.824.085            | 25 días    | \$ 28.182.922          | Cumplió      | Cumplió   |
| Aporte Anual 11                           | \$ 252.000.000                  | Noveno año de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/12/2023        | 11/01/2024       | 137,09 | 0,56933    | \$ 2.065.422                 | \$ 1.175.915              | 33 días    | \$ 29.358.837          | Cumplió      | Cumplió   |
| Total                                     | \$ 3.930.333.333                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |        |            | \$ 5.459.509.840             | \$ 3.958.224.414          |            |                        |              |           |

Durante diciembre de 2024, el Concesionario realizó el fondeo correspondiente al aporte anual 11, por un valor equivalente a \$250.532.243 (\$dic 2012). Con lo anterior, el

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 371 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Concesionario ha realizado todos los fondeos de la subcuenta, excediendo lo contractualmente establecido en \$27.891.080 (\$dic 2012).

### 12.3 APORTES ANI

- Con respecto a la retribución en etapa de reversión, con el objetivo de reconocer los valores de operación y mantenimiento que el concesionario debe realizar en esta etapa, esta interventoría esta preparando un concepto jurídico, financiero con recomendaciones hacia la entidad, dado que le que esta establecido en el contrato, es para una reversión normal generado por el cumplimiento del VIP, lo que no ocurrió en este contrato, ya que se generó fue por una terminación anticipada decretada por un Tribunal de Arbitramento.

:

#### VIGENCIA FUTURA CONTRACTUAL DICIEMBRE

| 2024                              |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Aportes                           | = \$        | 90.423.152.186         |
| IPC(mayo de 2014)                 | =           | 81,53                  |
| IPC(diciembre 2012)               | =           | 78,05                  |
| FUSD <sub>8</sub>                 | =           | 32,000000%             |
| TRM <sub>pc</sub>                 | = \$        | 1.915,110              |
| AporteUSD <sub>8</sub>            | = \$        | 15.782.668,40          |
| TRM <sub>8</sub> (29 nov 2024)    | = \$        | 4.406,16               |
| IPC <sub>8</sub> (noviembre 2024) | =           | 144,22                 |
| <b>APORTES<sub>8</sub></b>        | <b>= \$</b> | <b>183.157.392.243</b> |

El 11 de febrero de 2025 la ANI giró al Patrimonio Autónomo recursos equivalentes a \$106.238.744.306. A la fecha de presentación de este informe, se está a la espera del pronunciamiento de la Agencia considerando el Laudo Tribunal de Arbitramento del 19 de diciembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a procedimiento de distribución de vigencias futuras por unidad funcional.

### 12.4 TARIFAS DE PEAJE

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte en la Resolución 20243040035675 del 31 de diciembre de 2024, se llevaron a cabo en enero de 2025, dos incrementos de tarifas para la nivelación de los incrementos correspondientes al IPC para los años 2023 y 2024. En atención a la decisión del Gobierno Nacional, la estructura tarifaria a partir del 16 de enero de 2025 corresponde a la que se presenta a continuación:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 372 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### • Peaje Patios

| Categoría    | Tarifa 2024-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2024-1 con Fosevi | Incremento 2025-1 | Tarifa 2025-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2025-1 con Fosevi | Incremento 2025-2 | Tarifa 2025-2 sin Fosevi | Fosevi 2025 | Tarifa 2025-2 con Fosevi |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| I            | \$ 12.300                | \$ 500      | \$ 12.800                | \$ 342            | \$ 12.600                | \$ 500      | \$ 13.100                | \$ 674            | \$ 13.374                | \$ 526      | \$ 13.900                |
| II           | \$ 19.600                | \$ 500      | \$ 20.100                | \$ 546            | \$ 20.100                | \$ 500      | \$ 20.600                | \$ 974            | \$ 21.174                | \$ 526      | \$ 21.700                |
| III          | \$ 30.500                | \$ 500      | \$ 31.000                | \$ 849            | \$ 31.300                | \$ 500      | \$ 31.800                | \$ 1.574          | \$ 32.974                | \$ 526      | \$ 33.500                |
| IV           | \$ 44.800                | \$ 500      | \$ 45.300                | \$ 1.247          | \$ 46.000                | \$ 500      | \$ 46.500                | \$ 2.374          | \$ 48.474                | \$ 526      | \$ 49.000                |
| V            | \$ 61.500                | \$ 500      | \$ 62.000                | \$ 1.712          | \$ 63.200                | \$ 500      | \$ 63.700                | \$ 3.174          | \$ 66.574                | \$ 526      | \$ 67.100                |
| VI           | \$ 61.900                | \$ 500      | \$ 62.400                | \$ 1.723          | \$ 63.600                | \$ 500      | \$ 64.100                | \$ 3.174          | \$ 66.974                | \$ 526      | \$ 67.500                |
| E. Remolque  | \$ 11.000                | \$ -        | \$ 11.000                | \$ 306            | \$ 11.800                | \$ -        | \$ 11.800                | \$ 600            | \$ 11.900                | \$ -        | \$ 11.900                |
| E. Grúa      | \$ 8.400                 | \$ -        | \$ 8.400                 | \$ 234            | \$ 9.100                 | \$ -        | \$ 9.100                 | \$ 400            | \$ 9.100                 | \$ -        | \$ 9.100                 |
| E. Adicional | \$ 11.400                | \$ -        | \$ 11.400                | \$ 317            | \$ 12.200                | \$ -        | \$ 12.200                | \$ 600            | \$ 12.300                | \$ -        | \$ 12.300                |
| IE           | \$ 6.300                 | \$ 500      | \$ 6.800                 | \$ 175            | \$ 6.500                 | \$ 500      | \$ 7.000                 | \$ 374            | \$ 6.874                 | \$ 526      | \$ 7.400                 |
| IIA          | \$ 6.700                 | \$ 500      | \$ 7.200                 | \$ 187            | \$ 6.900                 | \$ 500      | \$ 7.400                 | \$ 374            | \$ 7.274                 | \$ 526      | \$ 7.800                 |
| IIIE         | \$ 13.200                | \$ 500      | \$ 13.700                | \$ 367            | \$ 13.600                | \$ 500      | \$ 14.100                | \$ 674            | \$ 14.274                | \$ 526      | \$ 14.800                |
| IE2A         | \$ 2.600                 | \$ 500      | \$ 3.100                 | \$ 72             | \$ 2.700                 | \$ 500      | \$ 3.200                 | \$ 174            | \$ 2.874                 | \$ 526      | \$ 3.400                 |
| IE2B         | \$ 2.600                 | \$ 500      | \$ 3.100                 | \$ 72             | \$ 2.700                 | \$ 500      | \$ 3.200                 | \$ 174            | \$ 2.874                 | \$ 526      | \$ 3.400                 |
| IE3          | \$ 3.600                 | \$ 500      | \$ 4.100                 | \$ 100            | \$ 3.700                 | \$ 500      | \$ 4.200                 | \$ 174            | \$ 3.874                 | \$ 526      | \$ 4.400                 |
| IE4          | \$ 4.000                 | \$ 500      | \$ 4.500                 | \$ 111            | \$ 4.100                 | \$ 500      | \$ 4.600                 | \$ 174            | \$ 4.274                 | \$ 526      | \$ 4.800                 |

### • Peaje La Cabaña

| Categoría    | Tarifa 2024-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2024-1 con Fosevi | Incremento 2025-1 | Tarifa 2025-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2025-1 con Fosevi | Incremento 2025-2 | Tarifa 2025-2 sin Fosevi | Fosevi 2025 | Tarifa 2025-2 con Fosevi |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| I            | \$ 12.300                | \$ 500      | \$ 12.800                | \$ 342            | \$ 12.600                | \$ 500      | \$ 13.100                | \$ 674            | \$ 13.374                | \$ 526      | \$ 13.900                |
| II           | \$ 19.600                | \$ 500      | \$ 20.100                | \$ 546            | \$ 20.100                | \$ 500      | \$ 20.600                | \$ 974            | \$ 21.174                | \$ 526      | \$ 21.700                |
| III          | \$ 30.500                | \$ 500      | \$ 31.000                | \$ 849            | \$ 31.300                | \$ 500      | \$ 31.800                | \$ 1.574          | \$ 32.974                | \$ 526      | \$ 33.500                |
| IV           | \$ 44.800                | \$ 500      | \$ 45.300                | \$ 1.247          | \$ 46.000                | \$ 500      | \$ 46.500                | \$ 2.374          | \$ 48.474                | \$ 526      | \$ 49.000                |
| V            | \$ 61.500                | \$ 500      | \$ 62.000                | \$ 1.712          | \$ 63.200                | \$ 500      | \$ 63.700                | \$ 3.174          | \$ 66.574                | \$ 526      | \$ 67.100                |
| VI           | \$ 61.900                | \$ 500      | \$ 62.400                | \$ 1.723          | \$ 63.600                | \$ 500      | \$ 64.100                | \$ 3.174          | \$ 66.974                | \$ 526      | \$ 67.500                |
| E. Remolque  | \$ 11.000                | \$ 500      | \$ 11.000                | \$ 306            | \$ 11.300                | \$ 500      | \$ 11.800                | \$ 600            | \$ 11.374                | \$ 526      | \$ 11.900                |
| E. Grúa      | \$ 8.400                 | \$ 500      | \$ 8.400                 | \$ 234            | \$ 8.600                 | \$ 500      | \$ 9.100                 | \$ 400            | \$ 8.574                 | \$ 526      | \$ 9.100                 |
| E. Adicional | \$ 11.400                | \$ 500      | \$ 11.400                | \$ 317            | \$ 11.700                | \$ 500      | \$ 12.200                | \$ 600            | \$ 11.774                | \$ 526      | \$ 12.300                |
| IE           | \$ 6.300                 | \$ 500      | \$ 6.800                 | \$ 175            | \$ 6.500                 | \$ 500      | \$ 7.000                 | \$ 374            | \$ 6.874                 | \$ 526      | \$ 7.400                 |
| IIA          | NA                       | NA          | NA                       | NA                | NA                       | NA          | NA                       | NA                | NA                       | NA          | NA                       |
| IIIE         | \$ 13.200                | \$ 500      | \$ 13.700                | \$ 367            | \$ 13.600                | \$ 500      | \$ 14.100                | \$ 674            | \$ 14.274                | \$ 526      | \$ 14.800                |

### • Peaje Sopó

| Categoría    | Tarifa 2024-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2024-1 con Fosevi | Incremento 2025-1 | Tarifa 2025-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2025-1 con Fosevi | Incremento 2025-2 | Tarifa 2025-2 sin Fosevi | Fosevi 2025 | Tarifa 2025-2 con Fosevi |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| I            | \$ 12.300                | \$ 500      | \$ 12.800                | \$ 342            | \$ 12.600                | \$ 500      | \$ 13.100                | \$ 674            | \$ 13.374                | \$ 526      | \$ 13.900                |
| II           | \$ 19.600                | \$ 500      | \$ 20.100                | \$ 546            | \$ 20.100                | \$ 500      | \$ 20.600                | \$ 974            | \$ 21.174                | \$ 526      | \$ 21.700                |
| III          | \$ 33.200                | \$ 500      | \$ 33.700                | \$ 924            | \$ 34.100                | \$ 500      | \$ 34.600                | \$ 1.774          | \$ 35.774                | \$ 526      | \$ 36.300                |
| IV           | \$ 49.100                | \$ 500      | \$ 49.600                | \$ 1.367          | \$ 50.500                | \$ 500      | \$ 51.000                | \$ 2.574          | \$ 53.074                | \$ 526      | \$ 53.600                |
| V            | \$ 67.100                | \$ 500      | \$ 67.600                | \$ 1.868          | \$ 69.000                | \$ 500      | \$ 69.500                | \$ 3.474          | \$ 72.474                | \$ 526      | \$ 73.000                |
| VI           | \$ 67.800                | \$ 500      | \$ 68.300                | \$ 1.888          | \$ 69.700                | \$ 500      | \$ 70.200                | \$ 3.574          | \$ 73.274                | \$ 526      | \$ 73.800                |
| E. Remolque  | \$ 11.000                | \$ 500      | \$ 11.000                | \$ 306            | \$ 11.300                | \$ 500      | \$ 11.800                | \$ 600            | \$ 11.374                | \$ 526      | \$ 11.900                |
| E. Grúa      | \$ 8.400                 | \$ 500      | \$ 8.400                 | \$ 234            | \$ 8.600                 | \$ 500      | \$ 9.100                 | \$ 400            | \$ 8.574                 | \$ 526      | \$ 9.100                 |
| E. Adicional | \$ 11.400                | \$ 500      | \$ 11.400                | \$ 317            | \$ 11.700                | \$ 500      | \$ 12.200                | \$ 600            | \$ 11.774                | \$ 526      | \$ 12.300                |
| IE           | \$ 2.200                 | \$ 500      | \$ 2.700                 | \$ 61             | \$ 2.300                 | \$ 500      | \$ 2.800                 | \$ 74             | \$ 2.374                 | \$ 526      | \$ 2.900                 |
| IIA          | \$ 6.700                 | \$ 500      | \$ 7.200                 | \$ 187            | \$ 6.900                 | \$ 500      | \$ 7.400                 | \$ 374            | \$ 7.274                 | \$ 526      | \$ 7.800                 |
| IIIE         | \$ 13.200                | \$ 500      | \$ 13.700                | \$ 367            | \$ 13.600                | \$ 500      | \$ 14.100                | \$ 674            | \$ 14.274                | \$ 526      | \$ 14.800                |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        |  | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                              | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. |  | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |  | <b>Página 373 de 591</b>                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |  | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

• **Peaje Choachí**

| Categoría    | Tarifa 2024-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2024-1 con Fosevi | Incremento 2025-1 | Tarifa 2025-1 sin Fosevi | Fosevi 2024 | Tarifa 2025-1 con Fosevi | Incremento 2025-2 | Tarifa 2025-2 sin Fosevi | Fosevi 2025 | Tarifa 2025-2 con Fosevi |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| I            | \$ 12.300                | \$ 500      | \$ 12.800                | \$ 342            | \$ 12.600                | \$ 500      | \$ 13.100                | \$ 674            | \$ 13.374                | \$ 526      | \$ 13.900                |
| II           | \$ 19.600                | \$ 500      | \$ 20.100                | \$ 546            | \$ 20.100                | \$ 500      | \$ 20.600                | \$ 974            | \$ 21.174                | \$ 526      | \$ 21.700                |
| III          | \$ 30.500                | \$ 500      | \$ 31.000                | \$ 849            | \$ 31.300                | \$ 500      | \$ 31.800                | \$ 1.574          | \$ 32.974                | \$ 526      | \$ 33.500                |
| IV           | \$ 44.800                | \$ 500      | \$ 45.300                | \$ 1.247          | \$ 46.000                | \$ 500      | \$ 46.500                | \$ 2.374          | \$ 48.474                | \$ 526      | \$ 49.000                |
| V            | \$ 61.500                | \$ 500      | \$ 62.000                | \$ 1.712          | \$ 63.200                | \$ 500      | \$ 63.700                | \$ 3.174          | \$ 66.574                | \$ 526      | \$ 67.100                |
| VI           | \$ 61.900                | \$ 500      | \$ 62.400                | \$ 1.723          | \$ 63.600                | \$ 500      | \$ 64.100                | \$ 3.174          | \$ 66.974                | \$ 526      | \$ 67.500                |
| E. Remolque  | \$ 11.000                | \$ 500      | \$ 11.000                | \$ 306            | \$ 11.300                | \$ 500      | \$ 11.800                | \$ 600            | \$ 11.374                | \$ 526      | \$ 11.900                |
| E. Grúa      | \$ 8.400                 | \$ 500      | \$ 8.400                 | \$ 234            | \$ 8.600                 | \$ 500      | \$ 9.100                 | \$ 400            | \$ 8.574                 | \$ 526      | \$ 9.100                 |
| E. Adicional | \$ 11.400                | \$ 500      | \$ 11.400                | \$ 317            | \$ 11.700                | \$ 500      | \$ 12.200                | \$ 600            | \$ 11.774                | \$ 526      | \$ 12.300                |
| IE           | \$ 6.300                 | \$ 500      | \$ 6.800                 | \$ 175            | \$ 6.500                 | \$ 500      | \$ 7.000                 | \$ 374            | \$ 6.874                 | \$ 526      | \$ 7.400                 |
| IIA          | \$ 6.700                 | \$ 500      | \$ 7.200                 | \$ 187            | \$ 6.900                 | \$ 500      | \$ 7.400                 | \$ 374            | \$ 7.274                 | \$ 526      | \$ 7.800                 |
| IIE          | \$ 13.200                | \$ 500      | \$ 13.700                | \$ 367            | \$ 13.600                | \$ 500      | \$ 14.100                | \$ 674            | \$ 14.274                | \$ 526      | \$ 14.800                |

**12.5 SALDOS DE LAS SUBCUENTAS**

A continuación, presentan los saldos de las subcuentas del Patrimonio Autónomo al 28 de febrero de 2025:

| DISPONIBLE (USD)                       |               |                          |                              |                          |          |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| NOMBRE DE CUENTA                       | NO. DE CUENTA | 3. SALDO FINAL           | 4. SALDO CONTABLE            | 5. PARTIDA CONCILIATORIA |          |
| ▢ VIGENCIAS FUTURAS POB UF 2- DOLARES  | 80100009082   | USD -                    | USD -                        | USD -                    | -        |
| ▢ VIGENCIAS FUTURAS POB UF 1 - DOLARES | 80100009083   | USD -                    | USD -                        | USD -                    | -        |
| ▢ VIGENCIAS FUTURAS POB UF 4- DOLARES  | 80100009084   | USD 26.135.787,65        | USD 26.135.787,65            | USD -                    | -        |
| ▢ VIGENCIAS FUTURAS POB UF 5- DOLARES  | 80100009085   | USD 23.436.601,53        | USD 23.436.601,53            | USD -                    | -        |
| ▢ VIGENCIAS FUTURAS POB UF 3- DOLARES  | 80100009086   | USD -                    | USD -                        | USD -                    | -        |
| ▢ SUBCUENTA USD CITI BANK              | 116341        | USD 276,53               | USD 276,53                   | USD -                    | -        |
|                                        | 116342        | USD -                    | USD -                        | USD -                    | -        |
| <b>TOTAL DISPONIBLE (USD)</b>          |               | <b>USD 49.572.665,71</b> | <b>USD 49.572.665,71</b>     | <b>USD -</b>             | <b>-</b> |
| <b>TRM</b>                             | <b>\$</b>     | <b>4.134,04</b>          | <b>\$ 204.935.382.951,77</b> |                          |          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 374 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| DISPONIBLE (COP)                               |               |                              |                              |                          |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DE CUENTA                               | NO. DE CUENTA | 3. SALDO FINAL               | 4. SALDO CONTABLE            | 5. PARTIDA CONCILIATORIA |
| - SUBCUENTA SEGUROS OBLIGATORIOS               | 5666460       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RESERVA OPEX                       | 3161208867    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RESERVA MANTENIMIENTO MAYOR        | 3161209014    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| - SUBCUENTA POB (FIDUEXCEDENTES)               | 2744          | \$ 3.037.168,53              | \$ 3.037.168,53              | \$ -                     |
| - SUBCUENTA PRINCIPAL                          | 5666351       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA REEMBOLSO ANI PPIO TRANSPARENCIA   | 5666381       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA INGRESOS CT                        | 5666399       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA DESEMBOLSOS FDN                    | 5666414       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA OPEX                               | 5666421       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RESERVA OPEX                       | 5666439       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RESERVA DE DEUDA COP               | 5666453       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RETENCION EPC                      | 5666478       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA DESEMBOLSOS COP                    | 5666367       | \$ 472,69                    | \$ 472,69                    | \$ -                     |
| - SUBCUENTA CAPEX                              | 5666407       | \$ 196,09                    | \$ 196,09                    | \$ -                     |
| - SUBCUENTA SUPERVISION Y VIATICOS CONTRATISTA | 3195239010    | \$ 2.806.895,20              | \$ 2.806.895,20              | \$ -                     |
| - SUBCUENTA REEMBOLSO ANI PRINCIPIO DE TRANSP  | 3161207119    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| - SUBCUENTA APORTES EQUITY                     | 5666374       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RESERVA MANTENIMIENTO MAYOR        | 5666446       | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 4                   | 3105804821    | \$ 263.442.494.705,65        | \$ 263.442.494.705,65        | \$ -                     |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 5                   | 3105804848    | \$ 237.770.440.589,31        | \$ 237.770.440.589,31        | \$ -                     |
| - P.A. POB-GENERAL PRINCIPAL.                  |               | \$ 50.401,88                 | \$ 50.401,88                 | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN INTERV Y SUPERVISIÓN            | 3133654886    | \$ 25.705.017.087,20         | \$ 25.705.017.087,20         | \$ -                     |
| - P.A. POB-GENERAL PREDIOS                     | 3133654916    | \$ 1.924.124.695,81          | \$ 1.924.124.695,81          | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN COMP AMBIENTALES.               | 3133654967    | \$ 48.650.074.609,98         | \$ 48.650.074.609,98         | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN SOP CONTRACTUAL                 | 3133654983    | \$ 4.822.835.393,11          | \$ 4.822.835.393,11          | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN REDES                           | 3133655025    | \$ 5.058.160.341,50          | \$ 5.058.160.341,50          | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN AMIGABLE COMPO                  | 3133655149    | \$ 515.982.451,02            | \$ 515.982.451,02            | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN APOR ANI                        | 3133655165    | \$ 106.679.118.046,35        | \$ 106.679.118.046,35        | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN REC PEAJE                       | 3133655271    | \$ 3.310.768.739,52          | \$ 3.310.768.739,52          | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN EXCENDENTES ANI                 | 3133655289    | \$ 1.126.043.485,71          | \$ 1.126.043.485,71          | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN ING X EXPLOT CCIAL              | 3133655408    | \$ 9.628.802,88              | \$ 9.628.802,88              | \$ -                     |
| - P.A. POB-GEN OBRAS MENORES                   | 3133655483    | \$ 47.166.272.248,76         | \$ 47.166.272.248,76         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 1              | 3139577981    | \$ 980.586.780,43            | \$ 980.586.780,43            | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 2              | 3139578278    | \$ 1.671.025.632,53          | \$ 1.671.025.632,53          | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 3              | 3139578375    | \$ 3.578.116.978,65          | \$ 3.578.116.978,65          | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 4              | 3139578553    | \$ 120.947.212.262,61        | \$ 120.947.212.262,61        | \$ -                     |
| - SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 5              | 3139578723    | \$ 108.616.884.889,80        | \$ 108.616.884.889,80        | \$ -                     |
| - DESEMBOLSOS COP                              | 3161206805    | \$ 61.773,99                 | \$ 61.773,99                 | \$ -                     |
| - APORTES EQUITY                               | 3161206911    | \$ 4.025,74                  | \$ 4.025,74                  | \$ -                     |
| - CAPEX                                        | 3161208026    | \$ 921.692.432,13            | \$ 4.697.640.403,28          | \$ 2.276.111,00          |
| - RESERVA SERVICIO DE DEUDA COP                | 3161209715    | \$ 2.399.035,08              | \$ 2.399.035,08              | \$ -                     |
| - RETENCION EPC                                | 3161210284    | \$ 1.727.377,05              | \$ 1.727.377,05              | \$ -                     |
| - SUBCUENTA DE OPEX MINIMO                     | 3163811731    | \$ 4.708.839.820,24          | \$ 4.708.839.820,24          | \$ -                     |
| - P.A. POB-EXPLT CCIAL UF1                     | 3186565630    | \$ 2.123.762,32              | \$ 2.123.762,32              | \$ -                     |
| - P.A. POB-EXPLT CCIAL UF3                     | 3186565770    | \$ 6.139.355,99              | \$ 6.139.355,99              | \$ -                     |
| - P.A. POB-EXPLT CCIAL UF4                     | 3186565931    | \$ 174.873.004,94            | \$ 174.873.004,94            | \$ -                     |
| - P.A. POB-EXPLT CCIAL UF5                     | 3186566032    | \$ 157.016.372,57            | \$ 157.016.372,57            | \$ -                     |
| - P.A. POB-EXPLT CCIAL UF2                     | 3186566113    | \$ 3.610.752,24              | \$ 3.610.752,24              | \$ -                     |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 1                   | 3186786245    | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 2                   | 3186786431    | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 3                   | 3186786466    | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                     |
| - SUBCUENTA SEGUROS OBLIGATORIOS               | 3161209928    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| - SUBCUENTA INGRESOS CT                        | 3161207275    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| - SUBCUENTA DESEMBOLSOS FDN                    | 3161207496    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| - SUBCUENTA OPEX                               | 3161208255    | \$ 1.351,05                  | \$ 1.351,05                  | \$ -                     |
| <b>TOTAL DISPONIBLE (COP)</b>                  |               | <b>\$ 987.959.180.044,85</b> | <b>\$ 991.735.128.016,00</b> | <b>\$ 2.276.111,00</b>   |

## 12.6 RENDIMIENTOS GENERADOS

A continuación, se detallan los rendimientos generados con corte al 28 de febrero de 2025:

| RENDIMIENTOS (USD)                       |               |                      |                                   |               |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| NOMBRE DE CUENTA                         | NO. DE CUENTA | 2.FEBRERO.2025       | TOTAL RENDIMIENTOS (USD) EN (COP) |               |
| - SUBCUENTA USD CITI BANK                | 116341        | USD 0,56             | \$                                | 2.307,26      |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 4- DOLARES    | 80100009084   | USD 8.017,29         | \$                                | 33.032.116,70 |
| - VIGENCIAS FUTURAS POB UF 5- DOLARES    | 80100009085   | USD 7.189,30         | \$                                | 29.620.706,82 |
| <b>TOTAL RENDIMIENTOS (USD) EN (COP)</b> |               | <b>USD 15.207,15</b> |                                   |               |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 375 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

|                                               |               | RENDIMIENTOS (COP)         |                          |                         |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DE CUENTA                              | NO. DE CUENTA | 2.FEBRERO.2025             | TOTAL RENDIMIENTOS (COP) |                         |
| APORTES EQUITY                                | 3161206911    | \$ 25,72                   | \$                       | 25,72                   |
| CAPEX                                         | 3161208026    | \$ 9.182.211,77            | \$                       | 9.182.211,77            |
| DESEMBOLSOS COP                               | 3161206805    | \$ 396,07                  | \$                       | 396,07                  |
| P.A. POB-EXPLT CCIAL UF1                      | 3186565630    | \$ 10.984,57               | \$                       | 10.984,57               |
| P.A. POB-EXPLT CCIAL UF2                      | 3186566113    | \$ 18.684,48               | \$                       | 18.684,48               |
| P.A. POB-EXPLT CCIAL UF3                      | 3186565770    | \$ 34.543,48               | \$                       | 34.543,48               |
| P.A. POB-EXPLT CCIAL UF4                      | 3186565931    | \$ 1.112.777,82            | \$                       | 1.112.777,82            |
| P.A. POB-EXPLT CCIAL UF5                      | 3186566032    | \$ 999.148,40              | \$                       | 999.148,40              |
| P.A. POB-GEN AMIGABLE COMPO                   | 3133655149    | \$ 3.311.219,16            | \$                       | 3.311.219,16            |
| P.A. POB-GEN APOR ANI                         | 3133655165    | \$ 440.373.740,35          | \$                       | 440.373.740,35          |
| P.A. POB-GEN COMP AMBIENTALES.                | 3133654967    | \$ 313.586.726,24          | \$                       | 313.586.726,24          |
| P.A. POB-GEN EXCENDENTES ANI                  | 3133655289    | \$ 7.231.767,01            | \$                       | 7.231.767,01            |
| P.A. POB-GEN ING X EXPLOT CCIAL               | 3133655408    | \$ 65.539,24               | \$                       | 65.539,24               |
| P.A. POB-GEN INTERV Y SUPERVISIÓN             | 3133654886    | \$ 165.467.865,09          | \$                       | 165.467.865,09          |
| P.A. POB-GEN OBRAS MENORES                    | 3133655483    | \$ 302.200.799,50          | \$                       | 302.200.799,50          |
| P.A. POB-GEN REC PEAJE                        | 3133655271    | \$ 16.639.553,30           | \$                       | 16.639.553,30           |
| P.A. POB-GEN REDES                            | 3133655025    | \$ 32.443.039,03           | \$                       | 32.443.039,03           |
| P.A. POB-GEN SOP CONTRACTUAL                  | 3133654983    | \$ 30.993.987,33           | \$                       | 30.993.987,33           |
| P.A. POB-GENERAL PREDIOS                      | 3133654916    | \$ 13.498.154,12           | \$                       | 13.498.154,12           |
| P.A. POB-GENERAL PRINCIPAL.                   | 3133654827    | \$ 323,14                  | \$                       | 323,14                  |
| RESERVA SERVICIO DE DEUDA COP                 | 3161209715    | \$ 15.387,28               | \$                       | 15.387,28               |
| RETENCION EPC                                 | 3161210284    | \$ 11.079,25               | \$                       | 11.079,25               |
| SUBCUENTA OPEX                                | 3161208255    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA DE OPEX MINIMO                      | 3163811731    | \$ 30.202.497,32           | \$                       | 30.202.497,32           |
| SUBCUENTA DESEMBOLSOS FDN                     | 3161207496    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA DESEMBOLSOS COP                     | 5666367       | \$ 0,01                    | \$                       | 0,01                    |
| SUBCUENTA INGRESOS CT                         | 3161207275    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA POB (FIDUEXCEDENTES)                | 2744          | \$ 18.776,28               | \$                       | 18.776,28               |
| SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 1               | 3139577981    | \$ 5.836.871,04            | \$                       | 5.836.871,04            |
| SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 2               | 3139578278    | \$ 9.949.948,44            | \$                       | 9.949.948,44            |
| SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 3               | 3139578375    | \$ 22.120.334,46           | \$                       | 22.120.334,46           |
| SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 4               | 3139578553    | \$ 774.235.165,28          | \$                       | 774.235.165,28          |
| SUBCUENTA RECAUDO DE PEAJE UF 5               | 3139578723    | \$ 695.303.432,45          | \$                       | 695.303.432,45          |
| SUBCUENTA REEMBOLSO ANI PRINCIPIO DE TRANSP   | 3161207119    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA RESERVA MANTENIMIENTO MAYOR         | 3161209014    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA RESERVA OPEX                        | 3161208867    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA SEGUROS OBLIGATORIOS                | 3161209928    | \$ 8,47                    | \$                       | 8,47                    |
| SUBCUENTA SUPERVISION Y VIATICOS CONTRATISTAS | 3195239010    | \$ 18.031,20               | \$                       | 18.031,20               |
| VIGENCIAS FUTURAS POB UF 4                    | 3105804821    | \$ 1.689.720.096,11        | \$                       | 1.689.720.096,11        |
| VIGENCIAS FUTURAS POB UF 5                    | 3105804848    | \$ 1.525.059.547,32        | \$                       | 1.525.059.547,32        |
| <b>TOTAL RENDIMIENTOS (COP)</b>               |               | <b>\$ 6.089.662.711,55</b> | <b>\$</b>                | <b>6.089.662.711,55</b> |

Los rendimientos de las cuentas evidencian un comportamiento positivo y no se prevé ningún riesgo. Al cierre de febrero de 2025 la tasa de rendimientos fue equivalente a 8,75%.

## 12.7 DETALLE DE SUBCUENTAS DEL FIDEICOMISO

A continuación, se presentan los flujos de caja de las subcuentas creadas a la fecha:

- **Subcuenta Predios**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 376 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                              |                     |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                        | 2.FEBRERO.2025      | ACUMULADO            |
| 0. SALDO INICIAL              | SALDO INICIAL                                                | \$ 2.917.969.718,34 |                      |
|                               |                                                              | \$ 2.917.969.718,34 |                      |
| 1. INGRESOS                   |                                                              |                     |                      |
|                               | DEVOLUCIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                 | \$ -                | \$ 467.269,48        |
|                               | DEVOLUCIÓN ORDENES DE OPERACIÓN                              | \$ -                | \$ 873.466.001,00    |
|                               | FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                                   | \$ -                | \$ 66.550.352.773,38 |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                               | \$ -                | \$ 2.957.181,00      |
|                               | PAGO NO APLICADO                                             | \$ -                | \$ 1.577.373.587,71  |
|                               | PENDIENTE POR IDENTIFICAR                                    | \$ -                | \$ 14.227.607,00     |
|                               | REINTEGRO PAGO PREDIO                                        | \$ -                | \$ 142.829.696,88    |
|                               | RENDIMIENTOS                                                 | \$ 13.498.154,12    | \$ 12.672.789.507,19 |
|                               | TRASLADO DESDE SUBCUENTA CAPEX                               | \$ -                | \$ 90.180.033,67     |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA CAPEX                               | \$ -                | \$ 1.557.853.927,80  |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                                  | \$ -                | \$ 4.088.332.809,55  |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA CAPEX (RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS )   | \$ -                | \$ 2.788.635,37      |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA CAPEX REINTEGRO DE GMF                    | \$ -                | \$ 168.890.150,17    |
|                               | TRASLADO DE FONDOS DESDE CAPEX A PREDIOS                     | \$ -                | \$ 1.226.841.574,07  |
|                               |                                                              | \$ 13.498.154,12    | \$ 88.969.350.754,27 |
| 2. EGRESOS                    |                                                              |                     |                      |
|                               | DEVOLUCIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE                         | \$ -                | \$ 1.249.096,00      |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                            | \$ 4.013.319,42     | \$ 324.050.263,02    |
|                               | MAYOR VALOR PAGADO                                           | \$ -                | \$ 25.488.467,22     |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                               | \$ -                | \$ 175.531.797,00    |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                             | \$ 1.003.329.857,23 | \$ 85.231.934.355,22 |
|                               | REEMBOLSOS                                                   | \$ -                | \$ 43.614.382,00     |
|                               | SERVICIOS BANCARIOS                                          | \$ -                | \$ 21.420,00         |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA CAPEX                               | \$ -                | \$ 84.785.230,00     |
|                               | TRASLADO REINTEGRO RETENCIONES SUBCUENTA SOPORTE CONTRACTUAL | \$ -                | \$ 4.752.000,00      |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA P CAPEX POR DEBITO ERRADO                 | \$ -                | \$ 1.153.799.048,00  |
|                               |                                                              | \$ 1.007.343.176,65 | \$ 87.045.226.058,46 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                              |                     |                      |
|                               | SALDO FINAL                                                  | \$ 1.924.124.695,81 |                      |
|                               |                                                              | \$ 1.924.124.695,81 |                      |

Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron pagos a terceros por \$1.003.329.857,23. Al corte de este informe el total por pagos equivale a \$85.231.934.355,22.

Los ingresos generados corresponden a los rendimientos del periodo.

- **Subcuenta Compensaciones Ambientales**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                            |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                      | 2.FEBRERO.2025       | ACUMULADO            |
| 0. SALDO INICIAL              | SALDO INICIAL                                                              | \$ 48.726.215.753,78 |                      |
|                               |                                                                            | \$ 48.726.215.753,78 |                      |
| 1. INGRESOS                   |                                                                            |                      |                      |
|                               | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS                                                     | \$ -                 | \$ 91.625.955,13     |
|                               | FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                                                 | \$ -                 | \$ 34.130.390.402,26 |
|                               | RENDIMIENTOS                                                               | \$ 313.586.726,24    | \$ 24.408.178.904,27 |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                                                | \$ 1.165.713,75      | \$ 38.416.078,02     |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA CAPEX RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS POR LOS FONDEOS DE | \$ -                 | \$ 547.080,62        |
|                               | TRASLADO DESDE SUBCUENTA CAPEX                                             | \$ -                 | \$ 18.959.799,13     |
|                               |                                                                            | \$ 314.752.439,99    | \$ 58.688.118.219,43 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                            |                      |                      |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                          | \$ 1.557.344,95      | \$ 39.972.282,97     |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                                             | \$ 49.220.000,00     | \$ 50.675.092,00     |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                           | \$ 340.116.238,84    | \$ 9.947.396.234,48  |
|                               |                                                                            | \$ 390.893.583,79    | \$ 10.038.043.609,45 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                            |                      |                      |
|                               | SALDO FINAL                                                                | \$ 48.650.074.609,98 |                      |
|                               |                                                                            | \$ 48.650.074.609,98 |                      |

Durante el mes de febrero de 2025 se presentaron pagos a terceros por \$9.947.396.234,48. Al corte de este informe el total por pagos es equivalente a para un total acumulado de \$9.947.396.234,48.

Los ingresos generados corresponden a los rendimientos del periodo.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 377 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- **Subcuenta Redes**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                |                            |                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                          | 2.FEBRERO.2025             | ACUMULADO                   |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                |                            |                             |
|                               | SALDO INICIAL                                  | \$ 5.025.717.302,47        |                             |
|                               |                                                | <b>\$ 5.025.717.302,47</b> |                             |
| 1. INGRESOS                   |                                                |                            |                             |
|                               | FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                     | \$ -                       | \$ 13.290.631.850,54        |
|                               | PAGO NO APLICADO                               | \$ -                       | \$ 474.860.595,00           |
|                               | RENDIMIENTOS                                   | \$ 32.443.039,03           | \$ 4.861.237.382,96         |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                    | \$ -                       | \$ 26.122.714,93            |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA CAPEX REINTEGRO DE GMF      | \$ -                       | \$ 26.162.145,73            |
|                               |                                                | <b>\$ 32.443.039,03</b>    | <b>\$ 18.679.014.689,16</b> |
| 2. EGRESOS                    |                                                |                            |                             |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO              | \$ -                       | \$ 52.284.860,66            |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                 | \$ -                       | \$ 54.735.935,00            |
|                               | PAGOS A TERCEROS                               | \$ -                       | \$ 13.491.339.842,00        |
|                               | REINTEGRO RETENCIONES MUNICIPALES Y NACIONALES | \$ -                       | \$ 22.493.710,00            |
|                               |                                                | <b>\$ -</b>                | <b>\$ 13.620.854.347,66</b> |
| 3. SALDO FINAL                |                                                |                            |                             |
|                               | SALDO FINAL                                    | \$ 5.058.160.341,50        |                             |
|                               |                                                | <b>\$ 5.058.160.341,50</b> |                             |

Durante el mes de febrero de 2025 no se realizaron pagos a terceros. Al corte de este informe el total por pagos equivale a \$13.491.339.842,00.

Los ingresos generados corresponden a los rendimientos del periodo.

- **Subcuenta Interventoría y Supervisión**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                       |                             |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                 | 2.FEBRERO.2025              | ACUMULADO                   |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                       |                             |                             |
|                               | SALDO INICIAL                                                         | \$ 26.042.146.699,16        |                             |
|                               |                                                                       | <b>\$ 26.042.146.699,16</b> |                             |
| 1. INGRESOS                   |                                                                       |                             |                             |
|                               | AJUSTE RENDIMIENTOS A LA SUBCUENTA DE OBRAS MENORES                   | \$ -                        | \$ 71.699.125,03            |
|                               | DEVOLUCIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                          | \$ -                        | \$ 1,07                     |
|                               | DEVOLUCIÓN SERVICIOS BANCARIOS                                        | \$ -                        | \$ 268,62                   |
|                               | FONDEO SUBCUENTA CAPEX                                                | \$ -                        | \$ 58.986.540.344,17        |
|                               | FONDEO SUBCUENTA POB                                                  | \$ -                        | \$ 12.568.374.413,19        |
|                               | FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                                            | \$ -                        | \$ 14.539.527.930,04        |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                                        | \$ -                        | \$ 747.753,00               |
|                               | RENDIMIENTOS                                                          | \$ 165.467.865,09           | \$ 7.007.080.865,80         |
|                               | TRASLADO DE RENDIMIENTOS SUBCUENTA CAPEX                              | \$ -                        | \$ 17.279.483,12            |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS AMIGABLE COMPONEDOR - RENDIMIENTOS             | \$ -                        | \$ 24.523,68                |
|                               | TRASLADO FIDEICOMISO TRANSACCION POB                                  | \$ -                        | \$ 4.402.734.900,90         |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                                           | \$ 1.332.896,78             | \$ 248.516.049,37           |
|                               |                                                                       | <b>\$ 166.800.761,87</b>    | <b>\$ 97.842.525.657,99</b> |
| 2. EGRESOS                    |                                                                       |                             |                             |
|                               | AJUSTE DB INTERESES AHORROS                                           | \$ -                        | \$ 58.965,86                |
|                               | DEBITO GENERICO EXENTO GMF                                            | \$ -                        | \$ 24.523,68                |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                     | \$ 1.255.485,60             | \$ 255.090.020,57           |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                                        | \$ 637.000,00               | \$ 2.643.249.916,88         |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                      | \$ 313.855.408,63           | \$ 61.167.011.562,44        |
|                               | SERVICIOS BANCARIOS                                                   | \$ -                        | \$ 268,62                   |
|                               | TRASLADO A SUBCUENTA SUPERVISION Y VIATICOS CONTRATO DE CONCESION     | \$ -                        | \$ 1.158.761.187,00         |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS | \$ 188.182.479,60           | \$ 6.913.312.125,74         |
|                               |                                                                       | <b>\$ 503.930.373,83</b>    | <b>\$ 72.137.508.570,79</b> |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                       |                             |                             |
|                               | SALDO FINAL                                                           | \$ 25.705.017.087,20        |                             |
|                               |                                                                       | <b>\$ 25.705.017.087,20</b> |                             |

Durante el mes de febrero de 2025 se realizaron pagos por Interventoría equivalentes a \$313.855408,63. Al corte de este informe el total por pagos equivale a \$61.167.011.562,44.

Los ingresos corresponden a los rendimientos del periodo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 378 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- **Subcuenta Soporte Contractual**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                       |                     |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                 | 2.FEBRERO.2025      | ACUMULADO           |
| <b>- 0. SALDO INICIAL</b>     |                                                                       |                     |                     |
|                               | SALDO INICIAL                                                         | \$ 4.830.021.285,25 |                     |
|                               |                                                                       | \$ 4.830.021.285,25 |                     |
| <b>- 1. INGRESOS</b>          |                                                                       |                     |                     |
|                               | AJUSTE RENDIMIENTOS A LA SUBCUENTA DE OBRAS MENORES                   | \$ -                | \$ 5.566.968,59     |
|                               | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS                                                | \$ -                | \$ 5.078.891,62     |
|                               | DEVOLUCIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                          | \$ -                | \$ 1,07             |
|                               | DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS                                               | \$ -                | \$ 26.197,33        |
|                               | DEVOLUCIÓN SERVICIOS BANCARIOS                                        | \$ -                | \$ 268,62           |
|                               | FONDEO SUBCUENTA APORTES EQUITY                                       | \$ -                | \$ 447.090.000,00   |
|                               | FONDEO SUBCUENTA CAPEX                                                | \$ -                | \$ 4.164.456.250,90 |
|                               | FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                                            | \$ -                | \$ 760.761.978,18   |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                                        | \$ -                | \$ 3.000,00         |
|                               | PAGO NO APLICADO                                                      | \$ -                | \$ 2.664.450,00     |
|                               | RENDIMIENTOS                                                          | \$ 30.993.987,33    | \$ 1.538.947.534,04 |
|                               | TRASLADO DE RENDIMIENTOS SUBCUENTA CAPEX                              | \$ -                | \$ 138.330,29       |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL P.A. TRANSACCIÓN PERIMETRAL                | \$ -                | \$ 230.157,31       |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                                           | \$ 13.468,52        | \$ 3.258.329,24     |
|                               | TRASLADO REINTEGRO GMF SUBCUENTA SOPORTE CONTRACTUAL                  | \$ -                | \$ 21.300,96        |
|                               | TRASLADO REINTEGRO RETENCIONES SUBCUENTA PREDIOS                      | \$ -                | \$ 4.752.000,00     |
|                               |                                                                       | \$ 31.007.455,85    | \$ 6.932.995.658,15 |
| <b>- 2. EGRESOS</b>           |                                                                       |                     |                     |
|                               | AJUSTE DB INTERESES AHORROS                                           | \$ -                | \$ 78.132,58        |
|                               | DEBITO GENERICO EXENTO GMF                                            | \$ -                | \$ 230.157,31       |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                     | \$ 13.311,61        | \$ 2.365.516,72     |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                                        | \$ 80.000,00        | \$ 40.639.217,00    |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                      | \$ 3.247.904,00     | \$ 553.404.430,66   |
|                               | SERVICIOS BANCARIOS                                                   | \$ -                | \$ 268,62           |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS | \$ 34.852.132,38    | \$ 1.513.442.542,15 |
|                               |                                                                       | \$ 38.193.347,99    | \$ 2.110.160.265,04 |
| <b>- 3. SALDO FINAL</b>       |                                                                       |                     |                     |
|                               | SALDO FINAL                                                           | \$ 4.822.835.393,11 |                     |
|                               |                                                                       | \$ 4.822.835.393,11 |                     |

Se evidencia el traslado de los rendimientos de acuerdo con la exigencia contractual a la subcuenta de Obras Menores. Los movimientos restantes son coherentes con la naturaleza de la subcuenta.

- **Subcuenta MASC**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                       |                   |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                 | 2.FEBRERO.2025    | ACUMULADO           |
| <b>- 0. SALDO INICIAL</b>     |                                                                       |                   |                     |
|                               | SALDO INICIAL                                                         | \$ 515.768.646,36 |                     |
|                               |                                                                       | \$ 515.768.646,36 |                     |
| <b>- 1. INGRESOS</b>          |                                                                       |                   |                     |
|                               | AJUSTE RENDIMIENTOS A LA SUBCUENTA DE OBRAS MENORES                   | \$ -              | \$ 3.594.108,36     |
|                               | CONSIGNACIÓN REINTEGRO- RETEN ALEJANDRO ATUESTA                       | \$ -              | \$ 1.301.169,00     |
|                               | FONDEO SUBCUENTA CAPEX                                                | \$ -              | \$ 4.643.625.629,46 |
|                               | FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                                            | \$ -              | \$ 815.191.736,00   |
|                               | PAGO NO APLICADO                                                      | \$ -              | \$ 104.220.197,91   |
|                               | REINTEGRO RETENCIONES MUNICIPALES Y NACIONALES                        | \$ 621.000,00     | \$ 664.000,00       |
|                               | RENDIMIENTOS                                                          | \$ 3.311.219,16   | \$ 332.805.861,13   |
|                               | TRASLADO CONTRATO DE CONCESION                                        | \$ -              | \$ 472.932,39       |
|                               | TRASLADO DE RENDIMIENTOS SUBCUENTA CAPEX                              | \$ -              | \$ 445.459,38       |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                                           | \$ 309,86         | \$ 8.506.500,61     |
|                               | TRASLADO REINTEGRO GMF SUBCUENTA AMIGABLE COMPONEDOR                  | \$ -              | \$ 169.104,80       |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA CAPEX REINTEGRO DE GMF                             | \$ -              | \$ 11.228.024,59    |
|                               |                                                                       | \$ 3.932.529,02   | \$ 5.922.224.723,63 |
| <b>- 2. EGRESOS</b>           |                                                                       |                   |                     |
|                               | AJUSTE DB INTERESES AHORROS                                           | \$ -              | \$ 48.256,95        |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                     | \$ -              | \$ 18.181.898,13    |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                                        | \$ -              | \$ 452.637.741,28   |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                      | \$ -              | \$ 4.602.333.596,92 |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS | \$ 3.718.724,36   | \$ 333.040.779,33   |
|                               |                                                                       | \$ 3.718.724,36   | \$ 5.406.242.272,61 |
| <b>- 3. SALDO FINAL</b>       |                                                                       |                   |                     |
|                               | SALDO FINAL                                                           | \$ 515.982.451,02 |                     |
|                               |                                                                       | \$ 515.982.451,02 |                     |

Los ingresos corresponden a los rendimientos generados. Adicionalmente, se evidencia el traslado de los rendimientos de acuerdo con la exigencia contractual a la subcuenta de

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 379 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Obras Menores. Los movimientos restantes son coherentes con la naturaleza de la subcuenta.

- Excedentes ANI

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                         |                     |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                   | 2.FEBRERO.2025      | ACUMULADO            |
| <b>0. SALDO INICIAL</b>       |                                                                         |                     |                      |
|                               | SALDO INICIAL                                                           | \$ 1.125.935.440,39 |                      |
|                               |                                                                         | \$ 1.125.935.440,39 |                      |
| <b>1. INGRESOS</b>            |                                                                         |                     |                      |
|                               | AJUSTE RENDIMIENTOS A LA SUBCUENTA DE OBRAS MENORES                     | \$ -                | \$ 48.395,94         |
|                               | RENDIMIENTOS                                                            | \$ 7.231.767,01     | \$ 840.402.257,95    |
|                               | TRASLADO RECAUDO UF 1                                                   | \$ -                | \$ 19.470,30         |
|                               | TRASLADO RECAUDO UF 2                                                   | \$ -                | \$ 804.474.917,35    |
|                               | TRASLADO RECAUDO UF 3                                                   | \$ -                | \$ 820.081.061,33    |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA DE RECAUDO - RECON.RENDIMIENTOS SOBANTES             | \$ -                | \$ 14.724.555,75     |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI 2.2%                                  | \$ -                | \$ 299.376,00        |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXPLOTACIÓN COMERCIAL 2.2%                           | \$ 112.922,70       | \$ 9.087.800,48      |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXPLOTACIÓN UF 2                                     | \$ -                | \$ 1.565.351,09      |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXPLOTACIÓN UF 3                                     | \$ -                | \$ 8.648.636,02      |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA RECAUDO SOBANTES                                     | \$ 881.800,00       | \$ 68.726.528,87     |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 1                                         | \$ -                | \$ 74.180.774,44     |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 2                                         | \$ -                | \$ 4.068.717.295,02  |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 3                                         | \$ -                | \$ 4.044.685.695,90  |
|                               | TRASLADO DESDE SUBCUENTAS RECAUDO PEAJE UF3 ANI- INCUMPLIMIENTO PREDIAL | \$ -                | \$ 10.118.857,55     |
|                               |                                                                         | \$ 8.226.489,71     | \$ 10.765.780.974,59 |
| <b>2. EGRESOS</b>             |                                                                         |                     |                      |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS   | \$ 8.118.444,39     | \$ 821.529.937,61    |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA RECAUDO PEAJE (ACTA DE COMPENSACIÓN)           | \$ -                | \$ 8.806.518.602,00  |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI SOBANTES                              | \$ -                | \$ 11.688.949,27     |
|                               |                                                                         | \$ 8.118.444,39     | \$ 9.639.737.488,88  |
| <b>3. SALDO FINAL</b>         |                                                                         |                     |                      |
|                               | SALDO FINAL                                                             | \$ 1.126.043.485,71 |                      |
|                               |                                                                         | \$ 1.126.043.485,71 |                      |

Los ingresos corresponden a los rendimientos generados. Adicionalmente, se evidencia el traslado de los rendimientos de acuerdo con la exigencia contractual a la subcuenta de Obras Menores. Los movimientos restantes son coherentes con la naturaleza de la subcuenta.

- Obras Menores

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                           |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                     | 2.FEBRERO.2025       | ACUMULADO            |
| <b>0. SALDO INICIAL</b>       |                                                                           |                      |                      |
|                               | SALDO INICIAL                                                             | \$ 46.629.179.406,01 |                      |
|                               |                                                                           | \$ 46.629.179.406,01 |                      |
| <b>1. INGRESOS</b>            |                                                                           |                      |                      |
|                               | AJUSTE MONEDA EXTRANJERA                                                  | \$ -                 | \$ 7.403.591,56      |
|                               | PENDIENTE POR IDENTIFICAR                                                 | \$ -                 | \$ 16.375.967,56     |
|                               | RENDIMIENTOS                                                              | \$ 302.200.799,50    | \$ 12.195.610.929,57 |
|                               | TRASLADO DESDE SUBCUENTA CAPEX                                            | \$ -                 | \$ 1.267.630,28      |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS AMIGABLE COMPONEDOR - RENDIMIENTOS                 | \$ 3.718.724,36      | \$ 384.344.776,98    |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS APORTES ANI -RENDIMIENTOS                          | \$ -                 | \$ 1.160.796.507,00  |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN - RENDIMIENTOS         | \$ 188.182.479,60    | \$ 6.789.177.644,25  |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS SOPORTE CONTRACTUAL -RENDIMIENTOS                  | \$ 34.852.132,38     | \$ 3.531.546.785,09  |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS SUBCUENTAS DE EXCEDENTE ANI- RENDIMIENTOS          | \$ 8.118.444,39      | \$ 4.620.571.369,33  |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS SUPERVISIÓN Y VIATICOS- RENDIMIENTOS               | \$ 20.262,52         | \$ 50.555.882,17     |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS VIGENCIAS FUTURAS UF1 DOLARES- RENDIMIENTOS        | \$ -                 | \$ 5.284.499,13      |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS VIGENCIAS FUTURAS UF1- RENDIMIENTOS                | \$ -                 | \$ 2.422.755.033,72  |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS VIGENCIAS FUTURAS UF2 DOLARES- RENDIMIENTOS        | \$ -                 | \$ 33.140.805,46     |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS VIGENCIAS FUTURAS UF2- RENDIMIENTOS                | \$ -                 | \$ 6.832.790.310,97  |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS VIGENCIAS FUTURAS UF3 DOLARES- RENDIMIENTOS        | \$ -                 | \$ 22.918.306,39     |
|                               | TRASLADO ENTRE CUENTAS VIGENCIAS FUTURAS UF3- RENDIMIENTOS                | \$ -                 | \$ 9.164.032.308,06  |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA CAPEX                                            | \$ -                 | \$ 413.015,00        |
|                               | TRASLADO MONETIZACION RENDIMIENTOS UF PANAMÁ                              | \$ -                 | \$ 33.113.503,41     |
|                               |                                                                           | \$ 537.092.842,75    | \$ 47.272.098.865,93 |
| <b>2. EGRESOS</b>             |                                                                           |                      |                      |
|                               | DEVOLUCIÓN POR DOBLE REINTEGRO RENDIMIENTOS SUBCUENTA EXCEDENTES ANI      | \$ -                 | \$ 3.546.137,36      |
|                               | DEVOLUCIÓN POR DOBLE REINTEGRO RENDIMIENTOS SUBCUENTA SOPORTE CONTRACTUAL | \$ -                 | \$ 5.488.995,44      |
|                               | DEVOLUCIÓN POR DOBLE REINTEGRO RENDIMIENTOS SUBCUENTA AMIGABLE COMP.      | \$ -                 | \$ 71.699.125,03     |
|                               | DEVOLUCIÓN POR DOBLE REINTEGRO RENDIMIENTOS SUBCUENTA INTERVENTORIA       | \$ -                 | \$ 48.395,94         |
|                               | TRASLADO CUENTA APORTES ANI -REINTEGRO RENDIMIENTOS                       | \$ -                 | \$ 23.306.217,84     |
|                               | TRASLADO CUENTA INGRESOS TT                                               | \$ -                 | \$ 1.737.745,56      |
|                               |                                                                           | \$ -                 | \$ 105.826.617,17    |
| <b>3. SALDO FINAL</b>         |                                                                           |                      |                      |
|                               | SALDO FINAL                                                               | \$ 47.166.272.248,76 |                      |
|                               |                                                                           | \$ 47.166.272.248,76 |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 380 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Los ingresos corresponden a los rendimientos generados y a los traslados de las subcuentas Amigable Componedor, Interventoría y Supervisión, Soporte Contractual, Excedentes ANI y Supervisión y Viáticos. Los movimientos restantes son coherentes con la naturaleza de la subcuenta.

- **Subcuenta Recaudo Peajes**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                    |                            |                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                              | 2.FEBRERO.2025             | ACUMULADO                    |
| <b>0. SALDO INICIAL</b>       |                                                    |                            |                              |
|                               | SALDO INICIAL                                      | \$ 3.641.870.430,77        |                              |
|                               |                                                    | <b>\$ 3.641.870.430,77</b> |                              |
| <b>1. INGRESOS</b>            |                                                    |                            |                              |
|                               | AJUSTE DE CONSIGNACIÓN                             | \$ -                       | \$ 34.901.090,02             |
|                               | AJUSTE INTERESES                                   | \$ -                       | \$ 467.104,81                |
|                               | CONSIGNACIÓN RECAUDO                               | \$ -                       | \$ 3.158.182.237,52          |
|                               | CONSIGNACIÓN RECAUDO UF 1 (9,17%)                  | \$ -                       | \$ 235.147.787,00            |
|                               | CONSIGNACIÓN RECAUDO UF 2 (15,56%)                 | \$ -                       | \$ 399.007.586,00            |
|                               | CONSIGNACIÓN RECAUDO UF 3 (16,81%)                 | \$ -                       | \$ 431.061.537,00            |
|                               | CONSIGNACIÓN RECAUDO UF 4 (30,80%)                 | \$ -                       | \$ 789.809.361,00            |
|                               | CONSIGNACIÓN RECAUDO UF 5 (27,66%)                 | \$ -                       | \$ 709.289.835,00            |
|                               | PAGO FOSEVI                                        | \$ -                       | \$ 12.182.000,00             |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                     | \$ -                       | \$ 166.303,73                |
|                               | PAGO NO APLICADO                                   | \$ -                       | \$ 16.889.600,00             |
|                               | RECAUDO                                            | \$ 3.373.625.100,00        | \$ 280.831.213.671,12        |
|                               | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                           | \$ 2.496.266,80            | \$ 47.444.027,69             |
|                               | RECONOCIMIENTO DEL DR8                             | \$ -                       | \$ 131.076.984.864,00        |
|                               | RENDIMIENTOS                                       | \$ 16.639.553,30           | \$ 1.764.802.795,27          |
|                               | RENDIMIENTOS SUBCTA RECAUDO UF 1                   | \$ -                       | \$ 740.786,59                |
|                               | RENDIMIENTOS SUBCTA RECAUDO UF 2                   | \$ -                       | \$ 1.256.994,48              |
|                               | RENDIMIENTOS SUBCTA RECAUDO UF 3                   | \$ -                       | \$ 1.357.974,11              |
|                               | RENDIMIENTOS SUBCTA RECAUDO UF 4                   | \$ -                       | \$ 2.488.138,17              |
|                               | RENDIMIENTOS SUBCTA RECAUDO UF 5                   | \$ -                       | \$ 2.234.477,33              |
|                               | REVERSIÓN COMISIÓN ADQ                             | \$ -                       | \$ 3.619,12                  |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                        | \$ 572.189,89              | \$ 17.701.506,75             |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA APORTES EQUITY                  | \$ -                       | \$ 374.767,98                |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA CAPEX REINTEGRO DE GMF          | \$ -                       | \$ 16.559.763,41             |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI                  | \$ -                       | \$ 8.806.518.854,83          |
|                               | DEVOLUCIÓN SERVICIOS BANCARIOS                     | \$ -                       | \$ 200,00                    |
|                               |                                                    | <b>\$ 3.393.333.109,99</b> | <b>\$ 428.356.786.882,93</b> |
| <b>2. EGRESOS</b>             |                                                    |                            |                              |
|                               | AJUSTE DB INTERESES AHORROS                        | \$ -                       | \$ 94.294.299,54             |
|                               | AJUSTE DB RETEFUENTE                               | \$ -                       | \$ 4.574,00                  |
|                               | AJUSTE DE CONSIGNACIÓN                             | \$ -                       | \$ 35.794.470,00             |
|                               | AJUSTE SOBRANTES                                   | \$ -                       | \$ 16.600,00                 |
|                               | COMISIÓN ADQ                                       | \$ -                       | \$ 3.154.057,81              |
|                               | COMISIÓN VENTA POS                                 | \$ -                       | \$ 6.725.378,42              |
|                               | DEDUCCIÓN ACTA COMAPENSACIÓN                       | \$ -                       | \$ 252,83                    |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                  | \$ 563.559,56              | \$ 34.565.517,93             |
|                               | PAGO FOSEVI                                        | \$ -                       | \$ 6.847.601.823,81          |
|                               | PAGO IMPUESTOS                                     | \$ -                       | \$ 75.005,00                 |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                   | \$ 138.166.434,00          | \$ 1.496.202.600,89          |
|                               | RECAUDO                                            | \$ -                       | \$ 23.042.974,76             |
|                               | REINTEGRO CONSIGNACIÓN ERRADA POR LA TRASNPORADORA | \$ -                       | \$ 8.310.145,82              |
|                               | REVERSIÓN ABONO BRUTO AQD                          | \$ -                       | \$ 86.400,00                 |
|                               | REVERSIÓN COMISIÓN ADQ                             | \$ -                       | \$ 85.800,00                 |
|                               | SERVICIOS BANCARIOS                                | \$ 2.723.477,29            | \$ 210.919.219,94            |
|                               | TRASLADO RECONOCIMIENTO DR8                        | \$ -                       | \$ 131.076.984.864,00        |
|                               | TRASLADO SUBCTA RECAUDO DE PEAJE UF1               | \$ 328.478.526,92          | \$ 26.146.942.772,16         |
|                               | TRASLADO SUBCTA RECAUDO DE PEAJE UF2               | \$ 557.374.686,93          | \$ 44.367.113.362,37         |
|                               | TRASLADO SUBCTA RECAUDO DE PEAJE UF3               | \$ 602.150.931,08          | \$ 47.931.309.487,28         |
|                               | TRASLADO SUBCTA RECAUDO DE PEAJE UF4               | \$ 1.103.286.655,36        | \$ 87.821.792.516,74         |
|                               | TRASLADO SUBCTA RECAUDO DE PEAJE UF5               | \$ 990.808.730,10          | \$ 78.868.531.851,00         |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI RENDIMIENTOS     | \$ -                       | \$ 383.869,11                |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI SOBRANTES        | \$ 881.800,00              | \$ 72.080.300,00             |
|                               |                                                    | <b>\$ 3.724.434.801,24</b> | <b>\$ 425.046.018.143,41</b> |
| <b>3. SALDO FINAL</b>         |                                                    |                            |                              |
|                               | SALDO FINAL                                        | \$ 3.310.768.739,52        |                              |
|                               |                                                    | <b>\$ 3.310.768.739,52</b> |                              |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                              | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <b>Página 381 de 591</b>                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- **Subcuenta Recaudo Peajes UF1**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                             |                   |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                       | 2.FEBRERO.2025    | ACUMULADO            |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                             |                   |                      |
|                               | SALDO INICIAL                                                               | \$ 646.271.382,47 |                      |
|                               |                                                                             | \$ 646.271.382,47 |                      |
| 1. INGRESOS                   |                                                                             |                   |                      |
|                               | RECONOCIMIENTO DEL DR8                                                      | \$ -              | \$ 28.935.386.403,00 |
|                               | RENDIMIENTOS                                                                | \$ 5.836.871,04   | \$ 987.063.771,47    |
|                               | TRASLADO DE LA SUBCUENTA DE RECAUDO DE PEAJES 031-336552-71                 | \$ 328.478.526,92 | \$ 26.146.942.772,16 |
|                               | TRASLADO DE LA SUBCUENTA INGRESOS-TRANSACCIÓN PERIMETRAL                    | \$ -              | \$ 0,20              |
|                               |                                                                             | \$ 334.315.397,96 | \$ 56.069.392.946,83 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                             |                   |                      |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                            | \$ -              | \$ 320.569.149,43    |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA EXCEDENTES ANI- PAGO DEDUCCION INDICE CUMPLIMEN | \$ -              | \$ 1.523.701,71      |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN        | \$ -              | \$ 25.831.326.912,26 |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO RECONOCIMIENTO DR8          | \$ -              | \$ 28.935.386.403,00 |
|                               |                                                                             | \$ -              | \$ 55.088.806.166,40 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                             |                   |                      |
|                               | SALDO FINAL                                                                 | \$ 980.586.780,43 |                      |
|                               |                                                                             | \$ 980.586.780,43 |                      |

- **Subcuenta Recaudo Peajes UF2**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                             |                     |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                       | 2.FEBRERO.2025      | ACUMULADO            |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                             |                     |                      |
|                               | SALDO INICIAL                                                               | \$ 1.103.700.997,16 |                      |
|                               |                                                                             | \$ 1.103.700.997,16 |                      |
| 1. INGRESOS                   |                                                                             |                     |                      |
|                               | RECONOCIMIENTO DEL DR8                                                      | \$ -                | \$ 49.098.649.121,00 |
|                               | RENDIMIENTOS                                                                | \$ 9.949.948,44     | \$ 5.536.962.073,50  |
|                               | TRASLADO DE LA SUBCUENTA DE RECAUDO DE PEAJES 031-336552-71                 | \$ 557.374.686,93   | \$ 44.367.113.362,37 |
|                               | TRASLADO DESDE LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT AJUSTE PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN | \$ -                | \$ 3,00              |
|                               |                                                                             | \$ 567.324.635,37   | \$ 99.002.724.559,87 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                             |                     |                      |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA EXCEDENTES ANI                                  | \$ -                | \$ 804.474.917,35    |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN        | \$ -                | \$ 18.264.213.004,04 |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO RECONOCIMIENTO DR8          | \$ -                | \$ 51.542.704.993,40 |
|                               | TRASLADO TRANSACCIÓN PERIMETRAL                                             | \$ -                | \$ 26.720.306.012,55 |
|                               |                                                                             | \$ -                | \$ 97.331.698.927,34 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                             |                     |                      |
|                               | SALDO FINAL                                                                 | \$ 1.671.025.632,53 |                      |
|                               |                                                                             | \$ 1.671.025.632,53 |                      |

- **Subcuenta Recaudo Peajes UF3**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                      |                     |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                | 2.FEBRERO.2025      | ACUMULADO             |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                      |                     |                       |
|                               | SALDO INICIAL                                                        | \$ 2.953.845.713,11 |                       |
|                               |                                                                      | \$ 2.953.845.713,11 |                       |
| 1. INGRESOS                   |                                                                      |                     |                       |
|                               | DEVOLUCIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                         | \$ -                | \$ 1.493.305,88       |
|                               | RECONOCIMIENTO DEL DR8                                               | \$ -                | \$ 53.042.949.340,00  |
|                               | RENDIMIENTOS                                                         | \$ 22.120.334,46    | \$ 2.639.540.951,94   |
|                               | TRASLADO DE LA SUBCUENTA DE RECAUDO DE PEAJES 031-336552-71          | \$ 602.150.931,08   | \$ 47.931.309.487,28  |
|                               | TRASLADO POR AJUSTE UF3                                              | \$ -                | \$ 2.012.965,18       |
|                               |                                                                      | \$ 624.271.265,54   | \$ 103.617.306.050,28 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                      |                     |                       |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                    | \$ -                | \$ 1.493.305,88       |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN | \$ -                | \$ 24.062.103.920,30  |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO RECONOCIMIENTO DR8   | \$ -                | \$ 53.042.949.340,00  |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI                                    | \$ -                | \$ 820.201.587,37     |
|                               | TRASLADO TRANSACCIÓN PERIMETRAL                                      | \$ -                | \$ 22.102.322.060,53  |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA EXCEDENTES ANI - INCUMPLIMIENTO PREDIAL  | \$ -                | \$ 10.118.857,55      |
|                               |                                                                      | \$ -                | \$ 100.039.189.071,63 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                      |                     |                       |
|                               | SALDO FINAL                                                          | \$ 3.578.116.978,65 |                       |
|                               |                                                                      | \$ 3.578.116.978,65 |                       |

- **Subcuenta Recaudo Peajes UF4**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                              | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <b>Página 382 de 591</b>                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                             |                       |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                       | 2.FEBRERO.2025        | ACUMULADO             |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                             |                       |                       |
|                               | SALDO INICIAL                                               | \$ 119.069.690.441,97 |                       |
|                               |                                                             | \$ 119.069.690.441,97 |                       |
| 1. INGRESOS                   |                                                             |                       |                       |
|                               | RENDIMIENTOS                                                | \$ 774.235.165,28     | \$ 33.125.419.745,87  |
|                               | TRASLADO DE LA SUBCUENTA DE RECAUDO DE PEAJES 031-336552-71 | \$ 1.103.286.655,36   | \$ 87.821.792.516,74  |
|                               |                                                             | \$ 1.877.521.820,64   | \$ 120.947.212.262,61 |
| 2. EGRESOS                    |                                                             |                       |                       |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                           | \$ -                  | \$ -                  |
|                               |                                                             | \$ -                  | \$ -                  |
| 3. SALDO FINAL                |                                                             |                       |                       |
|                               | SALDO FINAL                                                 | \$ 120.947.212.262,61 |                       |
|                               |                                                             | \$ 120.947.212.262,61 |                       |

- Subcuenta Recaudo Peajes UF5

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                             |                       |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                       | 2.FEBRERO.2025        | ACUMULADO             |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                             |                       |                       |
|                               | SALDO INICIAL                                               | \$ 106.930.772.727,25 |                       |
|                               |                                                             | \$ 106.930.772.727,25 |                       |
| 1. INGRESOS                   |                                                             |                       |                       |
|                               | RENDIMIENTOS                                                | \$ 695.303.432,45     | \$ 29.748.353.038,80  |
|                               | TRASLADO DE LA SUBCUENTA DE RECAUDO DE PEAJES 031-336552-71 | \$ 990.808.730,10     | \$ 78.868.531.851,00  |
|                               |                                                             | \$ 1.686.112.162,55   | \$ 108.616.884.889,80 |
| 2. EGRESOS                    |                                                             |                       |                       |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                           | \$ -                  | \$ -                  |
|                               |                                                             | \$ -                  | \$ -                  |
| 3. SALDO FINAL                |                                                             |                       |                       |
|                               | SALDO FINAL                                                 | \$ 108.616.884.889,80 |                       |
|                               |                                                             | \$ 108.616.884.889,80 |                       |

- Subcuenta Vigencias Futuras 1

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                           |                |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                     | 2.FEBRERO.2025 | ACUMULADO             |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                           |                |                       |
|                               | SALDO INICIAL                                                             | \$ -           |                       |
|                               |                                                                           | \$ -           |                       |
| 1. INGRESOS                   |                                                                           |                |                       |
|                               | RENDIMIENTOS                                                              | \$ -           | \$ 3.176.338.968,12   |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                               | \$ -           | \$ 120.044.247.857,69 |
|                               |                                                                           | \$ -           | \$ 123.220.586.825,81 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                           |                |                       |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA EXCEDENTES ANI                                | \$ -           | \$ 83.503.404,35      |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA OBRAS MENORES RENDIMIENTOS                    | \$ -           | \$ 2.228.711.441,83   |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN      | \$ -           | \$ 104.917.983.514,14 |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 1 DOLARES            | \$ -           | \$ 4.710.097.250,92   |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS     | \$ -           | \$ 1.015.111.838,87   |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS - SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 1 DOLARES | \$ -           | \$ 10.265.179.375,70  |
|                               |                                                                           | \$ -           | \$ 123.220.586.825,81 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                           |                |                       |
|                               | SALDO FINAL                                                               | \$ -           |                       |
|                               |                                                                           | \$ -           |                       |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                       |                |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                 | 2.FEBRERO.2025 | ACUMULADO        |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                       |                |                  |
|                               | SALDO INICIAL                                                         | USD -          |                  |
|                               |                                                                       | USD -          |                  |
| 1. INGRESOS                   |                                                                       |                |                  |
|                               | RENDIMIENTOS                                                          | USD -          | USD 4.357,61     |
|                               | VIGENCIAS FUTURAS                                                     | USD -          | USD 244.390,58   |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                           | USD -          | USD 3.908.532,64 |
|                               | INGRESOS EN DINERO                                                    | USD -          | USD 1.175.907,44 |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS UF 1                | USD -          | USD 2.353.702,97 |
|                               |                                                                       | USD -          | USD 7.686.891,24 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                       |                |                  |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA POB DOLLAR DS PAY TRANSACTION                      | USD -          | USD 4.152.682,64 |
|                               | MONETIZACIÓN VENTA DE DIVISAS                                         | USD -          | USD 197,00       |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN  | USD -          | USD 1.175.907,44 |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                      | USD -          | USD 2.353.934,45 |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS | USD -          | USD 4.169,71     |
|                               |                                                                       | USD -          | USD 7.686.891,24 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                       |                |                  |
|                               | SALDO FINAL                                                           | USD -          |                  |
|                               |                                                                       | USD -          |                  |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>Agencia Nacional de Infraestructura</b> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 383 de 591</b>                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- **Subcuenta Vigencias Futuras 2**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                           |                |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                     | 2.FEBRERO.2025 | ACUMULADO          |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                           |                |                    |
|                               | SALDO INICIAL                                                             | \$ -           |                    |
|                               |                                                                           | \$ -           |                    |
| 1. INGRESOS                   |                                                                           |                |                    |
|                               | RENDIMIENTOS                                                              | \$ -           | 10.074.457.281,43  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                               | \$ -           | 203.661.441.669,92 |
|                               |                                                                           | \$ -           | 213.735.898.951,35 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                           |                |                    |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN      | \$ -           | 174.065.865.572,34 |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS     | \$ -           | 10.190.704.940,17  |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI                                         | \$ -           | 4.068.717.295,62   |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS - SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 2 DOLARES | \$ -           | 25.410.611.143,22  |
|                               |                                                                           | \$ -           | 213.735.898.951,35 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                           |                |                    |
|                               | SALDO FINAL                                                               | \$ -           |                    |
|                               |                                                                           | \$ -           |                    |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                               |                |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                         | 2.FEBRERO.2025 | ACUMULADO         |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                               |                |                   |
|                               | SALDO INICIAL                                                                 | USD -          |                   |
|                               |                                                                               | USD -          |                   |
| 1. INGRESOS                   |                                                                               |                |                   |
|                               | RENDIMIENTOS                                                                  | USD -          | USD 16.927,38     |
|                               | VIGENCIAS FUTURAS                                                             | USD -          | USD 414.691,22    |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                                   | USD -          | USD 6.632.235,80  |
|                               | INGRESOS EN DINERO                                                            | USD -          | USD 1.995.323,85  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS UF 2                        | USD -          | USD 3.993.851,50  |
|                               |                                                                               | USD -          | USD 13.053.029,75 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                               |                |                   |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA POB DOLLAR DS PAY TRANSACTION                              | USD -          | USD 7.046.884,43  |
|                               | MONETIZACIÓN VENTA DE DIVISAS                                                 | USD -          | USD 231,50        |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN          | USD -          | USD 3.993.851,49  |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                              | USD -          | USD 1.995.716,66  |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS         | USD -          | USD 9.611,64      |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS UF2 RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS | USD -          | USD 6.734,03      |
|                               |                                                                               | USD -          | USD 13.053.029,75 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                               |                |                   |
|                               | SALDO FINAL                                                                   | USD -          |                   |
|                               |                                                                               | USD -          |                   |

- **Subcuenta Vigencias Futuras 3**

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                           |                |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                     | 2.FEBRERO.2025 | ACUMULADO          |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                           |                |                    |
|                               | SALDO INICIAL                                                             | \$ -           |                    |
|                               |                                                                           | \$ -           |                    |
| 1. INGRESOS                   |                                                                           |                |                    |
|                               | RENDIMIENTOS                                                              | \$ -           | 10.562.016.864,60  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                               | \$ -           | 220.046.663.788,36 |
|                               |                                                                           | \$ -           | 230.608.680.652,96 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                           |                |                    |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA TP INGRESOS TT PAGO ACTAS DE RETRIBUCIÓN      | \$ -           | 188.426.317.153,60 |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 3 DOLARES            | \$ -           | 8.634.322.211,19   |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS     | \$ -           | 10.685.725.838,93  |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA EXCEDENTES ANI                                         | \$ -           | 4.044.685.695,90   |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS - SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 3 DOLARES | \$ -           | 18.817.629.753,34  |
|                               |                                                                           | \$ -           | 230.608.680.652,96 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                           |                |                    |
|                               | SALDO FINAL                                                               | \$ -           |                    |
|                               |                                                                           | \$ -           |                    |



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/>01 al 31 de Marzo de 2025</p>                                                                               | <p align="center"><b>CONSORCIO INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 384 de 591</b></p>         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b></p> |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                  |                |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                            | 2.FEBRERO.2025 | ACUMULADO         |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                  |                |                   |
|                               | SALDO INICIAL                                                    | USD -          |                   |
|                               |                                                                  | USD -          |                   |
| 1. INGRESOS                   |                                                                  |                |                   |
|                               | RENDIMIENTOS                                                     | USD -          | USD 15.822,50     |
|                               | VIGENCIAS FUTURAS                                                | USD -          | USD 448.005,02    |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                      | USD -          | USD 7.164.995,78  |
|                               | INGRESOS EN DINERO                                               | USD -          | USD 2.155.616,58  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS UF 3           | USD -          | USD 4.314.694,31  |
|                               |                                                                  | USD -          | USD 14.099.134,19 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                  |                |                   |
|                               | TRASLADO SUBCUENTA POB DOLLAR DS PAY TRANSACTION                 | USD -          | USD 6.617.025,35  |
|                               | MONETIZACIÓN VENTA DE DIVISAS                                    | USD -          | USD 147,00        |
|                               | PAGOS A TERCEROS                                                 | USD -          | USD 3.154.339,58  |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE REND    | USD -          | USD 12.927,95     |
|                               | TRASLADO HACIA LA SUBCUENTA POB DOLLAR DSR - USD PAGO ACTAS DE R | USD -          | USD 4.314.694,31  |
|                               |                                                                  | USD -          | USD 14.099.134,19 |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                  |                |                   |
|                               | SALDO FINAL                                                      | USD -          |                   |
|                               |                                                                  | USD -          |                   |

- Subcuenta Vigencias Futuras 4

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                           |                       |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                     | 2.FEBRERO.2025        | ACUMULADO             |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                           |                       |                       |
|                               | SALDO INICIAL                                                             | \$ 261.752.774.609,54 |                       |
|                               |                                                                           | \$ 261.752.774.609,54 |                       |
| 1. INGRESOS                   |                                                                           |                       |                       |
|                               | CONSIGNACIÓN CORRESPONSAL CB                                              | \$ -                  | \$ 270.000,00         |
|                               | PENDIENTE POR IDENTIFICAR                                                 | \$ -                  | \$ 270.000,00         |
|                               | RENDIMIENTOS                                                              | \$ 1.689.720.096,11   | \$ 64.746.433.046,76  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                               | \$ -                  | \$ 246.720.290.820,79 |
|                               |                                                                           | \$ 1.689.720.096,11   | \$ 311.467.263.867,55 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                           |                       |                       |
|                               | AJUSTE REVERSION BANCARIA                                                 | \$ -                  | \$ 270.000,00         |
|                               | EGRESO CONSIGNACIÓN ERRADA                                                | \$ -                  | \$ 270.000,00         |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS - SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 4 DOLARES | \$ -                  | \$ 48.024.229.161,90  |
|                               |                                                                           | \$ -                  | \$ 48.024.269.161,90  |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                           |                       |                       |
|                               | SALDO FINAL                                                               | \$ 263.442.494.705,65 |                       |
|                               |                                                                           | \$ 263.442.494.705,65 |                       |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                               |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                         | 2.FEBRERO.2025    | ACUMULADO         |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                               |                   |                   |
|                               | SALDO INICIAL                                                 | USD 26.127.770,36 |                   |
|                               |                                                               | USD 26.127.770,36 |                   |
| 1. INGRESOS                   |                                                               |                   |                   |
|                               | RENDIMIENTOS                                                  | USD 8.017,29      | USD 336.700,74    |
|                               | VIGENCIAS FUTURAS                                             | USD -             | USD 820.854,05    |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                   | USD -             | USD 13.127.895,87 |
|                               | INGRESOS EN DINERO                                            | USD -             | USD 3.949.612,77  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS UF 4        | USD -             | USD 7.901.532,27  |
|                               |                                                               | USD 8.017,29      | USD 26.136.595,70 |
| 2. EGRESOS                    |                                                               |                   |                   |
|                               | TRASLADO HACIA SUBCUENTA OBRAS MENORES RECONOCIMIENTO DE REND | USD -             | USD 808,05        |
|                               |                                                               | USD -             | USD 808,05        |
| 3. SALDO FINAL                |                                                               |                   |                   |
|                               | SALDO FINAL                                                   | USD 26.135.787,65 |                   |
|                               |                                                               | USD 26.135.787,65 |                   |

- Subcuenta Vigencias Futuras 5

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/>01 al 31 de Marzo de 2025</p>                                                                               | <p align="center"><b>CONSORCIO INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 385 de 591</b></p>         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b></p> |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                                           |                       |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                                     | 2.FEBRERO.2025        | ACUMULADO             |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                                           |                       |                       |
|                               | SALDO INICIAL                                                             | \$ 236.245.381.041,99 |                       |
|                               |                                                                           | \$ 236.245.381.041,99 |                       |
| 1. INGRESOS                   |                                                                           |                       |                       |
|                               | RENDIMIENTOS                                                              | \$ 1.525.059.547,32   | \$ 57.304.278.109,51  |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI                               | \$ -                  | \$ 233.907.061.432,73 |
|                               |                                                                           | \$ 1.525.059.547,32   | \$ 291.211.339.542,24 |
| 2. EGRESOS                    |                                                                           |                       |                       |
|                               | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                         | \$ -                  | \$ 41.698.807,80      |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS - SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS POB UF 5 DOLARES | \$ -                  | \$ 53.399.200.145,13  |
|                               |                                                                           | \$ -                  | \$ 53.440.898.952,93  |
| 3. SALDO FINAL                |                                                                           |                       |                       |
|                               | SALDO FINAL                                                               | \$ 237.770.440.589,31 |                       |
|                               |                                                                           | \$ 237.770.440.589,31 |                       |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS |                                                        |                   |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CATEGORIA                     | RUBRO                                                  | 2.FEBRERO.2025    | ACUMULADO         |
| 0. SALDO INICIAL              |                                                        |                   |                   |
|                               | SALDO INICIAL                                          | USD 23.429.412,23 |                   |
|                               |                                                        | USD 23.429.412,23 |                   |
| 1. INGRESOS                   |                                                        |                   |                   |
|                               | RENDIMIENTOS                                           | USD 7.189,30      | USD 269.578,97    |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA APORTES ANI            | USD -             | USD 14.927.101,34 |
|                               | INGRESOS EN DINERO                                     | USD -             | USD 409.388,56    |
|                               | TRASLADO DE VIGENCIAS SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS UF 5 | USD -             | USD 9.758.473,53  |
|                               |                                                        | USD 7.189,30      | USD 25.364.542,40 |
| 2. EGRESOS                    |                                                        |                   |                   |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 1                        | USD -             | USD 244.958,05    |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 2                        | USD -             | USD 414.724,02    |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 3                        | USD -             | USD 447.972,22    |
|                               | TRASLADO VIGENCIAS FUTURAS UF 4                        | USD -             | USD 820.286,58    |
|                               |                                                        | USD -             | USD 1.927.940,87  |
| 3. SALDO FINAL                |                                                        |                   |                   |
|                               | SALDO FINAL                                            | USD 23.436.601,53 |                   |
|                               |                                                        | USD 23.436.601,53 |                   |

## 12.8 ENDEUDAMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS

El Concesionario ha recurrido al apalancamiento financiero, con endeudamiento de capital, de entidades financieras, con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales:

| Entidad           | MONTO CREDITO                | Saldo Anterior               | Movimiento Febrero 2025 | Acumulado Desembolsos        | SALDO CREDITO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Bancolombia       | \$ 429,900,000,000.00        | \$ 114,000,000,000.00        | \$ -                    | \$ 156,000,000,000.00        | \$ 273,900,000,000.00                   |
| ITAU              | \$ 177,500,000,000.00        | \$ 47,154,000,000.00         | \$ -                    | \$ 64,154,000,000.00         | \$ 113,346,000,000.00                   |
| Fondo CAF Ashmore | \$ 150,000,000,000.00        | \$ 39,846,000,000.00         | \$ -                    | \$ 54,846,000,000.00         | \$ 95,154,000,000.00                    |
| FDN               | \$ 112,600,000,000.00        | \$ 30,000,000,000.00         | \$ -                    | \$ 41,000,000,000.00         | \$ 71,600,000,000.00                    |
| <b>Total</b>      | <b>\$ 870,000,000,000.00</b> | <b>\$ 231,000,000,000.00</b> | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 316,000,000,000.00</b> | <b>\$ 554,000,000,000.00</b>            |
| BID               | USD 156,000,000.00           | USD 56,667,000.00            | USD 0.00                | \$ 56,667,000.00             | USD 99,333,000.00                       |
| <b>TOTAL</b>      |                              | <b>USD 56,667,000.00</b>     | <b>USD -</b>            | <b>USD 56,667,000.00</b>     | <b>USD 99,333,000.00</b>                |

Se ha desembolsado al Concesionario un total de \$316.000.000.000 del cual se encuentra un saldo vigente por \$231.000.000.000. Adicionalmente, el BID desembolsó un total de USD56.667.000.00 los cuales se encuentran pendientes de pago.

A la fecha de cierre de este informe, el Concesionario ha manifestado que no se realizaran más desembolsos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 386 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

## 12.9 CIERRE FINANCIERO

El 26 de octubre de 2015 la ANI emitió concepto de conformidad que acreditó el cierre financiero, en los términos establecidos en el literal (e) de la Sección 3.8 Parte General del Contrato de Concesión 002 de 2014. No obstante, el Concesionario realizó un segundo cierre financiero en mayo de 2016 el cual se presupuestó de la siguiente forma:

| Plan Financiero                         | COP MM           | USD MM @ 3,000 COP/USD |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------|
| Contrato de Crédito en Dólares          | 468.000          | 156,0                  |
| Contrato de Crédito en Pesos            | 870.000          | 290,0                  |
| <b>Total Financiación a Largo Plazo</b> | <b>1.338.000</b> | <b>446,0</b>           |
| Equity Estimado                         | 334.500          | 111,5                  |

El 16 de septiembre de 2016 el Concesionario recibió el primer desembolso por valor de USD19.667.000, 00 equivalente a COP109.000.000.000,00.

El 16 de diciembre de 2016 el Concesionario recibió el segundo desembolso por valor de USD\$22.000.000,00 equivalente a COP122.000.000.000,00

El 25 de mayo de 2017 se realizó el tercer desembolso por valor de USD15.000.000,00 equivalente a COP85.000.000.000,00.

## 12.10 ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se presentan los estados financieros con corte a febrero de 2025:

- **Estado de Situación Financiera**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 387 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
 PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y AL 31 DE ENERO DE 2025

|                                                      | ACUMULADO<br>FEBRERO DE 2025 | ACUMULADO<br>ENERO DE 2025  | VARIACION MENSUAL<br>ABSOLUTA | RELATIVA %     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                        |                              |                             |                               |                |
| <b>EFFECTIVO</b>                                     | <b>1.192.889.249.717,09</b>  | <b>1.085.230.369.929,44</b> | <b>107.658.879.787,65</b>     | <b>9,92%</b>   |
| BANCOS NACIONALES                                    | 987.953.866.765,32           | 877.885.432.336,50          | 110.068.434.428,82            | 12,54%         |
| BANCOS DEL EXTERIOR                                  | 204.935.382.951,77           | 207.344.937.592,94          | (2.409.554.641,17)            | -1,16%         |
| <b>INVERSIONES</b>                                   | <b>3.037.168,53</b>          | <b>3.018.875,57</b>         | <b>18.292,96</b>              | <b>0,61%</b>   |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1.110.852.567.229,06</b>  | <b>1.112.587.950.395,82</b> | <b>(1.735.383.166,76)</b>     | <b>-0,16%</b>  |
| IMPUESTOS                                            | -                            | 433.663,00                  | (433.663,00)                  | -100,00%       |
| ACUERDOS DE CONCESION DE SERVICIOS                   | 973.600.096.040,45           | 974.475.617.835,23          | (875.521.794,78)              | -0,09%         |
| DIVERSAS (CXC RECAUDO,FOSEVI,SOBRANTE)               | 137.252.471.188,61           | 138.111.898.897,59          | (859.427.708,98)              | -0,62%         |
| CUENTA POR COBRAR PROVEEDORES                        | 12.239.965,99                | 12.662.469,99               | (422.504,00)                  | -3,34%         |
| CXC PAJE-FOSEVI-SOBRANTES                            | 344.880.250,00               | 210.827.500,00              | 134.052.750,00                | 63,58%         |
| GASTOS REEMBOLSABLES                                 | 2.734.371,20                 | 2.496.266,80                | 238.104,40                    | 9,54%          |
| SEGUROS POR COBRAR                                   | 9.268.000,00                 | 9.268.000,00                | -                             | 0,00%          |
| OTRAS (CXC FIDEICOMITENTE)                           | 54.352.231.241,51            | 54.345.527.300,89           | 6.703.940,62                  | 0,01%          |
| TRASL. PA TRANSACCIÓN                                | 82.531.117.359,91            | 83.531.117.359,91           | (1.000.000.000,00)            | -1,20%         |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | <b>830.124.720,00</b>        | <b>970.573.167,00</b>       | <b>(140.448.447,00)</b>       | <b>-14,47%</b> |
| ANTICIPOS A CONTRATOS                                | 830.124.720,00               | 970.573.167,00              | (140.448.447,00)              | -14,47%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>2.304.574.978.834,68</b>  | <b>2.198.791.912.367,83</b> | <b>105.783.066.466,85</b>     | <b>4,81%</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                        |                              |                             |                               |                |
| <b>CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FCRAS</b> | <b>409.928.960.385,28</b>    | <b>408.951.004.214,83</b>   | <b>977.956.170,45</b>         | <b>0,24%</b>   |
| CRÉDITOS BANCOS NACIONALES                           | 205.151.269.461,08           | 202.582.736.811,68          | 2.568.532.649,40              | 1,27%          |
| CRÉDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES               | 204.777.690.924,20           | 206.368.267.403,15          | (1.590.576.478,95)            | -0,77%         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                             | <b>27.114.046.747,08</b>     | <b>29.357.232.859,42</b>    | <b>(2.243.186.112,34)</b>     | <b>-7,64%</b>  |
| IMPUESTOS APLICADOS                                  | 2.573.765.932,58             | 4.313.461.002,90            | (1.739.695.070,32)            | -40,33%        |
| IMPUESTOS APLICADOS                                  | 104.796.793,12               | 99.614.063,00               | 5.182.730,12                  | 5,20%          |
| PROVEEDORES                                          | 4.108.362.758,43             | 7.057.339.758,57            | (2.948.977.000,14)            | -41,79%        |
| OTRAS (PROVISION DE COSTOS, DESCUENTO EPC)           | 20.327.121.262,95            | 17.886.818.034,95           | 2.440.303.228,00              | 13,64%         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>1.087.145.889.393,09</b>  | <b>971.017.163.791,70</b>   | <b>116.128.725.601,39</b>     | <b>11,96%</b>  |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                    | 2.800.000.000,00             | 2.800.000.000,00            | -                             | 0,00%          |
| RETENCIONES A TERCEROS - RETEGARANTÍAS               | 861.735.302,46               | 770.478.322,46              | 91.256.980,00                 | 11,84%         |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                     | 248.055.833.804,97           | 241.639.270.731,58          | 6.416.563.073,39              | 2,66%          |
| RECURSOS ANI (VIGENCIAS FUTURAS)                     | 1.275.343.084.132,00         | 1.169.104.339.826,00        | 106.238.744.306,00            | 9,09%          |
| RECAUDO DE PEAJES                                    | 278.093.311.600,00           | 274.717.092.058,00          | 3.376.219.542,00              | 1,23%          |
| SOBRANTES                                            | 73.054.950,00                | 72.246.100,00               | 808.850,00                    | 1,12%          |
| COMPENSACION POR RIESGO                              | 8.806.518.602,00             | 8.806.518.602,00            | -                             | 0,00%          |
| RETRIBUCIÓN                                          | (859.258.724.062,89)         | (859.258.724.062,89)        | -                             | 0,00%          |
| EXCEDENTES ANI - DEDUCCIONES                         | 1.035.403.449,94             | 1.035.403.449,94            | -                             | 0,00%          |
| PASIVOS ANI DR                                       | 131.076.984.864,00           | 131.076.984.864,00          | -                             | 0,00%          |
| EXPLOTACIÓN COMERCIAL                                | 258.686.750,61               | 253.553.900,61              | 5.132.850,00                  | 2,02%          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>1.524.188.896.525,45</b>  | <b>1.409.325.400.865,95</b> | <b>114.863.495.659,50</b>     | <b>8,15%</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                    |                              |                             |                               |                |
| APORTES EN DINERO                                    | 309.077.505.543,15           | 309.077.505.543,15          | -                             | 0,00%          |
| APORTES EN ESPECIE                                   | 3.808.606.208,53             | 3.808.606.208,53            | -                             | 0,00%          |
| GANANCIAS ACUMULADAS                                 | 479.830.274.851,36           | 479.830.274.851,36          | -                             | 0,00%          |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                | (12.330.304.293,81)          | (3.249.875.101,16)          | (9.080.429.192,65)            | 279,41%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                              | <b>780.386.082.309,23</b>    | <b>789.466.511.501,88</b>   | <b>(9.080.429.192,65)</b>     | <b>-1,15%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     | <b>2.304.574.978.834,68</b>  | <b>2.198.791.912.367,83</b> | <b>105.783.066.466,85</b>     | <b>4,81%</b>   |

Se observa dentro del activo un aumento de 4,81% en comparación con el mes anterior, generado por el aumento del efectivo (9,92%). En cuanto al pasivo se presentó un mayor valor en 8,15% ocasionado principalmente por el aumento de los otros pasivos (11,96%). El patrimonio se redujo en \$9.080 millones debido a la pérdida del ejercicio.

- Estado de Resultados

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                        | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/><b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 388 de 591</b></p>                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b></p>            |



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.  
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

|                                      | ACUMULADO<br>FEBRERO DE 2025 | ACUMULADO<br>ENERO DE 2025 | VARIACION MENSUAL<br>ABSOLUTA | RELATIVA %     |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>       |                              |                            |                               |                |
| PARTICIPACIONES EN CONCESIONES       | -                            | 875.521.794,78             | (875.521.794,78)              | -100,00%       |
| FINANCIEROS - RENDIMIENTOS           | 882.058.105,96               | 483.115.899,46             | 398.942.206,50                | 82,58%         |
| POR VALORACIÓN DE INVERSIONES        | 39.343,61                    | 21.050,65                  | 18.292,96                     | 86,90%         |
| DIFERENCIA EN CAMBIO                 | 13.685.608.101,57            | 11.195.145.656,98          | 2.490.462.444,59              | 22,25%         |
| REEXPRESIÓN DE OTROS PASIVOS         | 13.679.440.547,84            | 11.188.978.103,25          | 2.490.462.444,59              | 22,26%         |
| POR LIQUIDACIÓN DE OTROS PASIVOS     | 6.167.553,73                 | 6.167.553,73               | -                             | 0,00%          |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES         | 347,50                       | -                          | 347,50                        | 100,00%        |
| AJUSTES A MILES                      | 347,50                       | -                          | 347,50                        | 100,00%        |
| <b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES</b> | <b>14.567.705.898,64</b>     | <b>12.553.804.401,87</b>   | <b>2.013.901.496,77</b>       | <b>16,04%</b>  |
| <b>GASTOS</b>                        |                              |                            |                               |                |
| GASTOS DE OPERACIONES                | 20.868.340.084,42            | 14.928.157.708,25          | 5.940.182.376,17              | 39,79%         |
| INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS         | 7.198.247.340,63             | 3.759.515.569,07           | 3.438.731.771,56              | 91,47%         |
| CRÉDITOS BANCOS                      | 5.360.223.750,89             | 2.791.691.101,49           | 2.568.532.649,40              | 92,01%         |
| BANCOS DEL EXTERIOR                  | 1.838.023.589,74             | 967.824.467,58             | 870.199.122,16                | 89,91%         |
| POR LIQUIDACIÓN DE PASIVOS           | 13.629.515.678,49            | 11.157.305.906,54          | 2.472.209.771,95              | 22,16%         |
| POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIV       | 13.629.515.678,49            | 11.157.305.906,54          | 2.472.209.771,95              | 22,16%         |
| IMPUESTOS Y TASAS                    | 40.576.294,38                | 11.335.462,31              | 29.240.832,07                 | 257,96%        |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 770,92                       | 770,33                     | 0,59                          | 0,08%          |
| COSTOS DE CONSTRUCCIÓN               | 6.029.670.108,03             | 875.521.794,78             | 5.154.148.313,25              | 588,69%        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                  | <b>26.898.010.192,45</b>     | <b>15.803.679.503,03</b>   | <b>11.094.330.689,42</b>      | <b>70,20%</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>      | <b>(12.330.304.293,81)</b>   | <b>(3.249.875.101,16)</b>  | <b>(9.080.429.192,65)</b>     | <b>279,41%</b> |

Para el mes de febrero de 2025 los ingresos operacionales alcanzaron un total de \$14.568 millones de pesos siendo 16,04% superiores a enero. El total de costos y gastos alcanzó los \$26.898 millones aumentando en 70,20% frente al mes anterior, principalmente por los mayores costos de construcción y los gastos bancarios. Con esto, la pérdida fue equivalente a \$12.330 millones.

## 12.11 INDICADORES FINANCIEROS

|                                                     | ene-25                               | feb-25                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1 RAZON CORRIENTE</b><br>(Actualización mensual) |                                      |                                      |
|                                                     | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |
| RAZON CORRIENTE                                     | 1.224.313.275.657<br>725.657.304.593 | 1.330.971.845.626<br>836.166.624.540 |
| <b>RAZON CORRIENTE</b>                              | <b>1,69</b>                          | <b>1,59</b>                          |

EL INDICADOR DE LIQUIDEZ PRESENTÓ UNA REDUCCIÓN DEL 5,66%, DEBIDO TANTO AL MAYOR VALOR DEL DEL PASIVO CORRIENTE POR EL INCREMENTO DE LOS OTROS PASIVOS; SIN EMBARGO, CON ESTE RESULTADO SE EVIDENCIA LA LIQUIDEZ CON LA QUE CUENTA PROYECTO PARA ATENDER LOS GASTOS Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CORTO PLAZO.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 389 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

|                                                             | ene-25                                     | feb-25                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2 CAPITAL NETO DE TRABAJO</b><br>(Actualización mensual) | <b>ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE</b> |                         |
| CAPITAL NETO DE TRABAJO                                     | 1.224.313.275.657                          | 1.330.971.845.626       |
|                                                             | <u>-725.657.304.593</u>                    | <u>-836.166.624.540</u> |
|                                                             | <b>498.655.971.064</b>                     | <b>494.805.221.086</b>  |
| <b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>                              | <b>498.655.971.064</b>                     | <b>494.805.221.086</b>  |

BAJO EL ARGUMENTO MENCIONADO ANTERIORMENTE SE EVIDENCIA LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS INMEDIATOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO.

|                                 |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>      | <b>TOTAL ACTIVO</b>      |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO          | <u>1.409.325.400.866</u> | <u>1.524.188.896.525</u> |
|                                 | 2.198.791.912.368        | 2.304.574.978.835        |
| <b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO</b>   | <b>64,1%</b>             | <b>66,1%</b>             |

EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AUMENTÓ EN 3,19% DEBIDO AL MAYOR VALOR DEL PASIVO POR EL INCREMENTO DE LOS OTROS PASIVOS POR EL INCREMENTO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS FUTURAS. EL INDICADOR REFLEJA QUE POR CADA 0,66 PESOS DE DEUDA TOTAL QUE SE TIENE, EXISTE EN EL ACTIVO UN PESO PARA CUBRIRLA. EL NIVEL NO DA EVIDENCIA DE RIESGO PARA EL PROYECTO.

|                                                     |                                          |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>4 NIVEL ENDEUDAMIENTO SECTOR FINANC. Y PROV.</b> | <b>PASIVOS SEC. FINAN. + PROVEEDORES</b> | <b>TOTAL ACTIVO</b>    |
| NIVEL ENDEUDAMIENTO SECTOR FINANC. Y PROV.          | <u>416.008.343.973</u>                   | <u>414.037.323.144</u> |
|                                                     | 2.198.791.912.368                        | 2.304.574.978.835      |
| <b>NIVEL ENDEUDAMIENTO SECTOR FINANC. Y PROV.</b>   | <b>18,9%</b>                             | <b>18,0%</b>           |

EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SE REDUJO EN 5,04% GRACIAS A LA DISMINUCIÓN DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS Y AL AUMENTO DEL ACTIVO; ESTE INDICADOR EVALÚA ÚNICAMENTE LA DEUDA FINANCIERA Y CON PROVEEDORES. EN LA ACTUALIDAD EL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO REPRESENTA EL 18,0% DEL ACTIVO TOTAL.

## 12.12 COMITÉ FIDUCIARIO

El Comité fiduciario correspondiente a la rendición de cuentas del Patrimonio Autónomo del mes de enero de 2025, se desarrolló el 25 de marzo de 2025 de forma virtual, con presencia de los representantes del Concesionario, la ANI y la Interventoría, en el cual se verificó el quórum requerido para realizarse, según el reglamento del comité y luego se definió que el mismo fuera presidido por el señor Néstor Vásquez – Representante del Concesionario y para la Secretaría se designó a la señora Maribel Castillo Carvajal - Representante de la Fiduciaria Bancolombia.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 390 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Dentro de la presentación efectuada por Bancolombia se expuso, el estado actual de cada una de las subcuentas de manejo de recursos del Concesionario y de la ANI, el ingreso del mes a la cuenta de recaudo y los estados financieros de prueba bajo IFRS. Información que de acuerdo con su importancia y relevancia a criterio de la Interventoría se incluye y/o analiza en el presente informe.

A continuación se presentan las proposiciones y varios:

#### 4. Proposiciones y Varios

- Ingresos de recursos por concepto de Vigencia Futuras del año 2024 cuenta Aportes ANI:
  - Por parte de la concesión, Tomer Ginesin pregunta a la ANI acerca de la instrucción para la distribución de las vigencias futuras que ingresaron durante el mes de febrero, lo anterior teniendo en cuenta que no es una obligación de pagar, pero sí de distribuir el ingreso a las distintas unidades funcionales, teniendo en cuenta la obligación de compra de dólares que tiene la concesión.
  - El representante de la ANI responde que el tema está en revisión de parte de la Vicepresidencia de la Agencia, ya que la agencia cumplió con el requisito contractual del fondeo. En cuanto al tema de la distribución menciona que no se puede pronunciar al respecto ya que el tema está en otras instancias, teniendo en cuenta el laudo publicado el 18 de diciembre y como el fondeo se realizó durante el mes de febrero 2025 la agencia está en la revisión de ese punto intermedio en el que, teniendo en cuenta lo indicado en el laudo pues no tendría por qué haberse
  - esos recursos; sin embargo, menciona que al interior de la ANI desde las distintas vicepresidencias de la agencia se están realizando reuniones para validar todo lo relacionado con las indicaciones del laudo, y validando la posible continuidad al contrato teniendo en cuenta que las UF4 y UF5.
  - Por parte de la concesión, Tomer Ginesin responde que en este momento el proyecto debería estar en etapa de reversión desde el 20 de diciembre de 2024, y que no hay hasta el momento un acuerdo distinto entre las partes, y ya que las vigencias futuras fueron acordadas y fondeadas se tiene la obligación de distribución de estas ya que no hay ninguna cláusula que exima a la ANI de hacer esta distribución cuando llega el pago. Así mismo, menciona que no saben a que unidad funcional corresponden las vigencias pagadas lo cual puede tener un efecto de intereses de mora.
  - Por parte de la concesión, Alvaro Oeding complementa diciendo que la posición formal y oficial del concesionario ha quedado documentada en comunicaciones que han enviado a la ANI en las que le ha expresado y aclarado que no ha existido como tal una negociación, y solicita que se parta de la premisa de que se paguen las vigencias futuras del 2024. Por otra parte, menciona que la obligación de la ANI, que en este momento a la fecha no ha cumplido, no solo es la de distribución sino también la del pago efectivo por tratarse de vigencias correspondientes al año 2024 y menciona que esto difiere a lo que mencionó el representante de la ANI. También menciona que para efectos de este comité lo que está pidiendo la concesión es que la ANI atienda la obligación de distribuir las vigencias futuras en las distintas cuentas de aportes ANI por unidad funcional, siendo este un paso para que se entienda por cumplida la obligación de pago de aportes por parte de la ANI.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                               | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | <b>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</b> | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>Página 391 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- Por parte de la concesión, Tomer Ginesin comenta que la ANI está en la posición que la reversión está efectuada desde el 10 de marzo como que les han informado desde los abogados de la ANI y solicita se le informe si esta posición ha cambiado.
- El representante de la ANI responde que no está de acuerdo con la posición del concesionario respecto a lo que menciona que la ANI no cumplió con su obligación, toda vez que la ANI ya fondeó la cuenta de aportes ANI, y termina su intervención dándole la palabra a la interventoría.
- Por parte de la concesión, Tomer Ginesin responde que entiende que no se ha fondeado al 100% el valor correspondiente a las vigencias futuras 2024, por lo cual es muy importante el tema de la distribución para saber la porción de dinero que le corresponde a cada UF ya que tiene unos intereses de mora en no hacer la distribución.
- Por parte de la interventoría, César Alba menciona que el pagar y la distribución es una obligación potestativa de la ANI, ellos como interventoría no influyen en la decisión de lo que la agencia decida y lo que les han comunicado es que están revisando al interior a nivel jurídico y financiero el realizar el paso a paso lo que el contrato estipula, y que el valor estaba reservado por vigencias futuras para este contrato por eso se giraron los recursos hacia el patrimonio autónomo; menciona que al igual que se manejó en años anteriores donde la agencia no tenía los recursos completos, se intentó cubrir lo de las 3 primeras unidades funcionales y que solo se sabrá o se confirmará en el momento en que la Agencia instruya, y que los intereses de mora que se puedan generar y tengan derecho, se generarán solamente hasta el momento en que se haga efectivo el desembolso del patrimonio autónomo hacia la concesión como remuneración de esas vigencias; menciona que en este momento no influiría el hecho de que se haga la distribución en el punto de los intereses de mora que la concesión pueda reclamar a futuro, sino hasta el momento en que hagan esos desembolsos; por lo cual la ANI realizó el giro de un valor hacia la cuenta de vigencias y así fue como la fiduciaria lo contabilizó y lo reporto en distintas certificaciones, pero más allá de determinar si tienen o no una obligación ya se podría decir que se hizo el giro, pero falta la distribución, por lo que menciona que la duda que se tiene es por la terminación anticipada de acuerdo a lo mencionado en el laudo y en las obligaciones en que incurriría la ANI con la concesión, una vez se tenga esa definición al interior de la ANI, la interventoría revisará si debe o no pronunciarse.
- Por parte de la concesión, Tomer Ginesin, menciona que eso tiene un efecto claro por temas de intereses al concesionario ya que estos intereses no son del concesionario y van a cada una de las subcuentas del patrimonio y esto afecta a la concesión al no recibirlos, teniendo en cuenta que no se habla de la obligación de pagar sino de realizar la distribución y pregunta si la ANI puede comprometer una fecha para recibir la respuesta al respecto a lo cual la ANI no da respuesta.
- Solicitud devolución por doble fondeo:
  - Por parte de la concesión, Nestor Vasquez, pregunta al representante de la ANI por el estado de la solicitud que hicieron acerca de la devolución de un doble de fondo hecho en la cuenta de interventoría y supervisión.
  - El representante de la ANI responde que la comunicación está radicada, está en trámite y en cuanto a tiempo de respuesta no se tiene ya que lo está revisando el área jurídica.
- Solicitudes de información interventoría:
  - Por parte de la interventoría, Cesar Alba informa a la fiduciaria que ellos están actuando de acuerdo con lo que requiere la reversión del contrato, que no hay una posición diferente en este momento y que haciendo caso lo que el laudo determinó, ya se han radicado comunicaciones hacia la fiduciaria y hacia el concesionario, solicitando información que el área técnica, financiera y jurídica necesitan, por lo cual solicita que sean atendidas.
  - La fiduciaria informa que a la fecha de este comité solo ha llegado una solicitud de información por parte de la interventoría, a lo cual responde Cesar Alba que debe estar por llegar una segunda solicitud hacia la fiduciaria y que la que se radicó a la concesión corresponde al listado de activos reversibles.
- El comité fiduciario No. 121 será el martes 29 de abril de 2025 a las 09:00AM.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 392 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### 12.13 TRÁFICO Y RECAUDO

A continuación, se presenta el tráfico del mes de marzo de 2025 en las estaciones de peaje:

| TRÁFICO MARZO 2025 |               |                         |              |                |                         |              |               |                       |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| La Cabaña          |               |                         | Los Patios   |                |                         | Sopó         |               |                       |
| Categoría          | Tráfico       | Recaudo                 | Categoría    | Tráfico        | Recaudo                 | Categoría    | Tráfico       | Recaudo               |
| I                  | 62.717        | \$ 871.766.300          | I            | 83.982         | \$ 1.167.349.800        | I            | 41.032        | \$ 570.344.800        |
| II                 | 4.187         | \$ 90.857.900           | II           | 5.925          | \$ 128.572.500          | II           | 2.969         | \$ 64.427.300         |
| III                | 876           | \$ 29.346.000           | III          | 1.245          | \$ 41.707.500           | III          | 1.074         | \$ 38.986.200         |
| IV                 | 661           | \$ 32.389.000           | IV           | 1.470          | \$ 72.030.000           | IV           | 2.225         | \$ 119.260.000        |
| V                  | 509           | \$ 34.153.900           | V            | -              | \$ -                    | V            | 396           | \$ 28.908.000         |
| VI                 | 1.193         | \$ 80.527.500           | VI           | -              | \$ -                    | VI           | 1.362         | \$ 100.515.600        |
| IE                 | 2.280         | \$ 16.872.000           | IE           | 29.596         | \$ 219.010.400          | IE           | 7.843         | \$ 22.744.700         |
| IE2A               | -             | \$ -                    | IE2A         | 8.518          | \$ 28.961.200           | IE2A         | -             | \$ -                  |
| IE2B               | -             | \$ -                    | IE2B         | 671            | \$ 2.281.400            | IE2B         | -             | \$ -                  |
| IE3                | -             | \$ -                    | IE3          | 431            | \$ 1.896.400            | IE3          | -             | \$ -                  |
| IE4                | -             | \$ -                    | IE4          | 5.389          | \$ 25.867.200           | IE4          | -             | \$ -                  |
| IIE                | 3.336         | \$ 49.372.800           | IIE          | 4.523          | \$ 66.940.400           | IIE          | 559           | \$ 8.273.200          |
| IIA                | -             | \$ -                    | IIA          | 6.011          | \$ 46.885.800           | IIA          | 1.104         | \$ 8.611.200          |
| Ejes               | 4             | \$ 44.800               | Ejes         | 2              | \$ 21.000               | Ejes         | 35            | \$ 374.500            |
| <b>Total</b>       | <b>75.763</b> | <b>\$ 1.205.330.200</b> | <b>Total</b> | <b>147.763</b> | <b>\$ 1.801.523.600</b> | <b>Total</b> | <b>58.599</b> | <b>\$ 962.445.500</b> |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Total Recaudo</b> | <b>\$ 3.969.299.300</b> |
| <b>POSEVI</b>        | <b>\$ 148.376.184</b>   |
| <b>Recaudo Neto</b>  | <b>\$ 3.820.923.116</b> |

### 12.14 RECAUDO Y VPIP

De acuerdo con el acta 101 de cálculo de VPIP con se alcanzaron las siguientes cifras:

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124**  
**01 al 31 de Marzo de 2025**

**Contrato VEJ-542**  
**de 2022**

Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca".

**VERSIÓN: 1**

**Página 393 de 591**

**Fecha: 30 de mayo de 2025**

| MES    | RECAUDO          |                    |                  |                   | VPIP             |                   |
|--------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|        | corrientes       |                    | k (\$ dic 2013)  |                   | mensual          | acumulado         |
|        | mensual          | acumulado          | mensual          | acumulado         |                  |                   |
| dic-14 | \$ 267.212.838   | \$ 267.212.838     | 252.896.652,94   | 252.896.652,94    | 220.800.899,65   | 220.800.899,65    |
| ene-15 | \$ 1.177.413.174 | \$ 1.444.626.012   | 1.107.210.000,14 | 1.360.106.653,08  | 961.239.989,14   | 1.182.040.888,79  |
| feb-15 | \$ 1.279.039.357 | \$ 2.723.665.369   | 1.189.076.994,51 | 2.549.183.647,59  | 1.026.492.735,50 | 2.208.533.624,29  |
| mar-15 | \$ 1.240.592.748 | \$ 3.964.258.117   | 1.146.661.275,26 | 3.695.844.922,86  | 984.294.645,45   | 3.192.828.269,74  |
| abr-15 | \$ 1.146.047.445 | \$ 5.110.305.562   | 1.053.613.625,75 | 4.749.458.548,61  | 899.322.436,33   | 4.092.150.706,07  |
| may-15 | \$ 1.299.701.636 | \$ 6.410.007.198   | 1.191.739.540,28 | 5.941.198.088,89  | 1.011.485.058,85 | 5.103.635.764,92  |
| jun-15 | \$ 1.170.543.146 | \$ 7.580.550.344   | 1.072.166.895,36 | 7.013.364.984,25  | 904.866.666,50   | 6.008.502.431,43  |
| jul-15 | \$ 1.167.823.871 | \$ 8.748.374.215   | 1.067.664.665,65 | 8.081.029.649,90  | 895.985.826,18   | 6.904.488.257,61  |
| ago-15 | \$ 1.236.712.605 | \$ 9.985.086.820   | 1.125.217.278,20 | 9.206.246.928,10  | 938.959.229,19   | 7.843.447.486,79  |
| sep-15 | \$ 1.208.817.891 | \$ 11.193.904.711  | 1.092.018.230,50 | 10.298.265.158,60 | 906.117.054,61   | 8.749.564.541,40  |
| oct-15 | \$ 1.269.816.367 | \$ 12.463.721.078  | 1.139.390.676,92 | 11.437.655.835,52 | 940.093.718,13   | 9.689.658.259,53  |
| nov-15 | \$ 1.230.445.610 | \$ 13.694.166.688  | 1.097.458.946,40 | 12.535.114.781,92 | 900.390.378,56   | 10.590.048.638,09 |
| dic-15 | \$ 1.318.529.048 | \$ 15.012.695.736  | 1.168.750.837,47 | 13.703.865.619,40 | 953.473.375,94   | 11.543.522.014,03 |
| ene-16 | \$ 1.292.901.872 | \$ 16.305.597.608  | 1.131.415.615,33 | 14.835.281.234,73 | 917.810.194,29   | 12.461.332.208,32 |
| feb-16 | \$ 1.252.883.170 | \$ 17.558.480.778  | 1.082.585.550,34 | 15.917.866.785,07 | 873.246.810,55   | 13.334.579.018,87 |
| mar-16 | \$ 1.247.708.563 | \$ 18.806.189.341  | 1.068.045.406,99 | 16.985.912.192,05 | 856.660.163,81   | 14.191.239.182,69 |
| abr-16 | \$ 1.424.680.267 | \$ 20.230.869.608  | 1.213.495.943,45 | 18.199.408.135,50 | 967.834.852,39   | 15.159.074.035,07 |
| may-16 | \$ 1.723.818.764 | \$ 21.954.688.372  | 1.460.836.788,11 | 19.660.244.923,61 | 1.158.533.773,25 | 16.317.607.808,32 |
| jun-16 | \$ 1.671.247.246 | \$ 23.625.935.618  | 1.409.555.491,38 | 21.069.800.414,99 | 1.111.560.876,82 | 17.429.168.685,14 |
| jul-16 | \$ 1.633.725.546 | \$ 25.259.661.164  | 1.370.775.047,30 | 22.440.575.462,29 | 1.074.883.356,34 | 18.504.052.041,48 |
| ago-16 | \$ 1.682.646.202 | \$ 26.942.307.366  | 1.416.285.271,42 | 23.856.860.733,71 | 1.104.307.343,05 | 19.608.359.384,53 |
| sep-16 | \$ 1.623.663.982 | \$ 28.565.971.348  | 1.367.360.343,93 | 25.224.221.077,64 | 1.060.147.454,32 | 20.668.506.838,85 |
| oct-16 | \$ 1.680.123.288 | \$ 30.246.094.636  | 1.415.760.256,70 | 26.639.981.334,34 | 1.091.483.272,42 | 21.759.990.111,26 |
| nov-16 | \$ 1.634.062.432 | \$ 31.880.157.068  | 1.375.392.255,52 | 28.015.373.589,86 | 1.054.382.078,38 | 22.814.372.189,65 |
| dic-16 | \$ 1.746.791.470 | \$ 33.626.948.538  | 1.464.214.559,04 | 29.479.588.148,90 | 1.116.144.015,26 | 23.930.516.204,91 |
| ene-17 | \$ 1.729.124.626 | \$ 35.356.073.164  | 1.434.671.779,17 | 30.914.259.928,07 | 1.087.457.124,40 | 25.017.973.329,32 |
| feb-17 | \$ 1.657.671.486 | \$ 37.013.744.650  | 1.361.745.706,47 | 32.276.005.634,54 | 1.026.359.898,54 | 26.044.333.227,85 |
| mar-17 | \$ 1.793.616.150 | \$ 38.807.360.800  | 1.466.526.454,32 | 33.742.532.088,86 | 1.099.101.081,59 | 27.143.434.309,44 |
| abr-17 | \$ 1.720.577.640 | \$ 40.527.938.440  | 1.400.254.670,34 | 35.142.786.759,20 | 1.043.515.337,80 | 28.186.949.647,25 |
| may-17 | \$ 1.791.894.672 | \$ 42.319.833.112  | 1.455.011.707,38 | 36.597.798.466,58 | 1.078.207.548,32 | 29.265.157.195,57 |
| jun-17 | \$ 1.664.866.374 | \$ 43.984.699.486  | 1.350.296.351,21 | 37.948.094.817,79 | 994.967.849,23   | 30.260.125.044,80 |
| jul-17 | \$ 1.674.463.178 | \$ 45.659.162.664  | 1.358.769.757,36 | 39.306.864.575,15 | 995.565.638,26   | 31.255.690.683,07 |
| ago-17 | \$ 1.740.056.080 | \$ 47.399.218.744  | 1.410.051.966,56 | 40.716.916.541,71 | 1.027.314.027,78 | 32.283.004.710,85 |
| sep-17 | \$ 1.641.944.620 | \$ 49.041.163.364  | 1.329.969.195,28 | 42.046.885.736,99 | 963.504.516,86   | 33.246.509.227,71 |
| oct-17 | \$ 1.664.461.868 | \$ 50.705.625.232  | 1.348.012.791,19 | 43.394.898.528,18 | 971.069.378,53   | 34.217.578.606,23 |
| nov-17 | \$ 1.629.918.834 | \$ 52.335.544.066  | 1.317.651.272,54 | 44.712.549.800,72 | 943.845.273,17   | 35.161.423.879,40 |
| dic-17 | \$ 1.716.317.862 | \$ 54.051.861.928  | 1.382.201.392,36 | 46.094.751.193,08 | 984.499.996,05   | 36.145.923.875,45 |
| ene-18 | \$ 1.675.522.028 | \$ 55.727.383.956  | 1.340.945.270,33 | 47.435.696.463,41 | 949.728.604,70   | 37.095.652.480,15 |
| feb-18 | \$ 1.588.805.318 | \$ 57.316.189.274  | 1.262.598.327,47 | 48.698.294.790,88 | 889.196.508,48   | 37.984.848.988,62 |
| mar-18 | \$ 1.756.438.190 | \$ 59.072.627.464  | 1.392.448.907,52 | 50.090.743.698,40 | 975.115.098,48   | 38.959.964.087,10 |
| abr-18 | \$ 1.630.619.672 | \$ 60.703.247.136  | 1.286.774.112,37 | 51.377.517.810,78 | 896.030.928,44   | 39.855.995.015,54 |
| may-18 | \$ 1.635.934.526 | \$ 62.339.181.662  | 1.287.696.738,68 | 52.665.214.549,46 | 891.617.028,90   | 40.747.612.044,44 |
| jun-18 | \$ 1.525.867.286 | \$ 63.865.048.948  | 1.199.202.136,07 | 53.864.416.685,53 | 825.659.962,10   | 41.573.272.006,54 |
| jul-18 | \$ 1.393.948.748 | \$ 65.258.997.696  | 1.096.913.082,35 | 54.961.329.767,88 | 750.974.380,36   | 42.324.246.386,90 |
| ago-18 | \$ 1.486.061.402 | \$ 66.745.059.098  | 1.168.000.182,55 | 56.129.329.950,43 | 795.133.202,88   | 43.119.379.589,79 |
| sep-18 | \$ 1.496.298.916 | \$ 68.241.358.014  | 1.174.148.384,47 | 57.303.478.334,90 | 794.811.306,32   | 43.914.190.896,11 |
| oct-18 | \$ 1.558.225.386 | \$ 69.799.583.400  | 1.221.285.222,28 | 58.524.763.557,18 | 822.057.558,42   | 44.736.248.454,53 |
| nov-18 | \$ 1.620.131.850 | \$ 71.419.715.250  | 1.268.294.199,57 | 59.793.057.756,75 | 848.885.673,59   | 45.585.134.128,12 |
| dic-18 | \$ 1.830.130.488 | \$ 73.249.845.738  | 1.428.388.296,00 | 61.221.446.052,76 | 950.647.595,64   | 46.535.781.723,76 |
| ene-19 | \$ 1.722.183.860 | \$ 74.972.029.598  | 1.336.147.617,03 | 62.557.593.669,78 | 884.243.316,29   | 47.420.025.040,05 |
| feb-19 | \$ 1.652.243.492 | \$ 76.624.273.090  | 1.274.536.514,63 | 63.832.130.184,42 | 838.713.628,00   | 48.258.738.668,04 |
| mar-19 | \$ 1.945.950.576 | \$ 78.570.223.666  | 1.494.601.874,21 | 65.326.732.058,62 | 977.982.341,66   | 49.236.721.009,70 |
| abr-19 | \$ 1.776.012.600 | \$ 80.346.236.266  | 1.357.400.934,49 | 66.684.132.993,11 | 883.197.249,36   | 50.119.918.259,06 |
| may-19 | \$ 1.969.009.268 | \$ 82.315.245.534  | 1.500.206.690,43 | 68.184.339.683,54 | 970.609.941,17   | 51.090.528.200,23 |
| jun-19 | \$ 1.898.547.340 | \$ 84.213.792.874  | 1.442.718.526,79 | 69.627.058.210,33 | 928.152.458,25   | 52.018.680.658,48 |
| jul-19 | \$ 1.893.188.616 | \$ 86.106.981.490  | 1.435.432.013,59 | 71.062.490.223,92 | 918.257.346,13   | 52.936.938.004,61 |
| ago-19 | \$ 2.075.048.964 | \$ 88.182.030.454  | 1.571.945.759,88 | 72.634.435.983,80 | 999.915.759,81   | 53.936.853.764,42 |
| sep-19 | \$ 1.963.453.644 | \$ 90.145.484.098  | 1.484.094.101,44 | 74.118.530.085,23 | 938.709.837,04   | 54.875.563.601,46 |
| oct-19 | \$ 1.969.022.756 | \$ 92.114.506.854  | 1.485.857.353,82 | 75.604.387.439,06 | 934.525.424,63   | 55.810.089.026,09 |
| nov-19 | \$ 1.946.786.220 | \$ 94.061.293.074  | 1.467.516.558,54 | 77.071.903.997,59 | 917.785.277,39   | 56.727.874.303,49 |
| dic-19 | \$ 2.094.585.560 | \$ 96.155.878.634  | 1.574.974.980,33 | 78.646.878.977,92 | 979.435.426,95   | 57.707.309.730,44 |
| ene-20 | \$ 2.402.932.480 | \$ 98.558.811.114  | 1.799.202.609,98 | 80.446.081.587,90 | 1.112.567.310,40 | 58.819.877.040,84 |
| feb-20 | \$ 2.597.033.776 | \$ 101.155.844.890 | 1.931.565.525,22 | 82.377.647.113,12 | 1.187.680.815,87 | 60.007.557.856,71 |
| mar-20 | \$ 1.708.629.504 | \$ 102.864.474.394 | 1.263.702.575,45 | 83.641.349.688,57 | 772.643.650,34   | 60.780.201.507,05 |
| abr-20 | -                | \$ 102.864.474.394 | -                | 83.641.349.688,57 | -                | 60.780.201.507,05 |
| may-20 | -                | \$ 102.864.474.394 | -                | 83.641.349.688,57 | -                | 60.780.201.507,05 |
| jun-20 | \$ 1.424.586.264 | \$ 104.289.060.658 | 1.059.245.097,70 | 84.700.594.786,27 | 636.741.346,71   | 61.416.942.853,76 |
| jul-20 | \$ 1.774.217.080 | \$ 106.063.277.738 | 1.319.211.613,74 | 86.019.806.400,00 | 788.542.541,19   | 62.205.485.394,96 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                               |  | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | <b>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</b> |  | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |  | <b>Página 394 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |  | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| MES      | RECAUDO          |                    |                  |                    | VPIP             |                    |
|----------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|          | corrientes       |                    | k (\$ dic 2013)  |                    | mensual          | acumulado          |
|          | mensual          | acumulado          | mensual          | acumulado          |                  |                    |
| ago-20   | \$ 1.789.629.040 | \$ 107.852.906.778 | 1.330.797.890,36 | 87.350.604.290,36  | 790.982.434,37   | 62.996.467.829,33  |
| sep-20   | \$ 2.542.411.268 | \$ 110.395.318.046 | 1.884.653.808,22 | 89.235.258.098,58  | 1.113.859.452,98 | 64.110.327.282,31  |
| oct-20   | \$ 2.858.349.184 | \$ 113.253.667.230 | 2.120.062.280,82 | 91.355.320.379,41  | 1.245.923.854,98 | 65.356.251.137,30  |
| nov-20   | \$ 2.646.042.388 | \$ 115.899.709.618 | 1.965.394.065,32 | 93.320.714.444,72  | 1.148.514.798,20 | 66.504.765.935,50  |
| dic-20   | \$ 2.917.155.104 | \$ 118.816.864.722 | 2.158.550.965,75 | 95.479.265.410,47  | 1.254.276.644,44 | 67.759.042.579,94  |
| ene-21   | \$ 2.230.799.066 | \$ 121.047.663.788 | 1.643.979.483,54 | 97.123.244.894,01  | 949.886.017,31   | 68.708.928.597,25  |
| feb-21   | \$ 2.627.873.329 | \$ 123.675.537.117 | 1.924.427.785,03 | 99.047.672.679,04  | 1.105.657.950,72 | 69.814.586.547,97  |
| mar-21   | \$ 3.804.957.271 | \$ 127.480.494.388 | 2.772.375.980,22 | 101.820.048.659,26 | 1.583.854.837,15 | 71.398.441.385,12  |
| abr-21   | \$ 2.280.609.664 | \$ 129.761.104.052 | 1.651.833.558,60 | 103.471.882.217,87 | 938.368.900,67   | 72.336.810.285,79  |
| may-21   | \$ 4.009.516.219 | \$ 133.770.620.271 | 2.875.254.877,74 | 106.347.137.095,60 | 1.624.156.008,48 | 73.960.966.294,27  |
| jun-21   | \$ 2.820.067.213 | \$ 136.590.687.484 | 2.023.407.298,90 | 108.370.544.394,51 | 1.136.524.441,06 | 75.097.490.735,33  |
| jul-21   | \$ 4.956.458.016 | \$ 141.547.145.500 | 3.544.544.146,50 | 111.915.088.541,00 | 1.979.702.494,97 | 77.077.193.230,30  |
| ago-21   | \$ 3.194.606.873 | \$ 144.741.752.373 | 2.274.576.413,41 | 114.189.664.954,41 | 1.263.234.986,03 | 78.340.428.216,33  |
| sep-21   | \$ 5.156.005.092 | \$ 149.897.757.465 | 3.657.090.125,69 | 117.846.755.080,10 | 2.019.590.645,07 | 80.360.018.861,41  |
| oct-21   | \$ 3.148.739.728 | \$ 153.046.497.193 | 2.232.955.985,56 | 120.079.711.065,65 | 1.226.173.491,50 | 81.586.192.352,91  |
| nov-21   | \$ 5.324.314.322 | \$ 158.370.811.515 | 3.757.348.398,12 | 123.837.059.463,77 | 2.051.621.776,51 | 83.637.814.129,42  |
| dic-21   | \$ 3.386.295.711 | \$ 161.757.107.226 | 2.372.321.876,34 | 126.209.381.340,12 | 1.288.052.368,11 | 84.925.866.497,53  |
| ene-22   | \$ 3.170.233.552 | \$ 164.927.340.778 | 2.184.678.869,27 | 128.394.060.209,39 | 1.179.482.734,59 | 86.105.349.232,12  |
| feb-22   | \$ 3.060.463.896 | \$ 167.987.804.674 | 2.075.138.624,64 | 130.469.198.834,03 | 1.114.025.590,30 | 87.219.374.822,42  |
| mar-22   | \$ 3.546.663.680 | \$ 171.534.468.354 | 2.381.017.548,80 | 132.850.216.382,84 | 1.271.026.843,14 | 88.490.401.665,56  |
| abr-22   | \$ 3.420.134.328 | \$ 174.954.602.682 | 2.267.789.349,25 | 135.118.005.732,09 | 1.203.757.236,18 | 89.694.158.901,74  |
| may-22   | \$ 3.570.079.604 | \$ 178.524.682.286 | 2.347.470.202,97 | 137.465.475.935,06 | 1.239.025.832,56 | 90.933.184.734,31  |
| jun-22   | \$ 3.325.260.068 | \$ 181.849.942.354 | 2.175.312.616,77 | 139.640.788.551,83 | 1.141.684.289,15 | 92.074.869.023,45  |
| jul-22   | \$ 3.491.329.748 | \$ 185.341.272.102 | 2.265.721.184,26 | 141.906.509.736,10 | 1.182.428.487,78 | 93.257.297.511,23  |
| ago-22   | \$ 3.572.119.576 | \$ 188.913.391.678 | 2.294.682.575,36 | 144.201.192.311,46 | 1.190.789.811,77 | 94.448.087.323,00  |
| sep-22   | \$ 3.425.392.324 | \$ 192.338.784.002 | 2.180.150.622,92 | 146.381.342.934,38 | 1.124.975.501,37 | 95.573.062.824,38  |
| oct-22   | \$ 3.496.831.896 | \$ 195.835.615.898 | 2.209.762.201,30 | 148.591.105.135,68 | 1.133.825.393,51 | 96.706.888.217,88  |
| nov-22   | \$ 2.958.549.940 | \$ 198.794.165.838 | 1.855.333.623,79 | 150.446.438.759,47 | 946.600.495,10   | 97.653.488.712,99  |
| dic-22   | \$ 3.323.732.336 | \$ 202.117.898.174 | 2.058.377.440,49 | 152.504.816.199,96 | 1.044.272.397,23 | 99.669.513.095,40  |
| ene-23   | \$ 3.245.103.984 | \$ 205.363.002.158 | 1.974.587.713,04 | 154.479.403.913,00 | 996.114.561,30   | 200.665.627.656,69 |
| feb-23   | \$ 3.058.753.608 | \$ 208.421.755.766 | 1.830.795.391,90 | 156.310.199.304,90 | 918.367.999,38   | 201.583.995.656,08 |
| mar-23   | \$ 3.224.547.436 | \$ 211.646.303.202 | 1.909.966.780,68 | 158.220.163.085,58 | 952.678.000,53   | 202.536.673.656,60 |
| abr-23   | \$ 3.082.932.132 | \$ 214.729.235.334 | 1.811.919.073,06 | 160.032.082.158,64 | 898.677.512,77   | 203.435.351.169,37 |
| may-23   | \$ 3.343.871.068 | \$ 218.073.106.402 | 1.956.733.669,65 | 161.988.815.828,29 | 965.030.121,69   | 204.400.381.291,07 |
| jun-23   | \$ 3.130.568.804 | \$ 221.203.675.206 | 1.826.438.145,85 | 163.815.253.974,14 | 895.690.965,08   | 205.296.072.256,15 |
| jul-23   | \$ 3.033.646.232 | \$ 224.237.321.438 | 1.761.071.687,67 | 165.576.325.661,81 | 858.764.993,77   | 206.154.837.249,92 |
| ago-23   | \$ 3.103.744.704 | \$ 227.341.066.142 | 1.789.255.293,21 | 167.365.580.955,02 | 867.588.289,90   | 207.022.425.539,82 |
| sep-23   | \$ 3.036.197.620 | \$ 230.377.263.762 | 1.741.056.676,52 | 169.106.637.631,54 | 839.456.803,05   | 207.861.882.342,87 |
| oct-23   | \$ 3.088.349.840 | \$ 233.465.613.602 | 1.766.549.688,62 | 170.873.187.320,15 | 846.945.324,53   | 208.708.827.667,39 |
| nov-23   | \$ 3.046.955.164 | \$ 236.512.568.766 | 1.734.735.214,46 | 172.607.922.534,61 | 827.002.429,00   | 209.535.830.096,39 |
| dic-23   | \$ 3.210.879.148 | \$ 239.723.447.914 | 1.819.700.243,26 | 174.427.622.777,87 | 862.616.015,11   | 210.398.446.111,50 |
| ene-24   | \$ 3.223.138.780 | \$ 242.946.586.694 | 1.810.087.651,31 | 176.237.710.429,18 | 853.220.619,83   | 211.251.666.731,32 |
| feb-24   | \$ 3.184.126.700 | \$ 246.130.713.394 | 1.768.959.277,78 | 178.006.669.706,96 | 829.131.940,17   | 212.080.798.671,49 |
| mar-24   | \$ 3.528.731.900 | \$ 249.659.445.294 | 1.946.688.753,15 | 179.953.358.460,10 | 907.290.582,81   | 212.988.089.254,30 |
| abr-24   | \$ 3.318.818.100 | \$ 252.978.263.394 | 1.820.079.768,87 | 181.773.438.228,97 | 843.498.624,79   | 213.831.587.879,10 |
| may-24   | \$ 3.420.811.500 | \$ 256.399.074.894 | 1.868.138.382,14 | 183.641.576.611,11 | 860.888.830,59   | 214.692.476.709,69 |
| jun-24   | \$ 3.415.646.200 | \$ 259.814.721.094 | 1.859.333.142,07 | 185.500.909.753,18 | 851.999.448,30   | 215.544.476.157,98 |
| jul-24   | \$ 3.084.510.300 | \$ 262.899.231.394 | 1.675.687.540,30 | 187.176.597.293,48 | 763.517.888,57   | 216.307.994.046,56 |
| ago-24   | \$ 3.622.133.200 | \$ 266.521.364.594 | 1.967.755.942,51 | 189.144.353.235,98 | 891.541.332,21   | 217.199.535.378,77 |
| sep-24   | \$ 3.151.567.300 | \$ 269.672.931.894 | 1.707.956.032,25 | 190.852.309.268,24 | 769.468.789,63   | 217.969.004.168,39 |
| oct-24   | \$ 3.385.990.300 | \$ 273.058.922.194 | 1.837.422.950,11 | 192.689.732.218,35 | 823.128.298,08   | 218.792.132.466,48 |
| nov-24   | \$ 3.344.281.400 | \$ 276.403.203.594 | 1.809.881.869,85 | 194.499.614.088,20 | 806.218.387,00   | 219.598.350.853,47 |
| 19/12/24 | \$ 2.251.514.700 | \$ 278.654.718.294 | 1.212.939.828,37 | 195.712.553.916,58 | 537.261.597,58   | 220.135.612.451,05 |

El 19 de diciembre de 2024 se recibió la notificación del Laudo Parcial Final Arbitraje internacional ICDR 01-20-0015-3123 en el cual se determinó la Terminación Anticipada del

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 395 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Contrato de Concesión “a partir de la fecha de la notificación del Laudo”, es decir que el contrato de Concesión entró en Etapa de Reversión el 20 de diciembre de 2024.

En consecuencia se realizó el cálculo del VPIP al corte del 19 de diciembre de 2024, último día de etapa de operación y mantenimiento del contrato de concesión. A esta fecha el VPIP alcanzó el 65,31% respecto a lo proyectado para el mes 156 es decir el año 13 de concesión. En relación con el VPIP total contractual, se alcanzó el 38,30%.

El cálculo presentado incluye valores de compensación especial por la no instalación del peaje Choachí por valor de \$8.806.518.602; se precisa que la ANI no ha realizado la aclaración de forma oficial, razón por la cual se contabiliza en el cálculo del VPIP el valor de la Compensación especial. Adicionalmente se incluyeron los valores del reconocimiento en el DR8 y el valor de descuento en su pago por índice de cumplimiento.

## 12.15 RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO

- Considerando que el 01 de febrero de 2019 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1, se inició la retribución al Concesionario. El histórico de pagos realizados, se detalla a continuación:

| Acta        | Aportes ANI       |               | Recaudo Peaje    |              | Explotación Comercial |           | Total Acta        |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|             | Retribución       | Deducción     | Retribución      | Deducción    | Retribución           | Deducción |                   |
| Acta 1      | 46.613.149.574,05 | 9.322.629,91  | 7.618.508.527,71 | 1.523.701,71 | 16.025.077,97         | 3.205,02  | 54.236.833.643,09 |
| Acta 2      | 0,00              | 0,00          | 173.539.746,38   | 0,00         | 1.115.036,81          | 0,00      | 174.654.783,19    |
| Acta 3      | 0,00              | 0,00          | 179.902.224,88   | 0,00         | 3.732,24              | 0,00      | 179.905.957,12    |
| Acta 4      | 0,00              | 0,00          | 164.379.853,85   | 0,00         | 267.618,29            | 0,00      | 164.647.472,14    |
| Acta 5      | 0,00              | 0,00          | 182.043.177,68   | 0,00         | 916,83                | 0,00      | 182.044.094,51    |
| Acta 6      | 0,00              | 0,00          | 175.718.229,07   | 0,00         | 143.512,39            | 0,00      | 175.861.741,46    |
| Acta 7      | 0,00              | 0,00          | 171.935.906,35   | 0,00         | 508,00                | 0,00      | 171.936.414,35    |
| Acta 8      | 0,00              | 0,00          | 186.665.883,43   | 0,00         | 34,52                 | 0,00      | 186.665.917,95    |
| Acta 9      | 0,00              | 0,00          | 182.319.457,16   | 5.661.451,86 | 1,86                  | 1.138,04  | 176.656.869,12    |
| Acta 10     | 0,00              | 0,00          | 179.676.873,93   | 1.419.447,30 | 1,80                  | 0,01      | 178.257.428,42    |
| Acta 11     | 0,00              | 0,00          | 182.136.901,27   | 0,00         | 1,86                  | 0,00      | 182.136.903,13    |
| Acta 12     | 20.605.770.678,00 | 74.180.774,44 | 194.703.034,29   | 19.470,30    | 0,72                  | 0,00      | 20.726.273.468,27 |
| Acta 13     | 0,00              | 0,00          | 222.249.692,64   | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 222.249.692,64    |
| Acta 14     | 0,00              | 0,00          | 240.471.462,80   | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 240.471.462,80    |
| Acta 14 usd | 2.976.775,27      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 2.976.775,27      |
| Acta 15     | 0,00              | 0,00          | 158.539.022,07   | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 158.539.022,07    |
| Acta 16     | 0,00              | 0,00          | 565.520,25       | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 565.520,25        |
| Acta 17     | 0,00              | 0,00          | 17.284,56        | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 17.284,56         |
| Acta 18     | 0,00              | 0,00          | 131.071.715,41   | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 131.071.715,41    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de<br>Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                                                                  | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | <b>Página 396 de 591</b>                   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Acta        | Aportes ANI      |           | Recaudo Peaje  |           | Explotación Comercial |           | Total Acta        |
|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|
|             | Retribución      | Deducción | Retribución    | Deducción | Retribución           | Deducción |                   |
| Acta 19     | 0,00             | 0,00      | 163.676.477,73 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 163.676.477,73    |
| Acta 20     | 0,00             | 0,00      | 165.103.078,40 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 165.103.078,40    |
| Acta 21     | 0,00             | 0,00      | 234.266.550,97 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 234.266.550,97    |
| Acta 22     | 0,00             | 0,00      | 263.300.373,16 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 263.300.373,16    |
| Acta 23     | 0,00             | 0,00      | 243.781.610,71 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 243.781.610,71    |
| Acta 24     | 8.401.822.438,69 | 0,00      | 268.654.000,78 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 8.670.476.439,47  |
| Acta 24 USD | 931.757,37       | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 931.757,37        |
| Acta 25     | 0,00             | 0,00      | 205.666.368,41 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 205.666.368,41    |
| Acta 26     | 0,00             | 0,00      | 321.779.515,08 | 0,00      | 647.022,01            | 0,00      | 322.426.537,09    |
| Acta 27     | 0,00             | 0,00      | 270.202.211,71 | 0,00      | 1.001,45              | 0,00      | 270.203.213,16    |
| Acta 28     | 0,00             | 0,00      | 367.898.048,12 | 0,00      | 101,63                | 0,00      | 367.898.149,75    |
| Acta 28 USD | 244.155,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 244.155,00        |
| Acta 29     | 0,00             | 0,00      | 211.197.033,77 | 0,00      | 0,10                  | 0,00      | 211.197.033,87    |
| Acta 30     | 0,00             | 0,00      | 259.698.217,61 | 0,00      | 134.544,69            | 0,00      | 259.832.762,30    |
| Acta 31     | 0,00             | 0,00      | 271.278.883,12 | 0,00      | 215,06                | 0,00      | 271.279.098,18    |
| Acta 32     | 0,00             | 0,00      | 294.436.699,83 | 0,00      | 34,93                 | 0,00      | 294.436.734,76    |
| Acta 33     | 0,00             | 0,00      | 289.031.972,88 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 289.031.972,88    |
| Acta 34     | 0,00             | 0,00      | 290.773.263,97 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 290.773.263,97    |
| Acta 35     | 0,00             | 0,00      | 490.779.628,81 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 490.779.628,81    |
| Acta 36     | 8.701.310.449,08 | 0,00      | 684.430.211,59 | 0,00      | 1.346.820,35          | 0,00      | 9.387.087.481,02  |
| Acta 36 USD | 1.175.907,44     | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 1.175.907,44      |
| Acta 37     | 0,00             | 0,00      | 294.311.001,85 | 0,00      | 3.743,72              | 0,00      | 294.314.745,57    |
| Acta 38     | 0,00             | 0,00      | 283.096.465,23 | 0,00      | 1.348.781,26          | 0,00      | 284.445.246,49    |
| Acta 39     | 0,00             | 0,00      | 327.962.863,06 | 0,00      | 678.796,71            | 0,00      | 328.641.659,77    |
| Acta 40     | 0,00             | 0,00      | 317.655.364,75 | 0,00      | 678.003,69            | 0,00      | 318.333.368,44    |
| Acta 41     | 0,00             | 0,00      | 331.135.510,99 | 0,00      | 3.309,04              | 0,00      | 331.138.820,03    |
| Acta 42     | 0,00             | 0,00      | 309.723.049,26 | 0,00      | 554,81                | 0,00      | 309.723.604,07    |
| Acta 43     | 0,00             | 0,00      | 325.881.691,60 | 0,00      | 4,81                  | 0,00      | 325.881.696,41    |
| Acta 44     | 0,00             | 0,00      | 333.615.389,34 | 0,00      | 0,52                  | 0,00      | 333.615.389,86    |
| Acta 45     | 0,00             | 0,00      | 320.569.146,43 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 320.569.146,43    |
| Acta 46     | 0,00             | 0,00      | 327.802.921,37 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 327.802.921,37    |
| Acta 47     | 9.784.476.337,37 | 0,00      | 280.609.124,92 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 10.065.085.462,29 |
| Acta 47 USD | 1.177.795,53     | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 1.177.795,53      |
| Acta 48     | 0,00             | 0,00      | 313.525.321,51 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 313.525.321,51    |
| Acta 49     | 0,00             | 0,00      | 306.690.939,11 | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 306.690.939,11    |
| Acta 50     | 0,00             | 0,00      | 291.759.769,37 | 0,00      | 4.264.350,02          | 0,00      | 296.024.119,39    |
| Acta 51     | 0,00             | 0,00      | 303.785.817,21 | 0,00      | 2.105.374,92          | 0,00      | 305.891.192,13    |
| Acta 52     | 0,00             | 0,00      | 294.901.545,46 | 0,00      | 69.432,76             | 0,00      | 294.970.978,22    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 397 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Acta        | Aportes ANI        |               | Recaudo Peaje     |              | Explotación Comercial |           | Total Acta         |
|-------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|             | Retribución        | Deducción     | Retribución       | Deducción    | Retribución           | Deducción |                    |
| Acta 53     | 0,00               | 0,00          | 345.060.002,24    | 0,00         | 2.955.261,34          | 0,00      | 348.015.263,58     |
| Acta 54     | 0,00               | 0,00          | 299.129.740,28    | 0,00         | 39.491,48             | 0,00      | 299.169.231,76     |
| Acta 55     | 0,00               | 0,00          | 289.538.571,88    | 0,00         | 28.894,44             | 0,00      | 289.567.466,32     |
| Acta 56     | 0,00               | 0,00          | 294.080.199,54    | 0,00         | 707.862,82            | 0,00      | 294.788.062,36     |
| Acta 57     | 0,00               | 0,00          | 289.175.346,96    | 0,00         | 7.854,94              | 0,00      | 289.183.201,90     |
| Acta 58     | 0,00               | 0,00          | 292.036.622,27    | 0,00         | 1.871,25              | 0,00      | 292.038.493,52     |
| Acta 59     | 0,00               | 0,00          | 289.035.519,98    | 0,00         | 65,87                 | 0,00      | 289.035.585,85     |
| Acta 60     | 0,00               | 0,00          | 304.949.376,81    | 0,00         | 940.410,03            | 0,00      | 305.889.786,84     |
| Acta 61     | 10.894.957.441,30  | 0,00          | 308.146.374,20    | 0,00         | 1.226.783,01          | 0,00      | 11.204.330.598,51  |
| Acta 61 USD | 1.175.907,44       | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 1.175.907,44       |
| Acta 62     | 0,00               | 0,00          | 303.377.169,19    | 0,00         | 19.728,02             | 0,00      | 303.396.897,21     |
| Acta 63     | 0,00               | 0,00          | 332.505.036,10    | 0,00         | 134.239,06            | 0,00      | 332.639.275,16     |
| Acta 64     | 0,00               | 0,00          | 313.861.930,93    | 0,00         | 136.756,99            | 0,00      | 313.998.687,92     |
| Acta 65     | 0,00               | 0,00          | 322.447.632,26    | 0,00         | 2.122,73              | 0,00      | 322.449.754,99     |
| Acta 66     | 0,00               | 0,00          | 322.137.007,75    | 0,00         | 829,63                | 0,00      | 322.137.837,38     |
| Acta 67     | 0,00               | 0,00          | 291.786.374,22    | 0,00         | 1.166.706,26          | 0,00      | 292.953.080,48     |
| Acta 68     | 0,00               | 0,00          | 340.089.994,49    | 0,00         | 1.178.127,31          | 0,00      | 341.268.121,80     |
| Acta 69     | 0,00               | 0,00          | 296.060.336,52    | 0,00         | 12.867,63             | 0,00      | 296.073.204,15     |
| Acta 70     | 0,00               | 0,00          | 316.577.945,73    | 0,00         | 1531,11               | 0,00      | 316.579.476,84     |
| Acta 71     | 0,00               | 0,00          | 311.328.245,65    | 0,00         | 424.246,73            | 0,00      | 311.752.492,38     |
| Total COP   | 105.001.486.918,49 | 83.503.404,35 | 26.464.748.008,84 | 8.624.071,17 | 38.824.186,42         | 4.343,07  | 131.411.927.295,16 |
| Total USD   | 7.682.298,05       | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00      | 7.682.298,05       |

- Considerando que el 31 de agosto de 2021 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 2, se inició la retribución al Concesionario. El histórico de pagos realizados, se detalla a continuación:

| Acta       | Aportes ANI |              |                   | Recaudo Peaje  |            |                   | Explotación Comercial |           |                   | Total Acta        |
|------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|            | Retribución | Deducción    | Valores Retenidos | Retribución    | Deducción  | Valores Retenidos | Retribución           | Deducción | Valores Retenidos |                   |
| Acta 1     | 0,00        | 1.737.745,56 | 17.377.455.583,38 | 465.318.480,83 | 318.311,12 | 3.183.112.231,37  | 7.534,74              | 450,87    | 4.508.719,61      | 21.028.346.042,38 |
| Acta 1 USD | 0,00        | 93,68        | 936.847,84        | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 936.754,16        |
| Acta 2     | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 503.075.103,96 | 0,00       | 0,00              | 5.179,85              | 0,00      | 0,00              | 503.080.283,81    |
| Acta 3     | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 490.446.546,44 | 0,00       | 0,00              | 9,18                  | 0,00      | 0,00              | 490.446.555,62    |
| Acta 4     | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 493.395.380,16 | 0,00       | 0,00              | 0,56                  | 0,00      | 0,00              | 493.395.380,72    |
| Acta 5     | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 832.773.286,42 | 0,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 832.773.286,42    |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 398 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Acta        | Aportes ANI       |           |                   | Recaudo Peaje    |           |                   | Explotación Comercial |           |                   | Total Acta        |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|             | Retribución       | Deducción | Valores Retenidos | Retribución      | Deducción | Valores Retenidos | Retribución           | Deducción | Valores Retenidos |                   |
| Acta 6      | 14.764.710.013,82 | 0,00      | 0,00              | 1.161.366.858,69 | 0,00      | 0,00              | 2.285.334,79          | 0,00      | 0,00              | 15.928.362.207,30 |
| Acta 6 USD  | 1.995.323,85      | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 1.995.323,85      |
| Acta 7      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 499.397.948,72   | 0,00      | 0,00              | 6.352,57              | 0,00      | 0,00              | 499.404.301,29    |
| Acta 8      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 480.368.702,27   | 0,00      | 0,00              | 2.288.678,01          | 0,00      | 0,00              | 482.657.380,28    |
| Acta 9      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 556.499.689,25   | 0,00      | 0,00              | 1.151.830,92          | 0,00      | 0,00              | 557.651.520,17    |
| Acta 10     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 540.747.909,10   | 0,00      | 0,00              | 1.158.853,21          | 0,00      | 0,00              | 541.906.762,31    |
| Acta 11     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 566.700.483,96   | 0,00      | 0,00              | 21.820,98             | 0,00      | 0,00              | 566.722.304,94    |
| Acta 12     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 534.481.596,46   | 0,00      | 0,00              | 27.326,62             | 0,00      | 0,00              | 534.508.923,08    |
| Acta 13     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 568.652.924,86   | 0,00      | 0,00              | 34.148,91             | 0,00      | 0,00              | 568.687.073,77    |
| Acta 14     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 585.136.803,07   | 0,00      | 0,00              | 33.286,17             | 0,00      | 0,00              | 585.170.089,24    |
| Acta 15     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 572.279.571,86   | 0,00      | 0,00              | 39.975,66             | 0,00      | 0,00              | 572.319.547,52    |
| Acta 16     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 593.785.869,38   | 0,00      | 0,00              | 46.263,72             | 0,00      | 0,00              | 593.832.133,10    |
| Acta 17     | 16.602.666.500,13 | 0,00      | 0,00              | 524.982.899,19   | 0,00      | 0,00              | 55.133,32             | 0,00      | 0,00              | 17.127.704.532,64 |
| Acta 17 USD | 1.998.527,64      | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 1.998.527,64      |
| Acta 18     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 592.058.268,38   | 0,00      | 0,00              | 58.001,21             | 0,00      | 0,00              | 592.116.269,59    |
| Acta 19     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 583.213.584,21   | 0,00      | 0,00              | 55.460,29             | 0,00      | 0,00              | 583.269.044,50    |
| Acta 20     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 569.713.920,00   | 0,00      | 0,00              | 7.298.042,02          | 0,00      | 0,00              | 577.011.962,02    |
| Acta 21     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 590.831.282,31   | 0,00      | 0,00              | 3.629.096,93          | 0,00      | 0,00              | 594.460.379,24    |
| Acta 22     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 608.661.596,99   | 0,00      | 0,00              | 173.294,38            | 0,00      | 0,00              | 608.834.891,37    |
| Acta 23     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 658.806.332,69   | 0,00      | 0,00              | 5.089.987,85          | 0,00      | 0,00              | 663.896.320,54    |
| Acta 24     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 591.696.073,22   | 0,00      | 0,00              | 225.614,58            | 0,00      | 0,00              | 591.921.687,80    |
| Acta 25     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 583.862.642,80   | 0,00      | 0,00              | 228.020,02            | 0,00      | 0,00              | 584.090.662,82    |
| Acta 26     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 596.720.492,91   | 0,00      | 0,00              | 1.423.140,05          | 0,00      | 0,00              | 598.143.632,96    |
| Acta 27     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 804.455.473,45   | 0,00      | 0,00              | 243.970,75            | 0,00      | 0,00              | 804.699.444,20    |
| Acta 28     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 517.275.296,38   | 0,00      | 0,00              | 92.256,27             | 0,00      | 0,00              | 517.367.552,65    |
| Acta 29     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 490.457.191,17   | 0,00      | 0,00              | 2.413,31              | 0,00      | 0,00              | 490.459.604,48    |
| Acta 30     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 517.669.034,13   | 0,00      | 0,00              | 1.596.645,55          | 0,00      | 0,00              | 519.265.679,68    |
| Acta 31     | 18.486.972.482,96 | 0,00      | 0,00              | 523.070.249,73   | 0,00      | 0,00              | 2.082.474,81          | 0,00      | 0,00              | 19.012.125.207,50 |
| Acta 31 USD | 1.995.323,85      | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 1.995.323,85      |
| Acta 32     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 513.809.849,38   | 0,00      | 0,00              | 31.406,28             | 0,00      | 0,00              | 513.841.255,66    |
| Acta 33     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 562.858.448,47   | 0,00      | 0,00              | 223.632,35            | 0,00      | 0,00              | 563.082.080,82    |
| Acta 34     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 532.553.532,59   | 0,00      | 0,00              | 232.002,70            | 0,00      | 0,00              | 532.785.535,29    |
| Acta 35     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 547.593.177,41   | 0,00      | 0,00              | 3.754,42              | 0,00      | 0,00              | 547.596.931,83    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 399 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Acta      | Aportes ANI       |              |                   | Recaudo Peaje     |            |                   | Explotación Comercial |           |                   | Total Acta        |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|           | Retribución       | Deducción    | Valores Retenidos | Retribución       | Deducción  | Valores Retenidos | Retribución           | Deducción | Valores Retenidos |                   |
| Acta 36   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 548.055.922,87    | 0,00       | 0,00              | 2.029,37              | 0,00      | 0,00              | 548.057.952,24    |
| Acta 37   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 499.387.421,68    | 0,00       | 0,00              | 1.981.572,33          | 0,00      | 0,00              | 501.368.994,01    |
| Acta 38   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 586.107.184,46    | 0,00       | 0,00              | 2.000.919,65          | 0,00      | 0,00              | 588.108.104,11    |
| Acta 39   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 516.791.052,70    | 0,00       | 0,00              | 31.829,72             | 0,00      | 0,00              | 516.822.882,42    |
| Acta 40   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 556.386.986,67    | 0,00       | 0,00              | 31.031,5              | 0,00      | 0,00              | 556.418.018,17    |
| Acta 41   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 533.377.828,91    | 0,00       | 0,00              | 725.894,9             | 0,00      | 0,00              | 534.103.723,81    |
| Total COP | 49.854.348.996,91 | 1.737.745,56 | 17.377.455.583,38 | 23.594.822.898,13 | 318.311,12 | 3.183.112.231,37  | 34.624.220,45         | 450,87    | 4.508.719,61      | 94.046.816.142,30 |
| Total USD | 5.989.175,34      | 93,68        | 936.847,84        | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 6.925.929,50      |

- Considerando que el 08 de abril de 2022 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3, se inició la retribución al Concesionario. A la fecha de corte de este informe, se encuentra suspendida la retribución de esta Unidad Funcional por la no entrega del peaje Choachí. El histórico de pagos realizados, se detalla a continuación:

| Acta No.   | Aportes ANI       |           |                   | Recaudo Peaje  |              |                   | Explotación Comercial |           |                   | Total Acta        |
|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|            | Retribución       | Deducción | Valores Retenidos | Retribución    | Deducción    | Valores Retenidos | Retribución           | Deducción | Valores Retenidos |                   |
| Acta 1     | 0,00              | 0,00      | 20.520.742.206,84 | 617.206.417,97 | 0,00         | 4.210.829.060,79  | 1.264.781,84          | 0,00      | 5.609.653,63      | 25.355.652.121,07 |
| Acta 1 USD | 0,00              | 0,00      | 1.269.234,74      | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 1.269.234,74      |
| Acta 2     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 602.530.503,75 | 0,00         | 0,00              | 1.269.549,35          | 0,00      | 0,00              | 603.800.053,10    |
| Acta 3     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 607.784.013,59 | 0,00         | 0,00              | 7.080,36              | 0,00      | 0,00              | 607.791.093,95    |
| Acta 4     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 567.789.772,12 | 0,00         | 0,00              | 1.044,14              | 0,00      | 0,00              | 567.790.816,26    |
| Acta 5     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 597.390.870,09 | 0,00         | 0,00              | 9,11                  | 0,00      | 0,00              | 597.390.879,20    |
| Acta 6     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 611.567.600,26 | 0,00         | 0,00              | 0,96                  | 0,00      | 0,00              | 611.567.601,22    |
| Acta 7     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 587.651.837,99 | 4.000.000,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 583.651.837,99    |
| Acta 8     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 600.912.443,78 | 2.000.000,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 598.912.443,78    |
| Acta 9     | 17.936.428.269,37 | 0,00      | 0,00              | 518.803.344,13 | 1.000.000,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 18.454.231.613,50 |
| Acta 9 USD | 2.159.077,74      | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 2.159.077,74      |
| Acta 10    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 588.751.917,07 | 1.160.000,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 587.591.917,07    |
| Acta 11    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 581.425.208,02 | 1.160.000,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00              | 580.265.208,02    |
| Acta 12    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 560.989.163,04 | 0,00         | 0,00              | 7.817.200,13          | 0,00      | 0,00              | 568.806.363,17    |
| Acta 13    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 580.788.000,36 | 0,00         | 0,00              | 3.859.471,54          | 0,00      | 0,00              | 584.647.471,90    |
| Acta 14    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 541.238.536,20 | 0,00         | 0,00              | 127.280,88            | 0,00      | 0,00              | 541.365.817,08    |
| Acta 15    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 633.085.862,27 | 0,00         | 0,00              | 5.417.442,19          | 0,00      | 0,00              | 638.503.304,46    |
| Acta 16    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 547.803.099,91 | 0,00         | 0,00              | 72.219,65             | 0,00      | 0,00              | 547.875.319,56    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 400 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Acta No.         | Aportes ANI              |             |                          | Recaudo Peaje            |                     |                         | Explotación Comercial |             |                     | Total Acta               |
|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
|                  | Retribución              | Deducción   | Valores Retenidos        | Retribución              | Deducción           | Valores Retenidos       | Retribución           | Deducción   | Valores Retenidos   |                          |
| Acta 17          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 530.866.952,85           | 0,00                | 0,00                    | 52.966,18             | 0,00        | 0,00                | 530.919.919,03           |
| Acta 18          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 539.187.113,10           | 0,00                | 0,00                    | 1.297.618,77          | 0,00        | 0,00                | 540.484.731,87           |
| Acta 19          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 530.203.801,23           | 0,00                | 0,00                    | 14.399,41             | 0,00        | 0,00                | 530.218.200,64           |
| Acta 20          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 535.262.205,61           | 0,00                | 0,00                    | 3.859,48              | 0,00        | 0,00                | 535.266.065,09           |
| Acta 21          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 529.900.305,59           | 0,00                | 0,00                    | 125,38                | 0,00        | 0,00                | 529.900.430,97           |
| Acta 22          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 559.018.121,44           | 0,00                | 0,00                    | 1.723.918,71          | 0,00        | 0,00                | 560.742.040,15           |
| Acta 23          | 19.972.108.512,66        | 0,00        | 0,00                     | 564.878.735,73           | 0,00                | 0,00                    | 2.248.883,24          | 0,00        | 0,00                | 20.539.236.131,63        |
| Acta 23 USD      | 2.155.616,57             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                | 2.155.616,57             |
| Acta 24          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 556.136.347,20           | 0,00                | 0,00                    | 36.165,60             | 0,00        | 0,00                | 556.172.512,80           |
| Acta 25          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 608.891.446,91           | 0,00                | 0,00                    | 244.541,01            | 0,00        | 0,00                | 609.135.987,92           |
| Acta 26          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 575.350.983,14           | 0,00                | 0,00                    | 250.683,18            | 0,00        | 0,00                | 575.601.666,32           |
| Acta 27          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 591.090.588,22           | 0,00                | 0,00                    | 3.879,88              | 0,00        | 0,00                | 591.094.468,10           |
| Acta 28          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 590.834.172,96           | 0,00                | 0,00                    | 1.655,07              | 0,00        | 0,00                | 590.835.828,03           |
| Acta 29          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 534.891.079,41           | 0,00                | 0,00                    | 2.138.750,58          | 0,00        | 0,00                | 537.029.829,99           |
| Acta 30          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 623.438.262,96           | 0,00                | 0,00                    | 2.159.686,85          | 0,00        | 0,00                | 625.597.949,81           |
| Acta 31          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 542.723.495,72           | 0,00                | 0,00                    | 23.588,35             | 0,00        | 0,00                | 542.747.084,07           |
| Acta 32          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 584.124.581,87           | 0,00                | 0,00                    | 15.933,28             | 0,00        | 0,00                | 584.140.515,1            |
| <b>Total COP</b> | <b>37.908.536.782,03</b> | <b>0,00</b> | <b>20.520.742.206,84</b> | <b>18.342.516.784,49</b> | <b>9.320.000,00</b> | <b>4.210.829.060,79</b> | <b>30.052.735,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.609.653,63</b> | <b>81.008.967.222,85</b> |
| <b>Total USD</b> | <b>4.314.694,31</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.269.234,74</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.583.929,05</b>      |

- De las retribuciones a las que el concesionario tenía derecho en etapa de operación y mantenimiento, de las unidades funcionales 1 y 2, solo faltan las del mes de diciembre de 2024, hasta la fecha del 19, las cuales están en trámite actualmente.
- Con respecto a la retribución en etapa de reversión, con el objetivo de reconocer los valores de operación y mantenimiento que el concesionario debe realizar en esta etapa, esta interventoría está preparando un concepto jurídico, financiero con recomendaciones hacia la entidad, dado que lo que está establecido en el contrato, es para una reversión normal generado por el cumplimiento del VIP, lo que no ocurrió en este contrato, ya que se generó fue por una terminación anticipada decretada por un Tribunal de Arbitramento.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 401 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 12.16 RETRIBUCIÓN DEL DIFERENCIAL DE RECAUDO (DR8)

Considerando que el 20 de diciembre de 2022 se cumplió el año 8 de ejecución del contrato y en consecuencia se hizo necesario el reconocimiento del diferencial de recaudo (DR8) establecido en el Contrato de Concesión, durante mayo de 2023 la Interventoría se reunió con la Gerencia Financiera de la ANI con el fin de alinear los criterios de la metodología de cálculo.

En este sentido, mediante comunicación ANI 2023-409051971-2 del 11 de mayo de 2023, la Interventoría remitió a la Agencia el cálculo del DR8 conforme a la metodología establecida en el Acta Aclaratoria con Efectos Transaccionales. En la comunicación se determinó el criterio de fecha de finalización del mes 96 (año 8 de concesión); adicionalmente, se estableció que la fecha de finalización del mes 96 del DR8 correspondería a noviembre 30 de 2022, el mes 1 correspondería a diciembre de 2014 y la variable  $q$  de la fórmula de cálculo del DR definida como "Número de meses transcurridos entre el Mes de Referencia y el Mes de la Fecha de Inicio.", tendría el valor de 23, contado hasta noviembre de 2014. De esta forma se detalló el cálculo que se presenta a continuación:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| ICP        | 0,999880                  |
| VPIP 8     | 198.625.240.698,00        |
| VPIP 96    | 97.653.488.712,986200000  |
| IPCf       | 124,46                    |
| IPCr       | 78,05                     |
| f+q        | 119                       |
| TDI        | 0,005671                  |
| <b>DR8</b> | <b>\$ 315.544.017.487</b> |

Distribuido de la siguiente forma por unidad funcional:

| <b>Distribución por UF</b> |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>UF</b>                  | <b>% Distribución Contractuales</b>  |
| UF1                        | 9,17%                                |
| UF2                        | 15,56%                               |
| UF3                        | 16,81%                               |
| UF4                        | 30,80%                               |
| UF5                        | 27,66%                               |
| <b>Distribución por UF</b> |                                      |
| <b>UF</b>                  | <b>Distribución Contractuales \$</b> |
| UF1                        | \$ 28.935.386.403,56                 |
| UF2                        | \$ 49.098.649.120,98                 |
| UF3                        | \$ 53.042.949.339,56                 |
| UF4                        | \$ 97.187.557.386,00                 |
| UF5                        | \$ 87.279.475.236,90                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 402 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

De estos valores según el acta de entendimiento solo se giró al fideicomiso el valor de las primeras tres unidades funcionales que son las que tenían la disponibilidad de la infraestructura.

De acuerdo con lo anterior, el 26 de mayo de 2023 la Fiduciaria certificó el pago de los recursos detallados en la resolución 20233060005525 del 15 de mayo de 2023, por concepto de DR8 por un total de \$131.076.984.864,00 a la subcuenta recaudo de peaje, tal y como se presenta a continuación:

| No. De Cuenta | Valor             | Fecha              |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 31-336552-71  | \$ 65,538,492,432 | 24 de mayo de 2023 |
| 31-336552-71  | \$ 65,538,492,432 | 24 de mayo de 2023 |

En consecuencia, desde el área financiera se dio concepto de no objeción para la firma del Acta de Cálculo 1 con fecha de 29 de mayo de 2023, de reconocimiento del DR8 en la cual se determinó que de acuerdo con los porcentajes de participación asociados a cada Unidad Funcional en la Sección 4.1 de la Parte Especial del Contrato y del estado de disponibilidad de la infraestructura, se procedería a pagar solo lo concerniente a las unidades funcionales 1 y 3 del valor del diferencial de recaudo del año 8 de la siguiente manera:

| Distribución por UF |                            |                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| UF                  | % Distribución Contractual | DR8                 |
| 1                   | 9,17%                      | \$28.935.386.403,56 |
| 3                   | 16,81%                     | \$53.042.949.339,56 |

Así mismo se procedió con el Acta de Cálculo 2 con fecha de 09 de junio de 2023, para reconocer el diferencial de recaudo del año 8 para la unidad funcional 2, así:

| Distribución por UF |                            |                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| UF                  | % Distribución Contractual | DR8                 |
| 2                   | 15,56%                     | \$49.098.649.120,98 |

El 30 de mayo de 2023 se realizó el traslado de los recursos a las subcuentas de las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 de la siguiente forma, desde donde fueron pagados y reconocidos los valores por concepto del diferencial de recaudo hacia el concesionario:

| FECHA      | NO. DE CUENTA | NOMBRE DE CUENTA             | RUBRO                  | VALOR                |
|------------|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 30/05/2023 | 3139577981    | SUBCUENTA RECAUDO PEAJE UF 1 | RECONOCIMIENTO DEL DR8 | \$ 28.935.386.403,00 |
| 30/05/2023 | 3139578278    | SUBCUENTA RECAUDO PEAJE UF 2 | RECONOCIMIENTO DEL DR8 | \$ 49.098.649.121,00 |
| 30/05/2023 | 3139578375    | SUBCUENTA RECAUDO PEAJE UF 3 | RECONOCIMIENTO DEL DR8 | \$ 53.042.949.340,00 |

A la fecha los valores correspondiente a las unidades funcionales 4 y 5 que se encuentran en el proceso jurídico del EER y que no tienen la infraestructura disponible no han sido girados al P.A.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 403 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 12.17 LAUDO TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

El 19 de diciembre de 2024, se entregó el Laudo Arbitraje Internacional ICDR Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. vs ANI por parte del Tribunal Arbitral internacional, en donde se resolvió ordenar y declarar la Terminación Anticipada del Contrato acogiendo lo dispuesto en la Sección 14.1 (e) del Contrato de Concesión *“pero sobre la base de una causa imputable a la ANI al no haber detectado oportunamente los manantiales. Asimismo, la mala fe de la ANI implicó que transcurrieran los 730 días sin llegar a acuerdos para la superación del EER de las UFs 4 y 5, y que el Proyecto resultara inviable. Se declara la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la fecha de la notificación de este Laudo;”*.

Así mismo, el tribunal condenó a la ANI al pago de una indemnización en los siguientes términos:

*“En resumen, la ANI deberá pagar a POB, COP \$413.605.900.000, por los costos incurridos respecto a las UFs 4 y 5; COP \$119.500.000.000, por la no reducción proporcional a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría; y COP \$803.300.000.000 por pérdida de utilidad respecto de las UF, por un total de COP \$1.336.405.900.000”*.

A la fecha de corte de este informe se están llevando a cabo las mesas de trabajo que permiten de la Etapa de Reversión para abordar las temáticas reguladas en el contrato y que permitirán llevar a cabo la posterior liquidación en los términos técnicos, jurídicos y financieros pertinentes.

### 12.18 AUDITORIA AL PATRIMONIO AUTONOMO

En el presente informe se detallará la forma en la que está Interventoría ha cumplido con la Auditoría del P.A desde su constitución y según el alcance establecido en la minuta estándar.

Dentro del contenido del informe mensual y desde el primer mes del contrato de Interventoría se han venido incorporado numerales donde se evidencian los requerimientos y controles realizados desde la Interventoría dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

- 1) Control y seguimiento a los aportes equity realizados por el Concesionario.
- 2) Control y seguimiento a los fondeos realizados por el Concesionario a las cuentas de destinación específica del contrato.
- 3) Verificación de los rendimientos generados en cada una de las subcuentas proyecto y subcuentas ANI. Así como el manejo que se le da de acuerdo con la subcuenta donde se genere y a lo estipulado en el contrato.
- 4) Seguimiento y verificación de las condiciones contractuales de los flujos de caja de las subcuentas proyecto y subcuentas ANI.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 404 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- 5) Seguimiento y verificación al manejo dado a los recursos que provienen de los recaudos realizados por el Concesionario en los peajes, recursos que incluyen FSV y sobrantes.
- 6) Análisis de los estados financieros mensuales entregados por el P.A.
- 7) Asistencia al comité mensual de Fiducia, del cual se adjuntan los temas más relevantes consignados en las respectivas actas.

Se detalla a continuación la forma en la que Interventoría cumplió con la Auditoría del P.A durante el mes de este reporte y según el alcance establecido en la minuta estándar.

Dentro del contenido del presente informe mensual se incluyen numerales donde se evidencian los requerimientos y controles realizados desde la Interventoría los cuales se enumeran y describen a continuación para este periodo:

- 1) Control y seguimiento a los aportes equity realizados por el Concesionario. Descrito en el numeral 1.2.1.
- 2) Control y seguimiento a los fondeos realizados por el Concesionario a las cuentas de destinación específica del contrato. Descrito en el numeral 1.2.2.
- 3) Verificación de los rendimientos generados en cada una de las subcuentas proyecto y subcuentas ANI. Así como el manejo que se le da de acuerdo con la subcuenta donde se genere y a lo estipulado en el contrato. Descrito en el numeral 1.6.
- 4) Seguimiento y verificación de las condiciones contractuales los flujos de caja de las subcuentas proyecto y subcuentas ANI. Realizado en los numerales 1.7.
- 5) Análisis de los estados financieros mensuales entregados por el P.A.: Ver Numeral 1.10 ESTADOS FINANCIEROS.
- 6) Seguimiento y verificación al manejo dado a los recursos que provienen de los recaudos realizados por el Concesionario en los peajes, recursos que incluyen FSV y sobrantes. Dentro del numeral 1.13. TRAFICO Y RECAUDO se observa la forma en que se realiza esta actividad.
- 7) Asistencia al comité mensual de Fiducia, del cual se adjuntan los temas más relevantes consignados en las respectivas actas, ver numeral 1.12.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 405 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 12.19 GESTIONES DE LA INTERVENTORIA

- En relación con el incumplimiento de la subcuenta Compensaciones Ambientales, la Interventoria mediante comunicación 20244090005982 del 04 de enero de 2024 remitió el informe de incumplimiento en el cual se determina que el Concesionario tiene un valor pendiente por pagar a la subcuenta equivalente a \$100.55.564, de los cuales \$43.428.165 corresponden a valor pendiente de fondeo de la subcuenta y \$57.131.399 corresponden a intereses. Adicionalmente, se tasó una multa equivalente a \$29.041.067.920.
- En relación con los incumplimientos del Concesionario frente a los fondeos de la subcuenta Interventoría y Supervisión, dada la postura expresada en el laudo por parte del Tribunal de Arbitramento, estos se dejan sin proceso jurídico y se revisaran al momento de la liquidación del contrato de Concesión.
- El 08 de diciembre de 2024, el Concesionario tenía la obligación contractual de realizar el fondeo anual 10 a la subcuenta. Realizó un aporte el 10 de diciembre de 2024, por \$646.726.500 (\$dic 2012). Este valor da cumplimiento a lo contractualmente establecido. Sin embargo, financieramente, primero se abonaron los pequeños valores adeudados a capital e intereses del aporte No. 9, quedando nuevamente un saldo por pagar del 10, por lo que debe recalcularse la deuda por el valor pendiente por fondear e iniciar el respectivo proceso jurídico.
- Durante el mes de marzo de 2025, la Interventoría remitió a la ANI el SIAC financiero con cifras correspondientes a febrero de 2025.
- Se requirió al Concesionario para la entrega del listado de ellos activos que ellos consideran son reversibles, al corte del mes de marzo no lo habían entregado. Así mismo se solicitó formalmente a la Fiduciaria la entrega de la cuantificación de los registros contables realizados en el P.A desde el inicio del contrato de Fiducia, información que tampoco ha sido suministrada por parte de ellos.

## 12.20 RECOMENDACIONES Y PUNTOS RELEVANTES

- El 19 de diciembre de 2024, se entregó el Laudo por parte del Tribunal Arbitral Internacional, en donde se resolvió ordenar y declarar la Terminación Anticipada del Contrato, así mismo, el tribunal condenó a la ANI al pago de una indemnización a POB, de \$413.605.900.000, por los costos incurridos respecto de las UFs 4 y 5; \$119.500.000.000, por la no reducción proporcional a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría; y \$803.300.000.000 por pérdida de utilidad respecto de las UF, por un total de \$1.336.405.900.000”.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 406 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

A la fecha de corte de este informe se están programando las mesas de trabajo que permitan en la Etapa de Reversión abordar las temáticas reguladas en el contrato y llevar a cabo la posterior liquidación en los términos técnicos, jurídicos y financieros pertinentes.

- En 2024, la ANI tenía la obligación de realizar el aporte 8, equivalente a \$183.157.392.243 (\$ corrientes). El 11 de febrero de 2025 la ANI giró al Patrimonio Autónomo recursos equivalentes a \$106.238.744.306. A la fecha de presentación de este informe, se está a la espera del pronunciamiento de la Agencia considerando el Laudo Tribunal de Arbitramento del 19 de diciembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a procedimiento de distribución de vigencias futuras por unidad funcional.
- En diciembre de 2024 el Concesionario presentaba la obligación de realizar el fondeo 10 a la Subcuenta de Soporte Contractual; en este sentido realizó un aporte el 10 de diciembre de 2024, por \$646.726.500 (\$dic 2012). No obstante, tenía un saldo pendiente correspondiente al aporte 9 de diciembre de 2023, que debe ser cuantificado nuevamente en función de los intereses generados y la transferencia realizada en diciembre de 2024.
- De igual forma en la verificación del estado de los fondeos, se detectó un faltante en la subcuenta de compensaciones ambientales, por lo que se solicitó a la ANI no objeción a periodo de cura para que el concesionario cumpla la obligación. Debido a que la Agencia emitió su no objeción, la Interventoría notificó al Concesionario sobre el periodo otorgado para fondear el valor correspondiente.

En enero de 2024 la Interventoría remitió a la ANI el informe de incumplimiento en el cual se determinó que el Concesionario tiene un valor pendiente por pagar a la subcuenta equivalente a \$100.55.564, de los cuales \$43.428.165 corresponden a valor pendiente de fondeo de la subcuenta y \$57.131.399 corresponden a intereses. Adicionalmente, se tasó una multa equivalente a \$29.041.067.920.

- De los fondeos de la subcuenta Interventoría y Supervisión, dada la postura expresada en el laudo por parte del Tribunal de Arbitramento, estos se dejan sin proceso jurídico y se revisaran al momento de la liquidación del contrato de Concesión.
- Considerando el inicio de la Etapa de Reversión el 20 de diciembre de 2024, en cumplimiento por lo determinado en el Laudo Arbitral Internacional, se llevó a cabo el cálculo del VPIP hasta el 19 de diciembre de 2024, fecha correspondiente al último día de Etapa de Operación.  
Respecto al valor contractual del mes 156, es decir el año 13 de concesión, se alcanzó el 65,31% del VPIP. En relación con el VPIP total contractual, se alcanzó el 38,30%.

Con este valor se da alcance a los valores presentados en informes anteriores, correspondientes al VPIP obtenido para diciembre 2024, enero y febrero de 2025, que superan la fecha de finalización de la Etapa de Operación del contrato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 407 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

El cálculo presentado incluye valores de compensación especial por la no instalación del peaje Choachí por valor de \$8.806.518.602 y los valores del reconocimiento en el DR8 y el valor de descuento en su pago por índice de cumplimiento.

- Se realizó el comité fiduciario de seguimiento de febrero de 2025, el día 25 de marzo de 2025.

### 12.21 CONCLUSIÓN

La Interventoría ha venido realizando las verificaciones del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato y participando en las mesas de trabajo acordadas para la ejecución de la Etapa de Reversión del Contrato, de acuerdo con lo establecido por el Laudo del Tribunal Arbitral Internacional del 19 de diciembre de 2024. En este sentido, se ha determinado que, el Concesionario ha presentado incumplimientos en pagos de los fondeos e intereses de mora por desplazamientos en las subcuentas de Soporte Contractual y Compensaciones Ambientales. Adicionalmente, no ha presentado documentos financieros en los términos que establece el contrato de concesión, por lo que se han adelantado las solicitudes y procesos para el cumplimiento de las obligaciones.

Las partes: ANI, Concesionario, Interventoría y Fiducia vienen adelantando las acciones encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones en la etapa de reversión, sin embargo, es importante que el equipo de trabajo solicitado a la agencia sea aprobado para poder avanzar según tiempos contractuales del concesionario.

Respecto a las demás obligaciones, el Concesionario ha dado cumplimiento como se presenta en este informe.

### 12.22 BIBLIOGRAFÍA

- Fiduciaria Bancolombia - Sociedad Fiduciaria; Informe Mensual de Rendición de Cuentas – FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO PERIMETRAL DE ORIENTE DE BOGOTÁ – FEBRERO DE 2025.
- Fiduciaria Bancolombia – Sociedad Fiduciaria; Certificaciones Mensuales - FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO PERIMETRAL DE ORIENTE DE BOGOTÁ – MARZO DE 2025.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 408 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 13 GESTIÓN JURÍDICA

En concordancia con el Contrato de Interventoría No. VEJ-542 de 2022 y su anexo 4; referente a la Metodología y Cargas de Trabajo, se hace mención al Área Jurídica como parte de la Gestión que debe realizarse por parte de la Interventoría en desarrollo del Contrato de Concesión Número 002 de fecha 08 de septiembre de 2014, por medio del cual se establece como objetivo específico de dicha área *"Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato."*

De este modo, dando aplicación a las actividades que se encuentran a cargo del Área Jurídica bajo el margen del Contrato de Interventoría No. VEJ-542 de 2022, cuyo objetivo principal es el seguimiento y control integral al Contrato de Concesión No. 002 de fecha 08 de septiembre de 2014, se informa la gestión del área jurídica para el periodo comprendido entre el 1º y el 31 de marzo de 2025, así:

#### 13.1 FUNCIONES GENERALES

**Tabla 226 Funciones Generales**

| <b><u>FUNCIÓN</u></b>                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>SEGUIMIENTO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.</u>                                                                                                 | <p>El Área Jurídica de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR ERS se encuentra a disposición de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para estudiar y conceptuar sobre aquellas consultas, sugerencias y requerimientos a que haya lugar en el desarrollo del Contrato de Concesión Número 002 de fecha 08 de septiembre de 2014.</p> <p>Ahora bien, durante el mes de marzo de 2025, el Consorcio Interventor ERS estuvo atento para atender cualquier situación que se presentara en relación con la situación actual del Proyecto en cada Unidad Funcional, y brindó asistencia a cada una de las reuniones sostenidas sobre el particular.</p> <p>Al respecto, en la Tabla No. 234 se indican los conceptos emitidos por el área jurídica durante el mes de marzo de 2025.</p> |
| <u>Efectuar la proyección, realización, estudio y análisis de los documentos contractuales que se llegasen a elaborar durante la vigencia de la Interventoría, así como el estudio, revisión, análisis y conceptos de la totalidad de</u> | <p>El Área Jurídica de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR ERS se encuentra a disposición para efectuar la proyección, realización, estudio y análisis de los documentos contractuales que se llegasen a elaborar durante la vigencia del Contrato de Interventoría, así como el estudio, revisión, análisis y conceptos de la totalidad de documentos legales del Contrato de Concesión Número 002 de fecha 08 de septiembre de 2014.</p> <p>Es menester informar que esta Interventoría continúa ejecutando sus labores de seguimiento, verificación y control, acatando en todo, los lineamientos establecidos para el efecto por parte del Gobierno Nacional, así como la Agencia Nacional de Infraestructura, haciendo uso de los</p>                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 409 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>documentos legales del Contrato de Concesión.</u>                                                                                                                                                                                                                                       | medios virtuales determinados para tal fin, cumpliendo con cada requerimiento efectuado por la ANI. Durante este periodo se realizó el estudio y análisis de los documentos contractuales y legales que sustentaron los conceptos que se relacionan en la Tabla 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Comunicar al Concesionario las sanciones que se generen por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se establecen en el Contrato de Concesión, sus Apéndices y sus Anexos, de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto en el Contrato de Concesión.</u> | <p>El Área Jurídica de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR ERS, se encuentra atenta y realizando actividades de seguimiento, vigilancia y control, atendiendo los parámetros establecidos en el Contrato de Concesión No. 002 de fecha 08 de septiembre de 2014 así como en sus Apéndices y Anexos, con la finalidad de conminar el cumplimiento de todas las actividades requeridas, y de no ser así identificar las posibles sanciones a las que puede ser acreedora la Sociedad Concesionaria POB S.A.S y proceder a su comunicación. Por lo anterior, esta Interventoría se encuentra ejecutando las actividades de seguimiento, vigilancia y control previstas para el buen funcionamiento de la misma.</p> <p>Es así como en la Tabla 232 se enlistan los diferentes presuntos incumplimientos que han sido notificados al Concesionario por parte del Interventor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Constatar la suscripción de Pólizas de calidad y cumplimiento a cargo del Concesionario y a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y velar por la buena calidad de documentos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.</u>                                       | <p>El Área Jurídica de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR ERS se encuentra realizando todas las actividades tendientes a lograr un buen desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de fecha 08 de septiembre de 2014, y el Contrato de Interventoría No. 542 de 2022; entre las cuales se encuentra constatar la suscripción de Pólizas de calidad y cumplimiento a cargo del concesionario y a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.</p> <p>Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto previamente, esta Interventoría se permite manifestar que la Sociedad Concesionaria POB S.A.S deberá dar aplicación a los lineamientos contractuales establecidos para el evento en el cual se produzca la prolongación de una Fase o de una Etapa Contractual, no siendo viable constituir y/o renovar las Pólizas para la Etapa de Operación y Mantenimiento, como quiera que, como es de pleno conocimiento de la Entidad, no será posible dar por terminada la Fase de Construcción y en consecuencia, dar inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento en los términos y condiciones descritos en el Contrato, dado que:</p> <p style="padding-left: 40px;">Se profirió Laudo Arbitral Parcial Final, que ordenó entre otros asuntos, la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión, y, en consecuencia, se dio inicio a la Etapa de Reversión.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente las pólizas vigentes con fecha de corte a 31 de marzo de 2025 se describen en la Tabla No. 227.</p> |
| <u>Preparar para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</u>                                                                                                                                                                                                                                | El Área Jurídica de la Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR ERS se encuentra a disposición de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para preparar las respuestas a todas las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 410 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| <b><u>FUNCIÓN</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>SEGUIMIENTO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras y actividades objeto del contrato de concesión y de esta Interventoría.</u> | <p>Entidades de Control del Estado, y en general todos los requerimientos a que haya lugar en el desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de fecha 08 de septiembre de 2014, y el Contrato de Interventoría No. VEJ-542 del 2022.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, el Área Jurídica de la Interventoría ha realizado la verificación a las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos generados, sobre las cuales lleva el seguimiento el área social. Así mismo, teniendo en cuenta que las mencionadas peticiones, en su mayoría son de carácter técnico, social, ambiental y predial, el área jurídica brinda apoyo y asesoramiento a cada una de las mencionadas áreas.</p> <p>Adicional a lo anterior, esta Interventoría brinda apoyo en la elaboración y revisión a las respuestas proyectadas por parte de la Sociedad Concesionaria a diferentes Derechos de Petición, Acciones de Tutela, Acciones Populares, Acciones de Cumplimiento y demás mecanismos constitucionales utilizados por los diferentes usuarios de la zona de influencia directa e indirecta del Proyecto, así como por el Congreso de la República. Igualmente, a los diferentes requerimientos remitidos por parte de los organismos de control tales como la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación.</p> |

Fuente: Elaboración propia



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 411 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

### 13.2 PÓLIZAS VIGENTES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2025

**Tabla 227 Pólizas vigentes con corte a 31 de marzo de 2025**

| Tabla 227 Pólizas vigentes con corte a 31 de marzo de 2025 |                                                                             |              |                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Póliza                                                 | AMPARO                                                                      | ASEGURADORA  | VALOR ASEGURADO                                                         | VIGENCIA   |            | ESTADO ACTUAL DE APROBACIÓN                                                                                                                                                                                                                            |
| 70941(*)                                                   | Responsabilidad civil extracontractual                                      | CHUBB        | \$54.712.850.736,71<br>Límite por evento                                | 28-01-2025 | 28-01-2026 | Una vez revisadas las pólizas allegadas por el Concesionario, esta Interventoría formuló diversas observaciones sobre las mismas, las cuales serán remitidas al Concesionario mediante requerimiento y a la ANI, mediante concepto en el mes de abril. |
| 4215727                                                    | Cumplimiento del Contrato                                                   | SURAMERICANA | \$15.293.610.762                                                        | 20-12-2024 | 17-08-2025 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | Pago de salarios y prestaciones                                             | SURAMERICANA | \$7.645.877.258                                                         | 20-12-2025 | 19-06-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1480314                                                    | Estabilidad y Calidad de las Obras                                          | SURAMERICANA | \$148.808.180.397,18                                                    | 31/08/2021 | 31/08/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                             |              |                                                                         | 08/04/2022 | 08/04/2027 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | Seguro de Automotores y Seguro de Equipo y Maquinaria (Maquinaria Amarilla) | SURAMERICANA | \$7.534.457.399,10                                                      | 31/08/2021 | 31/08/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                             |              |                                                                         | 08/04/2022 | 8/04/2027  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2147                                                       | Responsabilidad Civil o Todo Riesgo construcción                            | CHUBB        | Sección I<br>\$1.605.173.721.096<br><br>Sección II<br>\$127.576.364.005 | 26-11-2024 | 26-11-2025 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (*) Por la cual se renueva la póliza 64919                 |                                                                             |              |                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: Elaboración propia



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 412 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### 13.3 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Con posterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión las Partes han modificado su contenido a través del Contrato de Transacción suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. del 1 de septiembre de 2023 respecto del Puente Vehicular Teusacá y a través de los siguientes Otrosíes:

**Tabla 228 Otrosíes al Contrato de Concesión No. 002 de 2014**

| Otrosí No. | Generalidades del Otrosí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | El 19 de diciembre de 2014, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión con el objeto de (i) eliminar como requisito para la firma del Acta de Inicio del Contrato la designación de los miembros del Comité del Amigable Compondor y (ii) desarrollar un procedimiento inicial de ratificación de los miembros del Amigable Compondor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2          | El 27 de mayo de 2015 la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión con el propósito de modificar el Numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 “Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras” del Contrato de Concesión y modificar el Numeral 19.27 de la “Tabla de Referencias a la Parte General” prevista en el Capítulo II de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3          | El 2 de diciembre de 2015 la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión con el propósito de (i) aclarar la Tabla 10 – UF2: Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal “b”, (ii) aclarar la Tabla 14 – UF3: Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal “c”, (iii) aclarar la Tabla 17 – UF4: Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal “d”, (iv) aclarar la Tabla 9 – UF2: Obras especiales mínimas, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal “b” y (v) modificar la Tabla 16 – UF4: Obras especiales mínimas del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal “d”. |
| 4          | El 18 de abril de 2016 la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión mediante el cual se modificó la Sección 5.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión respecto de los plazos máximos para el inicio de la operación de las Unidades Funcionales. Mediante este Otrosí se determinó que el Plazo Máximo para el inicio de la Operación de la Unidad Funcional 3 correspondía a veintiún (21) meses contados a partir del 15 de diciembre de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5          | Que, el 19 de agosto de 2016, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión, mediante el cual se modificaron diversas secciones del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesión con el objeto de instrumentalizar el esquema de financiación escogido por el Concesionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6          | El 3 de noviembre de 2016, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión, mediante el cual se modificaron y aclararon diversas secciones del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. Lo anterior, considerando el impacto al tejido social de las comunidades del sector de Santa Rosa y en aras de garantizar la obtención del resultado de las intervenciones a ser realizadas por el Concesionario en condiciones de seguridad y operación de la vía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 413 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Otrosí No. | Generalidades del Otrosí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | Que, el 5 de febrero de 2018, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión, mediante el cual se modificaron y/o adicionaron diversas Secciones de la Parte Especial, del Apéndice Técnico 1 y del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8          | Que, el 23 de agosto de 2019, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 8 al Contrato de Concesión, mediante el cual se modificaron y/o adicionaron diversas Secciones del Apéndice Técnico 1 y del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9          | Que, el 8 de marzo de 2021, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 9 al Contrato de Concesión, mediante el cual (i) se modificó la delimitación de algunas de las coordenadas de inicio de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2) del Apéndice Técnico 1 y la Parte Especial del Contrato de Concesión, (ii) se modificó el Numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 “ <i>Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras</i> ” del Contrato de Concesión y (iii) se adicionó el romanito (v) a la Sección 12.8 de la Parte General del Contrato de Concesión en relación con el seguro de obras civiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10         | <p>Que el 5 de noviembre de 2021, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión, mediante el cual: (i) modificaron el alcance de la Intervenciones en lo que respecta a las características geométricas y técnicas en un sector de 0,27 km de la Unidad Funcional 3, (ii) se modificó la Tabla 3 “Unidades Funcionales del Proyecto” de la Sección 2.4 del Apéndice Técnico 1, (iii) se modificó la Tabla 12 “UF3 Generalidades y Subsectores” de la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1, (iv) se modificó la Tabla 14 “UF3 Características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y viaductos” de la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1, (v) se adicionó el numeral 3.8 en el Apéndice Técnico 1, (vi) se modificó el numeral 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 y (vii) se modificó el numeral 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2, entre otros aspectos allí señalados.</p> <p>Principalmente, se estableció que, la compensación por el riesgo por menor recaudo que había sido activada en virtud de las disposiciones contractuales contenidas en la Sección 3.3. Literal (h) de la Parte General del Contrato de Concesión, subsistió tan solo hasta el 6 de agosto de 2021, dado que, entre las Partes, se suscribió el documento contractual que permitió superar los hechos que generaron la imposibilidad de instalar el Peaje de Choachí.</p> |
| 11         | El 10 de diciembre de 2021 la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 11 al Contrato de Concesión, mediante el cual: (i) se modificó la Tabla 24 contenida en la Sección 3.5 (a) del Apéndice Técnico No. 1 del Contrato de Concesión, (ii) se adicionó el Numeral 3.9 en el Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión, entre otros aspectos allí señalados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12         | El 20 de diciembre de 2022, la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí No. 12 al Contrato de Concesión, mediante el cual: (i) se adicionó y modificó el capítulo I de la Parte General del Contrato; (ii) se modificó la sección 4.17 de la Parte General del Contrato, (iii) se adicionaron los literales (e), (f), (g) y (h) a la Sección 7.1 de la Parte General del Contrato, (iv) se modificó la Sección 4.3 (b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: Elaboración propia de conformidad con los documentos contractuales.

#### 13.4 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Los eventos Eximentes de Responsabilidad son los indicados a continuación:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 414 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 229 Eventos Eximentes de Responsabilidad**

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad /<br><br>Hallazgo Arqueológico en la Unidad Funcional 2ª, encontrado en cumplimiento del Plan de Manejo Arqueológico, y que obliga a adelantar un Plan de Manejo Arqueológico, fase de monitoreo arqueológico. | <b>ACEPTADO</b> por disposición del Panel del Amigable Composición, según fallo del 18 de diciembre de 2018, en el cual se indica que existe el Evento Eximente de Responsabilidad en el sector correspondiente a la zona de la Estación de Pesaje – Báscula K8+890 y demás áreas conexas que resulten afectadas.                                                                                                                                        | Con respecto a estos eventos Eximentes de Responsabilidad, la Interventoría se encuentra realizando el análisis de los efectos del Laudo Arbitral con relación a estos y procederá a radicar el concepto correspondiente durante el mes de abril de 2025. |
| Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad /<br><br>Imposibilidad de adquirir titularidad de predios en la Unidad Funcional 1 del Proyecto.                                                                                                               | <b>ACEPTADO</b> por el panel de amigable composición desde el 29 de mayo de 2019 hasta que se logre la titularidad del bien. (Decisión final del 24 de noviembre de 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad/<br><br>Nacimiento de fuentes de agua (manantiales) en las UF 4 y 5, incluyendo la variante de Choachí.                                                                                                        | <b>ACEPTADO</b> mediante “Acta de Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad y consecuente suspensión de la ejecución de las obras y actividades de intervenciones de las Unidades Funcionales No. 4 y 5, con ocasión de la declaratoria referida en desarrollo del proyecto perimetral de oriente de Cundinamarca Concesión Perimetral oriental de Bogotá S.A.S, contrato bajo el esquema de APP No. 002 de 2014” de fecha 1 de agosto de 2018. |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 415 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 230 Seguimiento Eventos Eximentes de Responsabilidad vigentes**

| EER                       | Causa                                  | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                               | ¿Persiste?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestiones de la Interventoría Consorcio ERS                                | Gestiones del Concesionario                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF 1 Predio<br>UF-1-050-D | EER Por naturaleza jurídica del predio | 29 noviembre de 2019.                                                                                                                                                                                                                         | <p>Es importante destacar que, mediante Laudo Parcial Final de fecha 19 de diciembre de 2024, se ordenó la terminación anticipada del Contrato de Concesión.</p> <p>En atención a lo anterior, la Interventoría se encuentra analizando si, con ocasión de la Terminación Anticipada, los EER siguen vigentes. En el momento en que se tenga completo el análisis se emitirá el concepto respectivo</p> | Durante el mes de marzo de 2025 no se presentaron asuntos sobre este tema. | Durante el mes de marzo de 2025 no se remitieron informes de seguimiento por parte del Concesionario. |
| UF 2<br>Alcaparros        | EER arqueología                        | ERS 3420-2023 POB Controversia 15856 declarando que existe Evento Eximente de Responsabilidad derivado de los hallazgos arqueológicos predio Alcaparros Estación de Pesaje- Unidad Funcional 2. Cumplimiento de la obligación contenida en el | <p>Es importante destacar que, mediante Laudo Parcial Final de fecha 19 de diciembre de 2024, se ordenó la terminación anticipada del Contrato de Concesión.</p> <p>En atención a lo anterior, la Interventoría se encuentra analizando si, con ocasión de la Terminación Anticipada, los EER siguen vigentes. En el momento en que se tenga completo el análisis se emitirá el concepto respectivo</p> | Durante el mes de marzo de 2025 no se presentaron asuntos sobre este tema. | Durante el mes de marzo de 2025 no se remitieron informes de seguimiento por parte del Concesionario. |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                  | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                            | <b>Página 416 de 591</b>                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| EER                                                           | Causa                                                                                                                                                                          | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                        | ¿Persiste?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestiones de la Interventoría Consorcio ERS                                                           | Gestiones del Concesionario                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                | Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 14.2, Literal (d) (vi). Entrega de informe semanal de arqueología.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |
| Evento Eximente de Responsabilidad declarado en las UFs 4 y 5 | La presencia de puntos de agua que generan la presunción de realineamiento de los viales propuestos dado que dentro de las rondas el uso de suelo será de protección forestal. | El 5 de noviembre de 2021 se suscribió entre la ANI y la Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB S.A.S., el Otrosí No. 10 por medio del cual se superan los hechos que dan lugar al EER, determinándose las acciones a seguir para el efecto. | <p>Es importante destacar que, mediante Laudo Parcial Final de fecha 19 de diciembre de 2024, se ordenó la terminación anticipada del Contrato de Concesión.</p> <p>En atención a lo anterior, la Interventoría se encuentra analizando si, con ocasión de la Terminación Anticipada, los EER siguen vigentes. En el momento en que se tenga completo el análisis se emitirá el concepto respectivo</p> | Durante el mes de marzo de 2025 no se remitieron informes de seguimiento por parte del Concesionario. | Durante el mes de marzo de 2025 no se remitieron informes de seguimiento por parte del Concesionario. |

Fuente: Elaboración propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 417 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Respecto de los Eventos Eximentes de Responsabilidad indicados en la Tabla anterior, la Interventoría precisa que: (1) durante el mes de abril de 2025 se estará radicando un concepto sobre el análisis que se encuentra realizando la Interventoría acerca de los efectos del Laudo con relación a la vigencia de cada EER; y (2) en el mes de marzo de 2025 el Concesionario no entregó ningún informe semanal como se indica en la siguiente tabla:

**Tabla 231 Seguimiento informes Eventos Eximentes de Responsabilidad vigentes**

| EER                    | COMUNICACIÓN ENVIADA POR CONCESIONARIO | INFORME DESARROLLO EER SEMANA |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| UNIDAD FUNCIONAL 1     | N/A                                    | No entregó informe            |
| UNIDAD FUNCIONAL 2     | N/A                                    | No entregó informe            |
| UNIDAD FUNCIONAL 4 Y 5 | N/A                                    | No entregó informe            |

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que actualmente la Interventoría está realizando el análisis sobre los efectos del Laudo Arbitral con respecto a la vigencia de los EER, de lo cual para el mes de abril de 2025 la Interventoría radicará un concepto a la ANI, se indica que, de acuerdo con lo que se concluya en dicho concepto se determinará si el Concesionario ha omitido su obligación de presentar informes de seguimiento al EER, o por el contrario ya no se encontraba obligado en tanto el EER ha perdido vigencia.

### 13.5 PROCESOS SANCIONATORIOS

**Tabla 232 - Procesos sancionatorios que se han tramitado durante la ejecución del Contrato de Concesión No.002 de 2014 son los siguientes:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 418 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Apéndice Técnico 1, Sección 4.3, literal (b) y en el Apéndice Técnico 2, Secciones 3.1.5 y 6.2 - Estructuras hidráulicas UF 4 Y 5 -</p>                                   | <p>Proceso Administrativo Sancionatorio Vigente. – No obstante, el Tribunal de Arbitramento Internacional declaró que se suspenda cualquier proceso que la ANI estuviera adelantando sobre hechos que son objeto de la demanda interpuesta por parte del Concesionario en contra de la ANI, no obstante, sobre tal situación no se ha pronunciado el Equipo Sancionatorio de la Entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>Actualizado mediante documento CERS-OP-3099-2023 de 27 de octubre de 2023 (RAD. ANI 20234091238462 de la misma fecha) - Actualización del informe de incumplimiento identificado con el número CP-PER-6512-2020 de fecha 28 de enero de 2020 (RAD. ANI 2020-409-008231-2).</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 3.14(i)(iv) de la Parte General Contrato de Concesión No. 002 de 2014, y en la Sección 4.5, Literal (e) de la Parte Especial del referido Contrato. - Fondeo Subcuenta Interventoría anualidad 2020.</p> | <p>Proceso Administrativo Sancionatorio Vigente. El Plazo de Cura se venció el 20 de julio de 2020. La anterior interventoría manifestó que persistía el incumplimiento, y así lo informó a la entidad mediante comunicación CP-PER-7592C-2020 (RAD. ANI 20204090703322).</p> <p>Actualizado mediante documento CERS-OP-2120-2023 (RAD. ANI 20234090863472 del 02 de agosto de 2023) - Actualización de los informes de incumplimiento identificados con los números CP-PER-7592C-2020 del 30 de julio de 2020 (RAD. ANI 20204090703322) y CP-PER-11197C-2022 del 1º de abril de 2022 (RAD. ANI 20224090373962).</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| <p>Solicitud de entrega de información comunicación INVIAS SF 24245 - FOSEVI</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>El Plazo de cura se venció el 23 de agosto de 2021, persistiendo el incumplimiento según lo manifestado por la anterior interventoría, dado lo cual, el día 25 de agosto de 2021, mediante comunicación CP-PER-9870C-2021 (RAD. ANI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>El 10 de septiembre del 2024, se llevó a cabo la audiencia que dio inicio al procedimiento sancionatorio contractual en contra del Concesionario, en la cual, el Concesionario remitió la comunicación No. D-1154-2024 del 10 de septiembre del 2024, en la cual informó el cumplimiento de las obligaciones de la Sección 4.5. de la Parte General</p>                                                                                          |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 419 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                 | TRAZABILIDAD                                                                                                       | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 20214090970692), la Interventoría anterior solicitó el inicio del proceso sancionatorio.                           | <p>mencionadas en el numeral 1.16. En dicha audiencia, en consideración a lo solicitado por el Concesionario, la Gerente del Grupo de Procedimiento Sancionatorios Contractuales de la ANI suspendió el trámite y solicitó a esta Interventoría la revisión de los documentos remitidos por el Concesionario y la actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>En razón a lo anterior, mediante CERS-OP-2286-2024 del 24 de septiembre del 2024, esta Interventoría solicitó el archivo del proceso sancionatorio en contra del Concesionario, en tanto que se evidenció que el Concesionario remitió la información en el formato o GCSP-F-311, y de esta manera cumplió con las obligaciones de la Parte General, Sección 4.5, Literal (k).</p> <p>Mediante auto con radicado No. 20247070001966 del 21 de octubre del 2024, la Gerente del GIT sancionatorios incorporó al expediente unas pruebas y se reprogramó la reanudación de la audiencia.</p> <p>El 30 de octubre del 2024 se reanudó la audiencia de que trata el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, en la cual la gerente ordenó el CIERRE del proceso sancionatorio en contra del Concesionario, en consideración al memorando No. 20243060167333 remitido por la vicepresidencia ejecutiva, en el cual allegó la respuesta de la interventoría a la prueba decretada el día 10 de septiembre de 2024, contenida en el oficio CERS-OP-2286-2024 de 24, en el cual se advirtió del cumplimiento del Concesionario.</p> |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 | Procedimiento Administrativo cerrado. El Plazo de cura se venció el 03 de diciembre de 2021. Dado que persistió el | Esta Interventoría mediante comunicado con radicado ANI 20234090092052 de fecha 26 de enero de 2023 solicitó el cierre del mismo indicando que la imposición de multas ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 420 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de 2014, Parte General, Sección 12.3., Literales (b) y (m) y Sección 14.2, literal (g), romanito (iii); así como de las disposiciones contenidas en el Apéndice Financiero 3 “Garantías y Seguros” – Póliza de Seguro de Obras Civiles.                                                                                            | incumplimiento, el día 9 de diciembre de 2021, mediante comunicación CP-PER-10502C-2021 (RAD. ANI 20214091429102), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE INFORME MEDIANTE COMUNICACIÓN CP-PER-11553C-2022 DEL 01 DE JUNIO DE 2022. (RAD. ANI No. 20224090613852).                                                                             | no es viable toda vez que las garantías sobre las cuales versan los incumplimientos ya no están vigentes. No obstante, mediante comunicado CERS-OP-674-2022 (sic) (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023) se radicó informe de incumplimiento, en respuesta a lo solicitado por la ANI mediante radicado 20233060049371 del 16 de febrero de 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solicitud de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 3.14(i)(iv) de la Parte General Contrato de Concesión No. 002 de 2014, y en la Sección 4.5 (e) de la Parte Especial del referido Contrato – Fondeo Subcuenta de Interventoría.                                                                              | Procedimiento Administrativo Sancionatorio vigente- El Plazo de cura se venció el 29 de marzo de 2022. Dado que persistía el incumplimiento, el día 31 de marzo de 2022, mediante comunicación CP-PER-11197C-2022 (20224090373962), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.                                                                                                    | Considerando que el incumplimiento persiste, esta Interventoría actualizó los informes de incumplimiento identificados con los números CP-PER-7592C-2020 del 30 de julio de 2020 (RAD. ANI 20204090703322) y CP-PER-11197C-2022 del 1º de abril de 2022 (RAD. ANI 20224090373962), mediante comunicación CERS-OP-2120-2023 (RAD. ANI 20234090863472 del 02 de agosto de 2023).                                                                                                                                                                                                                                               |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 12.3., Literales (b) y (m) y Sección 14.2, literal (g), romanito (iii); así como de las disposiciones contenidas en el Apéndice Financiero 3 “Garantías y Seguros”. (Póliza de Seguro de Obras Civiles) | El Plazo de cura se venció el 06 de mayo de 2022, persistiendo el incumplimiento, dado lo cual, el día 09 de mayo de 2022, mediante comunicación CP-PER-11391C-2022 (RAD. ANI 20224090512832), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE INFORME MEDIANTE COMUNICACIÓN CP-PER-11553C-2022 DEL 01 DE JUNIO DE 2022. (RAD. ANI No. 20224090613852). | Este procedimiento fue incluido dentro del Informe de Interventoría en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 identificado con número CERS-OP-674 (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023). Así las cosas, teniendo en cuenta que en este informe CERS-OP-674 lo que se hizo fue mutar de multa a incumplimiento los procesos que Intervías 4G había iniciado frente a pólizas, se aclara que el proceso iniciado mediante comunicación CP-PER-11391C-2022 (RAD. ANI 20224090512832) se encuentra contenido en el CERS-OP-674-2022 RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 421 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ahora bien, también es importante mencionar que, como se aprecia de la columna de “TRAZABILIDAD” de este procedimiento, lo último que hizo al respecto la anterior Interventoría fue emitir la ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN en el comunicado <b>CP-PER-11553C-2022 DEL 01 DE JUNIO DE 2022. (RAD. ANI No. 20224090613852)</b>. En esta unificación Intervías 4G incluyó tanto el informe <b>CP-PER-11391C-2022</b> como el informe <b>CP-PER-10502C-2021</b> (RAD. ANI 20214091429102), respecto del cual esta Interventoría aclaró en la V1 del informe de agosto de 2023 (y lo reiteró recientemente en la V2 del mismo), lo siguiente:</p> <table><tr><td>Procedimiento Administrativo cerrado. El Plazo de cura se venció el 03 de diciembre de 2021. Dado que persistió el incumplimiento, el día 9 de diciembre de 2021, mediante comunicación CP-PER-10502C-2021 (RAD. ANI 20214091429102), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE INFORME MEDIANTE COMUNICACIÓN CP-PER-11553C-2022 DEL 01 DE JUNIO DE 2022. (RAD. ANI No. 20224090613852).</td><td>Esta Interventoría mediante comunicado con radicación de salida ANI 20234090092052 de fecha 26 de enero de 2023 solicitó el cierre del mismo indicando que la imposición de multas ya no es viable toda vez que las garantías sobre las cuales versan los incumplimientos ya no están vigentes. No obstante, mediante comunicado CERS-OP-674-2022 (sic) (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023) en respuesta a lo solicitado por la ANI mediante radicado 20233060049371 del 16 de febrero de 2023), radicó informe de incumplimiento.</td></tr></table> <p>En esa medida, se aclara que el oficio de solicitud de cierre fue el RAD. ANI 20234090092052 de fecha 26 de enero de 2023, no obstante, lo cual, por solicitud de la ANI, se radicó posteriormente el informe de incumplimiento (no de multa) número CERS-OP-674 (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023).</p> | Procedimiento Administrativo cerrado. El Plazo de cura se venció el 03 de diciembre de 2021. Dado que persistió el incumplimiento, el día 9 de diciembre de 2021, mediante comunicación CP-PER-10502C-2021 (RAD. ANI 20214091429102), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE INFORME MEDIANTE COMUNICACIÓN CP-PER-11553C-2022 DEL 01 DE JUNIO DE 2022. (RAD. ANI No. 20224090613852). | Esta Interventoría mediante comunicado con radicación de salida ANI 20234090092052 de fecha 26 de enero de 2023 solicitó el cierre del mismo indicando que la imposición de multas ya no es viable toda vez que las garantías sobre las cuales versan los incumplimientos ya no están vigentes. No obstante, mediante comunicado CERS-OP-674-2022 (sic) (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023) en respuesta a lo solicitado por la ANI mediante radicado 20233060049371 del 16 de febrero de 2023), radicó informe de incumplimiento. |
| Procedimiento Administrativo cerrado. El Plazo de cura se venció el 03 de diciembre de 2021. Dado que persistió el incumplimiento, el día 9 de diciembre de 2021, mediante comunicación CP-PER-10502C-2021 (RAD. ANI 20214091429102), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE INFORME MEDIANTE COMUNICACIÓN CP-PER-11553C-2022 DEL 01 DE JUNIO DE 2022. (RAD. ANI No. 20224090613852). | Esta Interventoría mediante comunicado con radicación de salida ANI 20234090092052 de fecha 26 de enero de 2023 solicitó el cierre del mismo indicando que la imposición de multas ya no es viable toda vez que las garantías sobre las cuales versan los incumplimientos ya no están vigentes. No obstante, mediante comunicado CERS-OP-674-2022 (sic) (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023) en respuesta a lo solicitado por la ANI mediante radicado 20233060049371 del 16 de febrero de 2023), radicó informe de incumplimiento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en las Secciones 12.3 Literal (b), 12.6, 12.7 Literal (c), y 12.9 de la Parte General del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 – Atención de observaciones realizadas frente a las siguientes                                                                                                                                                                                                 | Cerrado. El Plazo de cura se venció el 20 de mayo de 2022, persistiendo el incumplimiento, dado lo cual, el día 24 de mayo de 2022, mediante comunicación CP-PER-11491C-2022 (RAD. ANI No. 20224090578252), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. Posteriormente, en virtud                                                                                                                                                                                                                                    | Cerrado.<br><br>Mediante Resolución No. 20227070021335 del 23 de diciembre de 2022 el Coordinador del GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios de la Agencia Nacional de Infraestructura declaró la terminación del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por la ANI en contra del Concesionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 422 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pólizas; (i) Responsabilidad Civil Extracontractual No. 48475 (ahora 54042); y (ii) Garantía única de Cumplimiento No. 1480314-1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>de la respuesta del Concesionario mediante comunicaciones D-780-2022, esta Interventoría realizó un alcance al informe, mediante comunicación No. CP-PER-11551C-2022 del 01 de junio de 2022, (RAD. ANI No. 20224090609762), en el cual se informó que, el incumplimiento NO se había superado. Se realizó un nuevo alcance mediante comunicación No. CP-PER-11714C-2022 del 29 de junio de 2022 (RAD. ANI No. 20224090716202), en el cual se informó que, el incumplimiento NO se había superado.</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Apéndice Técnico 1, Sección 4.3: “Intervenciones Prioritarias” y en el Apéndice Técnico 2, Numerales 2.1: “Servicios Obligatorios”, 3.1: “Operación del Proyecto”, 3.1.6: “Integridad del Corredor del Proyecto”, 3.3.7: “Seguridad Vial”, y 6.1 “Alcance General de las Obras de Mantenimiento”. Unidad Funcional 4.</p> | <p>Procedimiento Administrativo Sancionatorio Vigente. El Plazo de cura se venció el 09 de junio de 2022, persistiendo el incumplimiento, dado lo cual, el día 13 de junio de 2022, mediante comunicación CP-PER-11621C-2022 (RAD. ANI No. 20224090661202), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. Posteriormente, en virtud de la respuesta del Concesionario mediante comunicación D-884-2022, dicha Interventoría realizó un alcance al informe, mediante comunicación No. CP-PER-11633C-2022 del 15 de junio de 2022 (RAD. ANI No. 20224090669082), en el cual se informó que, el incumplimiento NO se había superado.</p> | <p>Se instaló Audiencia. La actuación se encuentra suspendida.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 423 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                    | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | <p>Considerando que el incumplimiento persiste, esta Interventoría actualizó el informe de incumplimiento identificado con el número CP-PER-11621C-2022 del 14 de junio de 2022 (RAD. ANI 20224090661202) y su alcance identificado con el número CP-PER-11633C-2022 del 15 de junio de 2022 (RAD. ANI 20224090669082) mediante comunicación CERS-OP-2120-2023 (RAD. ANI 20234090863472 del 02 de agosto de 2023), mediante comunicación CERS-OP- 2149-2023 (RAD. ANI 20234090880512 del 08 de agosto de 2023).</p> <p>En atención a las solicitudes formuladas por la ANI mediante comunicación 20243060000211 del 02 de enero de 2024, esta Interventoría actualizó el Informe de Incumplimiento por las Obligaciones Operación y Mantenimiento de la UF 4, respecto del año 2022 (CP-PER-11621C-2022), mediante radicado ANI 20244090108612, con consecutivo interno CERS-OP-260-2024 el día 29 de enero de 2024.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Apéndice Técnico 1, Sección 4.3: “Intervenciones Prioritarias” y en el Apéndice Técnico 2, Numerales 2.1: | Procedimiento Administrativo Sancionatorio Vigente: El 14 de junio de 2022, mediante comunicación CP-PER-11622C-2022 (RAD. ANI No. 20224090661222), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se instaló Audiencia. La actuación se encuentra suspendida.<br><br>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.<br><br>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 424 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                         | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Servicios Obligatorios”, 3.1: “Operación del Proyecto”, 3.1.6: “Integridad del Corredor del Proyecto”, 3.3.7: “Seguridad Vial”, y 6.1 “Alcance General de las Obras de Mantenimiento”. Unidad Funcional 5.</p> | <p>El informe de incumplimiento fue actualizado por esta Interventoría mediante documento CERS-OP-2436-2023 del 04 de septiembre de 2023 (RAD. ANI 2023409099901 de la misma fecha. En atención a las solicitudes formuladas por la ANI mediante comunicación 20243060000211 del 02 de enero de 2024, esta Interventoría actualizó el Informe de Incumplimiento por las Obligaciones Operación y Mantenimiento de la UF 5 respecto del año 2022 (CP-PER-11622C-2022), mediante radicado ANI 20244090108632, con consecutivo interno CERS-OP-261-2024 el día 29 de enero de 2024.</p> | <p>20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p>                   |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Contrato de Concesión, Parte General, Numerales 1.99 y 4.16 – Memoria Técnica de Operación y Mantenimiento – Unidad Funcional 1.</p>                | <p>El Plazo de cura se venció el 24 de junio de 2022, persistiendo el incumplimiento, dado lo cual, el día 29 de junio de 2022, mediante comunicación CP-PER-11709C-2022 (RAD. ANI No. 20224090715972), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Mediante comunicación con radicado ANI 20224091420992 con fecha 20 de diciembre de 2022 esta Interventoría solicitó el cierre del Proceso Administrativo Sancionatorio.</p> |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Contrato de Concesión, Parte General, Numerales 1.99 y 4.16 – Memoria Técnica de Operación y Mantenimiento – Unidad Funcional 2.</p>                | <p>El Plazo de cura se venció el 25 de junio de 2022, persistiendo el incumplimiento, dado lo cual, el día 29 de junio de 2022, mediante comunicación CP-PER-11713C-2022 (RAD. ANI No. 20224090716142), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Mediante comunicación con radicado ANI 20224091420992 con fecha 20 de diciembre de 2022 esta Interventoría solicitó el cierre del Proceso Administrativo Sancionatorio.</p> |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Contrato de Concesión, Parte</p>                                                                                                                    | <p>Se venció el Plazo de cura el 25 de junio de 2022, persistiendo el incumplimiento, dado lo cual, el día 29 de junio de 2022,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Mediante comunicado con radicado ANI 20224091420992 con fecha 20 de diciembre de 2022 esta Interventoría solicitó el cierre del Proceso Administrativo Sancionatorio.</p>   |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 425 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                            | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General, Numerales 1.99 y 4.16 – Memoria Técnica de Operación y Mantenimiento – Unidad Funcional 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mediante comunicación CP-PER-11708C-2022 (RAD. ANI No. 20224090715932), la Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Acuerdos contenidos en los Numerales 3 y 4 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 2 en relación con el Área Memoria Técnica y Calidad demás que se deriven de ello, así como de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 y Sección 3.2 “Intervenciones”, Literal (a), romanito (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10, en concordancia con lo descrito en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.17 (a) (iv) (2). | Mediante comunicación CP-PER-11721C-2022 del 05 de julio de 2022 (RAD. ANI No. 20224090733632), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. | Comoquiera que al día 01 de septiembre de 2023 el único pendiente de la UF2 era el Puente Teusacá, una vez suscrita la transacción del Puente Teusacá en esa fecha, se entendieron subsanados todos los incumplimientos de la UF 2, tanto así que fue liberada la retribución y el DR8. Por lo tanto, esta Interventoría procedió a informar el cumplimiento de las “obligaciones establecidas en los Acuerdos contenidos en los Numerales 3 y 4 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 2 en relación con el “Área Memoria Técnica y Calidad demás que se deriven de ello, así como de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 y Sección 3.2 “Intervenciones”, Literal (a), romanito (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10, en concordancia con lo descrito en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.17 (a) (iv) (2)” y, por lo tanto, el área técnica de la Interventoría solicitó formalmente el cierre del procedimiento administrativo por medio de radicado interno CERS-OP-3379-2023 con radicado ANI No. 20234091356242 del día 27 de noviembre del 2023. |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Acuerdos contenidos en los Numerales 3 y 4 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 2 en relación con el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mediante comunicación CP-PER-11720C-2022 del 05 de julio de 2022 (RAD. ANI No. 20224090733572), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio. | Cerrado.<br><br>Mediante Resolución 20237070004665 de fecha 24 de abril de 2023, la ANI declaró la terminación del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en contra de Perimetral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 426 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área Predial demás que se deriven de ello, así como de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 y Sección 3.2 “Intervenciones”, Literal (a), romanito (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10, en concordancia con lo descrito en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.17 (a) (iv) (2). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oriental de Bogotá S.A.S., Expediente No. 20227070320700063E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.5, Literal (k) – Solicitud información Programa de Monitoreo Unidades Funcionales 4 y 5.                                                                                                                                                                                                                                       | El Plazo de cura se venció el 05 de julio de 2022, persistiendo el incumplimiento. Por lo tanto, el día 08 de julio de 2022, la anterior interventoría mediante comunicación CP-PER-11760C-2022 (RAD. ANI No. 20224090754342), solicitó el inicio del proceso sancionatorio. Se actualizó informe de incumplimiento mediante comunicado CERS-OP-3098-2023 (RAD. ANI 20234091238332 del 27 de octubre de 2023). | Se instaló la audiencia. La actuación se encuentra suspendida.<br><br>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.<br><br>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar. |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mediante comunicación CP-PER-11861-2022 del 25 de julio de 2022 CP-PER-11760C-2022 (RAD. ANI No. 20224090814742), la anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se remitió el comunicado dirigido a la ANI (CERS-OP-2805-2023 - Rad ANI 20234091131392 del 3 de octubre de 2023, solicitud cierre proceso sancionatorio), para los ACUERDOS DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA UF 2.                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 427 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Resistente NSR10 y Sección 3.2 “Intervenciones”, Literal (a), romanito (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 – en relación con el Centro de Control de Operaciones - Unidad Funcional 2 – Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, en concordancia con lo descrito en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.17 (a) (iv) (2).</i> | Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Por lo anterior, ya se elaboró y radicó el documento correspondiente para el cierre del procedimiento sancionatorio, teniendo en cuenta que se cumplieron las obligaciones por parte del CONCESIONARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo contenido en el Numeral 3 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 2 en relación con el Puente Teusacá II, en concordancia con lo descrito en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.17 (a) (iv) (2).                                                                                             | <p>Mediante comunicación CP-PER-11855-2022 del 25 de julio de 2022 (RAD. ANI No. 20224090814632), la anterior Interventoría solicitó el inicio del proceso sancionatorio.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP- 1292-2023 del 16 de mayo de 2023 (RAD. ANI No. 20234090537732 del 16 de mayo de 2023), esta Interventoría solicitó a la ANI su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario.</p> | <p>Las Partes del Contrato de Concesión suscribieron una transacción al respecto el 1º de septiembre de 2023.</p> <p>Previo a ello, la ANI solicitó a la Interventoría emitir su concepto al respecto, lo cual fue atendido mediante los documentos radicados ante la ANI bajo los números 20234090666052 del 15 de junio de 2023, 20234090684902 de fecha 21 de junio de 2023 y 20234090846092 del 28 de julio de 2023.</p> <p>Así las cosas, toda vez que existe una transacción al respecto, esta Interventoría radicó el 27 de noviembre de 2023, informe de cierre a la entidad, mediante documento CERS-OP-3379-2023 (RAD. ANI 20234091356242 de la misma fecha).</p> |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento a cargo del Concesionario respecto de los                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mediante comunicación CERS-OP-1326-2023 del 10 de mayo de 2023 (RAD. ANI No. 20234090547052 del 18 de mayo de 2023), esta Interventoría solicitó a la ANI                                                                                                                                                                                                                                                   | Se instaló la audiencia, Pendiente rendición de descargos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 428 de 591</b>                   |
|                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                  | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>taludes de la UF 3 (incluyendo el Talud de Arrayanes) establecidas entre otras en la Sección 4.5 (c) de la Parte General del Contrato de Concesión, la Sección 6.3.7 del Apéndice Técnico 2 y la Sección 3.1 del Apéndice Técnico 2.</p> | <p>su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario.</p> <p>Mediante comunicación No. 20233060180731 del 26 de mayo de 2023 la ANI emitió su no objeción al plazo de cura.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP- 1569-2023 del 07 de junio de 2023 (radicada ante el Concesionario el 09 de junio de 2023 bajo el n. ° R-1799-2023, y ante la ANI el 13 del mismo mes y año bajo el n. ° 20234090647862) esta Interventoría notificó al Concesionario el otorgamiento del plazo de cura igual a cinco (5) días hábiles no objetado por la ANI.</p> <p>A través de comunicación CERS-OP-1789-2023 del 30 de junio de 2023, radicado ante la ANI bajo el número 20234090728382 del 30 de junio de 2023 esta Interventoría solicitó el cierre del procedimiento administrativo sancionatorio. Documento al cual se le dio alcance mediante comunicación CERS-OP- 2480-2023 (RAD. ANI 20234091009042 del 06 de septiembre de 2023), en el cual se señaló que, en lo que respecta al Talud Arrayanes, era procedente continuar con el trámite del Procedimiento Administrativo Sancionatorio por las obligaciones presuntamente incumplidas contenidas en</p> | <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                           |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Página 429 de 591</b>                   |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO ACTUAL |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>la Sección 4.4 literal a), romanillos (i) y (v) del Apéndice Técnico 1; así como en la Sección 6.1. del Apéndice Técnico 2. Razón por la cual, mediante comunicación CERS-OP-2439-2023 le fue otorgado un plazo de cura de 5 días hábiles al Concesionario para que saneara dicho presunto incumplimiento con radicado ANI No. 20234090996562 del día 4 de septiembre de 2023 y con radicado ante el POB 4 de septiembre de 2023, con No. R-2799-2023. Finalmente, fue radicado por esta Interventoría, el informe de incumplimiento al amparo del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante comunicación CERS-OP-2727-2023 (RAD. ANI. 20234091091862 del 25 de septiembre de 2023)</p> <p>El 8 de noviembre de 2023, mediante comunicación 20233060403671 la ANI hizo la devolución del informe de incumplimiento, requiriendo a la Interventoría, para que remitiera nuevamente la solicitud atendiendo las observaciones consignadas.</p> <p>Por lo anterior, esta Interventoría radicó los comunicados CERS-OP-3310-2023 de 16 de noviembre de 2023 y CERS-OP-3311-2023, dando respuesta al comunicado con radicado de salida ANI No. 20233060403671 del 08 de noviembre de 2023, mediante los cuales: (i) se</p> |               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 430 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>atendieron las observaciones formuladas por la ANI frente al informe de presunto incumplimiento; y (ii) se remitió el informe por el presunto incumplimiento (incluyendo las observaciones atendidas), respectivamente.</p> <p>Posteriormente, la ANI allegó a la Interventoría comunicación con radicado 20243060105831 de 1 de abril de 2024, solicitando aclaraciones y complementación de la petición de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio contra el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. – POB radicado ANI No. 20234091318482 del 16 de noviembre de 2023 (CERS-OP-3311-2023).</p> <p>Por esto, la Interventoría presentó las comunicaciones CERS-OP-1120-2024 de 30 de abril de 2024 y CERS-OP-1121-2024 de la misma fecha, dando atención a las observaciones formuladas por la ANI frente al informe de presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección 4.4 literal a), romanillos (i) y (v) del Apéndice Técnico 1, así como en la Sección 6.1. del Apéndice Técnico 2 respecto del Talud Arrayanes UF 3. La segunda comunicación mencionada acoge el Informe de Interventoría en cumplimiento de lo</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 431 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Mediante radicado ANI No. 20247070337111 de 19 de septiembre de 2024, se citó al Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y a sus garantes a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en la sección 4.4 literal a), romanillos (i) y (v) del apéndice técnico 1, y de la sección 6.1. del apéndice técnico 2, respecto del talud Arrayanes, dentro del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.</p> <p>El 8 de octubre de 2024, se instaló la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y, en su desarrollo, el despacho decretó como prueba de oficio la de requerir a la Interventoría del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, para que, por medio del equipo de supervisión y coordinación del Contrato de Concesión de la ANI, allegue a esta gerencia un informe en el que conceptúe sobre el contenido y alcance de la decisión de los amigables componedores frente al presunto incumplimiento contenido en la solicitud de inicio que dio origen a este procedimiento administrativo sancionatorio contractual. Por lo anterior, la audiencia fue suspendida.</p> |               |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de<br/>Infraestructura</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                                       | <p>CONSORCIO<br/>INTERVENTOR ERS</p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542<br/>de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p><b>VERSIÓN: 1</b></p>             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <p><b>Página 432 de 591</b></p>      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <p>Fecha: 30 de mayo de 2025</p>     |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>En consideración a lo anterior, mediante comunicación CERS-OP-2463-2024 de 18 de octubre de 2024, la Interventoría presentó ante la ANI el concepto solicitado frente a la decisión del panel de amigables componedores.</p> <p>Mediante auto No. 20247070002026 de 28 de octubre de 2024, el despacho ordenó la incorporación de estos documentos como medios de prueba y dispuso reprogramar la hora para la reanudación de la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para las 2:30 p.m. del mismo 5 de noviembre de 2024.</p> <p>Mediante auto No. 20247070002096 del 5 de noviembre del 2024, el Despacho incorporó unas pruebas, solicitó otras de oficio y suspendió la reanudación de la audiencia. En dicho auto el Despacho requirió a la Interventoría con el fin de aclarar y complementar la comunicación CERS-OP-2463-2024 de 18 de octubre de 2024.</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicación con radicado ANI No. 20243060403891 del 07 de noviembre de 2024, recibida por parte de este Consorcio Interventor ERS (“Interventoría”) el 12 de noviembre del</p> |               |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 433 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO ACTUAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>2024, la Agencia Nacional de Infraestructura solicitó:</p> <p>“Esta Entidad le informa que, la gerencia de Procedimientos Sancionatorios Contractuales presenta las siguientes solicitudes de cara a la actuación administrativa sancionatoria contractual dado que, el día 5 de noviembre de 2024, se expidió el auto Nro. 20247070002096 por el presunto incumplimiento respecto del Talud Arrayanes:</p> <p>“1. SOLICITAR a la Interventoría un alcance al oficio No. CERSOP-2463-2024 de 18 de octubre de 2024, con el fin de que responda puntualmente lo siguiente: ¿Con la decisión adoptada por el panel de amigables componedores el día 2 de septiembre de 2024, se modificaron o no los hechos y las obligaciones presuntamente incumplidas, contenidos en el informe de presunto incumplimiento que dio origen a este procedimiento administrativo sancionatorio contractual?”</p> <p>Al respecto, mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2600-2024 del 13 de noviembre del 2024, la Interventoría dio respuesta a la solicitud presentada por la entidad, informando que, respecto de las cláusulas presuntamente incumplidas, no hay ningún impacto como quiera que, a la fecha, el Concesionario sigue sin ejecutar las obras exigidas en el Talud Arrayanes</p> |               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 434 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                           | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | <p>de conformidad con lo establecido en la Sección 4.4 literal a), romanillos (i) y (v) del Apéndice Técnico 1, y de la Sección 6.1. del Apéndice Técnico 2, por lo cual, para esta Interventoría no han cambiado los fundamentos facticos y jurídico contractuales de cara al presunto incumplimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Presunto incumplimiento intervención sitios críticos Unidades Funcionales 4 y 5. Incumplimiento de las obligaciones de Operación y Mantenimiento a cargo del Concesionario en las Unidades Funcionales 4 y 5.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1328-2023 (RAD. ANI. 20234090547172 del 18 de mayo de 2023), esta Interventoría solicitó a la ANI su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario. Mediante comunicación con radicado ANI número 20233060187601 del 1º de junio de 2023 dicha entidad emitió su No Objeción al Plazo de Cura solicitado.</p> <p>La Interventoría, mediante comunicado CERS-OP-3592-2023 (RAD. ANI 20234091441502 del 15 de diciembre de 2023) emitió alcance a la solicitud de No objeción a Plazo de Cura radicada bajo el número CERS-OP-1328-2023 (RAD. ANI. 20234090547172 del 18 de mayo de 2023). La ANI emitió su no objeción mediante comunicado ANI 20243060002891 del 04 de enero de 2024.</p> <p>La Interventoría, mediante CERS-OP-412-2024 (RAD. ANI 20244090181112 del 13 de febrero de 2024) solicitó a la ANI cerrar</p> | <p>Se instaló la audiencia, Pendiente rendición de descargos.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 435 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO ACTUAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>el plazo de cura No Objetado mediante comunicado 20243060002891. La ANI, en su comunicado 20243060057001 de 17 de febrero de 2024 dio cierre al plazo de cura y solicitó a esta Interventoría notificar del mismo al Concesionario. En consecuencia, la Interventoría emitió comunicación CERS-OP-547-2024 del 27 de febrero de 2024, con radicado ANI 20244090253042, mediante el cual notificó al Concesionario cierre de Plazo de Cura Plazo solicitado mediante comunicado RAD. ANI 20243060057001 del 17 de febrero de 2024.</p> <p>La ANI mediante comunicación con radicado ANI 20243060159761 solicitó concepto a esta Interventoría respecto de la comunicación D-544-2024 de POB. En respuesta, se radicó la comunicación CERS-OP-1418-2024 de 4 de junio de 2024 de asunto “Alcance al radicado ANI No. 20244090644522 del día 28 de mayo 2024, Respuesta a su oficio de Radicado ANI 20243060159761 de 16 de mayo de 2024 de asunto “Solicitud concepto radicado ANI No. 20244090515282 del 30 de abril de 2024 comunicación Estado de Puntos Críticos de las Unidades Funcionales 4 y 5, correspondiente a marzo de 2024. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 436 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>Cundinamarca.” Comunicación D-544-2024. Puntos críticos.”</p> <p>Se radicó un Informe de Incumplimiento unificado respecto de las Intervenciones prioritarias, obligaciones de Operación y Mantenimiento y Sitios Críticos mediante comunicación CERS-OP-1791-2024 de 16/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090858602</p> <p>Mediante comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 de fecha 09 de septiembre de 2024, la ANI solicitó alcance al Informe de Incumplimiento</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2278-2024 y radicado ANI 20244091155952 del 17 de septiembre de 2024 el Consorcio Interventor ERS emitió el alcance solicitado.</p> <p>Posteriormente, mediante comunicación ANI No. 20243060349981 de fecha 27 de septiembre de 2024, la Gerencia de Procedimientos Sancionatorios Contractuales realizó nuevamente observaciones al Informe de Incumplimiento indicando.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2395-2024 del 8 de octubre del 2024, con radicado ANI 20244091249572,</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 437 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO ACTUAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>la Interventoría realizó las precisiones solicitadas por parte de la Gerente de Procedimientos Sancionatorios Contractuales.</p> <p>Mediante comunicación con radicado 20243060410101 del 13 de noviembre de 2024, la ANI presentó ante la Interventoría “Requerimiento respuesta a radicado ANI Nro. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024. Contrato de Interventoría Nro. VEJ-542-2022. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.”</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2625-2024 del 20 de noviembre del 2024, la Interventoría dio respuesta al requerimiento de la ANI donde informó: “nos permitimos aclarar, que, contrario a lo afirmado por la entidad, mediante comunicación con radicado 5143.051ANI CERS-OP-2278-2024 del 17 de septiembre del 2024, con radicado ANI 20244091155952 de la misma fecha (Adjunto), esta Interventoría dio respuesta Oportuna a lo solicitado por la entidad en la comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024, y dio alcance al informe de presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en (i) las Secciones 3.1., 3.1.6., 3.1.5., 3.3.1, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 6, 6.1., 6.2., y 6.4. del Apéndice</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 438 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Técnico 2 del Contrato relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 4 y 5. y (II) La Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5.”</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5, de conformidad con lo establecido en el Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1327-2023 (RAD. ANI20234090547232), esta Interventoría solicitó a la ANI su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario. Mediante comunicación con radicado ANI número 20233060187601 del 1º de junio de 2023 dicha entidad emitió su No Objeción al Plazo de Cura solicitado. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante CERS-OP-1917-2023 la Interventoría otorgó al Concesionario un Plazo de Cura de cinco días hábiles.</p> <p>Esta Interventoría notificó al Concesionario el Plazo de Cura No Objetado por la ANI, mediante comunicado CERS-OP-1917-2023 (RAD. ANI 20234090783462 del 14 de julio de</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 439 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>2023), por lo cual la Interventoría radicó informe de incumplimiento el 22 de noviembre de 2023 mediante CERS-OP-3346 (RAD. ANI 20234091341892 de la misma fecha).</p> <p>La Interventoría, mediante CERS-OP-412-2024 (RAD. ANI 20244090181112 del 13 de febrero de 2024) solicitó a la ANI cerrar el plazo de cura No Objetado mediante comunicado 20243060002891. La ANI, en su comunicado 20243060057001 de 17 de febrero de 2024 dio cierre al plazo de cura y solicitó a esta Interventoría notificar del mismo al Concesionario. En consecuencia, la Interventoría emitió comunicación CERS-OP-547-2024 del 27 de febrero de 2024, con radicado ANI 20244090253042, mediante el cual notificó al Concesionario cierre de Plazo de Cura Plazo solicitado mediante comunicado RAD. ANI 20243060057001 del 17 de febrero de 2024.</p> <p>La ANI mediante comunicación con radicado ANI 20243060159761 solicitó concepto a esta Interventoría respecto de la comunicación D-544-2024 de POB. En respuesta, se radicó la comunicación CERS-OP-1418-2024 de 4 de junio de 2024 de asunto “Alcance al radicado ANI No. 20244090644522 del día 28 de mayo 2024, Respuesta a su oficio de Radicado</p> |               |



|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de<br/>Infraestructura</p> | <p><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                                       | <p><b>CONSORCIO</b><br/><b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542</b><br/><b>de 2022</b></p>                                                                                | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p><b>VERSIÓN: 1</b></p>                           |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <p><b>Página 440 de 591</b></p>                    |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <p><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b></p>            |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO ACTUAL |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>ANI 20243060159761 de 16 de mayo de 2024 de asunto “Solicitud concepto radicado ANI No. 20244090515282 del 30 de abril de 2024 comunicación Estado de Puntos Críticos de las Unidades Funcionales 4 y 5, correspondiente a marzo de 2024. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.” Comunicación D-544-2024. Puntos críticos.”</p> <p>Se radicó un Informe de Incumplimiento unificado respecto de las Intervenciones prioritarias, obligaciones de Operación y Mantenimiento y Sitios Críticos mediante comunicación CERS-OP-1791-2024 de 16/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090858602</p> <p>Mediante comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 de fecha 09 de septiembre de 2024, la ANI solicitó alcance al Informe de Incumplimiento</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2278-2024 y radicado ANI 20244091155952 del 17 de septiembre de 2024 el Consorcio Interventor ERS emitió el alcance solicitado.</p> <p>Posteriormente, mediante comunicación ANI No. 20243060349981 de fecha 27 de septiembre de 2024, la Gerencia de</p> |               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                  | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 441 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>Procedimientos Sancionatorios Contractuales realizó nuevamente observaciones al Informe de Incumplimiento indicando.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2395-2024 del 8 de octubre del 2024, con radicado ANI 20244091249572, la Interventoría realizó las precisiones solicitadas por parte de la Gerente de Procedimientos Sancionatorios Contractuales.</p> <p>Mediante comunicación con radicado 20243060410101 del 13 de noviembre de 2024, la ANI presentó ante la Interventoría “Requerimiento respuesta a radicado ANI Nro. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024. Contrato de Interventoría Nro. VEJ-542-2022. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.”</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2625-2024 del 20 de noviembre del 2024, la Interventoría dio respuesta al requerimiento de la ANI donde informó: “nos permitimos aclarar, que, contrario a lo afirmado por la entidad, mediante comunicación con radicado 5143.051ANI CERS-OP-2278-2024 del 17 de septiembre del 2024, con radicado ANI 20244091155952 de la misma fecha (Adjunto), esta Interventoría dio respuesta</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 442 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO ACTUAL |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>Oportuna a lo solicitado por la entidad en la comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024, y dio alcance al informe de presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en (i) las Secciones 3.1., 3.1.6., 3.1.5., 3.3.1, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 6, 6.1., 6.2., y 6.4. del Apéndice Técnico 2 del Contrato relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 4 y 5. y (II) La Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5.”</p> <p>Mediante radicado ANI No. 20233060463811 del 21 de diciembre de 2023, recibido por esta interventoría el día 26 de diciembre de 2023 la ANI emitió observaciones frente al informe de incumplimiento presentado. Por lo tanto, mediante comunicación CERS-OP-449-2024 de 16 de febrero de 2024 se atendieron las mismas. Finalmente, esta Interventoría presentó la actualización del informe CERS-OP-3346 de 2023 a través</p> |               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                  | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 443 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>de comunicación CERS-OP-873-2024 del 3 de abril de 2024.</p> <p>Se radicó un Informe de Incumplimiento unificado respecto de las Intervenciones prioritarias, obligaciones de Operación y Mantenimiento y Sitios Críticos mediante comunicación CERS-OP-1791-2024 de 16/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090858602</p> <p>Mediante comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 de fecha 09 de septiembre de 2024, la ANI solicitó alcance al Informe de Incumplimiento</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2278-2024 y radicado ANI 20244091155952 del 17 de septiembre de 2024 el Consorcio Interventor ERS emitió el alcance solicitado.</p> <p>Posteriormente, mediante comunicación ANI No. 20243060349981 de fecha 27 de septiembre de 2024, la Gerencia de Procedimientos Sancionatorios Contractuales realizó nuevamente observaciones al Informe de Incumplimiento indicando.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2395-2024 del 8 de octubre del 2024, con radicado ANI 20244091249572,</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 444 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO ACTUAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>la Interventoría realizó las precisiones solicitadas por parte de la Gerente de Procedimientos Sancionatorios Contractuales.</p> <p>Mediante comunicación con radicado 20243060410101 del 13 de noviembre de 2024, la ANI presentó ante la Interventoría “Requerimiento respuesta a radicado ANI Nro. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024. Contrato de Interventoría Nro. VEJ-542-2022. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.”</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2625-2024 del 20 de noviembre del 2024, la Interventoría dio respuesta al requerimiento de la ANI donde informó: “nos permitimos aclarar, que, contrario a lo afirmado por la entidad, mediante comunicación con radicado 5143.051ANI CERS-OP-2278-2024 del 17 de septiembre del 2024, con radicado ANI 20244091155952 de la misma fecha (Adjunto), esta Interventoría dio respuesta Oportuna a lo solicitado por la entidad en la comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024, y dio alcance al informe de presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en (i) las Secciones 3.1., 3.1.6., 3.1.5., 3.3.1, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 6, 6.1., 6.2., y 6.4. del Apéndice</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 445 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                            | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | <p>Técnico 2 del Contrato relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 4 y 5. y (II) La Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5."</p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Presunto incumplimiento obligaciones de Operación y Mantenimiento a cargo del Concesionario en las Unidades Funcionales 4 y 5.</p> | <p>CERS-OP-1917-2023 del 14 de julio de 2023 (RAD. ANI No. 20234090783462 del 14 de julio de 2023) esta Interventoría solicitó a la ANI su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario. Mediante comunicación con radicado ANI número 20233060187601 del 1º de junio de 2023 dicha entidad emitió su No Objeción al Plazo de Cura solicitado. Mediante CERS-OP- 2134-2023 (RAD. ANI 20234090872222 del 04 de agosto de 2023) se otorgó plazo de cura al Concesionario.</p> <p>El Concesionario permanece incumplido, por lo cual esta Interventoría presentó informe de incumplimiento mediante comunicación CERS-OP-3371 (RAD. ANI</p> | <p>Se instaló la audiencia, Pendiente rendición de descargos.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 446 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO ACTUAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>20234091352942 del 24 de noviembre de 2023).</p> <p>El 16 de febrero de 2024, se radicó la comunicación CERS-OP-448-2024, Radicado ANI 20244090202142, mediante la cual se dio respuesta al comunicado con radicado ANI No. 20243060007351 del 09 de enero de 2024, recibido por esta interventoría el día 10 de enero de 2024, atendiendo las inconformidades frente al informe de presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Secciones 3.1, 3.3.1, 6, y 6.1 del Apéndice Técnico 2 del Contrato, relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 4 y 5. (Incumplimiento contemplado en el literal “s” de la Sección 6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014). Finalmente, esta Interventoría presentó la actualización del informe CERS-OP-3371 de 2023 mediante comunicación CERS-OP-896-2024 de 5 de abril de 2024.</p> <p>Se radicó un Informe de Incumplimiento unificado respecto de las Intervenciones prioritarias, obligaciones de Operación y Mantenimiento y Sitios Críticos mediante comunicación CERS-OP-1791-2024 de 16/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090858602</p> |               |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 447 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO ACTUAL |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>Mediante comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 de fecha 09 de septiembre de 2024, la ANI solicitó alcance al Informe de Incumplimiento</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2278-2024 y radicado ANI 20244091155952 del 17 de septiembre de 2024 el Consorcio Interventor ERS emitió el alcance solicitado.</p> <p>Posteriormente, mediante comunicación ANI No. 20243060349981 de fecha 27 de septiembre de 2024, la Gerencia de Procedimientos Sancionatorios Contractuales realizó nuevamente observaciones al Informe de Incumplimiento indicando.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2395-2024 del 8 de octubre del 2024, con radicado ANI 20244091249572, la Interventoría realizó las precisiones solicitadas por parte de la Gerente de Procedimientos Sancionatorios Contractuales.</p> <p>Mediante comunicación con radicado 20243060410101 del 13 de noviembre de 2024, la ANI presentó ante la Interventoría “Requerimiento respuesta a radicado ANI Nro. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024. Contrato de</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 448 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>Interventoría Nro. VEJ-542-2022. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.”</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2625-2024 del 20 de noviembre del 2024, la Interventoría dio respuesta al requerimiento de la ANI donde informó: <i>“nos permitimos aclarar, que, contrario a lo afirmado por la entidad, mediante comunicación con radicado 5143.051ANI CERS-OP-2278-2024 del 17 de septiembre del 2024, con radicado ANI 20244091155952 de la misma fecha (Adjunto), esta Interventoría dio respuesta Oportuna a lo solicitado por la entidad en la comunicación con radicado ANI No. 20243060320311 del 09 de septiembre de 2024, y dio alcance al informe de presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en (i) las Secciones 3.1., 3.1.6., 3.1.5., 3.3.1, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 6, 6.1., 6.2., y 6.4. del Apéndice Técnico 2 del Contrato relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 4 y 5. y (II) La Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de</i></p> |               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 449 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 y Sección 3.2 “Intervenciones”, Literal (a), romanito (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10. Área de Servicio y Estación de Pesaje de la Unidad Funcional 1 del proyecto. Fue enviado a la Interventoría el 18 de mayo de 2023.</p> | <p><i>Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5.”</i></p> <p>La última actuación llevada a cabo por Intervías 4G corresponde a la comunicación número CP-PER- 11979C-2022 del 12 de agosto de 2022, radicada ante la ANI bajo el número 20224090894552 en la misma fecha, mediante la cual Intervías 4G emitió su informe de incumplimiento al amparo del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>                                                                                              | <p>Esta Interventoría pudo verificar que, al 31 de agosto de 2023, no persistía el presunto incumplimiento, por lo cual la Interventoría solicitó el cierre mediante comunicación CERS-OP-2484-2023 (RAD. ANI 20234091010452 del 06 de septiembre de 2023).</p>              |
| <p>Presunto incumplimiento de la Obligación relacionada con la entrega de información financiera, contemplada en el literal (q) de la Sección 4.5, de la parte general del Contrato de Concesión bajo Esquema de APP N.º 002 de 2014.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1035-2023, radicada ante la ANI bajo el n.º 2023-409-047638-2 el 02 de mayo de 2023, la Interventoría presentó la solicitud de No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-1553-2023 (RAD. ANI No. 20234090629192 del 07 de junio de 2023, esta Interventoría solicitó a la ANI el cierre de la solicitud del plazo de cura, con ocasión del saneamiento del presunto incumplimiento por parte del Concesionario.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1553-2023 (RAD. ANI No. 20234090629192 del 07 de junio de 2023), esta Interventoría solicitó a la ANI el cierre de la solicitud del plazo de cura, con ocasión del saneamiento del presunto incumplimiento por parte del Concesionario.</p> |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones de entrega de información, y obtención y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1499-2023 del 1º de junio de 2023 (RAD. ANI No. 20234090606972 del mismo día), esta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se instaló la audiencia, Pendiente rendición de descargos.</p>                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 450 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                         | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mantenimiento de pólizas, establecidas en los literales (d) y (k) de la de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato.</p> | <p>Interventoría solicitó a la ANI su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario.</p> <p>A través de comunicación 20233060208051 del 15 de junio de 2023 la ANI emitió su pronunciamiento de No Objeción frente al plazo solicitado.</p> <p>Mediante comunicado CERS-OP-1844-2023 (RAD ANI. 20234090750862 del 07 de julio de 2023) esta Interventoría solicitó el cierre del plazo de cura otorgado.</p> <p>La Interventoría revisó las respuestas del Concesionario frente al memorando 20237050058993 del 21 de abril de 2023 de la ANI y respecto del requerimiento CERS-OP-1742-2023 del 27 de junio de 2023 (RAD ANI. 20234090708002 de la misma fecha), ambos relacionados con las garantías de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y seguro de obras civiles del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP n.º 002 de 2014. Revisión que dejó plasmada en el documento CERS-OP-3045- 2023 (RAD. ANI 20234091210362 del 20 de octubre de 2023), concluyendo que el Concesionario no cumplió a cabalidad con las observaciones.</p> <p>Como consecuencia de lo anterior, esta Interventoría emitió la comunicación</p> | <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 451 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>CERS-OP-3175-2023 (RAD. ANI 20234091264392 del 02 de noviembre de 2023) en la que solicitó a la ANI su No Objeción por el presunto incumplimiento de las obligaciones de obtención y mantenimiento de pólizas, de conformidad con el literal (d) de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato, en consonancia con las Secciones 12.2 (a) (i), (c), y (h); 12.3 (a), (f) y (h), y 12.8 (a) (iv) y (vi) de la misma parte del Contrato; así como con el Apéndice Financiero 3, frente a la falta de atención a la totalidad de observaciones formuladas por la Interventoría, comoquiera que el Concesionario permanece incumplido. Lo anterior, con el fin de continuar, en conjunto, con el proceso administrativo sancionatorio. De esta manera, mediante comunicación RAD. ANI 20233060417631 del 20 de noviembre de 2023 la ANI emitió su pronunciamiento de No Objeción.</p> <p>El 5 de diciembre de 2023, mediante comunicación CERS-OP-3496-2023 y RAD. ANI 20234091394112, la Interventoría notificó al Concesionario del otorgamiento del Plazo de Cura frente a la atención de la totalidad de las observaciones formuladas por la ANI y por la Interventoría.</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 452 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO ACTUAL |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>Respecto de lo anterior, el Concesionario, mediante comunicado D-1965 de fecha 27/12/2023 emitió respuesta, la cual fue revisada por la Interventoría determinando que el concesionario permanece incumplido, y por lo tanto presentó informe de incumplimiento mediante comunicado CERS-OP-232-2024 (RAD. ANI 20244090107512) del 29 de enero de 2024.</p> <p>El 1 de marzo de 2024, el Concesionario radicó la comunicación D-358-2024 y posteriormente la D-571-2024 de 17 de abril de 2024, en “respuesta a notificación otorgamiento Plazos de Cura por parte de la Interventoría a PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., de acuerdo con las no objeciones otorgadas por la ANI con oficios 20233060208051 del 15 de junio de 2023 y 20233060417631 del 20 de noviembre de 2023. Alcance a nuestro comunicado D-1965-2023.”</p> <p>Posteriormente, el 7 de junio de 2024 mediante Radicado ANI No.: 20243060193251, la Agencia solicitó <i>“actualización al inicio de procedimiento administrativo sancionatorio contra PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., por el presunto incumplimiento de la obligación relacionada en los literales (d) y (k) de la Sección 4.5, así como en la</i></p> |               |

|                                           |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Página 453 de 591</b>                   |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO ACTUAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p><i>sección 12.7 y 12.8 de la Parte General del Contrato, relacionadas con la obtención, corrección y mantenimiento de las garantías – Comunicación con radicado ANI No. 20244090107512 del 29 de enero de 2024.”</i> Por lo anterior, la Interventoría radicó solicitud de prórroga para la entrega de dicha actualización mediante comunicación con radicado CERS-OP-1632-2024 de 28 de junio de 2024.</p> <p>Se radicó el nuevo informe de incumplimiento mediante comunicación CERS-OP-1752-2024 del 12/07/2024, Numero de Radicado ANI 20244090846292.</p> <p>De conformidad con las observaciones realizadas por la ANI, esta Interventoría debió radicar un nuevo Informe mediante comunicación CERS-OP-1876-2024 de 25/07/2024. Numero de Radicado ANI 20244090910862</p> <p>Posteriormente, la ANI emitió nuevas observaciones frente al informe de incumplimiento radicado por la Interventoría. Por lo anterior, mediante comunicación CERS-OP-2136-2024 RAD. ANI 20244091065632 del 29 de agosto del 2024, la Interventoría presentó un nuevo informe de incumplimiento.</p> |               |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 454 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                        | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presunto incumplimiento de entrega de información relacionada con el Estudio de Pérdida Máxima Probable, establecida en el literal (k) de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1500-2023 del 1º de junio de 2023 (RAD. ANI No. 20234090606912 del mismo día), esta Interventoría solicitó a la ANI su No Objeción al Plazo de Cura a otorgar al Concesionario.</p> <p>A través de comunicación 20233060210601 del 16 de junio de 2023 la ANI emitió su pronunciamiento de No Objeción frente al plazo solicitado.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-1791-2023 del 30 de junio de 2023 (RAD. ANI No. 20234090733212 del 04 de julio de 2023), esta Interventoría notificó al Concesionario el otorgamiento del plazo de cura.</p> <p>Mediante comunicado D-999 del 06 de julio de 2023 el Concesionario remitió su respuesta al respecto.</p> | <p>El Concesionario permanece incumplido y la Interventoría radicó informe de incumplimiento el 23 de octubre de 2023, mediante comunicado CERS-OP-3052-2023 (RAD. ANI 20234091213732)</p> <p>El 7 de mayo de 2024, la ANI emitió su comunicación con Radicado ANI No.: 20243060145301 de asunto “<i>Solicitud aclaración a comunicaciones 20247070059523 del 03 de abril del 2024 - Solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio contra PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. por presunto Incumplimiento de la obligación contemplada en el literal (k) de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato de Concesión</i>” donde se solicitó el pronunciamiento de la Interventoría frente a los oficios remitidos por el GIT de Sancionatorios que se remitían con la comunicación, referente al memorando con Radicado ANI No.: 20247070059523 de 3 de abril de 2024.</p> <p>En respuesta, esta Interventoría remitió la comunicación CERS-OP-1372-2024 de 28 de mayo de 2024 con Número de Radicado ANI 20244090640712.</p> <p>Mediante comunicación con radicado CERS-OP-2025-2024 y radicado ANI 20244090991642 del 13 de agosto del 2024, la Interventoría actualizó el informe de incumplimiento identificado con radicado No. CERS-OP-3052-2023 (RAD. ANI 20234091213732)</p> <p>Mediante comunicación con radicado No. 20243060387561 del 25 de octubre del 2024, la ANI presentó solicitud de alcance al radicado ANI No 20234091213732 del 23 de</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 455 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>octubre de 2023, de cara al informe incumplimiento de estudio de pérdida máxima probable.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2585-2024 del 12 de noviembre del 2024, la interventoría dio respuesta y presentó la actualización del informe de incumplimiento identificado con el número CERS-OP-3052-2023 de fecha 23 de octubre de 2023 (RAD ANI 20234091213732)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Presunto Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el fondeo de la Subcuenta Soporte Contractual, prevista en la Sección 3.14 (i) (v) (1) de la Parte General del Contrato, y en la Sección 4.5 (f) de la Parte Especial del mismo.</p> | <p>Mediante comunicado CERS-OP-1934-2023 (RAD. ANI 20234090792742 del 17 de julio de 2023) esta Interventoría solicitó a la ANI su pronunciamiento de No Objeción.</p> <p>Por medio de comunicado 20233060265651 del 28 de julio de 2023 la ANI emitió su No Objeción.</p> <p>Mediante CERS-OP-2176-2023 (RAD. ANI 20234090883162 del 08 de agosto de 2023) la Interventoría notificó otorgamiento de plazo de cura al Concesionario por el incumplimiento de la obligación de fondeo de la Subcuenta Soporte Contractual (aporte anual 2022).</p> | <p>La Interventoría, mediante comunicación CERS-OP-2483-2023 (RAD. ANI 20234091010122 del 06 de septiembre de 2023), presentó informe de incumplimiento. Posteriormente, la ANI, mediante comunicación con radicado 20247070058411 del 19 de febrero de 2024 citó al Concesionario y a la aseguradora a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual tendría lugar el 07 de marzo de 2024.</p> <p>Por medio de Auto de 05/03/2024, se reprogramó la audiencia para el 14 de marzo de 2024.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-634-2024 de 5 de marzo de 2024 con radicado ANI no. 20244090289252 del 6 de marzo del mismo año, se solicitó el cierre del Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el saneamiento del incumplimiento referido.</p> <p>El 12 de marzo de 2024, el Concesionario radicó ante la ANI comunicación D-405-2024 de asunto “<i>Solicitud de informe de Interventoría actualizado (...)</i>”, requiriendo oficiar a la Interventoría a rendir informe actualizado puesto que aduce haber realizado el giro de los recursos, lo cual supuestamente informó en comunicaciones D-353 y D-1330-2023.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 456 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>El día 14 de marzo se llevó a cabo la audiencia ordenada en el auto del 5 de marzo, la cual se suspendió y se fijó fecha de reanudación para el 09 de abril de 2024.</p> <p>El día 18 de marzo de 2024 la ANI emitió el memorando de Rad. ANI 20243060052123 de asunto “Informe de Cumplimiento de Obligaciones en el marco de la Solicitud de Inicio de Proceso Sancionatorio con número de expediente 20247070320700001E, por el presunto incumplimiento de la obligación de la Subcuenta Soporte Contractual (Aporte Anual 2022)” donde aduce que traslada el informe sobre el saneamiento (CERS-OP-634-2024) al GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales para que, en el marco de sus competencias adopte la decisión que corresponda, siendo la recomendación de la Vicepresidencia Ejecutiva no dar trámite a la solicitud de inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio.</p> |
| <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el fondeo de la Subcuenta Compensaciones Ambientales, prevista en la Sección 3.14 (g) (i) de la Parte General del Contrato, y en la Sección 4.5 (b) de la Parte Especial del mismo.</p> | <p>Mediante comunicado CERS-OP-1945-2023 (RAD. ANI 20234090793342 del 17 de julio de 2023) esta Interventoría solicitó a la ANI su pronunciamiento de No Objeción al plazo de cura a otorgar.</p> <p>La ANI solicitó un alcance, mediante comunicación 20233060271711, atendido por esta Interventoría mediante comunicación CERS-OP-2293-2023 (RAD. ANI 20234090922832 del 16 de agosto de 2023).</p> <p>La ANI dio su No Objeción mediante RAD. 20233060344761 del 25 de septiembre de 2023.</p> <p>El 06 de octubre de 2023 la Interventoría notificó al Concesionario del otorgamiento de un plazo de cura de 3 días hábiles,</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio puede continuar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b>                                         | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 457 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                 | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <p>mediante comunicado CERS-OP-2859-2023 (RAD. ANI 20234091157292 del 09/10/2023)</p> <p>El Concesionario dio respuesta al comunicado CERS-OP-2859-2023, mediante el oficio D-1511-2023, el cual fue revisado por la Interventoría, presentando informe de incumplimiento al respecto el 02 de enero de 2024 vía correo electrónico por problemas en la plataforma de la ANI, y posteriormente el 04 de enero de 2024 mediante radicado CERS-OP-015-2024 (RAD. 20244090005982).</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Sección 2.2 (h) y V, Sección 5.1(a) - Presentación de Informes RCD 2022.</p> | <p>Mediante comunicado CERS-OP-2058-2023 (RAD. ANI 20234090834922 del 26 de julio de 2023) esta Interventoría solicitó a la ANI su pronunciamiento de No Objeción al plazo de cura a otorgar. La ANI emitió su No Objeción mediante comunicado 20233060299341 del 24 de agosto de 2023.</p> <p>Mediante CERS-OP-2492-2023 (RAD. ANI 20234091018242 del 07 de septiembre de 2023) se notificó al Concesionario de un plazo de cura de 5 días hábiles.</p> <p>Mediante CERS-OP-2492-2023 (RAD. ANI 20234091018242 del 07 de septiembre de 2023) se notificó al Concesionario de un plazo de cura de 5 días hábiles. El Concesionario cumplió con sus obligaciones. Por consiguiente, esta</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 458 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interventoría radicó cierre ante la ANI el día 18 de diciembre de 2023, mediante comunicado CERS-OP-3595-2023 (RAD. ANI 20234091444372).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presunto incumplimiento obligaciones previstas en el literal (w) de la Sección 4.5. y el literal I) de la Sección 9.2 de la Parte General del Contrato de Concesión No. 002 del 08 de septiembre de 2014, actuación del Inventario de Activos de la Concesión para el año 2023.                                                                                               | Mediante comunicación No. CERS-OP-2735-2023 radicado ante la ANI No. 20234091097252 del 26 de septiembre de 2023, la Interventoría presentó la solicitud de No Objeción al Plazo de Cura.<br>Mediante comunicación No. 20233060358431 del 4 de octubre de 2023 la ANI emitió su no objeción al plazo de cura solicitado.<br>Esta Interventoría otorgó al Concesionario un periodo de cura IGUAL A (5) DÍAS HÁBILES mediante comunicación CERS-OP-2923-2023 (RAD. ANI 20234091175242 del 12/10/2023). | El Concesionario dio respuesta al Plazo de Cura otorgado, mediante comunicación D-1568-2023 del 18 de octubre de 2023. La Interventoría revisó la respuesta y radicó solicitud de cierre ante la ANI el 22 de diciembre de 2023, mediante comunicado CERS-OP-3685-2023 (RAD. ANI 20234091475832).<br>La ANI dio respuesta a la anterior solicitud, mediante comunicado 20233060471011 del 28 de diciembre de 2023, allegado a la Interventoría al día siguiente, cerrando el plazo de cura y solicitando notificar al Concesionario al respecto. Así las cosas, esta Interventoría llevó a cabo la notificación al concesionario el 09 de enero de 2024, mediante comunicado CERS-OP-078-2024 (RAD. ANI 20244090017022) (Concesionario R-66-2024) |
| Presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales contenidas en la Sección 4.3. del Apéndice Técnico No. 1 y en el Apéndice Técnico No. 2, numerales 2.1., 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.6, 3.3.3.7, y 6.1 relacionados con el mantenimiento para garantizar la seguridad vial y la transitabilidad de las Unidades Funcionales 4 y 5, así como los tramos que cuentan con vía | Intervías 4G radicó los informes de incumplimiento identificados con los números CP-PER-6778-2020 del 06 de marzo de 2020 (RAD. ANI 20204090257032) y CP-PER-6782-2020 del 06 de marzo de 2020 (RAD. ANI 20204090257112).<br>Comoquiera que persiste el presunto incumplimiento, esta Interventoría actualizó los informes de Intervías 4G, mediante comunicación CERS-OP-3106 del 2023 (RAD. ANI 20234091241102 del 27 de octubre de 2023).                                                         | En atención a las solicitudes formuladas por la ANI mediante comunicación 20243060000211 del 02 de enero de 2024, esta Interventoría actualizó el Informe de Incumplimiento Obligaciones Operación y Mantenimiento UF 4 año 2020 (CP-PER-6778-2020), mediante radicado ANI 20244090108592 con consecutivo interno CERS-OP-258-2024 el día 29 de enero de 2024.<br>De igual manera, se realizó actualización del Informe de Incumplimiento Obligaciones Operación y Mantenimiento UF 5 año 2020 (CP-PER-6782-2020), mediante radicado ANI 20244090108602 con consecutivo interno CERS-OP-259-2024 el día 29 de enero de 2024.                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 459 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pavimentada en la Unidad Funcional 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el literal (b) de la Sección 4.3 del Apéndice Técnico No. 1, y en el Apéndice Técnico 2, Secciones 3.1.5 y 6.2, relacionadas con el mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje existentes en las Unidades Funcionales 4 y 5, del Contrato de Concesión No. 002 de 2014. | Intervias 4G radicó informe de incumplimiento identificado con el número CP-PER-6512-2020 de fecha 28 de enero de 2020 (RAD. ANI 2020-409-008231-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comoquiera que persiste el presunto incumplimiento, esta Interventoría actualizó el informe de Intervias 4G, mediante comunicación CERS-OP-3099-2023 (RAD. ANI 20234091238462) del 27 de octubre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones de fondeo de subcuenta de Interventoría y Supervisión anualidad 2022 contenidas en las Secciones 3.1.4 (iv), 3.6 (a) de la Parte General del Contrato de Concesión 002 del 08 de septiembre de 2014, y en la sección 4.5. (e) de la Parte Especial del mismo.                                             | Mediante comunicación CERS-OP-2215-2023 con radicado ANI 20234090895642 del 10 de agosto de 2023, la Interventoría presentó la solicitud de no objeción al Plazo de Cura.<br>En comunicación No. ANI 20233060321981 del 8 de septiembre de 2023 la ANI emitió su no objeción al plazo de cura solicitado.<br>La Interventoría, a través de comunicación CERS-OP-2824-2023 (RAD ANI No. 20234091142812) de fecha 5 de octubre de 2023, notificó al Concesionario del Plazo de Cura otorgado para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el fondeo de la Subcuenta de Interventoría y Supervisión, en un término de 3 días hábiles. | En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.<br><br>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.<br><br>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar. |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 460 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Esta Interventoría presentó informe de incumplimiento el 9 de noviembre de 2023 mediante comunicación CERS-OP-3246-2023 (RAD. ANI 20234091289932).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presunto incumplimiento de la obligación relacionada con prorrogar la póliza de Responsabilidad Extracontractual, de conformidad con lo previsto en la Sección 12.3 (b) y 12.7 literal (c) de la Parte General del Contrato, más allá del 17 de enero de 2024. | Mediante comunicación CERS-OP-193-2024 del 22 de enero de 2024 (RAD. ANI 20244090079672 y RAD. Concesionario R-232-2024) esta Interventoría le requirió para que, en el plazo de UN (1) DÍA HÁBIL siguiente al recibo de dicha comunicación, allegara la prórroga de la póliza de Responsabilidad Extracontractual #58922. En respuesta de lo anterior, el Concesionario expidió su comunicado D-95-2024, de Asunto “ <i>Remisión prórroga de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 58922. Respuesta a su comunicado CERS-OP-193-2024 (R-232-2024)</i> ” el cual rezaba “ <i>En virtud del asunto citado en esta carta, nos permitimos remitir la prórroga de la garantía RCE hasta el 27 de enero del 2024 una vez sea remitida la póliza con una prórroga definitiva, les será enviada a la mayor brevedad posible.</i> ” | Mediante comunicación D-219 del 8 de febrero de 2024, con radicado ANI 20244090177052, el Concesionario allegó su “Alcance al comunicado D-95-2024. Remisión prórroga de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 58922. Respuesta a su comunicado CERS-OP-193-2024 con radicado interno (R-232- 2024).” En dicha comunicación, remitió la renovación de la póliza RCE 64919 con la cual se renueva la póliza anterior No. 58922. Esto se evidencia en su Anexo 0, referencia 12006491900000, donde la vigencia del seguro se establece desde el 27 de enero de 2024 hasta el 27 de enero de 2025. La ANI mediante documento de Rad. ANI No. 20243060057041 de 17 de febrero de 2024, solicitó concepto a la Interventoría respecto de lo allegado por el Concesionario, frente a lo cual, la Interventoría radicó la comunicación CERS-OP-553-2024 de 27 de febrero de 2024 de asunto “Contestación a comunicación ANI, radicado ANI 20243060057041 del 17 de febrero de 2024. Concepto por parte de la Interventoría respecto a comunicación del Concesionario D-219 de 8 de febrero de 2024.” En esta última la Interventoría solicitó a la ANI dar cierre al Proceso |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 461 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>El 13 de febrero de 2024 se radicó la comunicación CERS-OP-407-2024, mediante la cual se remitió Solicitud de No Objeción de Plazo de Cura a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI por el presunto incumplimiento de la obligación relacionada con prorrogar la póliza de Responsabilidad Extracontractual, de conformidad con lo previsto en la Sección 12.3 (b) y 12.7 literal (c) de la Parte General del Contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Sancionatorio solicitado mediante comunicación CERS-OP-407-2024.</p> <p>Igualmente, esta Interventoría emitió la comunicación CERS-OP-998-2024 del 16 de abril de 2024 de asunto Saneamiento del incumplimiento de la obligación establecida en la Sección 12.3 (b) y 12.7 literal (c) de la Parte General del Contrato de Concesión N.º 002 de 2014, relacionadas con prorrogar la póliza de Responsabilidad Extracontractual. Solicitud cierre Procedimiento Administrativo Sancionatorio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Presunto incumplimiento de la obligación contenida en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 14.2, Literal (d) (vi) – Información frente a las medidas para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad declarado en las UF 4 y 5</p> | <p>Mediante documento CERS-OP-2136-2023 del 04 de agosto de 2023 (radicado ante el Concesionario bajo el número R-2429) esta Interventoría formuló requerimiento al Concesionario para que diera cumplimiento a la obligación contenida en la Sección 14.2 (d) (vi) de la Parte General del Contrato.</p> <p>En respuesta de lo anterior, el Concesionario emitió el comunicado D-1199 del 24 de agosto de 2023 rechazando la solicitud formulada por esta Interventoría.</p> <p>Más adelante, mediante comunicación D-1640 del 27 de octubre de 2023, allegada a esta Interventoría el día 1 de noviembre de 2023, el Concesionario adujo que presentaba informe de las actividades desplegadas frente al Evento Eximente de Responsabilidad hasta el 22 de septiembre de 2023; no obstante lo cual,</p> | <p>El 25 de enero de 2024 fue remitida a la Agencia Nacional de Infraestructura la Solicitud No objeción Plazo de Cura por el presunto Incumplimiento de la obligación contenida en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 14.2, Literal (d) (vi) – Información respecto de las medidas para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad declarado en las UFs 4 y 5, comunicación CERS-OP-222-2024 (RAD. ANI 20244090095982), donde se solicitó a la ANI.</p> <p>El 5 de febrero de 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura emitió la respuesta a la comunicación del 25 de enero de 2024, mediante documento de radicado ANI No. 20243060041181 de 5 de febrero de 2024, dando su no objeción al Plazo de Cura.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-418-2024, el Consorcio Interventor ERS notificó al Concesionario el otorgamiento del Plazo de Cura, de acuerdo con la No Objeción otorgada por la ANI mediante oficio con radicado 20243060041181 de 5 de febrero de 2024.</p> <p>Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. emitió su respuesta D-337 del 27 de febrero de 2024, donde reiteró de forma</p> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 462 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>continuó incumpliendo con la obligación mencionada.</p> <p>En respuesta de lo anterior, esta Interventoría emitió su comunicado CERS-OP-3317-2023 del 17 de noviembre de 2023 (RAD. ANI 20234091323002 de la misma fecha), radicado ante el Concesionario bajo el número R-3755-2023, mediante el cual reiteró al Concesionario la necesidad de dar cumplimiento a la obligación y, en esa medida, requirió nuevamente al Concesionario denotar que, en el marco del procedimiento de información previsto en el literal (d)(vi) de la Sección 14.2 de la Parte General del Contrato, ha llevado a cabo gestiones ante las autoridades correspondientes para el trámite de los permisos ambientales para superar el EER. El Concesionario allegó el día 30 de noviembre de 2023 a esta Interventoría el comunicado D-1829 de fecha 27 de noviembre de 2023, en el que se opuso a lo requerido.</p> <p>Posteriormente, mediante comunicación CERS-OP-3406-2023 del 30 de noviembre de 2023 (RAD. ANI 20234091375522 y RAD. Concesionario R-3853-2023) la Interventoría nuevamente solicitó al Concesionario el cumplimiento a las obligaciones de la Parte General, Sección 14.2 Evento Eximente de Responsabilidad, Literal (d) Procedimiento</p> | <p>integral las respuestas de las comunicaciones D-1199 y D-1829 de 2023, y donde adujo haber cumplido cabalmente la Sección invocada del Contrato.</p> <p>Finalmente, se radicó el Informe de Incumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 el día 15 de abril de 2024 bajo comunicación CERS-OP-983-2024.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 463 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO ACTUAL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | <p>de información, romanillo (vi), por medio del envío de información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos semanalmente.</p> <p>El 30 de noviembre de 2023, el Concesionario remitió a esta Interventoría las comunicaciones D-1815-2023 D-1816-2023 D-1817-2023, D-1818-2023, D-1819-2023, D-1820-2023, D-1821-2023 y D-1822-2023 (en los que el Concesionario adujo remitir los informes de las semanas de octubre y noviembre), no obstante, lo cual en ninguno de ellos se evidenciaron los avances en la gestión para superar el EER de las UF 4 y 5.</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicación CERS-OP-3667-2023 del 21 de diciembre de 2023, esta Interventoría se dirigió al Concesionario, en respuesta de las comunicaciones señaladas en el numeral anterior, requiriéndole denotar que en el marco del procedimiento de información previsto en el literal (d)(vi) de la Sección 14.2 de la Parte General del Contrato, ha llevado a cabo gestiones ante las autoridades correspondientes para el trámite de los permisos ambientales para superar el EER.</p> <p>El Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., dio respuesta a la</p> |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 464 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                         | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | comunicación anterior a través del documento denominado D-197-2024 del 8 de febrero de 2024, con asunto “Respuesta a su comunicación identificada con número de radicado CERS-OP-3667-2023 (R-4191-2023) del 21 de diciembre de 2023, en la que contempla el mismo contenido que la mencionada comunicación D-1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Presunto incumplimiento de la obligación relacionada con la actualización del valor de las pólizas del contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 12.9 (b) y 3.9 (b) de la Parte General del Contrato. | <p>Mediante comunicación CERS-OP-170-2024 del 18 de enero de 2024 (RAD. ANI 20244090066672 y RAD. Concesionario R-196-2024) esta Interventoría le requirió al Concesionario para que, en el plazo de dos (2) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de dicha comunicación, allegara cada una de las pólizas del Contrato de Concesión 002 de 2014 con el valor de las mismas actualizado con el IPC requerido contractualmente.</p> <p>En respuesta de lo anterior, el Concesionario expidió su comunicado D-127-2024, de Asunto: <i>“Remisión actualización de valores IPC de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 58922”</i>.</p> | <p>Esta Interventoría radicó la solicitud de No Objeción al Plazo de cura mediante documento CERS-OP-426-2024 de 15 de febrero de 2024, con radicado ANI 20244090190712, considerando que no se evidenciaba el cumplimiento de dichas obligaciones respecto de la actualización de valores de la Garantía Única de Cumplimiento y del Seguro de Daños contra Todo Riesgo.</p> <p>La ANI emitió su No Objeción mediante documento de Radicado ANI No. 20243060060081 de 20 de febrero de 2024.</p> <p>El día 4 de junio de 2024, esta Interventoría radicó comunicación CERS-OP-1411-2024 notificando al Concesionario el otorgamiento del Plazo de Cura de 2 días hábiles. En respuesta, POB emite su comunicación D-804-2024 del 6 de junio de 2024 en la cual corrige lo necesitado, cumpliendo lo requerido.</p> <p>Por ende, la Interventoría emite su comunicación de Solicitud cierre Procedimiento Administrativo Sancionatorio, CERS-OP-1500-2024 de 13 de junio de 2024 por el Saneamiento del incumplimiento de la obligación establecida en la Sección 12.9 literal (a) y (b) y 3.9 literal (b) de la Parte General del Contrato de Concesión N.º 002 de 2014, relacionadas con la actualización del valor de la cobertura de (i) estabilidad y calidad de la obra y (ii) Calidad</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 465 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. (Informes Trimestrales #35 y #36)                                                                                                                      | Mediante comunicación CERS-OP-714-2024, con radicado ANI 20244090327502 del 14 de marzo de 2024, la Interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura. La ANI, por su parte, mediante comunicación con radicado ANI 20243060098501 de fecha 20 de marzo de 2024, emitió la No Objeción al Plazo de Cura por un término de 5 días, para que el Concesionario saneara el incumplimiento. Mediante comunicado CERS-OP-1007-2024 del 17 de abril del 2024 se notificó el respectivo plazo de cura a PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. – de acuerdo con la no objeción otorgada por la ANI con oficio 20243060098501 de 20 de marzo de 2024. Incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. | de bienes y equipos de la garantía única de cumplimiento número 1480314-1.<br><br>Mediante comunicación CERS-OP-1338-2024 del 27 mayo de 2024 la Interventoría remitió el Informe de Interventoría en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 por el Incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. (Informe Trimestral #35) Esta Interventoría presentó informe de Incumplimiento unificado para los informes #35, 36 y 37 mediante comunicación CERS-OP-1765-2024 de 15/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090850572 Debido a observaciones de la ANI, mediante comunicación CERS-OP-1840-2024 de 22/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090885592, se radicó un nuevo informe de Incumplimiento. Mediante comunicación CERS-OP-2760-2024 radicado ANI 20244091577472 del 16 de diciembre de 2024 y de conformidad con las observaciones realizadas por la ANI la Interventoría emitió alcance al Informe de Incumplimiento de los informes trimestrales 35 y 36. |
| Presunto incumplimiento de la obligación relacionada con la Construcción e Instalación del Peaje Choachí de la Unidad Funcional 3B en los plazos establecidos en del Otrosí No. 10 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral del Oriente de Cundinamarca S.A.S. | Mediante comunicación CERS-OP-1094-2024 de 25/04/2024 con radicado ANI 20244090480152 la Interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura con el fin de que el Concesionario diera cumplimiento a su obligación de construir e instalar el peaje Choachí de la Unidad Funcional 3B en los plazos establecidos en del Otrosí No. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mediante comunicación CERS-OP-1269-2024 de 17/05/2024 con radicado ANI 20244090588852 la Interventoría radicó la Notificación del otorgamiento Plazo de Cura a PERIMETRAL ORIENTE DE BOGOTA S.A.S. de conformidad con la No Objeción otorgada por la ANI en comunicación con Radicado ANI No.: 20243060137031 de 3 de mayo de 2024. Mediante comunicación con radicado CERS-OP-1676-2024 del 5 de julio de 2024. Numero de Radicado ANI 20244090814132, se solicitó el cierre del plazo de cura en contra del Concesionario por el incumplimiento de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 466 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La ANI otorgó su No Objeción mediante comunicación Radicado ANI No. 20243060137031 de 3 de mayo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obligación relacionada con la construcción e instalación del Peaje Choachí de la Unidad Funcional 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Contrato de transacción del 1 de septiembre de 2023 y de la obligación contenidas en el literal (e) de la Sección 4.18 de la parte General del Contrato, en relación con la no ejecución del Plan de Obras de ampliación respecto del Puente Teusacá II. | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1125-2024 de 30/04/2024 con número de Radicado ANI 20244090515942 la Interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura con el fin de que el Concesionario diera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de transacción del 1 de septiembre de 2023 y de la obligación contenida en el literal (e) de la Sección 4.18 de la Parte General del Contrato, en lo concerniente a la ampliación del Puente Teusacá II.</p> <p>La ANI otorgó su No Objeción mediante comunicación Radicado ANI No. 20243060147631 de 8 de mayo de 2024.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1270-2024 de 17/05/2024 con radicado ANI 20244090588692 la Interventoría radicó la Notificación del otorgamiento Plazo de Cura a PERIMETRAL ORIENTE DE BOGOTA S.A.S. de conformidad con la No Objeción otorgada por la ANI.</p> <p>Se radicó el Informe de Incumplimiento mediante comunicación CERS-OP-1674-2024 de 5 de julio de 2024. Numero de Radicado ANI 20244090813792.</p> <p>Debido a que se presentaron observaciones por parte de la ANI mediante comunicado Radicado ANI No.: 20243050246031, se tuvo que radicar comunicación CERS-OP-1890-2024 de 26/07/2024. Numero de Radicado ANI 20244090917772, donde se resolvieron las mismas, radicando un nuevo informe de incumplimiento</p> <p>La ANI realizó observaciones al informe de incumplimiento y mediante comunicación CERS-OP-2012-2024 y radicado ANI no. 202044090986312 del 12 de agosto de 2024, la Interventoría radicó nuevo informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2491-2024 del 23 de octubre del 2024, la Interventoría presentó informe final frente al saneamiento del presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula Segunda del Contrato de Transacción del 1 de septiembre de 2023, así como la obligación contenida en el literal (e) de la Sección 4.18 de la Parte General del Contrato de Concesión No. 002 del 08 de septiembre del 2014, en lo concerniente a la ampliación del Puente Vehicular Teusacá II ubicado en el PR11+200 de la RN5009.</p> |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 467 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                               | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Así, en dicha comunicación la Interventoría advirtió que no considera pertinente continuar con el informe de presunto incumplimiento ni dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio contractual para este caso.                                                                                                                                                                                                                        |
| Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe (Informe T36). | <p>Mediante comunicación CERS-OP-1126-2024 de 30/04/2024 con número de Radicado ANI 20244090516312 la Interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura con el fin de que el Concesionario saneara el incumplimiento de la obligación contenida en el Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental en su CAPITULO II Obligaciones Generales, 2.4 “Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental”, Literal (b), consistente en la realización de informe trimestrales que detallen las actividades llevadas a cabo durante dicho tiempo en relación con las obligaciones de carácter ambiental.</p> <p>La ANI otorgó su No Objeción mediante comunicación Radicado ANI No. 20243060147571 de 8 de mayo de 2024. Mediante comunicación CERS-OP-1293-2024 de 21/05/2024 con radicado ANI 20244090588692 la Interventoría radicó la Notificación del otorgamiento Plazo de Cura a PERIMETRAL ORIENTE DE BOGOTA S.A.S. de conformidad con la No Objeción otorgada por la ANI.</p> <p>Esta Interventoría presentó informe de Incumplimiento unificado para los informes #35, 36 y 37 mediante comunicación</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |



|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 468 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CERS-OP-1765-2024 de 15/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090850572 Debido a observaciones de la ANI, mediante comunicación CERS-OP-1840-2024 de 22/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090885592, se radicó un nuevo informe de Incumplimiento. Mediante comunicación CERS-OP-2760-2024 radicado ANI 20244091577472 del 16 de diciembre de 2024 y de conformidad con las observaciones realizadas por la ANI la Interventoría emitió alcance al Informe de Incumplimiento de los informes trimestrales 35 y 36.</p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Supervisión, prevista en la Sección 3.14 (i) (iv) de la Parte General del Contrato, y en la Sección 4.5 (e) de la Parte Especial del mismo. (2023) | <p>Esta Interventoría presentó solicitud de No objeción al Plazo de Cura mediante comunicación CERS-OP-1186-2024 de 8 de mayo de 2024, a lo cual la ANI contestó mediante comunicación con Radicado ANI No.: 20243060168501 de 22 de mayo de 2024 otorgando su no objeción. Ante dicho documento, el Consorcio Interventor ERS radicó su comunicación CERS-OP-1467-2024 de 11 de junio de 2024 mediante la cual notificó al Concesionario respecto del plazo de cura de 3 días hábiles para dar cumplimiento a su obligación de relacionadas con el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Supervisión correspondiente al año 2023, prevista en la Sección 3.14 (i) (iv) de la Parte General del Contrato, y en la</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>Página 469 de 591</b>                   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sección 4.5 (e) de la Parte Especial del mismo.<br>Se radicó el Informe de Incumplimiento mediante comunicación CERS-OP-1705-2024 del 8 de julio de 2024. ANI Numero de Radicado 20244090820842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulo II, Numeral 2.1 literal (a) consistente en cumplir desde la fecha de inicio con las exigencias ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental – Manejo y Disposición de RCD. Solicitud de Periodo de Cura por los RCDs de CEMEX. | Esta Interventoría presentó solicitud de No objeción al Plazo de Cura mediante comunicación CERS-OP-1468-2024 de 11 de junio de 2024.<br><br>Solicitud de No objeción al Plazo de Cura mediante comunicación CERS-OP-1468-2024 de 11 de junio de 2024.<br>Se radicó el Plazo de Cura mediante comunicación CERS-OP-1754-2024 de 12/07/2024. ANI Numero de Radicado 20244090845852. De acuerdo a la información aportada en el comunicado D-1037-2024 por el Concesionario la interventoría solicito complemento de la información por medio del comunicado CERS-OP-2137-2024 con fecha de 29/08/2024 con Radicado ANI 20244091065392 el cual aún se encuentra pendiente de respuesta por parte del Concesionario<br>El 12 de septiembre de 2024, esta Interventoría, emitió el comunicado CERS-OP-2240-2024, con asunto: “Reitera del comunicado CERS-OP-2137-2024 - Respuesta al comunicado D-1037 de Asunto: Respuesta a su comunicación | En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.<br><br>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.<br><br>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 470 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CERSOP-1754-2024 (R-2322-2024) del 15 de julio de 2024, Notificación otorgamiento Plazo de Cura para el cumplimiento de las exigencias ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental – Manejo y Disposición de RCD.”                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presunto incumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento de la etapa preoperativa de la UF 3 subsector 1 en la zona denominada “curvas del guarapo”, de conformidad con lo previsto en el literal (c) en la Sección 4.5 de la Parte General del contrato y el Apéndice Técnico 2 Sección 3.1.1. y 3.1.6. relacionadas con el incumplimiento de los principios de continuidad e Integridad del Corredor del Proyecto. | Esta Interventoría presentó solicitud de No objeción al Plazo de Cura mediante comunicación CERS-OP-1408-2024 de 31 de mayo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                              | Mediante comunicación CERS-OP-2159-2024, con radicado ANI 20244091075482 del 30 de agosto del 2024, se informó sobre la subsanación del incumplimiento por parte del Concesionario, indicando que, a juicio de esta interventoría no se considera pertinente continuar con el informe de presunto incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                            |
| Presunto incumplimiento de la obligación establecidas (i) la cláusula 12 del Otrosí 10 y (ii) de la Sección 3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión respecto de la construcción e instalación de la Estación de Peaje de Choachí (Unidad Funcional 3 subsector 2). Contrato de Concesión No.                                                                                                                            | Mediante comunicación CERS-OP-2424-2024 radicado ante la ANI bajo el No. 20244091264472 de 10 de octubre de 2024, la Interventoría presentó a la ANI la Solicitud de No Objeción al Plazo de Cura por 1 DÍA CALENDARIO como consecuencia del incumplimiento por parte del Concesionario, de construir e instalar el Peaje de Choachí en el plazo establecido en el otrosí No. 10. | Mediante comunicación CERS-OP-0181-2025 y radicado ANI 20254090141002 de fecha 04 de febrero de 2025 esta Interventoría solicitó el cierre del plazo de cura otorgado al Concesionario teniendo en consideración que con ocasión de la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión y el inicio a la Etapa de Reversión las obligaciones establecidas en (i) la cláusula 12 del Otrosí 10 y (ii) de la Sección 3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión respecto de la construcción e instalación de la Estación de Peaje de |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 471 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002 del 08 de septiembre del 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Mediante comunicación No. 20243060446921 del 09 de diciembre de 2024, la ANI: i) emitió su no objeción al plazo de cura solicitado por la Interventoría señalando que este debía ser de 30 días calendario; y ii) advirtió que ante “el no saneamiento del presunto incumplimiento procederá con el proceso de imposición de multa, de conformidad con lo establecido en el Contrato y la Ley aplicable”.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2801-2024 radicado ANI 20244091595222 del 19 de diciembre de 2024, la Interventoría notificó al Concesionario el plazo de cura por el término de treinta días calendario para sanear el incumplimiento detectado.</p> | Choachí (Unidad Funcional 3 subsector 2), que estaban vinculadas al cumplimiento de las obligaciones propias de la Etapa Preoperativa y la Fase de Construcción del proyecto, ya no son exigibles.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Presunto incumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones contempladas en la Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción | <p>Mediante comunicación CERS-OP-2760-2024 y radicado ANI 20244091577472 de 16 de diciembre de 2024, el Consorcio Interventor ERS emitió informe al amparo del artículo 86 de la ley 1474 de 2011</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2760-2024 y radicado ANI 20244091577472 de 16 de diciembre de 2024, el Consorcio Interventor ERS emitió informe al amparo del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en relación con el presunto incumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones contempladas en la Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y</p>                                                                                             | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                           |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Página 472 de 591</b>                   |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                               | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5.                                                                                         | del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe (Informe T37). | <p>Mediante comunicación CERS-OP-0118-2025 radicado ANI 20254090104522 del 28 de enero de 2025 la Interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura con el fin de que el Concesionario saneara el incumplimiento de la obligación contenida en el Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental en su CAPITULO II Obligaciones Generales, 2.4 “Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental”, Literal (b), consistente en la realización del informe trimestral ambiental 37 que detalle las actividades llevadas a cabo durante dicho tiempo en relación con las obligaciones de carácter ambiental.</p> <p>Se solicitó a la ANI el cierre del plazo de cura solicitado mediante comunicación No. CERS-OP-0118-2025 de 28 de enero de 2025, y no objetado por la ANI, mediante comunicación No. 20253060067901 de 26 de febrero de 2025.</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Agencia Nacional de Infraestructura | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                          | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 473 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                     | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presunto incumplimiento obligaciones establecidas en Sección 9.7 (f), 9.2 (u) y 12,3 (b) en relación con mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 64919</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-0211-2025 y radicado ANI No. 20254090163912 de fecha 10 de febrero de 2025, la interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura a la ANI.</p> <p>Mediante comunicación 20253060063921 del 24 de febrero de 2025 la ANI: i) emitió su no objeción al plazo de cura solicitado por la Interventoría señalando que este debía ser de DOS (2) días calendario</p> | <p>Se solicitó a la ANI el cierre del plazo de cura otorgado mediante comunicación mediante oficio CERS-OP-0429-2025 de 13 de marzo de 2025.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 474 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | TRAZABILIDAD                                                                                                                                          | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presunto incumplimiento de la Obligación relacionada con la entrega de información financiera, contemplada en el literal (q) de la Sección 4.5, de la parte general del Contrato de Concesión bajo Esquema de APP N.º 002 de 2014.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-0347-2025 y radicado ANI No. 20254090264752, la interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura a la ANI.</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-0347-2025 y radicado ANI No. 20254090264752, la interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura a la ANI.</p> |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 475 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                        | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presunto incumplimiento de la obligación relacionada con no mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en las secciones 4.5 (d) y 12.3 (b) de la Parte General.</p> <p>- Póliza de Cumplimiento No. 1480314</p> | <p>Mediante comunicación CERS-OP-0350-2025 y radicado ANI No. 20254090264602 de fecha 28 de febrero de 2025 la interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura a la ANI.</p> | <p>Se solicitó a la ANI el cierre del plazo de cura solicitado mediante comunicación No. CERS-OP-0204-2025 de 10 de febrero de 2025 y no objetado mediante comunicación ANI 20253060086651 de 13 de marzo de 2025.</p> |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 476 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 233. Procedimientos Administrativos Sancionatorios vigentes y en curso:**

| # | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Apéndice Técnico 1, Sección 4.3, literal (b) y en el Apéndice Técnico 2, Secciones 3.1.5 y 6.2 - Estructuras hidráulicas UF 4 Y 5 -                                                                                            | Actualización Informe de incumplimiento mediante documento CERS-OP-3099-2023 de 27 de octubre de 2023 (RAD. ANI 20234091238462 de la misma fecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 3.14(i)(iv) de la Parte General Contrato de Concesión No. 002 de 2014, y en la Sección 4.5, Literal (e) de la Parte Especial del referido Contrato. - Fondeo Subcuenta Interventoría anualidad 2020.                                                          | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p>                                                                   |
| 3 | Solicitud de entrega de información comunicación INVIAS SF 24245 - FOSEVI                                                                                                                                                                                                                                                          | El 30 de octubre del 2024 se reanudó la audiencia de que trata el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, en la cual la gerente ordenó el cierre del proceso sancionatorio en contra del Concesionario, en consideración al memorando No. 20243060167333 remitido por la vicepresidencia ejecutiva, en el cual allegó la respuesta de la interventoría a la prueba decretada el día 10 de septiembre de 2024, contenida en el oficio CERS-OP-2286-2024 de 24, en el cual se advirtió del cumplimiento del Concesionario. |
|   | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 12.3., Literales (b) y (m) y Sección 14.2, literal (g), romanito (iii); así como de las disposiciones contenidas en el Apéndice Financiero 3 “Garantías y Seguros” – Póliza de Seguro de Obras Civiles. | Informe de incumplimiento mediante comunicado CERS-OP-674-2022 (sic) (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Solicitud de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 3.14(i)(iv) de la Parte General Contrato de Concesión No. 002 de 2014, y en la Sección 4.5 (e) de la Parte Especial del referido Contrato – Fondeo Subcuenta de Interventoría.                                                                              | Mediante CERS-OP-2286-2024 del 24 de septiembre del 2024, esta Interventoría solicitó el archivo del proceso sancionatorio en contra del Concesionario, en tanto que se evidenció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 477 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| # | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | que el Concesionario remitió la información en el formato o GCSP-F-311, y de esta manera cumplió con las obligaciones de la Parte General, Sección 4.5, Literal (k)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 12.3., Literales (b) y (m) y Sección 14.2, literal (g), romanito (iii); así como de las disposiciones contenidas en el Apéndice Financiero 3 “Garantías y Seguros”. (Póliza de Seguro de Obras Civiles)                                                                                        | Informe de incumplimiento mediante comunicado CERS-OP-674-2022 (sic) (RAD. ANI 20234090299282 del 16 de marzo de 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Apéndice Técnico 1, Sección 4.3: “Intervenciones Prioritarias” y en el Apéndice Técnico 2, Numerales 2.1: “Servicios Obligatorios”, 3.1: “Operación del Proyecto”, 3.1.6: “Integridad del Corredor del Proyecto”, 3.3.7: “Seguridad Vial”, y 6.1 “Alcance General de las Obras de Mantenimiento”. Unidad Funcional 4. | Actualización Informe de incumplimiento mediante radicado ANI 20244090108612, con consecutivo interno CERS-OP-260-2024 el día 29 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Apéndice Técnico 1, Sección 4.3: “Intervenciones Prioritarias” y en el Apéndice Técnico 2, Numerales 2.1: “Servicios Obligatorios”, 3.1: “Operación del Proyecto”, 3.1.6: “Integridad del Corredor del Proyecto”, 3.3.7: “Seguridad Vial”, y 6.1 “Alcance General de las Obras de Mantenimiento”. Unidad Funcional 5. | Actualización Informe de incumplimiento mediante radicado ANI 20244090108632, con consecutivo interno CERS-OP-261-2024 el día 29 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.5, Literal (k) – Solicitud información Programa de Monitoreo Unidades Funcionales 4 y 5.                                                                                                                                                                                                     | <p>Se instaló la audiencia. La actuación se encuentra suspendida.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 9 | Presunto incumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento a cargo del Concesionario respecto de los taludes de la UF 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se instaló la audiencia, Pendiente rendición de descargos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 478 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| #   | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (incluyendo el Talud de Arrayanes) establecidas entre otras en la Sección 4.5 (c) de la Parte General del Contrato de Concesión, la Sección 6.3.7 del Apéndice Técnico 2 y la Sección 3.1 del Apéndice Técnico 2.                                                                                                                                                                            | <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p>                                                                              |
| 10. | Presunto incumplimiento intervención sitios críticos Unidades Funcionales 4 y 5. Incumplimiento de las obligaciones de Operación y Mantenimiento a cargo del Concesionario en las Unidades Funcionales 4 y 5.                                                                                                                                                                                | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 11  | Presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5, de conformidad con lo establecido en el Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5. | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 12  | Presunto incumplimiento obligaciones de Operación y Mantenimiento a cargo del Concesionario en las Unidades Funcionales 4 y 5.                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 479 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| #  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p>                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Presunto incumplimiento de las obligaciones de entrega de información, y obtención y mantenimiento de pólizas, establecidas en los literales (d) y (k) de la de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato.                                 | Informe de incumplimiento mediante comunicación CERS-OP-2136-2024 RAD. ANI 20244091065632 del 29 de agosto del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Presunto incumplimiento de entrega de información relacionada con el Estudio de Pérdida Máxima Probable, establecida en el literal (k) de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato.                                                       | <p>Mediante comunicación con radicado No. 20243060387561 del 25 de octubre del 2024, la ANI presentó solicitud de alcance al radicado ANI No 20234091213732 del 23 de octubre de 2023, de cara al informe incumplimiento de estudio de pérdida máxima probable.</p> <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2585-2024 del 12 de noviembre 2024, la interventoría dio respuesta y presentó la actualización del informe de incumplimiento identificado con el número CERS-OP-3052-2023 de fecha 23 de octubre de 2023 (RAD ANI 20234091213732)</p> |
| 15 | Presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el fondeo de la Subcuenta Compensaciones Ambientales, prevista en la Sección 3.14 (g) (i) de la Parte General del Contrato, y en la Sección 4.5 (b) de la Parte Especial del mismo. | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio puede continuar.</p>                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 480 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| #  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales contenidas en la Sección 4.3. del Apéndice Técnico No. 1 y en el Apéndice Técnico No. 2, numerales 2.1., 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.6, 3.3.3.7, y 6.1 relacionados con el mantenimiento para garantizar la seguridad vial y la transitabilidad de las Unidades Funcionales 4 y 5, así como los tramos que cuentan con vía pavimentada en la Unidad Funcional 5.                                          | Actualización informe de incumplimiento mediante radicado ANI 20244090108602 con consecutivo interno CERS-OP-259-2024 el día 29 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el literal (b) de la Sección 4.3 del Apéndice Técnico No. 1, y en el Apéndice Técnico 2, Secciones 3.1.5 y 6.2, relacionadas con el mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje existentes en las Unidades Funcionales 4 y 5, del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.                                                                                                        | Actualización informe de incumplimiento mediante comunicación CERS-OP-3099-2023 (RAD. ANI 20234091238462) del 27 de octubre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Presunto incumplimiento de las obligaciones de fondeo de subcuenta de Interventoría y Supervisión anualidad 2022 contenidas en las Secciones 3.1.4 (iv), 3.6 (a) de la Parte General del Contrato de Concesión 002 del 08 de septiembre de 2014, y en la sección 4.5. (e) de la Parte Especial del mismo. Esta Interventoría presentó informe de incumplimiento el 9 de noviembre de 2023 mediante comunicación CERS-OP-3246-2023 (RAD. ANI 20234091289932). | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 19 | Presunto incumplimiento de la obligación contenida en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 14.2, Literal (d) (vi) – Información frente a las medidas para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad declarado en las UF 4 y 5                                                                                                                                                                | Informe de Incumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 el día 15 de abril de 2024 bajo comunicación CERS-OP-983-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. (Informe Trimestral #35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de incumplimiento. Mediante comunicación CERS-OP-2760-2024 radicado ANI 20244091577472 del 16 de diciembre de 2024 se radicó alcance al informe de incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 481 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| #  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | <p>Presunto incumplimiento de la obligación relacionada con la Construcción e Instalación del Peaje Choachí de la Unidad Funcional 3B en los plazos establecidos en el Otrosí No. 10 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral del Oriente de Cundinamarca S.A.S.</p>                  | <p>Mediante comunicación No. 20243060446921 del 09 de diciembre de 2024, la ANI: i) emitió su no objeción al plazo de cura solicitado por la Interventoría señalando que este debía ser de 30 días calendario; y ii) advirtió que ante "el no saneamiento del presunto incumplimiento procederá con el proceso de imposición de multa, de conformidad con lo establecido en el Contrato y la Ley aplicable".</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-2801-2024 radicado ANI 20244091595222 del 19 de diciembre de 2024, la Interventoría notificó al Concesionario el plazo de cura por el término de treinta días calendario para sanear el incumplimiento detectado.</p> <p>Mediante comunicación CERS-OP-0181-2025 y radicado ANI 20254090141002 de fecha 04 de febrero de 2025 esta Interventoría solicitó el cierre del plazo de cura otorgado al Concesionario teniendo en consideración que con ocasión de la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión y el inicio a la Etapa de Reversión las obligaciones establecidas en (i) la cláusula 12 del Otrosí 10 y (ii) de la Sección 3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión respecto de la construcción e instalación de la Estación de Peaje de Choachí (Unidad Funcional 3 subsector 2), que estaban vinculadas al cumplimiento de las obligaciones propias de la Etapa Preoperativa y la Fase de Construcción del proyecto, ya no son exigibles.</p> |
| 22 | <p>Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Contrato de transacción del 1 de septiembre de 2023 y de la obligación contenidas en el literal (e) de la Sección 4.18 de la parte General del Contrato, en relación con la no ejecución del Plan de Obras de ampliación respecto del Puente Teusacá II.</p> | <p>Mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2491-2024 del 23 de octubre del 2024, la Interventoría presentó informe final frente al saneamiento del presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula Segunda del Contrato de Transacción del 1 de septiembre de 2023, así como la obligación contenida en el literal (e) de la Sección 4.18 de la Parte General del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 482 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| #  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Contrato de Concesión No. 002 del 08 de septiembre del 2014, en lo concerniente a la ampliación del Puente Vehicular Teusacá II ubicado en el PR11+200 de la RN5009.</p> <p>Así, en dicha comunicación la Interventoría advirtió que no considera pertinente continuar con el informe de presunto incumplimiento ni dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio contractual para este caso.</p>                                     |
| 23 | Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe (Informe T36).                                                                                                                                                                                             | Informe de incumplimiento. Mediante comunicación CERS-OP-2760-2024 radicado ANI 20244091577472 del 16 de diciembre de 2024 se radicó alcance al informe de incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Supervisión, prevista en la Sección 3.14 (i) (iv) de la Parte General del Contrato, y en la Sección 4.5 (e) de la Parte Especial del mismo. (2023)                                                                                                     | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 25 | Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulo II, Numeral 2.1 literal (a) consistente en cumplir desde la fecha de inicio con las exigencias ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental – Manejo y Disposición de RCD. Solicitud de Periodo de Cura por los RCDs de CEMEX. | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 483 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| #  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <p>Presunto incumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones contempladas en la Sección 4.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato y del Acuerdo Segundo del Acta de Declaratoria de EER de las Unidades Funcionales 4 y 5, relacionadas con las (i) Intervenciones Prioritarias y (ii) garantizar la protección y estabilidad de todas las obras constructivas realizadas previamente de la suscripción del Acta de Declaratoria de EER de las Unidad Funcionales 4 y 5.</p> | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 27 | <p>Presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Numeral 2.4. del literal (b) del Capítulo II del Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental - Contenido del Informe (Informe T38)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Mediante comunicación con radicado CERS-OP-2760-2024 radicado ANI 20244091577472 del 16 de diciembre de 2024 la Interventoría remitió Solicitud No Objeción de Plazo de Cura por presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Numeral 2.4. del literal (b) del Capítulo II del Apéndice Técnico 6 – Gestión Ambiental - Contenido del Informe (Informe T38)</p>                                                                  |
| 28 | <p>Presunto incumplimiento obligaciones Apéndice técnico 6 – Gestión Ambiental, Capítulos II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe (Informe T37).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>En estudio de requisitos para inicio de PASC – Suspendido su trámite.</p> <p>La posición de esta Interventoría frente a este incumplimiento es que no continúa vigente.</p> <p>Mediante la comunicación CERS-OP-0526-2025 del 28 de marzo de 2025, radicada ante la ANI bajo el número 20254090399202 el 31 de marzo de 2025, la Interventoría indicó que, con ocasión del laudo arbitral, el procedimiento sancionatorio no debe continuar.</p> |
| 29 | <p>Presunto incumplimiento obligaciones establecidas en Sección 9.7 (f), 9.2 (u) y 12,3 (b) en relación con mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 64919</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Mediante comunicación CERS-OP-0351-2025 de fecha 28 de febrero de 2025 se otorga plazo de cura por dos días.</p> <p>Se solicitó a la ANI el cierre del plazo de cura otorgado mediante comunicación</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 484 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| #  | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | ÚLTIMA ACTUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                    | mediante oficio CERS-OP-0429-2025 de 13 de marzo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 | Presunto incumplimiento de la Obligación relacionada con la entrega de información financiera, contemplada en el literal (q) de la Sección 4.5, de la parte general del Contrato de Concesión bajo Esquema de APP N.º 002 de 2014. | Mediante comunicación comunicación CERS-OP-0347-2025 y radicado ANI No. 20254090264752, la interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura a la ANI.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | Presunto incumplimiento de la obligación relacionada con no mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en las secciones 4.5 (d) y 12.3 (b) de la Parte General. - Póliza de Cumplimiento No. 1480314        | Mediante comunicación CERS-OP-0350-2025 y radicado ANI No. 20254090264602 de fecha 28 de febrero de 2025, la interventoría solicitó la No Objeción al Plazo de Cura a la ANI.<br><br>Se solicitó a la ANI el cierre del plazo de cura solicitado mediante comunicación No. CERS-OP-0204-2025 de 10 de febrero de 2025 y no objetado mediante comunicación ANI 20253060086651 de 13 de marzo de 2025. |

Fuente: Elaboración propia

### 13.6 INTERVENCIONES DEL AMIGABLE COMPONEDOR:

En el marco de la ejecución del Contrato de Concesión, según la información que se tiene, se ha requerido la intervención del Amigable Componedor en los siguientes casos:

**Tabla 274 Intervenciones del Amigable Componedor**

| Quien solicita Intervención       | Documento por el cual se solicita la Intervención del A C | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actuaciones adelantadas                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. 2017-409-096276-2 del 06-09-2017                 | Solicitud de intervención del Amigable Componedor por parte del Concesionario para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 – Proyecto "Perimetral Oriental de Cundinamarca" (Puentes peatonales Sesquilé y Guatavita). | Sin vigencia - Con la suscripción del Contrato de Transacción la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. renuncia a cualquier reclamación sobre este particular. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 485 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Quien solicita Intervención       | Documento por el cual se solicita la Intervención del A C | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actuaciones adelantadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. 2017-409-099927-2 del 19-09-2017                 | Solicitud de intervención del Amigable Compondor por parte del Concesionario para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 – Proyecto “Perimetral Oriental de Cundinamarca” (Superposición límites BTS).                                                                                                                                                                                                                                                       | Sin vigencia - Con la suscripción del Contrato de Transacción la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. renuncia a cualquier reclamación sobre este particular.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. 2017-409-099931-2. del 19-09-2017                | Solicitud de intervención del Amigable Compondor por parte del Concesionario para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 – Proyecto “Perimetral Oriental de Cundinamarca” (Proveer y Operar una Emisora de Radio).                                                                                                                                                                                                                                           | Sin Vigencia - Con la suscripción del Contrato de Transacción la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. renuncia a cualquier reclamación sobre este particular.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. 2017-409-102948-2 del 26-09-2017                 | Solicitud de intervención del Amigable Compondor por parte del Concesionario para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 – Proyecto “Perimetral Oriental de Cundinamarca” (Diferencias técnicas y conceptuales respecto de la aplicabilidad de los Apéndices Técnicos en materia de Andenes).                                                                                                                                                                | Sin Vigencia - Con la suscripción del Contrato de Transacción la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. renuncia a cualquier reclamación sobre este particular.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | Correo electrónico del 17 de agosto de 2018               | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Compondor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Solicitud reconocimiento EER derivado de los hallazgos arqueológicos evidenciados desde el 08 de febrero de 2018 en la UF 2 en el sector correspondiente a la zona de la Estación de pesaje - Báscula K8+890) | Con decisión final por parte del Amigable Compondor:<br><br>ACEPTADO por disposición del Panel del Amigable Composición, según fallo del 18 de diciembre de 2018, en el cual se indica que existe el Evento Eximente de Responsabilidad en el sector correspondiente a la zona de la Estación de Pesaje - Báscula K8+890 y demás áreas conexas que resulten afectadas. El Evento Eximente de Responsabilidad se declara |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 486 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Quien solicita Intervención       | Documento por el cual se solicita la Intervención del A C | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actuaciones adelantadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | desde el 08 de febrero de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | Correo electrónico del 17 de agosto de 2018)              | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Solicitud reconocimiento EER derivado de los hallazgos arqueológicos en la Unidad Funcional 2 en el sector correspondiente al K5+650 al K5+960 - Yacimiento 1)                                            | Con decisión final por parte del Amigable Componedor:<br><br>ACEPTADO por disposición del Panel del Amigable Composición, según fallo del 18 de diciembre de 2018, en el cual se indica que existe el Evento Eximente de Responsabilidad en el sector correspondiente al K5+650 y al K5+960 y demás áreas conexas que resulten afectadas. El Evento Eximente de Responsabilidad se declara desde el 02 de noviembre de 2017. |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | Correo electrónico del 17 de agosto de 2018               | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Solicitud reconocimiento EER derivado de la existencia de un punto de interés hídrico, que fue considerado como nacimiento de agua por la corporación - CAR - Sector Arrayanes de la Unidad Funcional 3A) | Sin vigencia - Como quiera que, hubo aceptación del Evento Eximente de Responsabilidad objeto de controversia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. del 6-11-2018 (Correo electrónico)               | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y                                                                                                                                                                                                                                                 | Sin vigencia – El pasado 23 de abril de 2019, la CAR expidió la Resolución No. 0127, mediante la cual ordenó el levantamiento de la medida preventiva, dando viabilidad al Concesionario para realizar las Intervenciones allí previstas.                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 487 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Quien solicita Intervención       | Documento por el cual se solicita la Intervención del A C | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actuaciones adelantadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                           | Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Solicitud de Reconocimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad derivado de la decisión impuesta por la Alcaldía Municipal de La Calera a través de la cual ordenó la suspensión inmediata de las actividades de intervención en la Estación de Peaje de Patios, en la Unidad Funcional 3).                                                                                                                                                                                                  | Así pues, a la fecha, no existe imposibilidad para ejecutar las Intervenciones allí requeridas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. del 16-01-2019 (Correo electrónico)              | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Solicitud de Reconocimiento Evento Eximente de Responsabilidad derivado de la imposibilidad de canalizar la fibra óptica en ciertos tramos de las Unidades Funcionales 2 y 3).                                                      | Sin vigencia, el mismo fue suspendido por solicitud expresa por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. coadyuvado por la ANI, como quiera que la Sociedad Concesionaria POB S.A.S se encuentra estudiando la posibilidad de retirar dicha solicitud. – Suspendido desde el 04 de abril de 2019.<br><br>Esta Interventoría se encuentra revisando el estado actual de esta solicitud. |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI. del 10-12-2019 (Correo electrónico)              | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Controversias relacionadas con la suspensión de la Retribución derivado del incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Proceso establecido en el Contrato para la suscripción de las Actas de Cálculo de la Retribución). | El Panel de Amigable Componedor emitió Decisión Final el 26 de agosto de 2020, en relación con la controversia No. 122498. Decisión a favor de la ANI.                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 488 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Quien solicita Intervención       | Documento por el cual se solicita la Intervención del A C | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actuaciones adelantadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | RAD ANI del 14-08-2020 (Correo electrónico)               | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Controversia relacionada con la negación del EER - Gestión Predial UF 1 ante la presunta imposibilidad de llevar a cabo la adquisición predial del inmueble identificado UF-1-050-D). | El Panel de Amigable Componedor emitió Decisión Final el 24 de noviembre de 2020, en relación con la controversia. Decisión a favor del Concesionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S  | RAD ANI del 09-11-2020 (Correo electrónico)               | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (Controversia relacionada con los pagos de Redes, requisitos y verificación de Precios de Mercado).                                                                                    | El día 26 de febrero de 2021, el Panel de Amigable Composición presentó la decisión final frente a la controversia aquí descrita, manifestando la negativa a las pretensiones efectuadas por el Concesionario, y por su parte, accediendo a las pretensiones de la ANI, en tal sentido, se definió que la Interventoría deberá verificar que los precios sean precios de mercado, en el momento en que el Concesionario presente el corte, no siendo procedente revisar sobre el presupuesto presentado en el año 2015. |
| Sociedad Concesionario POB S.A.S. | 6 de mayo de 2024. Mediante correo electrónico.           | Solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria POB S.A.S. de intervención del Amigable Componedor para dirimir una controversia relacionada con las intervenciones necesarias para estabilizar el Talud Arrayanes de la Unidad Funcional 3.                                                                                                                                                                                                                                             | El Panel de Amigable Componentes presentó su Decisión Final del 2 de septiembre, la cual decidió: “PRIMERO: INTERPRETAR el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2014, celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- y PERIMETRAL ORIENTAL                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 489 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Quien solicita Intervención | Documento por el cual se solicita la Intervención del A C | Tema | Actuaciones adelantadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                           |      | DE BOGOTÁ S.A.S.,<br>DECLARANDO que las intervenciones necesarias para la estabilización del Talud Arrayanes, constituyen una obligación a cargo de POB.<br>SEGUNDO: INTERPRETAR el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2014, celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- y PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., DECLARANDO que la compra de los predios, para cumplir con esas labores de intervención, no debe ser asumida por POB con cargo a su patrimonio.” |

Fuente: Elaboración propia

### 13.7 LAUDO ARBITRAL TRIBUNAL INTERNACIONAL

A continuación, se hace un breve resumen de lo resuelto en el Laudo Arbitral:

Laudo proferido por el CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, dentro del caso número 01-20-0015-3123, entre Perimetral Oriental de Bogotá, S.A.S., y Shikun & Binui VT AG, Demandantes -y- AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Demandada.

El Laudo Parcial Final sobre jurisdicción, responsabilidad y daños fue proferido por el Tribunal Arbitral conformado por los siguientes árbitros:

- Elina Mereminskaya (Árbitro)
- Cristián Conejero (Árbitro)
- Eduardo Palmer (Presidente del Tribunal Arbitral)

Resolvió lo siguiente:

#### “PARTE RESOLUTIVA

900. Con base en los antecedentes presentados, el Tribunal cuenta con la información necesaria para expedir el presente Laudo Parcial de

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 490 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

Jurisdicción, Responsabilidad y Daños. En la sección de análisis legal de este Laudo Parcial, el Tribunal abordó los temas en el orden que resultaba más eficiente según las preguntas planteadas. En esta parte resolutive, el Tribunal resume su decisión sobre esos temas en el orden en que las Partes los presentaron en sus escritos, y por lo tanto decide lo siguiente:

1. Desestima la excepción de ANI sobre la jurisdicción del Tribunal Arbitral por una supuesta inobservancia de lo señalado en el literal c) del artículo 62 de la Ley 1536 de 2012;

2. Desestima la excepción de ANI sobre la jurisdicción del Tribunal Arbitral por una supuesta inobservancia de lo señalado en el literal a) del artículo 62 de la Ley 1536 de 2012;

3. Acoge la excepción de ANI sobre la jurisdicción del Tribunal Arbitral por el incumplimiento de las circunstancias descritas en el literal b) del artículo 62 de la Ley 1536 de 2012;

4. Desestima la excepción de ANI sobre la objeción de falta de competencia del Tribunal Arbitral para conocer las pretensiones relacionadas con las compensaciones e indemnizaciones en relación con EERs relacionados con la UFs 2, 4 y 5;

**5. Estima fundada la excepción de ANI** sobre la falta de competencia del Tribunal Arbitral para conocer las reclamaciones del Contratista EPC (Reclamaciones EPC), al recaer sobre daños y perjuicios sufridos por un tercero, el Contratista EPC. Por lo anterior, el Tribunal Arbitral encuentra que carece de competencia para pronunciarse sobre la pretensión de POB con respecto a la adjudicación de los daños supuestamente producidos por los hallazgos arqueológicos de la UF2, toda vez que dichos daños están basados en las Reclamaciones EPC.

6. **Falla a favor** de las Demandantes en relación con sus reclamos sobre las UFs 4 y 5, y declara que la ANI incumplió la obligación contractual y legal de estructuración y planeación del Proyecto, al no detectar oportunamente la existencia de los manantiales;

7. **Falla a favor** de la Demandada y declara que la ANI cumplió con los términos del Acta del EER relativa a las UFs 4 y 5, toda vez que la obligación de la ANI era “determinar y revisar”, pero no así de “suscribir” un convenio u Otrosí que permitiera superar el EER afectando la ejecución de la UFs 4 y 5;

8. Sin embargo, **falla a favor** de las Demandantes y declara que la ANI no cumplió con la obligación de actuar de buena fe en relación con la superación del EER de las UFs 4 y 5. La ANI incumplió la obligación de buena fe tanto en determinar la posibilidad o viabilidad de suscribir un documento contractual como en revisar las actividades y condiciones para ejecutar Intervenciones en las UFs 4 y 5;

9. **Estima fundada** la pretensión subsidiaria de la ANI sobre Terminación Anticipada y declara la terminación del Contrato. La Terminación Anticipada es acogida en virtud de lo dispuesto en la Sección 14.1(e) del

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 491 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

Contrato de Concesión, pero sobre la base de una causa imputable a la ANI al no haber detectado oportunamente los manantiales.

Asimismo, la mala fe de la ANI implicó que transcurrieran los 730 días sin llegar a acuerdos para la superación del EER de las UFs 4 y 5, y que el Proyecto resultara inviable. Se declara la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la fecha de la notificación de este Laudo;

10. **Falla a favor** de las Demandantes en relación con la reclamación de indemnización integral, y otorga COP \$413.605.900.000, con carácter de costos incurridos respecto de las UFs 4 y 5. Esta indemnización es en consideración al reconocimiento al daño antijurídico causado por los incumplimientos de la ANI y en virtud de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato. La ANI deberá pagar a la POB, la suma de COP \$413.605.900.000;

11. **Falla a favor** de la reclamación de POB en cuanto la pérdida derivada de mayores fondeos a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría. En consecuencia, el Tribunal otorga COP \$119.500.000.000, como consecuencia de la no reducción proporcional de la Subcuenta de Interventoría y Supervisión del Contrato y con carácter de costos incurridos respecto de las UFs 4 y 5. La ANI deberá pagar a la POB, la suma de COP \$119.500.000.000;

12. **Falla a favor** de las Demandantes en relación con la reclamación de indemnización integral, y otorga COP \$803.300.000.000, por pérdida de utilidad respecto de las UFs 1, 2 y 3. Esta indemnización es en consideración al reconocimiento al daño antijurídico causado por los incumplimientos de la ANI y en virtud de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato. La ANI deberá pagar a la POB, la suma de COP \$803.300.000.000;

13. **Desestima la pretensión de indemnización** de la Demandante S&B, toda vez que este Tribunal entiende y declara que no existen obligaciones contractuales que unen a S&B con la ANI, más allá de tener que considerar a S&B como una parte alcanzada por el acuerdo de arbitraje. Por tanto, no otorga daños antijurídicos causados por los incumplimientos de la ANI y tampoco en virtud de la declaratoria de Terminación Anticipada del Contrato;

14. **Desestima** la pretensión reconvencional de la ANI sobre el incumplimiento de POB a las obligaciones contractuales en materia arqueológica respecto de la UF2;

15. **Desestima** la pretensión reconvencional de la ANI de incumplimiento por parte de POB de la obligación de O&M en las UFs 4 y 5;

16. **Desestima** la pretensión reconvencional de la ANI de indemnización de perjuicios por los intereses de mora a causa de el no pago de POB de las obligaciones de fondeo 5, 6, 7 y 8 de la Subcuenta de Interventoría y Supervisión.

17. **En resumen, la ANI deberá pagar a POB**, COP \$413.605.900.000, por los costos incurridos respecto a las UFs 4 y 5; COP \$119.500.000.000,

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 492 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

por la no reducción proporcional a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría; y COP \$803.300.000.000 por pérdida de utilidad respecto de las UFs-1-3, por un total de COP \$1.336.405.900.000

18. El Expediente se mantiene abierto y el Tribunal se reserva la jurisdicción sobre la materia de intereses y costas, en conformidad con lo decidido en la Orden Procesal Núm. 16. El Tribunal instruye a las Partes a presentar sus escritos de intereses y costas, de conformidad a lo señalado en los artículos 31.4 y 34 del Reglamento. En los escritos, cada Parte deberá expresar de forma clara y concisa sobre el objeto de su pretensión en cuanto a intereses y costas de Arbitraje, las razones legales que fundamentan dicha pretensión, y deberá aportar la prueba necesaria que apoyen la pretensión de costas del Arbitraje. La presentación de los escritos sobre intereses y costas del Arbitraje deberán ser presentados de forma simultánea y dentro de los 27 días contados a partir de la presentación de los escritos iniciales, el día 11 de febrero de 2025.

Cualquier reclamo o petición, excepto los reclamos sobre intereses y costas, que no se haya expresado directamente en este Laudo Parcial, se considera denegado. Este Laudo constituye una liquidación de todas las reclamaciones presentadas en este Arbitraje, salvo lo acá enunciado. Además, este Laudo Parcial ejecutable inmediatamente y la ANI tiene la obligación de pagar la suma total de COP \$1.336.405.900 otorgada a POB, con efecto inmediato.

Por la presente certificamos que, a los efectos del artículo 1 de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, este Laudo Parcial se dictó en Bogotá, Colombia”

De lo anterior resultan importantes varios aspectos:

- El Tribunal Arbitral por medio del Laudo ordenó la terminación anticipada del Contrato de Concesión a partir de la notificación del mismo, en los siguientes términos:

“754. Ahora bien, es importante destacar que el Tribunal Arbitral acogerá la pretensión de Terminación Anticipada del Contrato de Concesión en virtud de lo dispuesto en la cláusula 14.1(e) del Contrato de Concesión, pero sobre la base de una causa imputable a la ANI. Y es que la razón por la que las Partes no pudieron avanzar en las negociaciones a desarrollarse durante la Actividad 2, se deben a la propia mala fe de la ANI en este punto.

755. Así las cosas, si bien se acoge la pretensión subsidiaria de Terminación Anticipada interpuesta por la ANI, y se declara la terminación del Contrato, la causal se cumple por cuanto fue la

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 493 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

conducta de la ANI la que implicó que transcurrieran los 730 días sin llegar a acuerdos para la superación del EER.

756. Así, por causa de los incumplimientos de la ANI, es que se declara la Terminación Anticipada de la totalidad del Contrato, por la causal de la cláusula 14.1(e), declarando el Contrato terminado a partir de la fecha de la notificación del presente Laudo.”

- Como consecuencia de la terminación anticipada, el Tribunal ordenó en favor de PBO el derecho de recibir indemnización de perjuicios como consecuencia de los incumplimientos de la ANI. En tal virtud reconoció perjuicios en favor del Concesionario por un valor total de COP \$1.336.405.900.000. Discriminados así:

La ANI deberá pagar a POB, COP \$413.605.900.000, por los costos incurridos respecto a las UFs 4 y 5; COP \$119.500.000.000, por la no reducción proporcional a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría; y COP \$803.300.000.000 por pérdida de utilidad respecto de las UFs-1-3.

- Sin embargo, es importante resaltar que, en materia de reconocimientos o indemnizaciones, dejó de lado la aplicación de fórmula de liquidación del Contrato, por cuanto según su parecer, ninguna de las hipótesis allí previstas resulta aplicable. Así lo consignó en el Laudo Arbitral:

“844. En efecto, la Sección 18.3 del Contrato regula hipótesis de liquidación del Contrato que miran, en esencia, a la compensación de trabajos, partidas y cantidades ejecutadas, y que no puede interpretarse como una cláusula exonerativa o excluyente de responsabilidad que sustituye cualquier otra indemnización. En ningún apartado de dicha Sección o del Contrato de Concesión las Partes le han atribuido semejante efecto, desconociendo o eliminando la posibilidad de las Demandantes de reclamar otros daños distintos al reembolso de aquellos costos incurridos que se comprenden en las partidas de liquidación del Contrato. Ello, sobre todo, cuando se trate de costos y perjuicios sufridos como consecuencia de los incumplimientos de la ANI

845. Segundo, por cuanto ninguna de las Partes ha solicitado la liquidación del Contrato de Concesión en virtud de la Sección 18.3 del Contrato, razón por la cual este Tribunal Arbitral no tiene competencia para ello.

846. En efecto, las Demandantes no pretenden en este Arbitraje la liquidación del Contrato, sino que la reparación e indemnización de los

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 494 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

perjuicios sufridos como consecuencia de los incumplimientos de la ANI que han causado un daño antijurídico a POB que éste no está obligado a soportar.

847. Las Demandantes tampoco solicitan las compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad, de conformidad con la Sección 12.1(h) del Contrato de Concesión, sino que la indemnización de perjuicios por los incumplimientos de la ANI, entre los que se incluyen los incumplimientos de la ANI a sus obligaciones establecidas en la misma Acta del EER.

848. Tercero, y en línea con lo anterior, porque el Tribunal considera que la Terminación Anticipada en virtud de la Sección 14.1(e) del Contrato, pero por incumplimientos imputables a la ANI, no se prevé en ninguna de las hipótesis de liquidación del Contrato establecida en la Sección 18.3 del Contrato y no cabe aplicarlas por analogía.

849. En efecto, el Tribunal Arbitral concuerda con las Demandantes de que no sería aplicable la fórmula establecida en la Sección 18.3(f) del Contrato, que contempla la Terminación Anticipada en la Fase de Construcción, por cuanto, no incluye todos los costos incurridos por el Concesionario, sino que únicamente aquellos que hayan sido reconocidos por la ANI y que sean atribuibles a una serie de actividades específicas establecidas en el Contrato para tal motivo, desde la Fecha de Inicio hasta la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato<sup>660</sup>. Además, esta fórmula implica la aplicación de una tasa de capitalización a dichos costos, según si se trata de Terminación Anticipada por (i) solicitud del Concesionario, (ii) por causas no imputables a ninguna de las Partes, y (iii) por causas imputables al Concesionario<sup>661</sup>. Lo mismo ocurre respecto de la fórmula establecida en la Sección 18.3(g) del Contrato, que contempla la Terminación Anticipada en la Etapa de Operación y Mantenimiento. Ninguna de ellas aplica a la hipótesis que se está en este Laudo, de Terminación Anticipada por causales imputables a la ANI...”

- Finalmente, otro aspecto importante, es la decisión respecto de las UF, en la medida en que, declara terminadas las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 por tanto cumplido al Concesionario, lo cual no resulta ser cierto, pues la UF3 tiene suscrita Acta de Terminación con Pendientes, por no haberse construido dentro del plazo fijado en el Contrato la estación de peaje de Choachí, lo cual riñe con el estado actual del Contrato pues por cuenta de la modificación de la Sección 4.17 transcurrieron más de 180 días sin el cumplimiento de la obligación.

“858. En efecto, las UFs 1, 2 y 3 fueron ejecutadas y finalizadas por POB, y todas ellas cuentan con Actas de Terminación de UF<sup>662</sup>. Así, de conformidad con la Sección 3.1 del Contrato de Concesión, POB



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 495 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

tiene el derecho contractual de recibir la Retribución de dichas UFs, de conformidad con los términos contractuales. El Tribunal Arbitral estima que la pérdida de utilidad o lucro cesante relacionado con las UFs 1, 2 y 3, reúne los requisitos de certeza y certidumbre que requiere la jurisprudencia del Consejo de Estado.

859. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las UFs 4 y 5, las cuales no se han ejecutado y finalizado. El escenario de Pérdida LoP del Proyecto (al igual que el escenario de Pérdida LoP UFs 4 y 5) asume, en una posición contrafactual, que, de no ser por los incumplimientos de la ANI, las Actas de Terminación de las UFs 4 y 5 se habrían suscrito en diciembre de 2018”

En relación con la Unidad Funcional 3 actualmente el Concesionario tiene la Retribución retenida.

El Laudo fue notificado el día 19 de diciembre de 2024

### 13.8 CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025

**Tabla 234 Conceptos emitidos por el área jurídica de la Interventoría durante el mes de marzo de 2025**

| N° | Tema Concepto                         | Temas Abordados                                                                                      | Recomendaciones y/o conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.º Radicado                                                                                                      |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistema SICC en la Etapa de Reversión | Obligaciones que tienen el Concesionario relacionadas con el SICC en la presente Etapa de Reversión. | 1. Es obligación del concesionario (i) seguir con la operación del SICC en los mismos términos en que venía realizándolo hasta que se firme el Acta de Reversión, pues así lo indica la sección 5.4.8. del Apéndice Técnico 4.<br><br>2. Es obligación del Concesionario diligenciar el Formato Inventario Software y Bases de Datos (GCSP-F-082), tal como lo dice el documento GCSP-M-001 versión 4 Manual de reversiones de la Agencia Nacional De | Comunicación CERS-OP-0477-2025 de 26 de marzo de 2025.<br><br>Radicado ANI 20254090382422 de 26 de marzo de 2025. |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 496 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| N° | Tema Concepto | Temas Abordados | Recomendaciones y/o conclusiones                                                                                                               | N.º Radicado |
|----|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |               |                 | Infraestructura ANI emitido en febrero de 2022.<br><br>3. El Concesionario debe revertir dicho sistema a la ANI una vez terminado el Contrato. |              |

Fuente: Elaboración Propia

### 13.9 OTRAS ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el mes de marzo de 2025 el área jurídica, además:

- Presentó informe mensual de febrero de 2025.
- Proyectó, mediante oficio CERS-OP-0257-2025 de 28 de febrero de 2025, la respuesta a la comunicación D-133-2025 del Concesionario de asunto: Proyección diferencia de recaudo por Reconocimiento de Compensación de Riesgo por la creación de las categorías Especiales IE2A, IE2B, IE3 y IE4 en la Estación de Peaje Los Patios, Febrero 2025.
- Proyectó, mediante oficio CERS-OP-0357-2025 de 3 de marzo de 2025, la respuesta a comunicación de la ANI No 20253060050181 del 13 de febrero de 2025, con asunto “*Solicitud de aclaración a las comunicaciones con radicados ANI Nos. 20254090149852 y 20254090149442 del 06 de febrero de 2025. Contrato de Concesión Nro. 002 de 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca*”, realizando las aclaraciones solicitadas por la ANI indicando que los movimientos de la subcuenta ambiental obedecen a actividades realizadas en cumplimiento de los actos administrativos exigidos a causa de compensación ambiental impuesta por la Autoridad Ambiental.
- Proyectó, mediante comunicación CERS-OP-0526-2025 de 28 de marzo de 2025, respuesta al oficio de la ANI del 11 de marzo de 2025 y N° de radicado 20253060084011, con asunto “*Solicitud pronunciamiento al memorando Nro. 20257070036403: “Solicitud de pronunciamiento respecto de los presuntos incumplimientos por parte de la sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.” Contrato de Interventoría Nro. 542 de 2022. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.*”, frente a el estado actual de los procedimientos sancionatorios iniciados con por presuntos incumplimientos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 497 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- Proyectó, mediante oficio CERS-OP-0522-2025 de 27 de marzo de 2025, la respuesta a los comunicados ANI No. 20253060074691 radicado el 6 de marzo de 2025 – Devolución Informe Interventoría enero V0 2025, con la debida atención a cada una de las observaciones.
- Proyectó, mediante oficio CERS-OP-0477-2025 de 26 de marzo de 2025 respuesta a oficio de la ANI del 14 de marzo de 2025 y N° de radicado 20253060089591, con asunto “*Solicitud concepto a comunicación D-79-2025 radicado ANI 20254090099902. Contrato de Interventoría Nro. VEJ-542 2022. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca*”, dando concepto referente a las obligaciones que tienen el Concesionario relacionadas con el SICC en la presente Etapa de Reversión.
- Proyectó la solicitud de información a la Fiduciaria Bancolombia S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el literal (i) de la sección 3.15 de la parte general Contrato de Concesión y de la sección 11.01, 11.03, 12,03 y 11.05 del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos.
- Proyectó la solicitud de información a la ANI, frente a la respuesta de la comunicación C305100002–1629-7165-25 del 26 de febrero de 2025 de la Fiduciaria Bancolombia S.A.
- Proyectó, mediante oficio CERS-OP-0450-2025 de 17 de marzo de 2025, la respuesta a comunicación D-244-2025: Respuesta parcial a Oficio CERS-OP 2422-2023 (R-2756-2023): Respuesta oficio D-602-2023: Entrega de Informe de construcción para revisión y aprobación de cantidades por las obras realizadas en el traslado y/o reubicación de redes de energía de propiedad de la empresa ENEL CODENSA; de conformidad con lo establecido en el PMTR. (Corte N°7 Redes ENEL CODENSA – POSTES SOPÓ ALPINA) y respuesta a oficio D-613-2023: Entrega de Informe de construcción para revisión y aprobación de cantidades por las obras realizadas en el traslado y/o reubicación de redes de energía de propiedad de la empresa ENEL CODENSA; de conformidad con lo establecido en el PMTR, (Corte N°7 Redes ENEL CODENSA – POTES SOPÓ ALPINA), con las observaciones pertinentes.
- Proyectó la solicitud a la ANI por el cierre del plazo de cura solicitado mediante comunicación No. CERS-OP-0204-2025 de 10 de febrero de 2025 y no objetado mediante comunicación ANI 20253060086651 de 13 de marzo de 2025, por el incumplimiento de la obligación relacionada con no mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en las secciones 4.5 (d) y 12.3 (b) de la Parte General.
- Proyectó, mediante comunicación CERS-OP-0447-2025 de 14 de marzo de 2025, requerimiento al Concesionario para que dentro del plazo de un (1) día hábil realizara la respectiva prórroga de la Garantía Única de Cumplimiento.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 498 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

- Proyectó, mediante oficio CERS-OP-0444-2025 de 14 de marzo de 2025, la respuesta al oficio D-0120-2025 del Concesionario del 30 de enero de 2025, con asunto “*Respuesta a la comunicación ANI con Radicado No. 20243060402321 (R-3654-2024), CERS-OP-2712-2024 (R-3987-2024) y CERS-OP-2536-2024 (R-3591-2024) con asunto: Solicitud de ejecución actividades de mantenimiento e intervención a los taludes localizados a lo largo de la Unidad Funcional 1 (“UF1”), RNs 0803 y 0804 – Taludes en riesgo Unidad Funcional 3B, de la Ruta Nacional 4006A.*”
- Proyectó la solicitud a la ANI por el cierre del plazo de cura otorgado mediante comunicación No. CERS-OP-0351-2025 de 28 de febrero de 2025, posterior a la no objeción emitida por la ANI, mediante comunicación No. 20253060063921 de 24 de febrero de 2025, por el presunto incumplimiento de la obligación contenida en la Sección 12.3 (b) de no mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el Contrato, en relación con la póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 64919, mediante oficio CERS-OP-0429-2025 de 13 de marzo de 2025.
- Proyectó la solicitud a la ANI por el cierre del plazo de cura solicitado mediante comunicación No. CERS-OP-0118-2025 de 28 de enero de 2025, y no objetado por la ANI, mediante comunicación No. 20253060067901 de 26 de febrero de 2025, Presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección 4.5(a) de la Parte General del Contrato y el literal (b), del numeral 2.4 del Apéndice Técnico 6 de Gestión Ambiental, relacionadas con el contenido del Informe Trimestral 37.

### 13.10 CONCLUSIONES DEL ÁREA JURÍDICA

1. El área jurídica informará las situaciones de alerta desde el punto de vista jurídico que puedan implicar un incumplimiento contractual o la materialización de un riesgo.
2. Así mismo, continuará efectuando un seguimiento exhaustivo de la ejecución del Contrato de Concesión, especialmente de aquellas situaciones que puedan tener implicaciones jurídicas como son los posibles incumplimientos que den lugar a la aplicación de Sanciones o instrumentos de apremio incorporados en el Contrato objeto de análisis.
3. El área jurídica seguirá emitiendo conceptos sobre distintos asuntos legales relacionados con el Contrato de Concesión con el fin de anticipar y plantear soluciones en relación con situaciones que puedan impactar positiva o negativamente la ejecución del contrato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 499 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

4. Considerando que el cumplimiento de los Indicadores y la consecuente afectación del Índice de Cumplimiento puede llegar a relacionarse con la gestión jurídica del proyecto en el sentido que constituyen obligaciones a cargo del Concesionario, el área jurídica estará atenta a trabajar interdisciplinariamente con el área técnica y el área financiera de la Interventoría con el fin de cumplir adecuadamente con todas las disposiciones contractuales.
5. El área jurídica en colaboración con las otras áreas del proyecto prestará especial atención a lo establecido en el capítulo 13 de la Parte General del Contrato denominado "Ecuación Contractual y Asignación de Riesgos"; así como la Matriz de Riesgos del citado contrato, con el ánimo de identificar el plan de acción frente a cada riesgo individualmente considerado.
6. Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión, es un contrato interdisciplinario, el área jurídica de la Interventoría profundizará las capacitaciones con las distintas áreas de la Interventoría con el objetivo de lograr un adecuado entendimiento de cada una de las cláusulas contractuales.

#### 13.11 MARCO LEGAL DE REFERENCIA:

- a. El Contrato de Interventoría No. VEJ-542 de 2022, Anexo 4 –Metodología y Plan de Cargas de Trabajo.
- b. El Contrato de Concesión No. 002 de Fecha 08 de septiembre de 2014.
- c. Ley 9 de 1989: Procedimiento para la adquisición de predios por enajenación voluntaria y por expropiación.
- d. Ley 80 de 1993: Estatuto de Contratación administrativa.
- e. Ley 388 de 1997: Ley de Ordenamiento Territorial.
- f. Decreto 1420 de 1998: Reglamenta: Ley 9 de 1989, Decreto Ley 2150 de 1995, Ley 388 de 1997, Decreto Ley 151 de 1998.
- g. Ley 1150 de 2007: Se introducen medidas para eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1993.
- h. Ley 1228 de 2008: Se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial nacional.
- i. Decreto 2150 de 1995: Se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública.
- j. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
- k. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
- l. Ley 1508 de 2012.
- m. Decreto 1510 de 2013, por medio del cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
- n. Ley 1682 de 2013: Se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.
- o. Decreto 1082 de 2015.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 500 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

- p. Ley 1882 de 2018 *“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”*.
- q. Ley 2080 de 2021.

### **13.12 SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA ANI AL CONCESIONARIO DESDE MAYO DE 2023 A MARZO DE 2025**

En los anexos 7 y 8, se relaciona el seguimiento que el área de Gestión Documental de la Interventoría lleva a cabo, respecto de las diferentes comunicaciones remitidas por la ANI al Concesionario desde mayo de 2023, en las cuales ha requerido el seguimiento del interventor, para cuyo efecto se indica: comunicación, fecha, trazabilidad del seguimiento realizado por el Interventor.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 501 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 14 GESTIÓN DE CALIDAD

En cumplimiento del contrato de interventoría 542 de 2022 y del Sistema de Gestión de Calidad transversal de SGS, el CONSORCIO ERS cuenta con un sistema de gestión de calidad, en el cual tiene definido los siguientes indicadores de gestión:

**Tabla 235 Indicadores de calidad**

| OBJETIVOS DE LA CALIDAD                            | #   | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                  | FÓRMULA                                                                                                                                                              | META       | RESULTADOS DEL PERIODO |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1. Aumentar la satisfacción de nuestro cliente.    | 1.1 | Oportunidad de Respuesta a requerimientos de correspondencia recibida                                 | $\frac{\text{(No. Requerimientos Tramitados en los tiempos establecidos / No. Total, de requerimientos Recibidos por correspondencia interna)}}{\text{}} \times 100$ | $\geq$ 80% | 85.7%                  |
| 2. Dar Cumplimiento a los requisitos contractuales | 1.2 | Oportunidad en la entrega informes al cliente (mensual, bimestral, avance, terminación de cada etapa) | $\frac{\text{(No. informes entregados en el periodo / No. informes programados para entregar en el periodo)}}{\text{}} \times 100$                                   | = 100%     | 100%                   |

Fuente: Elaboración Propia

Periódicamente este consorcio Interventor ha realizado la entrega oportuna de los informes establecidos contractualmente en concordancia con la disponibilidad y oportunidad de los insumos requeridos para este fin. Se han establecido estrategias para mejorar el indicador de oportunidad de respuesta el cual ha venido cumpliendo la meta propuesta.

### 14.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de calidad del CONSORCIO ERS se enfoca a la satisfacción del cliente y de todas las partes interesadas, mediante el cumplimiento permanente de los requisitos; para lo anterior, la interventoría realiza un permanente control de cada componente del proyecto para obtener resultados confiables.

Durante el periodo se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad de Consorcio ERS:

- Se realizó cambio en este periodo la identificación de comunicados y codificación de la correspondencia, esto con el fin de cumplir con los requerimientos internos de calidad de la compañía, los cuales quedaron de la siguiente forma: 5143.051ANI CERS-OP/OC-001-2024

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 502 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- Seguimiento al Plan de Mejora para atender las no conformidades de la Auditoria de Control Interno de la ANI.
- Reporte periódico del estatus del sistema de gestión de calidad del proyecto al área de calidad transversal de SGS, con el fin de realizar seguimiento y determinar las acciones necesarias para contar con un sistema que se adapte a las políticas organizacionales y a los requerimientos del cliente.
- Se reportaron las lecciones aprendidas, indicadores de gestión, actividades realizadas de gestión y aseguramiento de calidad, costos de no calidad, estado de acciones correctivas y preventivas del proyecto.
- Cargue de registros e información de la gestión adelantada por parte de la interventoría durante el periodo en el repositorio documental del proyecto CRONOS (Correspondencia, informes, registros de los componentes, actas, etc.).

**Figura 63 Cronos**

|                                                                                                             |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 5143.051ANI_PERIMETRAL ORIENTE / Gestión documental /                                                       |                          |                              |
| Documentos y multimedia                                                                                     |                          |                              |
| <div> <div> Inicio Reciente Mío Examinar por tipo </div> <div> Ordenar por Administrar Buscar </div> </div> |                          |                              |
| Inicio                                                                                                      |                          |                              |
| <b>Título</b>                                                                                               | <b>Fecha de creación</b> | <b>Fecha de modificación</b> |
| ACTAS                                                                                                       | hace 5 Años              | hace 5 Años                  |
| CONTRATOS                                                                                                   | hace 5 Años              | hace 5 Años                  |
| CORRESPONDENCIA                                                                                             | hace 5 Años              | hace 5 Años                  |
| INFORMACIÓN DEL PROYECTO                                                                                    | hace 5 Años              | hace 5 Años                  |
| INFORMES                                                                                                    | hace 5 Años              | hace 5 Años                  |

Fuente: Elaboración Propia

## 14.2 COMUNICACIÓN

La comunicación entre las partes interesadas del proyecto es controlada mediante el registro “ET-5143.051ANI-F-01 Control de correspondencia”, además de existir otros canales de comunicación como son; personal, telefónica y por correo electrónico, otro control de las comunicaciones que llegan a esta interventoría es la respuesta oportuna a los oficios enviados por las partes interesadas.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 503 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### 14.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN INTERVENTORÍA

En el periodo del presente informe, el área de topografía del proyecto realizó el seguimiento y verificación de calibración de los equipos utilizados por la interventoría, con el ánimo de garantizar la confiabilidad en la información generada por la interventoría en las actividades de seguimiento a la ejecución del contratista de obra. Para el periodo de ejecución se tuvieron los siguientes equipos, los cuales corresponden a los mismos reportados en el mes anterior y cuentan con los respectivos certificados de calibración vigentes:

**Tabla 236. Control de equipos de medición Interventoría**

| Instrumento                  | Modelo | Serie    | Calibración  |               |             | OBSERVACIÓN                                                                          |
|------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        |          | Periodicidad | Ultima        | Próxima     |                                                                                      |
| ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA | ES 105 | GZ2243   | SEMESTRAL    | 19-marzo-2025 | 18-sep-2025 | Requiere calibración cada 6 meses. El certificado de calibración enuncia las fechas  |
| NIVEL TOPOGRÁFICO            | AL24   | SN101014 | SEMESTRAL    | 19-marzo-2025 | 18-sep-2025 | Requiere calibración cada 6 meses. El certificado de calibración enuncia las fechas. |

Fuente: Elaboración Propia

En el anexo 10 se presentan los certificados de calibración vigentes de los equipos reportados en la tabla anterior.

### 14.4 CAPACITACIONES RELACIONADAS AL SGC

Para este periodo se realizó la capacitación relacionada con:

- Quejas, reclamos y apelaciones

En el anexo 10 se encuentra el listado de asistencia de las personas que asistieron a la capacitación.

### 14.5 CONCLUSIÓN

- Durante el mes de marzo de 2025 se da cumplimiento a la meta establecida del Indicador de oportunidad de respuesta a requerimientos de correspondencia recibida.
- Durante el mes de marzo de 2025 se da cumplimiento a la meta establecida para el indicador Oportunidad en la entrega informes al cliente.
- El sistema de Gestión de Calidad del Consorcio ERS se encuentra implementado y mantenido, dando cumplimiento a lo definido en el plan de calidad de la

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca".</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 504 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

interventoría, lo que permitió mantener la certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2015.

- Los equipos utilizados en el periodo cuentan con la calibración vigente y cumplen con los estándares requeridos para el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por el POB
- Se realizó la capacitación correspondiente al periodo y se da cumplimiento al PIC del contrato.
- El reporte mensual del estatus del sistema de gestión de calidad del proyecto al área de calidad transversal de SGS, con el fin de realizar seguimiento y determinar las acciones necesarias para contar con un sistema que se adapte a las políticas organizacionales y a los requerimientos del cliente
- Se reportaron las lecciones aprendidas, indicadores de gestión, actividades realizadas de gestión y aseguramiento de calidad, costos de no calidad, estado de acciones correctivas y preventivas del proyecto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 505 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

## 15 GESTIÓN DE RIESGOS - ETAPA REVERSIÓN DEL –CONTRATO DE CONCESIÓN 002 DE 2014 - SEGÚN LAUDO ARBITRAJE NO. 01-20-0015-3123

El área de Riesgos se encuentra reglamentada en el Capítulo XIII “Ecuación Contractual y asignación de Riesgos” de la Parte General del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 en los siguientes términos:

*“(… 13.1 Ecuación Contractual,*

*(a) El Concesionario asume (A) el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y (B) los riesgos que le han sido asignados mediante este Contrato, así como los riesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones. (...)*

*Corresponde al Concesionario asumir los riesgos propios de la ejecución del Presente Contrato puesto que el cumplimiento de las Obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del Concesionario.*

*(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que i) no hayan sido previstos en el Contrato y, ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del Concesionario estén asignados a este; pueda proceder al restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e imprevisible, y no imputable al Concesionario, tenga las características de gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de conformidad con la Ley aplicable.*

*(c) La ANI asume el costo de los riesgos expresamente asignados a la ANI, y del cumplimiento de las obligaciones a su cargo”.*

Por otra parte, la Resolución 4859 de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece lo siguiente:

**“Valoración de obligaciones contingentes:** Para cada obligación contingente a cargo de la entidad estatal que se ubique en el área de riesgos definida en el artículo 3 de la presente Resolución, se deberá presentar la valoración de obligaciones contingentes, ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para su respectiva aprobación. Dicha valoración será el resultado de la aplicación de la metodología adoptada mediante la presente Resolución y deberá sujetarse a todo lo dispuesto en el documento mencionado en el artículo 1° de esta Resolución.

| Criterios de Valoración Cualitativa |              |                      |            |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Probabilidad (Frecuencia)           | Categoría    | Impacto (Sobrecosto) | Categoría  |
| Rara vez                            | BAJO         | 0% - 5%              | BAJO       |
| Pocas veces                         | MEDIO – BAJO | 5%-15%               | MEDIO-BAJO |
| Frecuentemente                      | MEDIO – ALTO | 15%-30%              | MEDIO-ALTO |
| Muchas veces                        | ALTO         | >30%                 | ALTO       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 506 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 15.1 CONTEXTO Y ANÁLISIS DE RIESGOS

### 15.1.1 DEMORAS EN LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL.

**Tabla 237 Descripción del riesgo No.1**

| Tipo de riesgo                                                                           | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Demoras en la disponibilidad de predios derivadas de las actividades de gestión predial. | Privado    | Medio Alto   | Medio Alto | NA        |

Fuente: Elaboración propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Se tiene un acumulado de las 3 unidades funcionales de 22 predios pendientes por adquirir, de la UF1 falta 1 predio, de la UF2 faltan 11 predios (9 en expropiación, 2 en adjudicación de baldíos) y de la UF 3 faltan 9 predios (8 en expropiación y 1 predio en proceso de enajenación voluntario).

Se cuenta con 411 solicitudes de desenglobe catastral registrados a la fecha de Marzo 2025 para las unidades funcionales 1, 2 y 3.

A continuación, se da un detallado de la gestión predial del mes en mención, para cada Unidad Funcional.

**Tabla 238 Consolidado de gestión predial unidad funcional 1**

| CONSOLIDADO DE GESTIÓN PREDIAL UNIDAD FUNCIONAL 1 |                                     |                                        |           |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Predios requeridos                                | Cesión gratuita (a favor de la ANI) | Baldíos y/o clarificación de propiedad | FOLIO ANI | EXPEDIENTES RADICADOS EN ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ANI |
| 38                                                | 4*                                  | 1                                      | 37        | 20                                                    |

En la Unidad funcional 1 se reportan 38 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales uno (1) está pendiente por clarificarse su naturaleza jurídica (posible baldío) y cuatros (4) predios que fueron cedidos por sus propietarios a título gratuito, los cuales están identificados con las siguientes fichas prediales y ya cuentan con folio a favor de la ANI:

Predio UF-1-005A-D: Folio de Matrícula Segregado 50N-20872071.  
 Predio UF-1-015A-I: Folio de Matrícula Segregado 50N-20852707.  
 Predio UF-1-017A-D: Folio de Matrícula Segregado 50N-20852822.  
 Predio UF-1-018A-D: Folio de Matrícula Segregado 50N-20857743.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 507 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

De los 38 predios, 37 predios cuentan ya con folio ANI según la sábana de avance predial en su versión 113 correspondiente al mes de febrero de 2025, la cual es suministrada por el concesionario.

La Unidad Funcional 1, cuenta con seis predios con solicitud de desenglobe, 32 predios con resolución de desenglobe, para un total de 38 predios con solicitud y resolución expedida; por último, se cuenta con 28 certificados catastrales del área segregada, es decir, solo faltan 9 predios con dicho certificado.

**UF-1-050-D – Proceso de clarificación de la propiedad – Solicitud Adjudicación Baldíos**

Mediante comunicación D-1605 del 12 de diciembre de 2024, el concesionario informa que la Agencia Nacional de Tierras “ANT” el 28 de noviembre del 2024 expidió las Resoluciones 02443006055686, 202443006055676 y 202443006055706 por las cuales se adjudicó las áreas de terreno como predios Baldíos.

**Tabla 239 Consolidado de gestión predial unidad funcional 2**

| CONSOLIDADO DE GESTIÓN PREDIAL UNIDAD FUNCIONAL 2 |                                 |                        |                                    |                       |                                    |           |                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Predios requeridos                                | Trámite adjudicación de baldíos | Expropiación Sentencia | Etapas administrativa expropiación | Expropiación juzgados | Escrituración o Registro sentencia | FOLIO ANI | EXPEDIENTES RADICADOS ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ANI |
| 225                                               | 2                               | 3                      | 0                                  | 6                     | 0                                  | 214       | 0                                                  |

En la unidad funcional 2 la gestión predial en el periodo es la siguiente:

- Expropiación con sentencia: Son predios que ya tienen sentencia a favor de la ANI, pero por algún motivo no se ha registrado la sentencia.
- Etapas administrativa: Son predios que están empezando el proceso de expropiación y se encuentran en revisión de la resolución de expropiación por la ANI o por la Interventoría.
- Expropiación en juzgados: Son predios que tienen demanda admitida, sin embargo, aún no cuentan con sentencia a favor de la ANI.

Para el mes de Marzo 2025, en la Unidad funcional 2 se reportan 225 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales se cuenta con doscientos catorce (214) predios con folio ANI, de los cuales 9 predios se encuentran en proceso de expropiación y 2 predios en adjudicación de baldíos, para un total de once (11) predios pendientes por adquirir a favor de la ANI para el mes.

PREDIO UF-2-087-I:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 508 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

El jueves 21 de Noviembre del 2024, la ANI solicita al Concesionario la revisión del borrador de la Resolución de adjudicación de Predio Baldío aportada por la ANT. En consecuencia, el Concesionario el mismo día retorna a la ANI el documento con los comentarios y/o ajustes evidenciados. En este sentido, el Concesionario está a la espera de la expedición de la Resolución por parte de la ANT.

PREDIO UF-2-062A-I:

El jueves 21 de Noviembre del 2024, la ANI solicita al Concesionario la revisión del borrador de la Resolución de adjudicación de Predio Baldío aportada por la ANT. En consecuencia, el Concesionario el mismo día retorna a la ANI el documento con los comentarios y/o ajustes evidenciados. En este sentido, el Concesionario está a la espera de la expedición de la Resolución por parte de la ANT.

**Tabla 240 Consolidado de gestión predial unidad funcional 3**

| CONSOLIDADO DE GESTIÓN PREDIAL UNIDAD FUNCIONAL 3 <sup>a</sup> |                        |                                    |                       |                                   |                                |            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Pedios requeridos                                              | Expropiación Sentencia | Etapas administrativa expropiación | Expropiación juzgados | Proceso de enajenación voluntaria | Pedios de adquisición especial | FOLI O ANI | EXPEDIENTES RADICADOS EN ARCHIVO DEFINITIVO DE LA ANI |
| 228                                                            | 1                      | 1                                  | 7                     | 1*                                | 0                              | 219        | 0                                                     |

De 228 Predios requeridos para la UF-3, se cuenta con 219 predios a favor de la ANI, 8 Predios en proceso de expropiación con demanda admitida, 1 predio con Resolución de Expropiación en proceso de notificación. Así las cosas, se relaciona el estado de la gestión para un (1) predio restante:

**Justificación calificación Probabilidad:** Con base a la tabla anterior, la calificación de probabilidad de ocurrencia es medio alta teniendo en cuenta los predios que se encuentran en gestión de las UF 1, 2 y 3, que pueden presentar demoras sea por el proceso de expropiación o por los problemas de cabida y linderos. Por otra parte, la UF4 y UF5 se encuentran sometidos a la definición del Tribunal de arbitramento internacional, por lo cual se han suspendido las actividades, la calificación de probabilidad de ocurrencia es medio alta.

**Justificación calificación Impacto:** Si no se cuenta con la disponibilidad total de predios se puede generar retrasos en la ejecución de las actividades planificadas y por tanto se pueden generar costos no previstos, por tanto, la calificación del impacto es Medio alta.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (viii)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 509 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**15.1.2 SOBRECOSTOS POR ADQUISICIÓN (INCLUYENDO EXPROPIACIÓN) Y COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS.**

**Tabla 241 Descripción del riesgo No.2**

| Tipo de riesgo                                                                          | Asignación                    | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas. | (Público -Privado Compartido) | Alta         | Alto    | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** A continuación, se evidencia los movimientos de la subcuenta predial



Bancolombia



Fogafin

Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

PA POB GEN PREDIOS

KR 48 26 85

MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE2025/01/31

HASTA2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 31-336549-16

031

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

|                |    |                  |                  |    |               |
|----------------|----|------------------|------------------|----|---------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 2,917,969,718.34 | SALDO PROMEDIO   | \$ | 2,093,747,064 |
| TOTAL ABONOS   | \$ | 13,498,154.12    | CUENTAS X COBRAR | \$ | .00           |
| TOTAL CARGOS   | \$ | 1,007,343,176.65 | VALOR INTERESES  | \$ | 13,498,154.12 |
| SALDO ACTUAL   | \$ | 1,924,124,695.81 | RETEFUENTE       | \$ | .00           |

| FECHA | DESCRIPCIÓN                  | SUCURSAL | DCTO | VALOR           | SALDO            |
|-------|------------------------------|----------|------|-----------------|------------------|
| 5/02  | ABONO INTERESES AHORROS      |          |      | 3,354,808.57    | 2,921,324,526.91 |
| 6/02  | IMPTO GOBIERNO 4X1000        |          |      | -4,013,319.42   | 2,917,311,207.49 |
| 6/02  | PAGO A PROVEE PERIMETRAL ORE |          |      | -14,873,521.00  | 2,902,437,686.49 |
| 6/02  | PAGO A PROVEE ESCOBAR DE MUN |          |      | -888,456,336.23 | 1,913,981,350.26 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS      |          |      | 10,143,345.55   | 1,924,124,695.81 |
|       | FIN ESTADO CUENTA            |          |      |                 |                  |

Considerando que la Fiducia entrega la información con un mes de retraso, el saldo mostrado por la FIDUCIA de \$ 1,924,124,695.81 corresponde a corte del mes de febrero de 2025, este valor es el reportado por la fiducia referente a la utilización de los fondos de la subcuenta predial recibido en el mes de febrero 2025.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 510 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 242 Reporte subcuenta predial Pagos reportados en febrero de 2025**

| Fondeo Subcuenta Predial<br>Fiducia más rendimientos<br>febrero 2025-Pesos<br>Corrientes | Valor pagado a febrero<br>2025 Pesos Corrientes | % De<br>ejecución | Rendimientos a<br>febrero 2025<br><br>Reporte Fiducia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| \$ 79.223.142.280                                                                        | \$ 77.287.365.000                               | 97.60%            | \$ 12.672.789.507                                     |

Fuente: Elaboración propia en base a la información Sabanas Prediales y Fiducia con corte al mes de febrero de 2025.

**Tabla 243 Reporte subcuenta predial Pagos reportados en febrero de 2025**

| Valor base<br>(Fondeo Inicial) | Valor pagado a febrero 2025<br>Pesos Constantes | % De<br>ejecución |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| \$ 59.899.835.500              | \$ 59.586.621.169,00                            | 99.48%            |

Fuente: Elaboración propia en base a la información Sabanas Prediales con corte al mes de febrero de 2025.

Los valores tomados en tabla 243, son los reportados versión 115 e incluyen gastos de Escrituración, registro, beneficencia, lucro cesante, daño emergente y compensaciones sociales, el porcentaje de ejecución es del 99.48 % en pesos constantes, para el periodo se conserva, pues no hubo pagos para este periodo.

Adicionalmente se debe aclarar que los valores acá presentados deberán ser cotejados con los reportes de la Fiducia mes a mes conforme al numeral 7 de la guía de CONTROL Y SEGUIMIENTO PREDIAL DE INTERVENTORÍA EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ANI que dice: **7. SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL**. Para la Agencia Nacional Infraestructura el manejo de los recursos prediales debe ser revisado continuamente y **comparados contra los reportes de fiducia** para lograr resultados transparentes, eficientes a través de un control y seguimiento estricto (negrilla nuestro).<sup>1</sup>.

Adicionalmente se elabora un cuadro que fue solicitado por la supervisión donde se muestran los valores ofertados vs los valores pagados a febrero de 2025, con base en la información aportada de pagos a predios por la Fiducia.

<sup>1</sup> Los valores acá presentados deberán ser cotejados con los reportes de la Fiducia mes a mes conforme al numeral 7 de la guía de control y seguimiento predial de la interventoría en los proyectos a cargo de la ANI que dice: 7. SEGUIMIENTO SUBCUENTA PREDIAL. Para la Agencia Nacional Infraestructura el manejo de los recursos prediales debe ser revisado continuamente y comparados contra los reportes de fiducia para lograr resultados transparentes, eficientes a través de un control y seguimiento estricto.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 511 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

| UNIDAD FUNCIONAL | TOTAL PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS OFERTADOS Y REGISTRADOS | VALOR OFERTADO A PREDIOS OFERTADOS + REGISTRADOS | PREDIOS ADQUIRIDOS | VALOR PAGADO A PREDIOS -INCLUYE ADQUIRIDOS | VALOR PAGADO A COMPENSACIONES SOCIALES | PAGADO POR DAÑO EMERGENTE | PAGADO POR LUCRO CESANTE | TOTAL PAGADO          |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| UF1              | 38                       | 31                              | 1.853.629.709                                    | 37                 | 1.853.629.712                              | 33.656.184                             | 39.692.701                | 16.641.000               | 1.943.619.597         |
| UF2              | 225                      | 224                             | 24.376.743.149                                   | 214                | 24.285.197.594                             | 200.044.365                            | 525.036.574               | 64.198.083               | 25.074.436.616        |
| UF3A             | 228                      | 221                             | 42.728.281.982                                   | 219                | 42.686.109.821                             | 198.646.926                            | 740.427.518               | 636.505.095              | 44.261.689.360        |
| UF3B             | 1                        | 1                               | -                                                | -                  | -                                          | -                                      | -                         | -                        | -                     |
| UF4*             | 414                      | 177                             | 5.906.327.005                                    | 61                 | 4.901.197.916                              | 68.347.267                             | 73.553.749                | -                        | 5.043.098.932         |
| UF5*             | 476                      | 135                             | 1.282.619.670                                    | 20                 | 858.882.616                                | 81.769.258                             | 23.868.623                | -                        | 964.520.497           |
| UF5V             | 107                      | 0                               | -                                                | -                  | -                                          | -                                      | -                         | -                        | -                     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1.489</b>             | <b>789</b>                      | <b>76.147.601.516</b>                            | <b>551</b>         | <b>74.585.017.658</b>                      | <b>582.464.000</b>                     | <b>1.402.579.165</b>      | <b>717.304.178</b>       | <b>77.287.365.001</b> |

Fuente: Elaboración propia en base a la información de pagos con corte al mes de febrero de 2024.

| FONDEO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                                  |                               |            |                        |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| SUBCUENTA PREDIOS                         |                                 |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            |                                  |                               |            |                        |                |
| Aporte                                    | Monto Contractual (\$ dic 2012) | Fecha Contract Max del Aporte                                                                                                    |                   | Aportes          |        |            |                                  |                               | Diferencia |                        | Cumplimiento   |
|                                           |                                 | Descripción                                                                                                                      | Fecha Contractual | Fecha del Aporte | IPC    | Ajuste IPC | Valor del Aporte (\$ corrientes) | Valor del Aporte (\$dic 2012) | Fecha      | Acumulada (\$dic 2012) |                |
| <b>Aporte 1</b>                           | \$ 3.573.647.275                | Fecha de constitución del Patrimonio autonomo                                                                                    | 11/11/2014        | 11/11/2014       | 117,68 | 0,95020    | \$ 3.760.926.590                 | \$ 3.573.647.275              | 0 días     | \$ -                   | <b>Cumplió</b> |
| <b>Aporte 2</b>                           | \$ 11.878.252.825               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de inicio.      | 22/06/2015        | 24/06/2015       | 121,95 | 0,91693    | \$ 12.954.422.531                | \$ 11.878.339.708             | 2 días     | \$ 86.883              | <b>Cumplió</b> |
| <b>Aporte 3</b>                           | \$ 44.447.935.400               | Dentro de los cinco (5) días siguientes al transcurso de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha de inicio. | 19/12/2015        | 22/12/2015       | 125,37 | 0,89192    | \$ 49.835.003.652                | \$ 44.448.832.323             | 3 días     | \$ 983.806             | <b>Cumplió</b> |
| <b>Total</b>                              | \$ 59.899.835.500               |                                                                                                                                  |                   |                  |        |            | \$ 66.550.352.773                | \$ 59.900.819.307             |            |                        |                |

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta que aún quedan predios pendientes por adquirir en el proyecto y el presupuesto ejecutado se encuentra en el 102.58% de acuerdo con las Ejecución Subcuenta Predial, según reporte de la fiducia la probabilidad de ocurrencia se califica en Alta.

**Justificación calificación Impacto:** Debido al contexto particular del riesgo y con base en la sabana predial versión 111 e incluyen gastos de Escrituración, registro, beneficencia, lucro cesante, daño emergente y compensaciones sociales, ya que la Interventoría a la fecha no ha recibido la versión que corresponde al mes de Marzo 2025, el porcentaje de ejecución es del 98.13% en pesos constantes. La calificación del impacto es Alto debido a mayores requerimientos por ejecutar.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (vii), Sección 13.3 (e).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 512 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### 15.1.3 DEMORAS EN LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS.

**Tabla 244 Descripción del riesgo No.3**

| Tipo de riesgo                                         | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Privado    | Media-baja   | Media Bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

#### Contexto particular de riesgo:

Al momento, no se ha regulado la situación contractual del EER que se encuentra vigente y sus efectos.

A la fecha se cuenta con la totalidad de los permisos necesarios para las UF1, UF2 y UF3 en la fase de operación y mantenimiento de la etapa preoperativa en la cual se encuentra el proyecto. Respecto a las UF4 y UF5 no se requerirán permisos y licencias ambientales debido a la resolución del laudo arbitral de diciembre de 2024.

**Justificación calificación Probabilidad:** La probabilidad de ocurrencia en relación con el riesgo es Medio Baja dado que ya no se requieren licencias para las UF 4 y UF5.

**Justificación calificación Impacto:** el impacto en relación con el riesgo es Medio Bajo dado que ya no se requieren licencias para las UF 4 y UF5.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2. (a)(ix).

### 15.1.4 SOBRECOSTOS POR COMPENSACIONES SOCIO AMBIENTALES.

**Tabla 245 Descripción del riesgo No.4**

| Tipo de riesgo                                    | Asignación                    | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|
| Sobrecostos por compensaciones socio ambientales. | (Privado/Público/ Compartido) | Medio Baja   | Medio Bajo | No        |

Fuente: Elaboración Propia

Contexto particular de riesgo: Los recursos que a la fecha existen en la Subcuenta Ambiental son suficientes para cubrir los recursos estimados. No obstante, es de aclarar que dichas estimaciones dependen de las definiciones finales de la etapa de reversión en funciones de las responsabilidades que se acuerden con las partes y lo definido en la reversión de las Unidades Funcionales 4 y 5 (incluida la Variante de Choachí).

A continuación, se muestran los valores de la Subcuenta Ambiental

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 513 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| FLUJOS DE CAJA FUENTES Y USOS                                                                |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RUBRO                                                                                        | 2.FEBRERO.2025       | ACUMULADO            |
| SALDO INICIAL                                                                                | \$ 48.726.215.753,78 |                      |
|                                                                                              | \$ 48.726.215.753,78 |                      |
| DEVOLUCIÓN DE RECURSOS                                                                       | \$ -                 | \$ 91.625.955,13     |
| FONDEO SUBCUENTA PRINCIPAL                                                                   | \$ -                 | \$ 34.130.390.402,26 |
| RENDIMIENTOS                                                                                 | \$ 313.586.726,24    | \$ 24.408.178.904,27 |
| TRASLADO DESDE SUBCUENTA CAPEX REINTEGRO PAGO DEBITADO                                       | \$ 1.165.713,75      | \$ 38.416.078,02     |
| TRASLADO RECONOCIMIENTO GMF                                                                  | \$ -                 | \$ 547.080,62        |
| TRASLADO SUBCUENTA CAPEX RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS POR LOS FONDEOS DEL 24 DE JUNIO 2025 | \$ -                 | \$ 18.959.799,13     |
|                                                                                              | \$ 314.752.439,99    | \$ 58.688.118.219,43 |
| GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO                                                            | \$ 1.557.344,95      | \$ 39.972.282,97     |
| PAGO IMPUESTOS                                                                               | \$ 49.220.000,00     | \$ 50.675.092,00     |
| PAGOS A TERCEROS                                                                             | \$ 340.116.238,84    | \$ 9.947.396.234,48  |
|                                                                                              | \$ 390.893.583,79    | \$ 10.038.043.609,45 |
| SALDO FINAL                                                                                  | \$ 48.650.074.609,98 |                      |
|                                                                                              | \$ 48.650.074.609,98 |                      |

Fuente Fiducia 2025.

**Justificación calificación Probabilidad:** Se tiene disponible en la subcuenta de compensaciones ambientales \$24.292.110.137,66 (\$dic/2012), con un valor aproximado requerido para las unidades funcionales 1,2 y 3 de \$7.948.225.429 (\$dic/2012), del cual se ha pagado \$6.253.066.818,34 (\$dic/2012), quedando un valor aprox de \$18.039.043.319,33 (\$dic/2012). A la fecha se cuenta con recursos en la subcuenta. Por lo anterior la calificación de probabilidad de ocurrencia es medio baja.

**Justificación calificación Impacto:** No se prevé un sobre costo en las compensaciones ambientales. El impacto se califica en medio bajo debido a la disponibilidad de recursos.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2. (a)(ix), Sección: 13.3 (g)

#### 15.1.5 OBRAS SOLICITADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, POSTERIORES A LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA(S)/PERMISO(S) AMBIENTALE(S), POR RAZONES NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO.

Tabla 246 Descripción del riesgo No.5

| Tipo de riesgo                                                                                                                                                 | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Obras solicitadas por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia/permiso(s) ambiental(es), por razones no imputables al concesionario. | Público    | Medio baja   | Medio Alto | No        |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 514 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Contexto particular de riesgo:** A la fecha las UF 1, 2 y 3 cuentan con el instrumento ambiental PAGA en el marco de la operación y mantenimiento. se define no proceder con las unidades UF 4 y UF5 de acuerdo al laudo del 19 de diciembre de 2024.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad se da como medio baja, debido a que se define en el laudo arbitral lo relacionado con las UF4 y UF5.

**Justificación calificación Impacto:** En caso de presentarse la materialización del riesgo la calificación del impacto es medio alto, teniendo en cuenta que obras y estudios adicionales no se tienen contempladas en el presupuesto inicial, lo cual podría generar un sobre costo con asignación pública.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (h).

#### 15.1.6 EFECTOS DESFAVORABLES POR DECISIONES DE LA ENTIDAD FRENTE AL MOVIMIENTO O REUBICACIÓN DE CASETAS DE PEAJE EXISTENTES, PREVISTAS EN LA ESTRUCTURACIÓN.

**Tabla 247 Descripción del riesgo No.6**

| Tipo de riesgo                                                                                                                                        | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento o reubicación de casetas de peaje existentes, previstas en la estructuración. | Público    | Baja         | Medio Alto | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto particular de riesgo:** A continuación, se muestra el estado del riesgo en cada una de las estaciones de peaje para el mes de Marzo 2025.

#### **Peaje Choachí:**

No aplica, esto en concordancia Laudo Arbitral Parcial Final, que ordenó entre otros asuntos, la terminación anticipada del Contrato de Concesión, y, en consecuencia, se dio inicio a la etapa de Reversión.

#### **Peaje Ubaque:**

No aplica, esto en concordancia Laudo Arbitral Parcial Final, que ordenó entre otros asuntos, la terminación anticipada del Contrato de Concesión, y, en consecuencia, se dio inicio a la etapa de Reversión.

#### **Peaje Patios:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 515 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Dadas las condiciones que se surten con la Actualización - Fijación de requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, procedimiento para acceder al beneficio, mecanismos de otorgamiento, reemplazo, control y causales de pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales en la Estación de Peaje Los Patios para los residentes de la Vereda El Verjón y los sectores rurales de La Calera, y en caso de ser materializado dicho otorgamiento; se hace indispensable que se genere la implementación de la metodología para la Socialización de los beneficiarios. Para el presente periodo, se fijaron los requisitos y se está en espera que la comunidad informada y beneficiada allegue al Concesionario la respectiva documentación. En ese sentido, las cinco veredas de La Calera y una Vereda de la localidad de Santafé, donde el ministerio de Transporte expidió la Resolución 202330040041285 del 22 de Octubre 2023.

### Peaje La Cabaña

Continúa ubicada en el mismo punto geográfico, la cual a la fecha opera de manera normal. El concesionario perimetral de oriente S.A.S, genera los mantenimientos del caso. Socialmente, no se generan en el periodo situaciones de riesgos.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de probabilidad de ocurrencia es baja dado que a la fecha no se tiene previsto reubicar las Estaciones de Peaje existentes.

**Justificación calificación Impacto:** En caso de materialización del riesgo se generaría un cambio en las condiciones de acceso y de cotidianidad, pues la comunidad podría oponerse a las obras de reubicación de casetas de peaje existentes, por lo cual se debe establecer un protocolo donde se establezcan las posibles compensaciones para el manejo y mitigación del impacto. Por lo anterior, la calificación del impacto es medio Alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (d)

#### 15.1.7 EFECTOS DESFAVORABLES POR DECISIONES DE LA ENTIDAD FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE UBICACIÓN DE CASSETAS DE PEAJE NUEVAS, PREVISTAS EN LA ESTRUCTURACIÓN (NO INSTALACIÓN DE CASSETAS DE PEAJE).

Tabla 248 Descripción del riesgo No.7

| Tipo de riesgo                                                                                                                                                                            | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente a la imposibilidad de ubicación de casetas de peaje nuevas, previstas en la estructuración (No instalación de casetas de peaje) | Público    | Alta         | Medio-Alto | Si        |

Fuente: Elaboración Propia



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 516 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Contexto particular de riesgo:** A continuación, se muestra el estado del riesgo en cada una de las estaciones de peaje para el mes de marzo 2025.

#### **Peaje Choachí:**

La situación actual de las Unidades Funcionales 4 y 5, afectadas por el EER, conlleva a suspender las actividades de obra que allí se estaban ejecutando, siendo necesario iniciar la búsqueda de posibles soluciones que permitieran la construcción de la carretera sin afectar los nacederos evidenciados por el Concesionario, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, lo que hace que a la fecha no se haya podido instalar el peaje de Ubaque. Sin embargo, es de aclarar que durante las reuniones de socialización del pasado 15 de Octubre de 2024 y 3 de enero 2025, la comunidad continúa con el mismo sentir, de no permitir la construcción del Peaje Choachí.

No aplica, esto en concordancia Laudo Arbitral Parcial Final, que ordenó entre otros asuntos, la terminación anticipada del Contrato de Concesión, y, en consecuencia, se dio inicio a la etapa de Reversión.

#### **Peaje Ubaque:**

La situación actual de las Unidades Funcionales 4 y 5, afectadas por el EER, conllevó a suspender las actividades de obra que allí se estaban ejecutando, siendo necesario iniciar la búsqueda de posibles soluciones que permitieran la construcción de la carretera sin afectar los nacederos evidenciados por el Concesionario, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, lo que hace que a la fecha no se haya podido instalar el peaje de Ubaque. Sin embargo, es de aclarar que durante las reuniones de socialización del pasado 15 de Octubre de 2024 y 3 de enero 2025, la comunidad continúa con el mismo sentir de no permitir la construcción del peaje.

No aplica, esto en concordancia al Laudo Arbitral Parcial Final, que ordenó entre otros asuntos, la terminación anticipada del Contrato de Concesión, y, en consecuencia, se dio inicio a la etapa de Reversión.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad de ocurrencia es alta por la suspensión de las UF4 y UF5 y las afectaciones en la construcción del peaje de Ubaque.

**Justificación del Impacto:** En caso de materialización del riesgo se generaría un cambio en las condiciones de acceso pues la comunidad podría oponerse al funcionamiento de operación de casetas de peaje nuevas, por lo cual se debe establecer un protocolo donde se establezcan las posibles compensaciones para el manejo y mitigación del impacto.

**Justificación calificación Impacto:** En caso de materialización del riesgo se generaría un cambio en las condiciones de acceso y de cotidianidad, pues la comunidad podría oponerse a la entrega de la documentación y cumplimiento de los tiempos de respuesta por parte del



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 517 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Concesionario no sea el más adecuado. Por lo cual se debe establecer un protocolo metodológico donde se establezcan las posibles compensaciones para el manejo y mitigación del impacto. Por lo anterior, la calificación del impacto es medio Alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (c)

#### 15.1.8 INVASIÓN DEL CORREDOR DEL PROYECTO.

**Tabla 249 Descripción del riesgo No.8**

| Tipo de riesgo                      | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Invasión del Corredor del Proyecto. | Privado    | Baja         | Medio Bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto particular de riesgo:** Las invasiones de derecho de vía pueden ocasionar accidentes viales debido a la limitación en la visibilidad. Igualmente, la apropiación de la faja de vía y el ancho del corredor, por parte de terceros, pueden retrasar los procesos de adquisición predial, al tener que efectuar un procedimiento legal para el desalojo, lo que a su vez ocasiona retrasos en el inicio de las actividades constructivas faltantes. Al respecto, la sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe gestionar ante Autoridades Municipales, principalmente la Alcaldía, y la Policía para recuperar el derecho de vía con anticipación, detectando las invasiones y actuando con premura frente a las ocupaciones que se vayan generando. De igual manera, reportar de manera oportuna para generar las acciones necesarias en los tiempos establecidos que establece la ley.

**Justificación calificación Probabilidad:** A la fecha, si bien la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ha tenido que querrellar algunas invasiones al derecho de vía, que en general han correspondido a algunas vallas, accesos a predios y publicidad, las mismas no han afectado la construcción de las obras. La calificación de probabilidad de ocurrencia es baja.

**Justificación calificación Impacto:** En caso de que el riesgo identificado llegue a materializarse el concesionario debe asumir la responsabilidad e implementar las acciones necesarias para reducir el impacto causado por la invasión de áreas de manera ilegal, aplicando la Ley relacionada de forma y oportunidad. Por lo anterior, la calificación del impacto es medio baja.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (xxi)

#### 15.1.9 SOBRECOSTOS POR INTERFERENCIA DE REDES.

**Tabla 250 Descripción del riesgo No.9**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 518 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Tipo de riesgo                          | Asignación                   | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Sobrecostos por interferencia de redes. | (Privado/Público Compartido) | Alta         | Alto    | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto particular de riesgo:** En el periodo del mes de Marzo de 2025, la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., ha culminado con los traslados de redes de alcantarillado sanitario, causadas por la interferencia con la ampliación del Puente Teusaca II.

**Tabla 251 Traslados y pendientes de Redes por unidad Funcional**

| UF | Avance | Traslados Realizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendientes                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 100%   | Dado que se desarrolló mejoramiento de trazado y rehabilitación, solo se realizó traslado de las siguientes redes:<br>Redes eléctricas Operador CODENSA.                                                                                                                                                                                   | No hay pendientes de traslado de redes. |
| 2A | 100%   | Dado que se desarrolló mejoramiento de trazado y sección transversal, se realizó traslado de las siguientes redes:<br>Redes eléctricas Operador CODENSA.<br>Redes de Acueducto y Alcantarillado de Operador Emsersopo, Progresar y Acueductos Veredales.                                                                                   | No hay pendientes de traslado de redes. |
| 2B | 99%    | Dado que se desarrolló mejoramiento de trazado y sección transversal, se realizó traslado de las siguientes redes:<br>Redes eléctricas Operador CODENSA.<br>Redes de Acueducto y Alcantarillado de Operador Progresar y Acueductos Veredales.                                                                                              | No hay pendientes de traslado de redes. |
| 3B | 100%   | Dado que se desarrolló mejoramiento de trazado y sección transversal, se realizó traslado de las siguientes redes:<br>Redes eléctricas Operador CODENSA.<br>Redes de Alumbrado Operador Municipio de La Calera.<br>Redes Subterráneas Operados Movistar.<br>Redes de Acueducto y Alcantarillado de Operador Espucal y Aguas de San Rafael. | No hay pendientes de traslado de redes. |
| 4  | 7.48%  | Previo a la declaración del Evento Eximente de Responsabilidad, se realizó traslado de las siguientes redes:<br>Tramos de red Eléctricas Operador CODENSA.<br>Tramos de red de Acueducto.                                                                                                                                                  | En ejecución.                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 519 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| UF | Avance | Traslados Realizados                                                                                                                                       | Pendientes    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5  | 25.71% | Previo a la declaración del Evento Eximente de Responsabilidad, se realizó traslado de las siguientes redes:<br>Tramos de red Eléctricas Operador CODENSA. | En ejecucion. |

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto a la Subcuenta de Redes ha avalado un valor total en precios constantes de \$11.550.936.808 por concepto de diseños y cortes de obra con ocasión de ejecución de traslados de redes secas y húmedas en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3A, quedando pendiente pagos por redes secas y por redes húmedas. Por otra parte, llevado el valor avalado a precios constantes se da el valor de \$8.703.190.756 (pesos constantes). El valor aún está por debajo del valor estimado inicial, por lo que a la fecha no se ha materializado el riesgo.

En el siguiente cuadro se reporta el valor pagado con cargo a la subcuenta Redes y el saldo de esta a precios origen de contrato.

**Tabla 252 Ejecución Subcuenta Redes (\$ constantes)**

| Valor base Subcuenta | Valor pagado a 31 de marzo 2025 | % Ejecución | Saldo Subcuenta a 31 de marzo 2025 | Rendimientos Acumulados |
|----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| \$ 11.550.936.808    | \$8.703.190.756                 | 75,35%      | \$2.847.746.051                    | \$4.861.237.383         |

**NOTA:** El saldo de la Subcuenta de Redes ha venido generando rendimientos mensuales, por lo que el saldo es mayor a la resta directa de ingresos por fondeos y egresos por pagos a terceros

**Justificación calificación Probabilidad:** De acuerdo con lo que se defina respecto a la UF4 y UF5 entre las partes y teniendo en cuenta el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto con relación a redes existe una alta probabilidad de presentarse sobrecostos por interferencia de redes.

**Justificación calificación Impacto:** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. Realizó una revisión de las redes afectadas por el proyecto, elaborando en consecuencia un presupuesto por valor de \$24.602.277.791 estimado, lo cual equivale a \$19.223.349.472 a precios constantes del Contrato, que se distribuyen de la siguiente manera por unidad funcional:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 520 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Tabla 253 Valor estimado Redes**

| UF           | VALOR TOTAL<br>(\$ dic/2012) |
|--------------|------------------------------|
| UF1          | \$ 293.860.019               |
| UF2          | \$ 9.277.322.480             |
| UF3          | \$ 3.019.216.576             |
| UF4          | \$ 5.224.473.991             |
| UF5          | \$ 1.408.476.404             |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 19.223.349.472</b>     |

Fuente: Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

De acuerdo con el valor requerido estimado para la interferencia de redes, se presenta un sobrecosto mayor al 20% del establecido contractualmente. Por consiguiente, la calificación de impacto es Alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (x). - Parte General: Sección 13.3 (i).

#### 15.1.10 SOBRECOSTOS DERIVADOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

**Tabla 254 Descripción del riesgo No.10**

| Tipo de riesgo                                   | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Sobrecostos derivados de los estudios y diseños. | Privado    | Medio baja   | Medio bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. entregó la totalidad de los estudios y diseños. La interventoría verificó que las modificaciones a los diseños realizadas por la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. estuvieran enmarcadas en los requerimientos contractuales y no generaran sobrecostos.

A continuación, en la siguiente se evidencia cada uno de los radicados donde se identifican las observaciones que se realizaron al concesionario para cada uno de los diseños no objetados.

**Tabla 255 Relación de Estudios y Diseños No Objetados**

| VOLUMEN / DOCUMENTO |                       | UF1                                             | UF2                                             | UF3                                             | UF4                                             | UF5                                             |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                   | Estudio de Transporte | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 521 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| VOLUMEN / DOCUMENTO |                                                                       | UF1                                             | UF2                                             | UF3                                             | UF4                                                                                    | UF5                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2                   | Información Geográfica Georreferenciada                               | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
| 3                   | Estudio De Trazado y Diseño Geométrico, Seguridad Vial y Señalización | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682<br><br>CP- PER 360 - 2015 (09-12-2015) | CP-PER-356- 2015 (04-12-2015)<br>20154090806042 |
| 4                   | Geología para Ingeniería y Geotecnia                                  | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
| 5                   | Estudio de estabilidad y estabilización de taludes                    | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
| 6                   | Estudio de suelos para el Diseño de fundaciones                       | NA                                              | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
| 7                   | Estudio Geotécnico Y Diseño Del Pavimento                             | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
| 8                   | Hidrología, Hidráulica y Socavación                                   | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
| 9                   | 9.1 Paso peatonal                                                     | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015)<br>20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826682                                        | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015)<br>20154090826742 |
|                     | 9.2 Puentes a rehabilitar                                             |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                        |                                                 |
|                     | 9.3 Puentes Nuevos                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                        |                                                 |
|                     | 9.4 Alcantarillas Cajón                                               |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                        |                                                 |
|                     | 9.5 Alcantarillas Tubulares                                           |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                        |                                                 |
|                     | 9.6 Muro de sostenimiento                                             |                                                 |                                                 |                                                 |                                                                                        |                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 522 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| VOLUMEN / DOCUMENTO |                                                                    | UF1                                          | UF2                                          | UF3                                          | UF4                                          | UF5                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | 9.7 Ampliación de puentes                                          |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 10                  | Paisajismo y Urbanismo                                             | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 20154090826682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 20154090826742 |
| 11                  | Arquitectura                                                       | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 20154090826682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 20154090826742 |
| 12                  | Iluminación Exterior                                               | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 20154090826682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 20154090826742 |
| 13                  | Telecomunicaciones-Fibra Óptica                                    | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 20154090826682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 20154090826742 |
| 14                  | Especificaciones Técnicas de construcción generales y Particulares | CP-PER-371- 2015 (14-12-2015) 20154090826662 | CP-PER-375- 2015 (14-12-2015) 20154090826672 | CP-PER-276- 2015 (14-12-2015) 20154090662262 | CP-PER-370- 2015 (14-12-2015) 20154090826682 | CP-PER-369- 2015 (14-12-2015) 20154090826742 |

Fuente: elaboración propia.

**Justificación calificación Probabilidad:** Se califica la probabilidad de ocurrencia Medio baja debido a que se definió la no ejecución las Unidades Funcionales 4 y 5.

**Justificación calificación Impacto:** Se califica el impacto en medio bajo dada la etapa de reversión dada.

**Regulación Contractual:** Sección 13.2 (a) (vi) (xxiii).

#### 15.1.11 SOBRECOSTOS POR AJUSTES EN DISEÑOS COMO CONSECUENCIA DEL TRÁMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES POR RAZONES NO ATRIBUIBLES AL CONCESIONARIO.

**Tabla 256 Descripción del riesgo No.11**

| Tipo de riesgo                                                                                                                         | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario. | Público    | Medio baja   | Medio bajo | No        |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 523 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Contexto Particular del Riesgo:** Respecto a la Estación de Peaje de Choachí, se aclara que el Otrosí No. 10 ajustó las especificaciones de este Peaje ajustándolo a las intervenciones que permite la Autoridad Ambiental en el sector condicionando a solo poder construir en el ancho del corredor actual, así mismo se clarificó que este rediseño no incurriría en sobrecostos para la Entidad.

**Justificación calificación Probabilidad:** la calificación de la probabilidad de ocurrencia es Media baja dado que a la fecha, no se han presentado adecuaciones y/o modificaciones a los diseños por decisiones propias de las Licencias Ambientales, y se definió la no realización de las unidades UF 4 y UF5

**Justificación calificación Impacto:** Hasta la fecha la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no ha informado la ocurrencia de sobrecostos en las actividades de diseño como consecuencia del trámite de licencias ambientales y/o por decisiones de la ANI para las UF 1, 2 y 3. y dado la definición de las UF 4 y 5 se califica el impacto como medio bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (r).

#### 15.1.12 SOBRECOSTOS EN DISEÑOS POR DECISIONES DE LA ANI.

**Tabla 257 Descripción del riesgo No.12**

| Tipo de riesgo                                   | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI. | Pública    | Medio baja   | Medio Alto | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** A la fecha no se han presentado modificaciones al diseño por decisiones propias de la Entidad contratante.

En las Unidades Funcionales 4 y 5, como efecto de diversas situaciones, entre ellas medioambientales, de mantenimiento, geotécnicas y otros, se ha visto aumentado el deterioro de las vías, existiendo diferentes puntos críticos que requieren de intervención urgente para garantizar la transitabilidad de la vía y la seguridad vial, esto conlleva a la necesidad de revisar cada uno de los puntos críticos para determinar las posibles obras que se necesiten para recuperar la banca y mantener la transitabilidad de la vía, así como para garantizar la seguridad vial, por lo que deberán hacerse diferentes estudios y diseños para determinar las obras a acometer, esta situación, puede impactar en costos que no estaban determinados.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad de ocurrencia es medio baja, teniendo en cuenta la definición del laudo sobre las UF 4 y 5. Por otra parte, como se mencionaba existen puntos críticos en la vía en las mismas UF que posiblemente requieran obras con el fin de mantener la vía.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 524 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Justificación calificación Impacto:** La calificación del impacto en el periodo es medio alta porque si se da el requerimiento de obras adicionales que no se tenían presupuestadas generando sobrecostos.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (h).

#### 15.1.13 SOBRECOSTOS DERIVADOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS.

**Tabla 258 Descripción del riesgo No.13**

| Tipo de riesgo                                        | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Sobrecostos derivados de mayores cantidades de obras. | Privado    | Medio alta   | Medio Alto | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá debe planificar bien los trabajos y ejecutar las obras con calidad para evitar reprocesos y sobrecostos, así como adelantar los estudios que se estimen necesarios que permitan tomar acciones antes de iniciar los trabajos, en especial estudios geotécnicos en zonas de remoción activa. Las mayores cantidades de obra están ceñidas a las obras a construir descritas en el Apéndice Técnico No. 1 del Contrato General que se ejecutarán en cada Unidad Funcional.

**Justificación calificación Probabilidad:** Se han presentado afectaciones que han requerido nuevos diseños y obras para garantizar la estabilidad de los taludes, por generarse por esta causa un deterioro prematuro de la vía, el riesgo se califica con una probabilidad de ocurrencia medio alta.

Se entra en etapa de Reversión dicha situación, deberá ser estudiada de manera conjunta en la búsqueda de que las decisiones que se tomen impacten lo menos posible en el proyecto y los costos en general los elementos de valor requeridos para el efecto.

Así mismo, se debe tener en cuenta el aumento en el deterioro de las vías en diferentes puntos críticos que requieren de intervención urgente para garantizar la transitabilidad de la vía y la seguridad vial, situación puede llevar a requerir cantidades de obra no contempladas.

**Justificación calificación Impacto:** Como se ha descrito el requerimiento de mayores cantidades de obra puede impactar en costos que no estaban determinados, no obstante, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. por esta razón, la calificación del impacto es medio alta y la asignación del riesgo es del privado.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (ii)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 525 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

#### 15.1.14 VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS.

**Tabla 259 Descripción del riesgo No.14**

| Tipo de riesgo                      | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Variación de precios de los insumos | Privado    | Medio Baja   | Medio Bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Los riesgos de construcción de acuerdo con los definidos en la matriz de riesgos del contrato están asignados exclusivamente al privado. No obstante, conforme al seguimiento que se realiza mes a mes la variación de precios de los insumos de construcción no han sido significativos. Una vez se supere el EER de la UF 4 y 5 se deberá evaluar el comportamiento de los precios, dado que actualmente el proyecto se encuentra en la fase de construcción operación y mantenimiento de la etapa preoperativa.

**Justificación calificación Probabilidad:** Dado que no se han presentado cambios importantes en los precios de los insumos de construcción y esperando que se mantenga esta tendencia en el tiempo, la calificación de la probabilidad de ocurrencia es medio baja.

**Justificación calificación Impacto:** Considerando que los precios de los insumos no presentan una variación significativa y al no presentarse a la fecha dichas variaciones la calificación del impacto es medio baja.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (ii) (v).

#### 15.1.15 SOBRECOSTOS POR OBRAS MENORES

**Tabla 260 Descripción del riesgo No.15**

| Tipo de riesgo                 | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|--------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Sobrecostos por obras menores. | Público    | Baja         | Bajo    | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Se indica que con fecha de corte a Marzo 2025, no hay avance en la ejecución de obras que a la fecha se realizan en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 corresponden a labores de operación y mantenimiento y pendiente en la ampliación del puente Teusacá II en la UF2B con obras.

**Justificación calificación Probabilidad:** Por lo expuesto en el contexto particular del riesgo la calificación de la probabilidad se estima Baja

**Justificación calificación Impacto:** Por lo expuesto en el contexto particular del riesgo la calificación del impacto se estima Baja.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (ii) (v).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 526 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

#### 15.1.16 MAYORES CANTIDADES DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**Tabla 261 Descripción del riesgo No.16**

| Tipo de riesgo                                                            | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento. | Privado    | Medio Baja   | Medio Bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Se inició la investigación geotécnica, que se realiza para la ejecución de los diseños para la solución definitiva del talud Arrayanes localizado en el PR1+080 de la UF3A, A julio 31 de 2023, se culminaron los diseños Fase 1 y se espera continuar con la fase 2.

**Justificación calificación Probabilidad:** Para Marzo 2025, no se presenta variación en el estado del riesgo por la anterior la probabilidad se estima Medio Baja.

**Justificación calificación Impacto:** Los estudios de la fase 2 se iniciarán tan pronto se llegue a un acuerdo conjunto con los actores involucrados, la calificación del impacto se estima Medio Bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (iii).

#### 15.1.17 VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**Tabla 262 Descripción del riesgo No.17**

| Tipo de riesgo                                                                     | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento. | Privado    | Baja         | Medio Bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Para este periodo no se ha presentado una variación importante en los precios insumos que conlleve a mayores costos de las actividades de operación.

**Justificación calificación Probabilidad:** Por lo anterior, la calificación de la probabilidad de ocurrencia es baja.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 527 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Justificación calificación Impacto:** Considerando que los precios de los insumos no varíen, no se esperan sobrecostos por este ítem, por tanto, la calificación del impacto es medio baja.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (iv).

#### 15.1.18 MENORES INGRESOS POR DISMINUCIÓN DEL RECAUDO DE PEAJES.

**Tabla 263 Descripción del riesgo No.18**

| Tipo de riesgo                                          | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes. | Público    | Alta         | Medio-Alto | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Se mantiene seguimiento a este riesgo dado que por la no instalación del peaje de CHOACHÍ, donde no se va a compensar el dinero dejado de recaudar, el cual se calcula en un valor cercano a los 2.200 millones de pesos trimestrales.

A continuación, se presenta el tráfico del mes en las estaciones de peaje.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2025, el tráfico vehicular aumentó en las tres estaciones de peaje, lo anterior respecto al mes de febrero de 2025 como se muestra a continuación:

| Peajes           | Tráfico Mensual |            |
|------------------|-----------------|------------|
|                  | Febrero 2025    | Marzo 2025 |
| Peaje Sopó       | 51.146          | 59.090     |
| Peaje La cabaña  | 64.553          | 76.384     |
| Peaje Los Patios | 134.532         | 148.560    |

#### **Justificación de la Probabilidad:**

La no instalación del peaje genera impacto financiero directo que afecta el VIP, al disminuirlo y como consecuencia aumentando el DR a reconocerse mediante compensación, y según se pudo evidenciar en el reconocimiento del DR8, donde este riesgo se materializó y la Nación tuvo que entrar a compensar el impacto, mientras las condiciones no cambien es un hecho que la calificación de la probabilidad de ocurrencia es alta.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 528 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### Justificación del Impacto:

El impacto se califica como medio alto, dado que el desfase se sigue presentando si no se logra completar las condiciones proyectadas en la estructuración. Como se evidencio en las actas trimestrales en donde se reconocen los menores recaudos por Decreto 050 el valor correspondiente al último trimestre cumplido 18 de julio al 17 de octubre de 2024 es de \$ 541.189.100 y una suma total de \$ 7.270.611.802.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (I).

### 15.1.19 MENORES INGRESOS DERIVADOS DE EVASIÓN DEL PAGO DE PEAJES.

**Tabla 264 Descripción del riesgo No.19**

| Tipo de riesgo                                            | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes. | Privado    | Baja         | Bajo    | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** El Concesionario ha tomado medidas adecuadas para eliminar al máximo la evasión de peajes, se han instalado reductores de velocidad en el carril IP/REV de la estación de peaje Los Patios donde se ha detectado mayor evasión, de esta manera se ha logrado disminuir la cantidad de vehículos infractores.

**Justificación calificación Probabilidad:** De acuerdo con los controles que se tienen implementados y a las medidas preventivas descritas en el contexto para evitar la evasión del pago de peajes la probabilidad de ocurrencia es baja.

**Justificación calificación Impacto:** Teniendo en cuenta que el concesionario ha instalado mecanismos e implementado controles para evitar la evasión del pago de peajes la calificación del impacto es bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (xxiv).

### 15.1.20 MENORES INGRESOS DERIVADOS DE ELUSIÓN DEL PAGO DE PEAJES.

**Tabla 265 Descripción del riesgo No.20**

| Tipo de riesgo                                           | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Público    | Baja         | Bajo    | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Mediante oficio CP-PER-2800-2018 (Rad ANI No. 2018-409-003505-2 de 15 de enero de 2018), se informó que se habían identificado la existencia de algunas rutas, las cuales, dada la ubicación de las Estaciones de Peaje de Sopó y Patios, pueden dar lugar a elusores.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 529 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Justificación calificación Probabilidad:** Las vías alternas por las cuales se podría eludir los peajes son vías terciarias o veredales que no son responsabilidad del Concesionario POB. Por lo tanto, no se puede programar ningún tipo de control, estas vías se encuentran en un estado regular lo cual hace que el desplazamiento sea lento, a esto se suma que son vías retiradas de los centros poblados siendo este un trayecto más largo, por lo cual la calificación de la probabilidad de ocurrencia es baja.

**Justificación calificación Impacto:** Teniendo en cuenta que se tienen identificadas las rutas alternas y la verificación periódica de las condiciones de las mismas, las cuales son poco favorables para la elusión del pago de peajes la calificación del impacto es baja.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (p)

#### 15.1.21 NO OBTENCIÓN DEL CIERRE FINANCIERO.

**Tabla 266 Descripción del riesgo No.21**

| Tipo de riesgo                      | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| No obtención del cierre financiero. | Privado    | Baja         | Medio Alto | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** al periodo actual, el cierre financiero contractual ya se llevó a cabo.

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá ya está cerrado, la calificación de la probabilidad de ocurrencia es baja.

**Justificación calificación Impacto:** La calificación del impacto es medio alto, ya que el riesgo está relacionado con la capacidad financiera para llevar a cabo la construcción de las Unidades funcionales (esto aplicaría para las UF4 y UF5 de superar el EER).

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (xiv).

#### 15.1.22 ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y/O COSTOS DE LA LIQUIDEZ QUE RESULTEN DE LA VARIACIÓN EN LAS VARIABLES DEL MERCADO O CONDICIONES DEL PROYECTO.

**Tabla 267 Descripción del riesgo No.22**

| Tipo de riesgo                                                                                                                                                | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto. | Privado    | Baja         | Bajo    | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 530 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### Contexto Particular del Riesgo:

En reunión sostenida con el privado el pasado 16 de Diciembre de 2024, con presencia de Ana Polanco, Manuel Castellanos Y Lilian Bohórquez en representación de la ANI, de Tomer Ginesin y Néstor Vásquez del área financiera y de Álvaro Oeding del área jurídica por parte del concesionario y de Mauricio Hernández, Profesional de Riesgos y Cesar Alba Subdirector Financiero por parte de interventoría,, para la revisión semestral de revisión de la matriz de riesgos contractual, se encontró que el comportamiento de las variables del mercado como IPC e IBR han venido a la baja, el impacto en el costo de financiamiento también, sin embargo, el concesionario manifiesta que los ingresos se ven afectados de la misma forma por lo que tampoco se altera la TIR del proyecto, pero si alterna el flujo de caja.

Para la revisión las tasas se han mantenido a la baja y los ingresos se ajustan al IPC, y considerando que la diferencia relacionada al decreto 050 se pagará como una compensación, este incremento no ha afectado la TIR del proyecto, y la probabilidad de que este tipo de cambios afecten al contrato lo ven como baja, al igual que el impacto que pueda tener, esto considerando ejecución completa del contrato de concesión incluyendo la construcción de la UF 4 & 5 y que la plata relacionada a estos UFs se pagará al concesionario. En caso de que el concesionario seguirá con la retribución de las UF 1-3 solamente, el incremento del IPC tendría un efecto material a su TIR y al equilibrio económico del concesionario

**Justificación calificación Probabilidad:** Hasta la fecha la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ha manifestado que estos antecedentes no impactan la TIR del proyecto y no ven como probable que pueda ocurrir, por lo anterior la calificación de probabilidad de ocurrencia es baja.

**Justificación calificación Impacto:** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. evalúa como bajo el impacto que pueda tener en el proyecto, en caso de que se salga de los rangos estos incrementos.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2. (a) (xi).

### 15.1.23 INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA INTERVENTORÍA POR RAZONES NO ATRIBUIBLES AL CONCESIONARIO.

**Tabla 268 Descripción del riesgo No.23**

| Tipo de riesgo                                                                                          | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario. | Público    | Baja         | Medio Alto | No        |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 531 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** En primera instancia se aclara que el análisis se realiza desde la definición del riesgo en la matriz contractual, es decir sólo por razones no atribuibles al concesionario, lo que significa que se hace solo por razones atribuibles al público en cabeza de la ANI, por lo que no se observa en este momento que pueda presentarse.

### Subcuenta Soporte Contractual

Frente al estado de fondeos de la subcuenta Interventoría y Supervisión, el Concesionario no ha cumplido con la totalidad de fondeos establecidos contractualmente; la diferencia es equivalente a \$28.509.823.717 (\$ dic 2012) respecto a lo contractualmente requerido, sin incluir los intereses de mora.

El 19 de octubre de 2023, el Concesionario realizó un fondeo a la subcuenta por un total de \$10.380.097.885. De acuerdo con la cuantificación de la Interventoría:

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Valor transf- abono el 19/10/2023                   | 10.380.097.884,65        |
| uso del valor transferido                           |                          |
| pago intereses (5)                                  | 10.380.097.884,65        |
| abono al valor fondeo                               | -                        |
| Intereses por pagar del (5)                         | 4.323.819.220,35         |
| Valor pendiente fondear (corrientes) al 19 oct 2023 | 41.084.082.866,70        |
| <b>TOTAL ADEUDADO POR PAGAR 19/10/2023</b>          | <b>45.407.902.087,05</b> |

Debido a que el Concesionario no dio cumplimiento a la obligación, la Interventoría remitió a la ANI mediante comunicación No. 20234091010122 del 06 de Octubre de 2023, el informe de incumplimiento en el cual se determinó que al 05 de Octubre el valor pendiente por fondear es equivalente a \$7.078.688,05, de los cuales \$6.673.780,05 corresponden al valor pendiente por fondear y \$404.908,00 corresponden a los intereses causados. Adicionalmente, se estableció una multa equivalente a \$6.193.600.000.

En respuesta a la notificación remitida, el Concesionario envió comunicación D-1330-2023 del 12 de Octubre de 2023, en la cual informó que, dado que realizó el fondeo el 02 de junio de 2023 por un valor de \$613.767.113 y adicionalmente fondeo los intereses del periodo 09-12-2022 al 02-06-2023, aun considerando que no era procedente, no se encuentra en incumplimiento de ninguna obligación para la subcuenta.

Mediante comunicación No. 20233060369451 del 11 de octubre de 2023, la ANI solicitó a la Interventoría la tasación de la multa por el incumplimiento presentado y la especificación de la fecha desde la cual se dio su inicio. En este sentido, la Interventoría a través de comunicación 20234091200142 del 19 de octubre de 2023, remitió a la ANI.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 532 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### ➤ Fondeo año 2023

En relación con el aporte 9 que debió realizarse como máximo el 18 de Marzo 2025 de 2023, por un valor correspondiente a \$10.160.367.351 (\$dic 2012), el cual no se cumplió por parte del concesionario, requiere que esta Interventoría solicite al privado, el cumplimiento de la obligación con los respectivos intereses de mora como máximo

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Valor fondeo anual 8 \$ dic 2022                    | \$ 350.000.000         |
| IPC MES REFERENCIA                                  | 78,05                  |
| Plazo máximo para realizar fondeo                   | 9/12/2022              |
| IPC nov 2022                                        | 124,46                 |
| Valor fondeo \$ dic 09 2022                         | \$ 558.116.592         |
| Fecha de Abono                                      | 2/06/2023              |
| Intereses mora al 02 jun 2023                       | 62.324.302             |
| <b>Total adeudado por pagar a 02-06-2023</b>        | <b>620.440.894,00</b>  |
| <b>Valor transferido 02 de junio 2023</b>           | <b>613.767.113,95</b>  |
| uso del valor transferido                           |                        |
| pago intereses                                      | 62.324.302,00          |
| abono al valor fondeo                               | 551.442.811,95         |
| Valor pendiente por fondear                         | 6.673.780,05           |
| <b>Fecha de corte</b>                               | <b>15/10/2023</b>      |
| Interés mora a la fecha de corte                    | 573.717,00             |
| <b>Total adeudado por pagar a la fecha de corte</b> | <b>\$ 7.247.497,05</b> |

**Justificación calificación Probabilidad:** Dado el contexto, el que este riesgo se concrete en términos de responsabilidad del público, se considera como de baja ocurrencia.

**Justificación calificación Impacto:** Con el fin de dar continuidad al proyecto y en la búsqueda permanente de soluciones en el desarrollo del proyecto, y para dar cumplimiento a la actual ley de contratación estatal, donde debe garantizarse la continuidad de la interventoría, en caso de ausencia de recursos la calificación del impacto es medio alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (m).

### 15.1.24 LIQUIDEZ EN EL RECAUDO DE PEAJE

Tabla 269 Descripción del riesgo No.24

| Tipo de riesgo                  | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Liquidez en el Recaudo de Peaje | Privado    | Alta         | Medio Bajo | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 533 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Con corte febrero de 2025, el recaudo neto de peajes acumulado sin incluir FOSEVI ni sobrantes, asciende a la suma de \$858.379 millones; representados en 50,06 millones de vehículos aproximadamente, sin incluir exentos

El Recaudo acumulado al corte del 28 de febrero de 2025 es de \$882.357.761.673.

El VPIP acumulado al corte del 28 de febrero de 2025 es de \$405.945.933.388 pesos de (dic14) y el Porcentaje de Cumplimiento del VPIP es de 34,03%

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de probabilidad de ocurrencia para el riesgo es alta, ya que se está presentando un menor ingreso por recaudo el concesionario, afectando la liquidez por recaudo de peajes.

**Justificación calificación Impacto:** De acuerdo con lo manifestado por el privado, el impacto se califica como medio bajo, ya que el valor que se está desplazando es una proporción medio bajo con respecto al total del recaudo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (XIX).

#### 15.1.25 RIESGO DE LIQUIDEZ GENERAL.

**Tabla 270 Descripción del riesgo No.25**

| Tipo de riesgo              | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Riesgo de liquidez general. | Privado    | Medio baja   | Medio Alto | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo;** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ha manifestado que con los mismos inconvenientes generados en el recaudo de peajes y el acceso a esas retribuciones, unido a no tener disponibilidad más rápida al total de los aportes del estado en los tiempos establecidos en el contrato, sus dos principales fuentes de liquidez, han originado dificultades, aun sin impacto material.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad de ocurrencia es medio baja debido a que cuentan con una liquidez adecuada.

**Justificación calificación Impacto:** Dado que el no tener acceso a algunos de los recursos de la retribución pueden tener impacto con el flujo de caja y el no acceso a recursos de capital, el privado manifiesta que de darse esto, el impacto sería medio alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2. (a) (xi).

#### 15.1.26 VARIACIONES DEL PESO FRENTE A OTRAS MONEDAS.

**Tabla 271 Descripción del riesgo No.26**

| Tipo de riesgo                               | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Variaciones del peso frente a otras monedas. | Privado    | Baja         | Bajo    | NA        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 534 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** El concesionario informa que, con la única moneda extranjera que el privado tiene ingresos y/o costos es el dólar, y dada la estabilidad que ha tenido la TRM desde el inicio del contrato de concesión, el balance existente entre estos parámetros, no ha generado que las proyecciones cambien y se mantengan lo esperado.

### Gráfica del precio del dólar



**Justificación calificación Probabilidad:** Dado que las condiciones macroeconómicas proyectadas no muestran un cambio que permita inferir mayores variaciones como las que se han tenido hasta la fecha, la calificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja.

**Justificación calificación Impacto:** La calificación del impacto es baja debido a que el privado espera no tener efectos diferenciales en las finanzas relacionadas con costos en dolares y dadas las proyecciones de la TRM.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2. (a) (xvii).

#### 15.1.27 COMPENSACIONES POR NUEVAS TARIFAS DIFERENCIALES.

Tabla 272 Descripción del riesgo No.27

| Tipo de riesgo                                   | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales. | Público    | Alta         | Alto    | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Como consecuencia del Decreto 050 de 2023, el Ministerio de Transporte como autoridad competente de fijar las tarifas de peaje decidió modificar la estructura tarifaria, al establecer el NO incremento anual dispuesto tanto en el Contrato de Concesión como en la resolución del peaje.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 535 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Por parte de residentes del Municipio de La Calera y la Vereda El Verjón de la ciudad de Bogotá D.C. se presentaron manifestaciones solicitando que para la Estación de Peaje de Los Patios se cobre una tarifa diferencial en proporción a la distancia recorrida sobre el corredor concesionado en el tramo del Peaje Los Patios, hasta el casco urbano del municipio de La Calera.

Adición de las categorías IE2 definida para residentes de las veredas El Hato y El Líbano (Calera) y vereda El Verjón (Bogotá), IE3 definida para los residentes de la vereda Camino Al Meta (Calera) y IE4 definida para los residentes de las veredas Salitre y Frailejón (Calera) ubicadas sobre el corredor del Proyecto, entre el tramo comprendido desde el casco urbano del municipio y el peaje de Los Patios, se estiman 2250 beneficiarios, con la necesidad de una compensación para el concesionario, la cual se puede cubrir solo por un periodo de tiempo corto con recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. Actualmente se está a la espera que el Ministerio de Transporte realice el análisis y de ser el caso emita la Resolución, así también se adelantan las gestiones necesarias para la actualización del plan de aportes al FCEE para incorporar los recursos necesarios para la compensación del riesgo.

A partir del 28 de septiembre quedó en firme mediante Resolución del Ministerio de Transporte la nueva estructura tarifaria específicamente para los Peajes Neiva y Patá. En dicha resolución se crearon nuevas categorías con tarifa especial, diferencial que deberá ser compensado por la Entidad al Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el CCPG. A continuación el detalle por peaje y categoría de las compensaciones por menor recaudo por tarifas diferenciales desde el mes de enero de 2023, por un costo total de \$13.112.862.400

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad de ocurrencia es alta teniendo en cuenta que estima que el riesgo se materialice. De acuerdo con el análisis realizado por la ANI se cuenta con los recursos necesarios para cubrir la compensación para la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. a través de la subcuenta excedentes ANI por dos años y posteriormente a través de la actualización del plan de aportes al FCEE para la modificación de las tarifas diferenciales para la categoría IE de la Estación de Peaje Los Patios e inclusión de la comunidad de la Vereda El Verjón. Durante el periodo la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. avanzó de manera satisfactoria con la asignación del beneficio de la tarifa diferencial a los residentes del municipio de La Calera.

**Justificación calificación Impacto:** De acuerdo con estimación de la ANI la propuesta de compensaciones por tarifas diferenciales por lo anteriormente nombrado asciende a \$545.500.800 anuales, lo cual tiene un impacto alto en el proyecto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (n).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 536 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 15.1.28 CAMBIO EN NORMATIVIDAD (TECNOLOGÍA DE RECAUDO ELECTRÓNICO DE PEAJES).

**Tabla 273 Descripción del riesgo No.28**

| Tipo de riesgo                                                        | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Cambio en normatividad (Tecnología de recaudo electrónico de peajes). | Público    | Medio Alta   | Bajo    | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. está operando el Recaudo Electrónico Vehicular con 4 Intermediadores FacilPass, Gopass, Copiloto, Flypass lo cual es un requisito para certificarse como operador de IP/REV.

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta que la regulación es dinámica, es posible que se presenten cambios en la normativa relacionada con la tecnología de recaudo electrónico de peajes, por esta razón la calificación de la probabilidad de ocurrencia es medio alta.

**Justificación calificación Impacto:** Con la prestación del servicio de IP/REV de manera continua, en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo con la normatividad vigente, la calificación de impacto es bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (q).

### 15.1.29 CAMBIO EN NORMATIVIDAD. (REFORMA TRIBUTARIA)

**Tabla 274 Descripción del riesgo No.29**

| Tipo de riesgo         | Asignación                   | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Cambio en normatividad | (Privado/Público Compartido) | Medio alta   | Bajo    | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** : El concesionario expone el requerimiento nuevo realizada por la DIAN a los concesionarios de la implementación del documento equivalente para los recaudos de peaje, para lo cual ya envió comunicación a ANI la cual espera sea respondida para cuantificar posibles impactos económicos y responsabilidades. En la reunión de revisión semestral de los riesgos que debe hacer esta interventoría con el privado se evaluará este aspecto.

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta que la legislación colombiana es dinámica, es posible que se presenten cambios en la normativa tributaria relacionada con el proyecto, por esta razón la calificación de la probabilidad de ocurrencia es medio alta.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 537 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Justificación calificación Impacto:** Se califica el impacto en bajo debido a que estas reformas no deben tener cambios significativos que puedan afectar no solo a este proyecto sino a los contratos que tienen en curso la Nación con el sector Privado, ya que pueden terminar en reclamaciones extra.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2 (a) (xxv) - Sección 13.3 (s)

#### 15.1.30 CAMBIO EN NORMATIVIDAD (NORMAS NIIF).

**Tabla 275 Descripción del riesgo No.30**

| Tipo de riesgo                        | Asignación                    | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Cambio en normatividad (normas NIIF). | (Privado/Público/ Compartido) | Baja         | Bajo    | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Lo que corresponde a normas internacionales NIIF, el Contrato de Concesión tanto en la contabilidad del Concesionario como la del Patrimonio Autónomo, cumple actualmente y desde su implementación obligatoria hace más de 6 años con la Normatividad NIIF, el concesionario afirma que no ha habido cambio en la normatividad.

**Justificación calificación Probabilidad:** En la normatividad NIIF, dado que, una de las características de estas normas es la estabilidad de las mismas, por lo que puede ser evaluada como de baja probabilidad de ocurrencia.

**Justificación calificación Impacto:** Así mismo al ser normas con muy pocas variaciones y ajustes que no cambian de fondo el impacto también se le da una calificación de bajo.

**Regulación contractual:** Parte General: Sección 13.2 (xxv).

#### 15.1.31 FUERZA MAYOR EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL OCASIONADA POR EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

**Tabla 276 Descripción del riesgo No.31**

| Tipo de riesgo                                                                             | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Público    | Medio Alta   | Medio Alto | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** El Contrato de Concesión No. 002 de 2014 señala taxativamente los casos en los cuales se generan Eventos Eximentes de Responsabilidad por Fuerza Mayor Predial. Atribuyendo principalmente a la no consecución de la entrega de



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 538 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

los predios faltantes para concluir una Unidad Funcional o predios faltantes para completar el porcentaje exigido como requisito para iniciar las Intervenciones en determinada Unidad Funcional, como resultado de la demora en los procesos de expropiación por vía judicial o administrativa según proceda.

Se debe determinar una nueva estimación presupuestal en los costos prediales que resulte de la alternativa que decida adoptarse entre la ANI y la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para efectos de solventar la situación existente en las Unidades Funcionales 4 y 5.

Seguimiento previo:

La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. fue radicada la comunicación No. D-937-2020 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual presentó una nueva Notificación de EER por la presunta Imposibilidad de realizar la Gestión Predial del Predio UF-1-051A-D, sobre el cual se pronunció de manera negativa mediante comunicación No. CP-PER-7264C-2020 (RAD. ANI No. 20204090517292) del 11 de junio de 2020.

Ahora bien, ante la negativa de aceptación del EER referido en la comunicación D-131-2020, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. presentó una controversia ante el Amigable Compondedor para dirimir una controversia expresamente señalada en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, suscitada entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (controversia relacionada con la negación del EER - Gestión Predial UF 1 ante la presunta imposibilidad de llevar a cabo la adquisición predial del inmueble identificado UF-1-050-D). Sobre el particular, el Panel de Amigable Composición se pronunció a favor de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., declarando el Evento Eximente de Responsabilidad por este solicitado hasta tanto se logre la titularidad del predio a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta el EER por la Imposibilidad de realizar la Gestión Predial del Predio del inmueble identificado UF-1-050-D de la UF1 y dependiendo lo que resuelva frente a la UF 4 y UF 5 se pueden llegar a presentar situaciones en relación con la gestión predial, por esta razón, la calificación de probabilidad de ocurrencia es medio alta.

**Justificación calificación Impacto:** Teniendo en cuenta la alternativa la definición del laudo sobre las Unidades UF4 y 5, por esta razón la calificación del impacto es medio alta, teniendo en cuenta la alternativa definida entre las partes.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (f).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 539 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

### 15.1.32 COSTOS OCIOSOS DE LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA QUE LLEGAREN A CAUSARSE POR EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

**Tabla 277 Descripción del riesgo No.32**

| Tipo de riesgo                                                                                                   | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad. | Público    | Medio Baja   | Medio Bajo | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Se encuentran vigentes tres (3) Eventos Eximentes de Responsabilidad de los que han sido declarados y ocho (8) adicionales que ya se encuentran superados.

**Tabla 278 Eventos Eximentes de Responsabilidad Vigentes**

| QUIÉN NOTIFICA EL EER                         | DOCUMENTO POR EL CUAL SE NOTIFICA EL EER                                                    | TEMA                                                                                                                                                                                                                       | ADMISIÓN / RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. | D-916-2018 del 27-04- 2018.                                                                 | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5.                                                                                         | <b>ACEPTADO</b> - Desde el 31 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                               | Se suscribe Acta de declaratoria de EER el día 01 de Octubre de 2018 entre la ANI y el Concesionario. |
| Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. | D-432-2018 del 22-02- 2018 - Alcance mediante comunicación D-2313 del 26 de octubre de 2018 | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Hallazgo Arqueológico en la Unidad Funcional 2A, encontrado en cumplimiento del Plan de Manejo Arqueológico, y que obliga a adelantar un Plan de Manejo Arqueológico, | <b>ACEPTADO</b> por disposición del Panel del Amigable Composición, según fallo del 18 de Marzo 2025 de 2018, en el cual se indica que existe el Evento Eximente de Responsabilidad en el sector correspondiente a la zona de la Estación de Pesaje - Báscula K8+890 y demás áreas conexas que | Vigente                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 540 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| QUIÉN NOTIFICA EL EER                         | DOCUMENTO POR EL CUAL SE NOTIFICA EL EER                                              | TEMA                                                                                                                                         | ADMISIÓN / RECHAZO                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                       | fase de monitoreo arqueológico.                                                                                                              | resulten afectadas. El Evento Eximente de Responsabilidad se declara desde el 08 de febrero de 2018.                                                                        |               |
| Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. | D-131-2020 del 27-01- 2020 - Reiterada mediante comunicación D-1155-2020 del 08072020 | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Imposibilidad de adquirir titularidad de predios en la Unidad Funcional 1 del Proyecto. | <b>ACEPTADO POR EL PANEL DE AMIGABLE COMPOSICIÓN DESDE EL 29 DE MAYO DE 2019 HASTA QUE SE LOGRE LA TITULARIDAD DEL BIEN.</b> (Decisión final del 24 de Marzo 2025 de 2020). | Vigente       |

Frente al Evento Eximente de Responsabilidad declarado como consecuencia de la Pandemia – COVID-19, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. presentó una reclamación por costos ociosos en virtud de lo descrito en el Acuerdo que declaró el referido EER. Lo anterior se produjo mediante comunicación No. D-2053-2020 del 11 de Marzo 2025 de 2020, la cual le remitió a la ANI indicando el valor y supuestos soportes frente a los costos ociosos que, a su juicio, se generaron. En este sentido, se realizó la respectiva revisión aclarando que:

1. La revisión que efectuará sería meramente de los documentos que aportará la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., relacionando los mismos y presentando las consideraciones sobre el particular.
2. La revisión que se efectuará frente a los denominados costos ociosos, así como el resultado de esta, no podría entenderse como aprobación de los mismos, sino una mera verificación conceptual.

Ahora bien, mediante comunicación No. CP-PER-8509C-2020 (RAD. ANI No. 20204091268092) del 15 de Marzo 2025 de 2020, se remitió las observaciones resultantes de la revisión efectuada sobre los documentos y soportes presentados por la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., concluyendo lo siguiente: No se cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo suscrito entre la ANI y los Concesionarios de modo carretero, en relación con la acreditación de costos ociosos a ser reconocidos a la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., siendo necesario en tal sentido que proceda a realizar todos los ajustes necesarios que permitan solventar las observaciones aquí planteadas, en los términos, plazos y condiciones establecidos para el efecto. Razón por la cual, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante comunicación No. D-2323-2020

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 541 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

del 22 de Marzo 2025 de 2020 le remitió a la ANI nuevamente los presuntos costos ociosos del Concesionario y sus subcontratistas, causados entre el 25 de marzo y el 31 de mayo de 2020, con la finalidad de que los mismos le fueran reconocidos en virtud de lo descrito en el Acuerdo Cuarto del Acuerdo suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y los Concesionarios de Modo Carretero, en virtud de la situación generada como consecuencia de la Pandemia declarada por el nuevo coronavirus COVID-19, indicando adicionalmente que, en la documentación presentada nuevamente, se atienden las observaciones que fueron presentadas.

Mediante correo electrónico del 28 de Marzo 2025 de 2020, la ANI le indicó la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. lo siguiente:

*“... tal como se informó, se envía copia del oficio de la ANI en el cual se manifiesta que se solicitó unificar la metodología para presentar los soportes de costos ociosos, esto para que lo tengan en cuenta una vez se defina adicional a las observaciones ya emitidas por la Interventoría y la ANI en días pasados (...)”.*

Mediante comunicación No. D-1443-2021 del 13 de Octubre de 2021, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. le remitió a la ANI lo siguiente: (i) dos certificaciones conforme al alcance y competencia del Representante Legal y Revisor Fiscal de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y (ii) certificaciones emitidas frente a la causación de costos ociosos en relación con el EPC y su subcontratista UT 2030. Lo anterior, fue remitido como respuesta a la comunicación por parte de la ANI.

Durante el mes de febrero de 2022, la ANI emite una serie de lineamientos con la finalidad de que se procediera a efectuar la revisión de los costos ociosos que habían sido reclamados por la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., dichos lineamientos se encuentran contenidos en la siguiente documentación:

#### **Tabla 279 Lineamientos ANI Costos Ociosos**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 542 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| NÚMERO DE CIRCULAR                                                                                                                                                                  | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular con radicado ANI No. 20225000000034 del 28 de enero de 2022 recibida por parte del Consorcio Intervías 4G mediante comunicación 20223060021811 del 2 de febrero de 2022.   | LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y CONTABLES PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LAS INTERVENTORÍAS DE PROYECTOS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES Y DEMÁS PROYECTOS. Contrato de Concesión No. 002 de 2014                                                                                                                                          |
| Circular con radicado ANI No. 20225000000024 del 28 de enero de 2022, recibida por parte del Consorcio Intervías 4G mediante comunicación 20223060035561 del 14 de febrero de 2022. | METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DEFINIR EL PERIODO DE AFECTACIÓN COSTOS OCIOSOS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LAS INTERVENTORÍAS DE PROYECTOS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES, DE ACUERDO CON EL RITMO DE EJECUCIÓN Y LA FECHA DE REACTIVACIÓN DE LOS PROYECTOS                                                                       |
| CIRCULAR No. 20225000000104 del 18 de febrero de 2022. Recibida por parte del Consorcio Intervías 4G mediante comunicación 20223060045221 del 23 de febrero de 2022.                | GUÍA JURÍDICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COSTOS OCIOSOS. Contrato de Concesión No. 002 de 2014. y LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR EL INFORME CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO Y CONTABLE DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE COSTOS OCIOSOS POR PARTE DE LAS INTERVENTORÍAS DE LOS PROYECTOS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES Y DEMÁS PROYECTOS |

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura

Se procedió a revisar la información que fue remitida por parte de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., remitiendo los respectivos análisis y conceptos mediante comunicación No. CP-PER-10952C-2022 (RAD. ANI No. 20224090205472) del 22 de febrero de 2022, con alcance mediante la comunicación No. CP-PER-10974C-2022 (RAD. ANI No. 20224090216622) del 24 de febrero de 2022. Ahora bien, en las comunicaciones antes referidas se concluyó lo siguiente:

*“En virtud de los lineamientos establecidos frente a la verificación de los costos ociosos, se presenta en el cuadro anexo el resultado de la revisión efectuada frente a cada ítem y soporte presentado por el Concesionario y su respectivo análisis conforme a la circular emitida por la Entidad sobre el particular. Ahora bien, en el documento anexo se podrá evidenciar la valoración de “aplica” o “no aplica”, frente a cada ítem que fue objeto de reclamación del Concesionario, frente a lo cual nos permitimos aclarar que, bajo la valoración denominada “no aplica”, se encuentran incluidos aquellos aspectos que no cumplieron con las especificaciones contenidas en la Circular No. 20225000000034 y aquellos sobre los cuales no se remite ningún soporte o que, habiéndose remitido, el mismo no resulta válido dadas sus características.*

*Por otra parte, es menester indicar que la Circular No. 20225000000024 no fue objeto de verificación, teniendo en cuenta el estado de avance de cada Unidad Funcional, así como*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 543 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

*el resultado de la valoración de la Circular No. 20225000000034, misma que permitió un análisis completo frente a los insumos presentados por el Concesionario”.*

Ahora, en el anexo al concepto emitido, se evidencia que, de conformidad con los lineamientos expedidos para la verificación de los costos ociosos, no resulta viable la aplicación de ningún ítem que fuera reclamado por la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

Por otra parte, mediante comunicación No. D-505-2022 del 08 de abril de 2022, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. solicitó lo siguiente: *“Por todo lo anterior respetuosamente solicitamos a la ANI, que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del acuerdo cuarto, se sirva de llevar a cabo el reconocimiento y pago de los montos correspondientes a los costos ociosos que no se encuentren en disputa. Lo anterior bajo el entendido de que, sobre los demás costos ociosos, las Partes podrán acudir a los mecanismos de solución de controversias, según las reglas contractuales previstas en el Contrato de Concesión”.*

Para lo cual, se le informó a la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. que, una vez realizada la valoración respectiva, se determinó la improcedencia del reconocimiento de costos ociosos a la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., por los ítems y soportes por él remitidos.

Posteriormente, mediante comunicación D-1575-2022 del 30 de Octubre de 2022, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura lo siguiente: *“Por todo lo anterior, le solicitamos comedidamente a la ANI proceder con el pago de los costos ociosos que fueron plenamente acreditados por el Concesionario, de forma la Entidad honre lo señalado en el referido “Acuerdo CCI””.*

Sobre lo cual, mediante comunicación CP-PER-12439C-2022 (RAD. ANI No. 20224091226322) del 31 de octubre de 2022 se comunicó:

*“Sobre el particular, nos permitimos informar que, en la medida que la comunicación aportada por el Concesionario no contiene nuevos documentos, cálculos ni soportes diferentes a los ya analizados por esta Interventoría con base en los lineamientos emitidos por la ANI para efectuar la respectiva revisión, es menester indicar que no hay hechos nuevos que modifiquen el concepto emitido mediante comunicación CP-PER-10952C-2022 (RAD. ANI No. 20224090205472) del 22 de febrero de 2022, reiterando el mismo mediante la presente comunicación”.*

A la fecha no se ha reconocido ningún valor por este concepto a la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

En virtud de tal acuerdo se dispuso, entre otras consideraciones, lo siguiente:



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 544 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

PRIMERO. Reconocimiento de afectación a ingresos de los concesionarios de iniciativa pública. Las partes reconocen que las medidas adoptadas para la mitigación de la pandemia del Covid-19, referidas a la exención del cobro de la tarifa de peaje a los vehículos que transitaron por el territorio nacional entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020 y al Aislamiento Preventivo Obligatorio comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de Octubre de 2020 han afectado los ingresos de los Concesionarios de iniciativa pública.

SEGUNDO. COMPENSACIONES FRENTE A LAS AFECTACIONES POR MENOR INGRESO DE LOS CONCESIONARIOS DE INICIATIVA PÚBLICA. Para compensar la afectación en los ingresos de los CONCESIONARIOS de Iniciativa Pública, la ANI acepta efectuar los siguientes reconocimientos a su favor:

a) Como consecuencia de la exención generada por el Gobierno nacional en virtud del artículo 13 del Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 y el artículo 9 del Decreto 569 de 2020, la ANI acepta reconocer el cien por ciento (100%) del valor del recaudo asociado al tráfico que transitó realmente por cada estación de peaje que no fue objeto de cobro, sin el reconocimiento de intereses remuneratorios o moratorios, sin perjuicio de la aplicación de la fórmula del DR8 y de la causación de los intereses derivados del no pago del DR8 en la fecha prevista, con cargo a los siguientes mecanismos de compensación:

(i) Recursos disponibles, superavitarios, excedentarios y/o remanentes de los patrimonios autónomos de cada Contrato de Concesión de los que legal y contractualmente la ANI pueda disponer, los cuales deberán ser revisados por lo menos una vez al año para esta finalidad. Una vez pagados, estos recursos serán considerados como parte del VPIP.

(ii) En caso de insuficiencia de las fuentes anteriores para atender la afectación bajo el presente literal (a), tal afectación será compensada con los recursos correspondientes a este riesgo disponibles en el Fondo de Contingencias para cada contrato de concesión, sin que se afecte la cobertura de otros riesgos.

(iii) En caso de insuficiencia de las fuentes anteriores para atender la afectación bajo el presente literal (a), tal afectación será compensada de acuerdo con lo dispuesto en la Parte General, numeral 3.4, Obtención del VPIP, literal b), según el cual si al vencimiento del año ocho (8) contado desde la Fecha de Inicio, el valor del VPIPm es inferior al VPIP8, la ANI pagará al Concesionario la diferencia (DR8) ponderada por el Índice de Cumplimiento promedio observado hasta dicho año (8)- conforme a las reglas allí contempladas o el primer VPIPn o DRn, que para el efecto aplique en cada proyecto.

b) Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades del orden territorial referidas al aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo y hasta el 31 de Octubre de 2020, la ANI acepta reconocer el cien por ciento (100%) del valor del recaudo asociado al tráfico que habría transitado por los corredores de los Proyectos si no se hubieran adoptado tales medidas, sin el reconocimiento de intereses remuneratorios o moratorios pero sin perjuicio de la aplicación de la fórmula del DR8 y de la causación de los intereses derivados del no pago del DR8 en la fecha prevista,



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br><b>Agencia Nacional de Infraestructura</b> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                                                                 | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Página 545 de 591</b>         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b> |

descontando el efecto del tráfico que transitó realmente por cada estación de peaje pero que no fue objeto de cobro cuyo reconocimiento se adelantará bajo las reglas del literal (a) inmediatamente anterior. La compensación de la afectación contemplada en el presente Literal (b), se realizará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del recaudo asociado al tráfico que habría transitado por los corredores de los Proyectos si no se hubieran adoptado tales medidas, con los recursos disponibles, superavitarios, excedentarios y/o remanentes de los patrimonios autónomos de cada Contrato de Concesión de los que legal y contractualmente la ANI pueda disponer, los cuales deberán ser revisados entre las PARTES por lo menos una vez al año para esta finalidad, a efectos de verificar su disponibilidad, sin que en ningún caso se afecte la cobertura de otros usos de acuerdo a la destinación de cada subcuenta. Una vez pagados, estos recursos serán considerados como parte del VPIP. Para estos efectos, las Partes acuerdan tener como base de cálculo del tráfico objeto de compensación, la diferencia entre (i) el tráfico real presentado por peaje y categoría en los meses de marzo a Octubre de 2019 con una tasa de crecimiento equivalente a la tasa promedio de crecimiento del tráfico de enero y febrero de 2020 comparado con el año 2019 y (ii) el tráfico real por peaje y categoría presentado en los meses de marzo a Octubre de 2020.

En caso de insuficiencia de las fuentes anteriores para atender la afectación bajo el presente literal (b) incluyendo el valor no compensado con los recursos disponibles, superavitarios, excedentarios y/o remanentes de los patrimonios autónomos de cada Contrato de Concesión de los que legal y contractualmente la ANI pueda disponer, tal afectación será compensada de acuerdo con lo dispuesto en la Parte General, numeral 3.4, Obtención del VPIP, numeral b), según el cual si al vencimiento del año ocho (8) contado desde la Fecha de Inicio, el valor del VPIP<sub>m</sub> es inferior al VPIP<sub>8</sub>, la ANI pagará al Concesionario la diferencia (DR<sub>8</sub>) ponderada por el Índice de Cumplimiento promedio observado hasta dicho año (8)- conforme a las reglas allí contempladas o el primer VPIP<sub>n</sub> o DR<sub>n</sub>, que para el efecto aplique en cada proyecto (...).

La estimación presentada del valor que pudiera corresponder según lo descrito en el Acuerdo No. 2 mediante comunicación No. CP-PER-9111C-2021 (RAD. ANI No. 20214090338742) del 26 de marzo de 2021, indicando los valores que a continuación indicamos:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 546 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Tabla 280 Acuerdo No.2**

| <b>ACUERDO No. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Como consecuencia de la exención generada por el Gobierno nacional en virtud del artículo 13 del Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 y el artículo 9 del Decreto 569 de 2020, la ANI acepta reconocer el cien por ciento (100%) del valor del recaudo asociado al tráfico que transitó realmente por cada estación de peaje pero que no fue objeto de cobro, sin reconocimiento de intereses remuneratorios ni moratorios, con cargo a los siguientes mecanismos de compensación:                                                                                                                                                                                                    | \$1.964.510.764 |
| Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades del orden territorial referidas al aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo y hasta el 31 de Octubre de 2020, la ANI acepta reconocer el cien por ciento (100%) del valor del recaudo asociado al tráfico que habría transitado por los corredores de los Proyectos si no se hubieran adoptado tales medidas, aplicando las fórmulas previstas en los contratos, descontando el efecto del tráfico que transitó realmente por cada estación de peaje pero que no fue objeto de cobro cuyo reconocimiento se adelantará bajo las reglas del literal (a) inmediatamente anterior: | \$7.093.277.653 |

Fuente: Elaboración Propia

Lo anterior, presentando las siguientes aclaraciones:

Solo se tuvieron en cuenta aquellas Estaciones de Peaje de las que se disponía de datos de tráfico para los años 2019 y 2020, es decir, para las Estaciones de Peaje de Patios y La Cabaña.

A la hora de calcular la diferencia de tráficos entre el 2019 y el 2020, solo se tuvo en cuenta para ello el periodo que daba lugar a la compensación, es decir, entre el 25 de marzo y el 31 de Octubre 2020.

Para el cálculo de la tasa promedio de crecimiento del tráfico de enero y febrero de 2019 comparado con el año 2020, los porcentajes se obtuvieron sumando los tráficos por categoría de enero y febrero de 2019 y comparándolos con los de enero y febrero de 2020, obteniendo una tasa de crecimiento equivalente por categoría y que en algunos casos resultó negativa.

En el caso de las tasas de crecimiento equivalentes negativas, se siguieron considerando en el cálculo, al entender que el Acuerdo No. 2 (b) buscaba compensar a los Concesionarios por el menor recaudo obtenido como consecuencia únicamente de la pandemia, por lo que si en alguna categoría el recaudo fue menor por otras circunstancias ajenas a la pandemia (tasa de crecimiento equivalente negativa en los meses de enero y febrero antes de la

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 547 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

pandemia) esto no debía ser compensado y por tanto se debía reflejar en la valoración económica el valor que resultara para esa categoría. Por el contrario, se daba el caso de que, incluso con tasa de crecimiento equivalente positiva, los tráficos podían ser superiores para una categoría en el periodo de estudio para el año 2020 con respecto al año 2019, como era el caso de la Categoría IV en la Estación de Peaje de Patios, en la que, a pesar de tener una tasa de crecimiento equivalente del 45,12 %, resultó que para el periodo de estudio en el año 2020 pasaron 947 vehículos más que en el 2019, lo cual generaba una reducción de la valoración total de la compensación del Acuerdo 2 (b) de \$ 33.402.584.

Para el caso de la Categoría EA (Eje Adicional) en la Estación de Peaje de La Cabaña se encontró con la imposibilidad matemática de calcular la tasa de crecimiento equivalente, al pasar de cero (0) en el año 2019 a seis (6) en el año 2020, en este caso especial se consideró una tasa de crecimiento equivalente del 0%.

En la Estación de Peaje La Cabaña se daba la particularidad de que en el año 2019 no existía la Categoría IE, la cual se introdujo en la Resolución No. 000020 de 10 de enero de 2020, por ello no fue posible establecer una tasa de crecimiento equivalente para la Categoría IE. Ante dicha problemática, se consideró en los meses de enero y febrero de 2019 todos los vehículos contabilizados en la Categoría I, los cuales también incluían los futuros vehículos de la Categoría IE, y los comparó con los vehículos de las Categorías I y IE de los meses de enero y febrero de 2020, conservando en la comparación una coherencia y obteniendo una tasa de crecimiento 2019 – 2020 de la Categoría I+IE. Con esta tasa, se pudo obtener el número de vehículos que dejaron de pasar en el periodo de marzo a Octubre de 2020 por causa de la pandemia. El siguiente problema por resolver surgió a la hora de valorar económicamente ese número de vehículos que resultó ser de 208.929, pues para ello era necesario saber cuántos pertenecían a la Categoría I (\$ 9.672) y cuántos a la Categoría IE (\$4.972), para ello se recurrió a la proporcionalidad evidenciada entre ambas Categorías en el periodo del estudio de compensación del 2020, es decir entre el 25 de marzo de 2020 y el 31 de Octubre de 2020. De lo anterior se obtuvo que el 95,36 % de los vehículos de la Categoría I+IE eran de la Categoría I en el periodo anteriormente indicado y el resto, es decir, el 4,64 %, de la Categoría IE. Aplicando dicha proporcionalidad a los 208.929 vehículos se consideró que 199.235 vehículos se valoraban con tarifa plena de la Categoría I y que el resto, es decir, 9.694 vehículos, se valoraban con la tarifa diferencial de la Categoría IE.

El valor anteriormente indicado de \$7.093.277.653 correspondía al 100% del valor resultante de la diferencia de tráficos para el periodo del 25 de marzo al 31 de Octubre, entre los años 2019 y 2020.

Además, por parte de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., también fue remitido la estimación de los costos por menor recaudo que, a su juicio, resultaban aplicables por los efectos generados por la pandemia de la COVID-19, así las cosas, mediante comunicación No. D-604-2021 del 26 de marzo de 2021, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. presentó la estimación de la siguiente manera:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 548 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Tabla 281 Estimación de costos por menor recaudo Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.**

| ESTACIÓN DE PEAJE | CASO A                  | CASO B                   |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Patios            | \$ 806.402.396          | \$ 4.447.758.376         |
| La Cabaña         | \$ 489.498.224          | \$ 2.982.938.688         |
| Sopó              | \$ 668.610.144          | \$ 2.521.253.031         |
| Choachí           | No Aplica               | \$ 1.680.246.354         |
| <b>Subtotal</b>   | <b>\$ 1.964.510.764</b> | <b>\$ 11.632.196.450</b> |
| <b>TOTAL</b>      |                         | <b>\$ 13.596.707.214</b> |

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede evidenciar, existe una amplia diferencia en los valores presentados por parte la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta que el concesionario no ha presentado reclamaciones por costos ociosos diferentes a los relacionados con la pandemia del Covid 19, la calificación de la probabilidad de ocurrencia es medio baja.

**Justificación calificación Impacto:** Debido a que no se cuenta con costos ociosos reconocidos por la ANI durante el desarrollo del proyecto diferentes a los relacionados con el Covid 19, para los cuales se cuenta con acuerdos, la calificación del impacto es medio bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (f).

#### 15.1.33 FUERZA MAYOR POR INTERFERENCIA DE REDES EN EL CORREDOR CONSIDERADO COMO EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

**Tabla 282 Descripción del riesgo No.33**

| Tipo de riesgo                                                                                              | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Fuerza mayor por interferencia de redes en el corredor considerado como evento eximente de responsabilidad. | Público    | Baja         | Medio Alto | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Riesgo que se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura por considerarse Eventos Eximente de Responsabilidad.

**Justificación calificación Probabilidad:** Hasta ahora la posibilidad de presentarse el riesgo, por tanto, la calificación de probabilidad es baja.

**Justificación calificación Impacto:** Dada la actual etapa de reversión y al no presentarse el traslado de redes en las UF 4 y 5 la calificación del impacto es medio bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (j).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 549 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

#### 15.1.34 FUERZA MAYOR POR DEMORAS EN LA CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES EN UN PLAZO MAYOR DE 360 DÍAS POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO.

**Tabla 283 Descripción del riesgo No.34**

| Tipo de riesgo                                                                                                                          | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Fuerza Mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario. | Público    | Baja         | Alto    | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Para las UF 1, 2 Y 3. Fue ejecutado en la etapa correspondiente por parte del Concesionario Perimetral del Oriente S.A.S y se ha dado cumplimiento contractual con las entidades competentes.

Para las UF 4 y 5 este aspecto solo se abordará toda vez sea surtido la claridad de las condiciones definidas para el EER contractual con el Concesionario Perimetral del Oriente S.A.S

**Justificación calificación Probabilidad:** Teniendo en cuenta que en la fase de preconstrucción contractualmente se debía realizar la consulta con las comunidades, la calificación de probabilidad de ocurrencia es baja.

**Justificación calificación Impacto:** Teniendo en cuenta que en la fase de preconstrucción contractualmente se debía realizar la consulta con las comunidades, la calificación del impacto es baja.

Para el tiempo estimado se menciona que es prudencial la justificación del impacto, en razón que esto no requiere mayores trámites, no obstante, los tiempos de demora podrían ser poco probable, en caso de ser materializado.

**Regulación contractual:** Parte General: Sección 13.3 (h).

#### 15.1.35 FUERZA MAYOR POR DEMORAS EN MÁS DE UN 150% DEL TIEMPO MÁXIMO ESTABLECIDO POR LA LEY APLICABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONCESIONARIO.

**Tabla 284 Descripción del riesgo No.35**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 550 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Tipo de riesgo                                                                                                                                                                        | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Fuerza Mayor por Demoras en más de un 150% del Tiempo Máximo Establecido por la Ley Aplicable para la Expedición de la Licencia Ambiental, por Causas No Imputables al Concesionario. | Público    | Medio baja   | Medio Alto | Si        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante los comunicados D-1203-2020 (01/07/2020) y D-118-2029 (22/01/2019), informó a la ANLA que las fechas de inicio de las intervenciones aprobadas por la Licencia Ambiental están suspendidas por la presencia de puntos de interés hídrico dentro del tramo que comprende la Construcción de la Variante Choachí. La ANI mediante comunicación 20216050198771 del 06 de julio de 2021, responde a la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. sobre la vigencia de la Licencia Ambiental de la variante Choachí - (Radicados ANI 20204091285022 del 18 Marzo 2025 2020 y 20214090237542 del 03 de marzo del 2021), aclarando que si bien existen unas condiciones establecidas en el acta de reconocimiento del EER de las UF4 y 5 desde el 31 de octubre del 2017 y firmada el 01 de Octubre del 2018, donde se acuerda suspender el plazo para la ejecución de todas las obras y actividades de intervención en las UF 4 y 5, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. tuvo un periodo aproximado de un año y tres meses para iniciar una o algunas de las obras, infraestructura y/o actividades autorizadas en la Licencia Ambiental. De igual manera, tampoco se evidencia que, a la fecha, la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. haya llevado a cabo una gestión ambiental pertinente y direccionada a minimizar al máximo el riesgo de la pérdida de vigencia de Licencia Ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo del 2015, anudado a lo anterior, la ANI no considera procedente aceptar que los gastos asociados a una posible gestión ambiental para la obtención de una posible nueva Licencia Ambiental para la Variante Choachí sean reconocidos por la Agencia, sino que éstos deberán ser asumidos por la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. de acuerdo a las condiciones contractuales asociadas a la gestión ambiental que están su cargo, cuenta y riesgo.

La Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. por medio de oficio No. D-1139-2021 allegado el día 08 de julio de 2021, dio respuesta frente al requerimiento efectuado en relación con los trámites adelantados por la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la finalidad de impedir la pérdida de ejecución de la Licencia Ambiental de la Unidad Funcional 5 – Variante Choachí, manifestando que se encuentra a la espera del requerimiento que efectúe la Autoridad Ambiental al respecto.

**Justificación calificación Probabilidad:** La gestión de la licencia ambiental es obligación contractual de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., ya que no se presentan actividades constructivas, por esta razón la calificación de la probabilidad de ocurrencia es Medio baja.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 551 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

**Justificación calificación Impacto:** Si no se cuenta con las licencias de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión se pueden generar retrasos, por lo cual la calificación del impacto es medio alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (h).  
De acuerdo con el Artículo Quincuagésimo Primero de la Resolución 0248 de 2016 se establece textualmente:

*“(…) Artículo Quincuagésimo Primero. En caso de que la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio a la etapa constructiva del proyecto, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7, de la Sección 8, Capítulo 3, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 o al que lo modifique o sustituya, en relación con la pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental”. (…)*

#### 15.1.36 EVENTOS ASEGURABLES.

**Tabla 285 Descripción del riesgo No.36**

| Tipo de riesgo       | Asignación | Probabilidad | Impacto | Valorable |
|----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| Eventos asegurables. | Privado    | Baja         | Bajo    | NA        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** El Consorcio ERS realizó el seguimiento a las garantías que para efectos del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, se han presentado bajo la modalidad de pólizas, en las cuales se verificó que se amparasen y asegurasen los eventos contractualmente exigibles para las pólizas de; (i) Cumplimiento, (ii) Responsabilidad Civil Extracontractual y (iii) Póliza de Seguro de Obras Civiles. Durante el periodo se encuentra que las pólizas no se encuentran aprobadas debido a observaciones que se encuentran pendientes por subsanar.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad de ocurrencia se considera baja en la medida que rara vez se han reportado siniestros durante la ejecución del contrato que requieran cobertura por las pólizas previstas, por acaecimiento de eventos cubiertos.

**Justificación calificación Impacto:** En caso de materialización del riesgo, debido a que el mismo se encuentra en cabeza de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y dado que la posible pérdida se encuentra asegurada según los términos contractuales, el impacto sobre el valor del proyecto se considera bajo.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.2. (a) (xvi).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 552 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### 15.1.37 EVENTOS NO ASEGURABLES.

**Tabla 286 Descripción del riesgo No.37**

| Tipo de riesgo         | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Valorable |
|------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Eventos no asegurables | Público    | Baja         | Medio Alto | No        |

Fuente: Elaboración Propia

**Contexto Particular del Riesgo:** Teniendo en cuenta que se trata de la ocurrencia de eventos fuera del control razonable de la parte que lo invoca, el riesgo se encontrará latente durante la ejecución del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.

**Justificación calificación Probabilidad:** La calificación de la probabilidad de ocurrencia es baja, debido que no se evidencian a la fecha situaciones que pudiesen llegar a constituir eventos no asegurables.

**Justificación calificación Impacto:** En caso de materialización del riesgo, debido a que se encuentra en cabeza de la ANI en virtud de la asignación definida contractualmente, el impacto sobre el valor del proyecto se considera medio alto.

**Regulación Contractual:** Parte General: Sección 13.3 (b)

## 15.2 RIESGOS DE LA ETAPA DE REVERSIÓN

Como medida de seguimiento de Riesgo se definen los siguientes Riesgos para que desde las áreas se realice el seguimiento y contexto a medida que surge la etapa de Reversión.

### 15.2.1 GUARDA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**Tabla 287 Descripción del riesgo No.1.2.1**

| Tipo de riesgo                                | Asignación | Probabilidad | Impacto    | Área                      |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|
| Aseguramiento de la operación y mantenimiento | Público    | Baja         | Medio Alto | Operación y Mantenimiento |

Fuente: Elaboración Propia

Basados en lo referido a la etapa de reversión y sin perjuicio de las obligaciones que le asisten al concesionario en cuanto a la ejecución de las intervenciones previstas, las obligaciones de operación y las obras de mantenimiento dentro del marco del contrato, y por lo tanto la ANI debe asegurar un ente propio o externo que asegure estas labores.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 553 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

### **15.2.2 ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y SUS ANEXIDADES.**

Todos los bienes muebles e inmuebles deben ser entregados por el concesionario con un listado y protocolo de estado adecuado para la recepción de la Ani, en las condiciones señaladas en el apéndice Técnico 2. Para lo cual la entidad debe definir o delegar un responsable de la verificación.

La actualización del inventario y avalúo de los activos de la concesión incluirá todos los bienes inmuebles y todos aquellos bienes adquiridos para las actividades de operación incluidos en el apéndice técnico 2 y así mismo se verificará que los predios adquiridos, se encuentren libres y en orden física y legalmente.

En el evento que haya activos en leasing o arriendo deberá anticiparse el contrato de manera que pueda transferirse la propiedad de dichos activos a la ANI.

El concesionario debe adelantar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las transferencias de los bienes muebles e inmuebles.

Los activos intangibles, de propiedad planta y equipo se deben registrar y entregar según lo contemplado en el régimen y doctrina de la contaduría pública. Que entre otros debe incluir a completitud los formatos (57) aportes estatales, (112 A y B) Inversiones del privado y recaudos totales de peajes.

### **15.2.3 DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS A COMPLETITUD.**

Realizar dentro de los plazos establecidos la entrega y cierre a completitud de los bienes inmuebles asegurados dentro del plazo definido para la etapa de Reversión

### **15.2.4 RIESGO DE LIQUIDEZ POR LAS RESTRICCIONES DE LA ETAPA DE REVERSIÓN**

Dadas las condiciones definidas por el amigable componedor y el periodo para definir los flujos de pagos requeridos el concesionario podría tener una disminución del flujo de efectivo en su mantenimiento, por lo cual se debe realizar seguimiento para evitar afectar los procesos que pudieran tener un deterioro dentro de la etapa de Reversión.

### **15.2.5 CUBRIMIENTO DE LAS ACCIONES AMBIENTALES**

Dentro de la etapa de reversión y previo a la entrega a un ente competente para el cumplimiento de las funciones de operación y mantenimiento oportuno, las especies y zonas ambientalmente sensibles pueden tener un deterioro por la falta de mantenimiento adecuado en el periodo de Reversión.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b>                                 |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b><br><b>Página 554 de 591</b><br>Fecha: 30 de mayo de 2025 |

### 15.2.6 AFECTACIÓN DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Asegurar el mantenimiento de los niveles de atención en el servicio, en cuanto a la relación y comunicación efectiva con las comunidades de las zonas de influencia del proyecto, para evitar quejas y/o protestas que pudiera afectar el normal funcionamiento de las vías activas.

De otra parte, continúa con la atención de las PQRS que surjan dentro de la etapa de reversión, con el fin de mantener indemne a la ANI de reclamaciones.

Todos estos deben darse dentro de los plazos máximos definidos para la Etapa de Reversión, y especificando siempre las condiciones técnicas incluyendo la última medición de los indicadores técnicos y cumplimiento definidos en la Reversión.

### 15.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

**Tabla 288 Valoración riesgos**

|              |            |                                         |                              |                        |             |
|--------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| PROBABILIDAD | ALTA       |                                         | R24                          | R7; R18                | R2; R9; R27 |
|              | MEDIO ALTA | R28; R29                                |                              | R1; R13; R31           |             |
|              | MEDIO BAJA | R3;                                     | R4;R10;R11;<br>R14; R16; R32 | R5; R12; R25; R35      |             |
|              | BAJA       | R15; R19; R20;<br>R22; R26; R30;<br>R36 | R8; R17                      | R6; R21; R23; R33; R37 | R34         |
|              |            | BAJO                                    | MEDIO BAJO                   | MEDIO ALTO             | ALTO        |
|              | IMPACTO    |                                         |                              |                        |             |

Fuente: Elaboración Propia

**Nota:** De acuerdo con la resolución 4859 de 2019, los riesgos valorables cuantitativamente corresponderán únicamente a riesgos a cargo del público o compartidos por este que se encuentren en el área de riesgo (Riesgos en color amarillo).

Los siguientes riesgos se encuentran en zona valorable con asignación pública:

**Riesgo No. 2 “Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas”** Debido al contexto particular del riesgo y con base en la sabana predial versión 112 e incluyen gastos de Escrituración, registro, beneficencia, lucro cesante, daño emergente y compensaciones sociales, ya que la Interventoría a la fecha no ha recibido la versión que corresponde al mes de Marzo 2025, el porcentaje de ejecución es del 98.13% en pesos constantes. La calificación del impacto es Alto debido a mayores requerimientos por ejecutar.

La calificación de la probabilidad es Alta.

**Riesgo No. 7 “Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente a la imposibilidad de ubicación de casetas de peaje nuevas, previstas en la estructuración (No instalación de casetas de peaje)”** debido a que la construcción de

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 555 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

las estaciones de peaje de Choachí (UF3B) y Ubaque (UF5) sigue suspendida debido a un EER. Mediante el otrosí No. 10 las actividades de construcción de la estación de peaje de la Unidad Funcional 3B - Choachí, fueron reanudadas. Por otra parte, la situación actual de las UF 4 y 5 afectadas por el EER, conllevó a suspender las actividades de obra que allí se estaban ejecutando, siendo necesario iniciar la búsqueda de posibles soluciones que permitan la construcción de la carretera sin afectar los nacaderos en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, lo que hace que a la fecha no se pueda instalar el peaje de Ubaque. Por lo anterior, se ve afectado el recaudo de peajes.

**Riesgo No.9 “Sobrecostos por interferencia de redes”:** Con respecto a la Subcuenta de Redes ha avalado un valor total en precios constantes de \$11.550.936.808 por concepto de diseños y cortes de obra con ocasión de ejecución de traslados de redes secas y húmedas en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3A, quedando pendiente pagos por redes secas y por redes húmedas. Por otra parte, llevado el valor avalado a precios constantes se da el valor de \$8.703.190.756 pesos constantes. El valor anteriormente indicado aún está por debajo del valor estimado inicial, por lo que a la fecha no se ha materializado el riesgo. Es de aclarar que los traslados de redes húmedas y secas de las Unidades Funcionales 4 y 5 requieren del estudio que corresponda de acuerdo con la decisión que tomen las Partes para viabilizar el corredor existente o un nuevo corredor por el que transcurran las obras.

**Riesgo No.18 “Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes”,** Se mantiene seguimiento a este riesgo dado que por la no instalación del peaje de CHOACHÍ, donde no se va a compensar el dinero dejado de recaudar, el cual se calcula en un valor cercano a los 2.200 millones de pesos trimestrales.

**Riesgo No.27 “Compensaciones por Tarifas diferenciales”** Se evidencia una posible materialización del riesgo. De acuerdo con el análisis realizado por la ANI se cuenta con los recursos necesarios para cubrir la compensación para la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. a través de la subcuenta excedentes ANI por dos años y posteriormente a través de la actualización del plan de aportes al FCEE para la modificación de las tarifas diferenciales para la categoría IE de la Estación de Peaje Los Patios e inclusión de la comunidad de la Vereda El Verjón. La propuesta de compensaciones por tarifas diferenciales asciende a \$545.500.800 anuales, lo cual tiene un impacto alto en el proyecto.

**Riesgo No.31 “Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad”,** Teniendo en cuenta el EER por la Imposibilidad de realizar la Gestión Predial del Predio del inmueble identificado UF-1-050-D de la UF1 y dependiendo lo que resuelva frente a la UF 4 y UF 5 se pueden llegar a presentar situaciones en relación con la gestión predial, por esta razón, la calificación de probabilidad de ocurrencia es medio alta.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 556 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 15.4 FLUJO DE EGRESOS DE LOS PRESUPUESTO

**Tabla 289 Presupuesto estimado que se espera ejecutar durante la vigencia del proyecto con corte informe financiero 30 de Diciembre 2024**

| RIESGO                         | Valor base subcuenta (\$ dic/2012) | Presupuesto estimado total por riesgo (\$ dic 2012) | Pagado (\$ dic 2012) | % ejecutado (Valor pagado vs Presupuesto o estimado Total) | Flujo de egresos anual (\$ dic 2012) |                     |                    |                  |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                |                                    |                                                     |                      |                                                            | 2023                                 | 2024                | 2025               | 2026             |
| <b>Ambiental</b>               | \$ 30.545.176.956                  | \$27.948.512.111,42                                 | \$ 2.245.734.655,20  | 8.03                                                       | \$5.468.379.095,20                   | \$397.411.271,45    | \$20.514.897.838,2 | \$103.326.930,57 |
| <b>Predial</b>                 | \$ 59.899.835.500                  | \$ 100.109.735.082                                  | \$48.295.856.094,3   | 48,24                                                      |                                      | \$51.813.878.987    |                    |                  |
| <b>Redes</b>                   | \$ 11.550.936.808                  | \$ 19.223.349.472                                   | \$ 7.350.540.661,28  | 38.23                                                      |                                      | \$11.872.808.810,72 |                    |                  |
| <b>Geológico</b>               | \$ 0                               | \$ 0                                                | \$ 0                 | -                                                          | \$ 0                                 |                     |                    |                  |
| <b>Menor recaudo Acuerdo 1</b> | N.A.                               | \$ 1.217.996.673,68                                 | \$ 0                 | -                                                          | \$ 1.217.996.673,6                   |                     |                    |                  |
| <b>Menor recaudo Acuerdo 2</b> | N.A.                               | \$ 7.211.961.799                                    | \$ 0                 | -                                                          | \$ 7.211.961.799                     |                     |                    |                  |

Fuente: Elaboración Propia

**Nota 1:** Se estima un DR8 (Del 19 de Enero de 2014 al 18 de Diciembre de 2022) de \$315.544.663.784 (\$corriente).

**Nota 2:** se realizó el cálculo del VPIP al corte del 19 de diciembre de 2024, último día de etapa de operación y mantenimiento del contrato de concesión. A esta fecha el VPIP alcanzó el 65,31% respecto a lo proyectado para el mes 156 es decir el año 13 de concesión. En relación con el VPIP total contractual, se alcanzó el 38,30%.

**Nota 3:** El cumplimiento de este flujo de egresos se deriva de la consecución de predios para adelantar la siembra de árboles impuesta por parte de la CAR en el "Plan Único de Compensaciones Ambientales "emitido mediante Resolución DGEN No. 20227000463 del 25-AGO-22. Respecto a las compensaciones ambientales de la UF4 y UF5 se registran las compensaciones asociadas al convenio de Corporinoquia para las UF 3B 4 y 5 y las compensaciones de la UF 4 con la CAR incluidas en el Plan Único de compensaciones Municipales de Agua (BAMA) impuesto mediante Resolución DGEN No.20227000463 de 25-AGO-22.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca".</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 557 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

## 15.5 RECOMENDACIÓN

Continuar con el seguimiento al diferencial en el recaudo VIP que se viene presentando y a las acciones que las partes consideren necesarias.

Verificación a los recursos estimados necesarios para las subcuentas de redes y predial y a los planes de acción definidos entre el concesionario y la ANI para mitigar los sobre costos y verificar porcentajes de cumplimiento contractual.

Revisión de los parámetros de acción para el Procedimiento de reversión del contrato según los términos previstos en el laudo arbitral del 19 de diciembre de 2024.

Definición de planes de acción por área para cumplir con los cronogramas pactado para la reversión del contrato.

Acciones de cumplimiento de las definiciones del amigable componedor.

Seguimiento a las definiciones de ubicación del peaje de Choachí (UF3B).

## 15.6 CONCLUSIONES

A continuación, se resumen las principales conclusiones del presente periodo:

- Para la gestión predial en el mes de Marzo 2025, se realiza el seguimiento por unidad funcional obteniendo los siguientes datos, en la Unidad funcional 1 se reportan 38 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales uno (1) está pendiente por clarificarse su naturaleza jurídica (posible baldío) y cuatro (4) predios que fueron cedidos por sus propietarios a título gratuito, Para el mes de Marzo 2025, en la Unidad funcional 2 se reportan 225 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales se cuenta con doscientos catorce (214) predios con folio ANI, 9 predios se encuentran en proceso de expropiación y 2 predios en adjudicación de baldíos, para un total once (11) predios pendientes por adquirir a favor de la ANI, para el mes en mención., para la UF-3 de 228 Predios requeridos, se cuenta con 219 predios a favor de la ANI, 8 Predios en proceso de expropiación con demanda admitida, 1 predio con Resolución de Expropiación radicada ante la ANI.
- El Riesgo predial por sobre costos, Los valores tomados en tabla 284, son los reportados según sabana predial versión 112 e incluyen gastos de Escrituración, registro, beneficencia, lucro cesante, daño emergente y compensaciones sociales, el porcentaje de ejecución es del 98.13 % en pesos constantes.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 558 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- El riesgo por sobrecostos por interferencia de redes, con respecto a la Subcuenta de Redes ha avalado un valor total en precios constantes de \$11.550.936.808 por concepto de diseños y cortes de obra con ocasión de ejecución de traslados de redes secas y húmedas en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3A, quedando pendiente pagos por redes secas y por redes húmedas. Por otra parte, llevado el valor avalado a precios constantes se da el valor de \$8.703.190.756 pesos constantes. El valor anteriormente indicado aún está por debajo del valor estimado inicial, por lo que a la fecha no se ha materializado el riesgo. Es de aclarar que los traslados de redes húmedas y secas de las Unidades Funcionales 4 y 5 requieren del estudio que corresponda de acuerdo con la decisión que tomen las Partes para viabilizar el corredor existente o un nuevo corredor por el que transcurran las obras.
- Con respecto al riesgo por Menores Ingresos Por Disminución Del Recaudo De Peajes, en el periodo de Marzo 2025, el tráfico vehicular aumentó con respecto al mes anterior.
- Dado el conocimiento del laudo arbitral se puede resaltar las conclusiones y examinar con detenimiento las implicaciones en el proyecto y en los riesgos en particular.

De este Laudo se resaltan:

- Jurisdicción: el arbitraje se considera con acción internacional dado que se cumplen los criterios de internacionalidad previstos en el literal c) del artículo 62 de la Ley 1536 de 2012.
- Falta de competencia por inexistencia de relación con el EPC y accionistas: Se acepta la excepción de la ANI sobre la falta de competencia del Tribunal para abordar las reclamaciones del Contratista EPC, ya que se refieren a daños sufridos por un tercero. Igualmente, desestimó la solicitud de indemnización de la accionista Shikun & Binui VT AG (S&B), al no existir obligaciones contractuales que la vinculen con la ANI.
- Terminación anticipada solicitada por la ANI: Se acoge la pretensión de la ANI sobre la Terminación Anticipada del Contrato, declarando su finalización a partir de la fecha de notificación del Laudo e iniciando el periodo de cierre del contrato.
- Incumplimiento por identificación de los manantiales en las UF 4 y 5: Señala que es atribuible a la ANI por no haberse identificado en la fase de estructuración de la iniciativa pública con lo cual se viola el deber de planeación que le asisten a las entidades públicas. Por lo anterior, falla a favor de las Demandantes en su reclamación de indemnización, asignando la suma de \$413.605'900.000 por costos incurridos en las UFs 4 y 5 o por Intervenciones Prioritarias y en general mantenimiento.



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca".</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 559 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

- Cumplimiento del Acta de Evento de Eximente de Responsabilidad (EER) para las UFs 4 y 5 reconocido por la ANI sobre los manantiales: dijo que la ANI cumplió con los términos del EER para las UFs 4 y 5, ya que su obligación era "determinar y revisar", no "suscribir" un acuerdo superador del EER como un Otrosí, sin embargo, dijo que en la superación del EER respecto a las UFs 4 y 5, incumpliendo su deber de buena fe tanto en la evaluación de la viabilidad de un acuerdo como en la revisión de las actividades necesarias para que se pudieran llevar a cabo las intervenciones.
- Imposición de la ANI al fondear subcuenta de interventoría: POB fue obligada a fondear la subcuenta de interventoría, la cual no estaba activa al 100% debido a problemas ambientales, lo que resultó en mayores aportes a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría. Por lo tanto, el Tribunal asignó \$119.500.000.000, al no haber una reducción proporcional de dicha subcuenta en relación con los costos incurridos en las UFs 4 y 5.
- Consecuencias de la terminación anticipada pedida por la ANI: al haber accedido a la petición de la ANI de terminar el contrato, el Tribunal ha otorgado por pérdida de utilidad derivada de las unidades funcionales ya terminadas por POB y en operación y mantenimiento (UF1, 2 y 3) la suma de \$803.300.000.000.
- En resumen, la ANI deberá pagar a POB, \$413.605.900.000, por los costos incurridos respecto a las UFs 4 y 5; \$119.500.000.000, por la no reducción proporcional a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría; y \$803.300.000.000 por pérdida de utilidad respecto de las UFs 1, 2 y 3, por un total de COP \$1.336.405.900.000.
- Sobre la implicación y por menores que incluyen en cada caso se deberá examinar jurídica y técnicamente en cada área y tipo de riesgo asociado.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 560 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 16 SEGUIMIENTO HALLAZGOS CONTRALORÍA

Mediante circular 20245000000164 del 6 de marzo de 2024, la entidad requiere que la Interventoría incluya dentro de los informes mensuales un capítulo de seguimiento junto con los soportes de las gestiones efectuadas, respecto de los planes de mejoramiento de los hallazgos emitidos por la Contraloría General de la República en los correspondientes proyectos de concesión.

Por lo anterior, se presenta el seguimiento efectuado por esta Interventoría a los 3 hallazgos efectuados por la Contraloría.

### 16.1 HALLAZGO 1241 PRESUNTOS RETRASOS ENTREGA Y PLAN DE OBRAS DE LAS UF 1, 2 Y 3:

De la revisión realizada al cumplimiento de los compromisos y obligaciones del Contrato y lo observado en la visita a la Concesión por parte de la CGR, se evidenció que la Unidad Funcional 1, que debía culminar el pasado 12 de junio de 2017 y las Unidades Funcionales 2 y 3 que tenían fecha de terminación de 15 de diciembre de 2017 no habían sido terminadas dentro de dichos plazos. En la presentación entregada como anexo al Acta de visita a la Concesión y el informe de Interventoría No. 39, de febrero de 2018, se observa que el avance total del proyecto a febrero de 2018 es de 26.40%, por lo que existe un atraso del 21.28% respecto al avance programado que corresponde a 47.68%. A la fecha, la Unidad Funcional 1 está terminada, en verificación de la Interventoría, las Unidades Funcionales 2 y 3 están incumplidas y las Unidades Funcionales 4 y 5 están atrasadas en un 10.54% y 4.67%, respectivamente.

#### Causa del hallazgo

La anterior situación evidencia que las obras de las Unidades Funcionales 1,2 y 3, no se efectuaron dentro de los tiempos establecidos en el Plan de Obras contractual vigente.

#### Gestiones efectuadas

A la fecha de la ejecución del presente informe, con relación a los pendientes del Acta de Terminación Parcial de la UF 2 suscrita el 17 de octubre de 2019, está pendiente la ampliación del Puente Teusacá II y las labores de terminación en la Báscula de Sopó. Respecto a la ampliación del Puente Teusacá II, el “CONTRATO DE TRANSACCIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S”, fue firmado entre las partes el 1 de septiembre de 2023; la ampliación del puente se encuentra en ejecución (De acuerdo con la reprogramación presentada con comunicación D-50-2024 del 26 de enero de 2024, con corte a 31 de marzo de 2024 se verifica que se presenta un ejecutado del 40,67% y un programado del 57,55%, con un atraso del 16.88% ). Mediante comunicación D-460-2024 del 27 de marzo de 2024, la Concesionaria realiza notificación para solicitud de reconocimiento de Evento Eximente de Responsabilidad por la imposibilidad de terminar las Obras de ampliación del puente vehicular Teusacá II dentro de los plazos de la cláusula segunda del Contrato de Transacción, por demoras en la gestión de la CAR.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 561 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

Con respecto a las labores de terminación en la Báscula de Sopó, falta culminar un sector de la Estación de Pesaje (Sector Alcaparros) afectado por el EER de Arqueología, durante el presente periodo de marzo de 2024, no se ha ejecutado ninguna actividad constructiva; sin embargo, las labores arqueológicas han terminado y se espera que se concluyan las labores pendientes (Labores de catalogación del ICANH). La interventoría remitió comunicado dirigido a la ANI CERS-OP-2805-2023 (Rad ANI 20234091131392) del 3 de octubre de 2023, solicitando el cierre proceso sancionatorio, para los ACUERDOS DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA UF 2. La Unidad Funcional 2 continúa en operación y mantenimiento.

Con relación a los pendientes relacionados en el Acta de Terminación Parcial de la UF 3 suscrita el 7 de noviembre de 2019, mediante el comunicado CERS-OP-660-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, respecto a la revisión de los aspectos definidos en los Acuerdos contenidos en los Numerales 3 y 5 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3, Contrato de Concesión No. 002 de 2014. Proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca- (Tema: Informe respecto de pendientes UF3), donde concluye: “... Con las revisiones conjuntas y el seguimiento que se ha efectuado a las correcciones de parte del Concesionario, EL CONSORCIO INTERVENTOR ERS encuentra que el Concesionario atendió todas las observaciones.”; sin embargo, se encuentra aún pendiente la ejecución del peaje de Choachí, labores que se encuentran suspendidas desde el 19 de febrero de 2024 por problemas con la comunidad y el plazo solicitado por CORPORINOQUIA para la revisión sobre el estudio complementario que se adelanta por la revisión de emisiones solicitada por la comunidad.

## 16.2 HALLAZGO 1377 SUSPENSION CONSTRUCCIÓN UF 4 Y UF 5 , CON RECONOCIMIENTO EER

Frente a los hallazgos 1377 correspondiente a la Suspensión de la Construcción de la UF 4 y UF 5 nos permitimos relacionar lo siguiente:

1. A continuación, se relacionan los Eventos Eximentes de Responsabilidad en referencia al área ambiental, ver la siguiente tabla:

**Tabla 290 Trazabilidad del Evento de responsabilidad Eximente.**

| Quien Notifica el EER             | Documento por el cual se Notifica el Evento Eximente de Responsabilidad. | Tema                                                                                                                                                                           | ADMISIÓN / RECHAZO                                              | OBSERVACIONES                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-485-2018 del 01-03- 2018.                                              | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Existencia de fuente hídrica y orden de la Alcaldía del Municipio de La Calera en la Unidad Funcional 3 (sector La Calera | ACEPTADO (Duración: 16-02-2018 al 16-03-2018) – <b>SUPERADO</b> | Se suscribe Acta de reconocimiento de EER el día 01 de agosto de 2018, entre la ANI, Interventoría y el Concesionario. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 562 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Quien Notifica el EER             | Documento por el cual se Notifica el Evento Eximente de Responsabilidad. | Tema                                                                                                                                                                                                                                     | ADMISIÓN / RECHAZO                                                   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                          | Patios) – Suspensión inmediata de las Intervenciones. <b>PK 6+230 y PK 6+430<sup>a</sup></b>                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-916-2018 del 27-04- 2018.                                              | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5.                                                                                                       | ACEPTADO – Desde el <b>31 de octubre de 2017. VIGENTE</b>            | Se suscribe Acta de declaratoria de EER el día 01 de agosto de 2018 entre la ANI y el Concesionario.                                                                                                                                                                   |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-983-2018 del 09-05- 2018.                                              | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / Existencia de fuente hídrica y orden de la Alcaldía del Municipio de Sopó en la Unidad Funcional 2 (sector La Duraznero – Casa Vieja) – Suspensión inmediata de las Intervenciones. | ACEPTADO – Desde el <b>23 de abril de 2018. SUPERADO</b>             | EER superado, el Concesionario ya notifico formalmente la cesación de los hechos, pero a la fecha no ha reportado la finalización de la actividad técnica que se está realizando.                                                                                      |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-1017-2018 del 15-05- 2018.                                             | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad / por Imposibilidad de instalar la Estación de Peaje nueva de la Unidad Funcional 3B.                                                                                                 | ACEPTADO – Desde el <b>23 de noviembre de 2017. HECHOS SUPERADOS</b> | El 5 de noviembre de 2021 se suscribió entre la ANI y la Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB S.A.S., el Otrosí No. 10 por medio del cual se superan los hechos que dan lugar al EER, determinándose las acciones a seguir para el efecto. |
| Sociedad Concesionaria POB S.A.S. | D-462 -2018                                                              | Notificación de Evento Eximente de Responsabilidad realizada mediante comunicación D-462 del 27 de febrero de                                                                                                                            | ACEPTADO – Desde el <b>13 de febrero de 2018. HECHOS SUPERADOS</b>   | El 5 de noviembre de 2021 se suscribió entre la ANI y la Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB                                                                                                                                              |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b> | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO INTERVENTOR ERS</b> |
|                                                                                                                      | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | <b>Página 563 de 591</b>         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025        |

| Quien Notifica el EER | Documento por el cual se Notifica el Evento Eximente de Responsabilidad. | Tema                                | ADMISIÓN / RECHAZO | OBSERVACIONES                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                          | 2018 – presunto nacedero Arrayanes. |                    | S.A.S., el Otrosí No. 10 por medio del cual se superan los hechos que dan lugar al EER, determinándose las acciones a seguir para el efecto. |

Fuente: elaboración Propia.

Conforme a lo anterior el EER fue Notificado al Concesionario; sin que a la fecha se haya obtenido cambio alguno en los detonantes (identificación de nacimiento de agua) que dieron lugar al evento.

2. A continuación, se relacionan los Puntos de Interés Hídrico que fueron reportados a la anterior Interventoría mediante las comunicaciones D-1323 del 25 de junio de 2018 y D-1466 del 25 de agosto de 2020, resultado de los estudios de la Javeriana, SIAM y los estudios de isotopía que fueron realizados sobre nueve (9) puntos analizados en el laboratorio Hydrosys Labor LTD en Budapest, Hungría:

**Tabla 291 Identificación nacederos UF 4 - UF5**

| CLASIFICACIÓN                                                            | UF 4     |           |          | UF 5     |           |          | Variante |          |          | TOTAL POR INFORME |           |          | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
|                                                                          | J        | S         | I        | J        | S         | I        | J        | S        | I        | J                 | S         | I        |            |
| Manantiales (Agua de origen subterráneo)                                 | 1        | 11        | 4        | 3        | 47        | 2        | 2        | 2        | 0        | 6                 | 60        | 6        | 72         |
| Aguas Superficiales                                                      | 7        | 13        | 1        | 0        | 3         | 0        | 0        | 1        | 0        | 7                 | 17        | 1        | 25         |
| Escorrentía de Ladera (Agua de mezcla escorrentía y flujos subterráneos) | 1        | 11        | 1        | 2        | 4         | 0        | 5        | 1        | 0        | 8                 | 16        | 1        | 25         |
| <b>Total</b>                                                             | <b>9</b> | <b>35</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>54</b> | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>21</b>         | <b>93</b> | <b>8</b> | <b>122</b> |

Javeriana, S: SIAM, I: Isotopía

Fuente: elaboración Propia.

3. Frente a estos puntos hídricos, el Concesionario presentó a las autoridades ambientales CAR y Corporinoquía las medidas de mitigación tipo para que estas se pronunciaran sobre la posibilidad de implementarlas. Lo anterior en el marco de las actividades establecidas en el Acta de Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad y Consecuente Suspensión de las obras y actividades de Intervención de las Unidades Funcionales No. 4 y 5. Sin embargo esta actividad no tuvo efector para superar el evento ya que las autoridades no se pueden pronunciar

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 564 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

sobre medidas de mitigación si no están enmarcadas dentro de una solicitud de permiso ambiental. Por lo anterior, esta actividad no dio solución al EER.

4. Mediante comunicado 2021-605-019202-1, la ANI puso en conocimiento la mesa de trabajo interinstitucional de articulación y coordinación, convocada por la procuraduría general de la nación, que se llevó a cabo el miércoles 16 de junio de 2021, relacionada con el proceso para la obtención de las autorizaciones, de orden ambiental, requeridas para el desarrollo del proyecto perimetral de oriente de Cundinamarca.

Durante este espacio, se presentaron los temas ambientales que, a la fecha, han impedido el desarrollo de las obras y actividades relacionadas con la construcción de las Unidades Funcionales 4 y 5, puntualmente, los relacionados con la intervención en rondas hídricas de manantiales, y con las intervenciones en sitios identificados como puntos críticos localizados en la ronda hídrica de nacederos de estas unidades funcionales del proyecto.

5. Se realizó mesa de trabajo el 14 de julio del 2021 con la ANI, Interventoría y el Concesionario en la que se compartió la experiencia en trámites ambientales ante la ANLA de la Concesión BBY en zonas con presencia de manantiales y de acuerdo con la solicitud de la ANI, el Concesionario remitió las fichas técnicas de las medidas de manejo tipo puestas a consideración en el año 2018 a la CAR y a Corporinoquía con ocasión al EER que impacta las Unidades Funcionales 4 y 5 de proyecto, las cuales fueron revisadas por la Interventoría y se remitieron las respectivas observaciones, para así ser remitidas según el compromiso adquirido en la mesa de trabajo del 16 de junio de 2021.
6. Durante este periodo, el 25 de agosto de 2021, se realizó mesa de trabajo con la participación de la ANI, Concesionario, Procuraduría, Corporinoquía, en la cual la Corporación entregó el siguiente listado de documentos requeridos de análisis técnico – Ambiental en manantiales, nacederos sobre el trazado de la vía perimetral Choachí - La Calera:  
Identificar a una escala de detalle adecuada los manantiales, nacederos en el área de influencia de la vía perimetral.
7. El 27 de agosto de 2021 mediante reunión virtual el Concesionario presentó ante la ANI y la Interventoría el resultado del análisis de la información presentada en los estudios de la Javeriana y SIAM con respecto a los documentos requeridos por la Corporación Autónoma de la Orinoquía. En conclusión, se entregará a Corporinoquía la información que a la fecha se tiene de cada uno de los nacederos



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 565 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

identificados y al corte de este informe se estaba a la espera de la reunión de presentación de información a Corporinoquía por parte del Concesionario.

8. El 8 de abril de 2022, la Interventoría fue invitada por la PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS con el fin de atender queja, puesta por el Concejo Municipal de Choachí en sesión llevada a cabo el 18 de febrero de 2022, se convoca a la ANLA, al Consorcio Perimetral de Oriente, a la ANI, a Corporinoquía, a la Alcaldía de Choachí, a una visita técnica en el municipio de Choachí para verificar las condiciones técnicas actuales denunciadas por la comunidad como constitutivas de presunta amenaza, riesgo o vulnerabilidad, de los bienes, infraestructura física e integridad de los ciudadanos, en el marco de las obras de la variante Perimetral de Oriente de Cundinamarca.

De otro modo, en virtud de las mesas de trabajo, el 07 de abril de 2022, por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, se emitió un concepto frente a la situación de las Unidades Funcionales 4 y 5 del Proyecto, concluyendo lo siguiente:

*“En virtud de lo expuesto, esta Delegada les hace un llamado de advertencia en orden a que no se exijan requisitos, condiciones, estudios, permisos o trámites ambientales, que no estén contemplados en la normatividad para el adelantamiento de las obras de mejoramiento y rehabilitación que se requieren adelantar en las unidades funcionales 4 y 5 del proyecto perimetral de Oriente de Cundinamarca, y de otra parte, a que continúen ejerciendo sus funciones como autoridad ambiental en materia de seguimiento y control en torno a este proyecto, para evitar afectaciones e impactos no mitigados o compensados adecuadamente en los nacederos identificados, y si se llegan a presentar ejercer su autoridad en materia sancionatoria en el marco de las competencias de las cuales se encuentran investidos legalmente. Esta Procuraduría en ejercicio de nuestras funciones en materia preventiva, intervención y control a la gestión pública, continuará atenta a que en todas las actuaciones administrativas derivadas de este proyecto de utilidad social, se garanticen los principios de seguridad jurídica, eficiencia administrativa, celeridad, protección del patrimonio público, transparencia, coordinación interinstitucional, presunción de buen fe y legalidad; recordándoles que el incumplimiento de los funcionarios públicos a sus deberes funcionales, a la normatividad y a los principios que orientan las actuaciones administrativas, les genera responsabilidad disciplinaria.”*

9. La ANI mediante comunicación Radicado ANI No.: 20223060239321 señaló:

*“Frente al alcance de los compromisos asumidos en el marco de la reunión desarrollada el pasado 17 de mayo de 2022, debe señalarse que los mismos fueron*



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                                                                       | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 566 de 591</b></p>                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |

claros y guardan plena concordancia con lo indicado en la reunión, pues no hay lugar a efectuar interpretaciones sobre su alcance, toda vez que, en el acta de reunión y la grabación de la misma, se indicó por parte de Corporinoquía que no emitiría ningún pronunciamiento teniendo en cuenta que fue el Concesionario quien solicitó ante esa Entidad la suspensión de algunos permisos ambientales y trámites que se encontraban en curso. En consecuencia, le corresponde al Concesionario solicitar las reanudaciones correspondientes, así quedó consignado en el acta: “Interviene la directora de Corporinoquía, doctora Doris Bernal, quien señala que como Corporación acatan la directriz de la Procuraduría, que revisadas las actuaciones no observan ninguna solicitud de permiso ambiental en trámite, por cuanto los permisos que estaban en curso se suspendieron, por solicitud del Consorcio Perimetral”; manifestar o interpretar lo contrario configura actos dilatorios que impiden la superación de la situación actual de las Unidades Funcionales 4 y 5.

En virtud del apoyo conceptual por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a través del Viceministro de Ambiente, se generaron las siguientes comunicaciones para las Corporaciones que fueron remitidas al Concesionario mediante comunicación No. 20223060166151 del 07 de junio de 2022:

Oficio del 12 de mayo de 2022 dirigido al Director General de la CAR, suscrito por el Viceministro de Ambiente, en el cual se solicita que se atienda lo establecido en el oficio No. 263 de 7 de abril de 2022 emitido por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Oficio del 12 de mayo de 2022 dirigido al Delegado al Consejo Directivo de la CAR, suscrito por el Viceministro de Ambiente, en el cual se solicita que se incluya dentro del próximo Consejo Directivo, la lectura del oficio No. 263 de 7 de abril de 2022 emitido por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Oficio del 12 de mayo de 2022 dirigido al Delegado del Consejo Directivo de Corporinoquía, suscrito por el Viceministro de Ambiente, en el cual se solicita que se incluya dentro del próximo Consejo Directivo, la lectura del oficio No. 263 de 7 de abril de 2022 emitido por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Oficio del 12 de mayo de 2022 dirigido a la Directora General de Corporinoquía, suscrito por el Viceministro de Ambiente, en el cual se solicita que se atienda lo establecido en el oficio No. 263 de 7 de abril de 2022 emitido por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Es pertinente recordar al Concesionario que, si bien existe un Memorando de Entendimiento suscrito por las Partes ello no implica que el Concesionario no deba cumplir con sus obligaciones contractuales pues en el mismo expresamente se indicó: “El presente documento no tiene alcance de modificación contractual, razón por la cual no exime a las Partes de la ejecución u observancia de las obligaciones a su cargo, tal como se encuentran pactadas en el Contrato de Concesión y sus otrosíes”, sin perjuicio de que de conformidad con lo pactado por las Partes a la fecha el mismo se encuentra sin vigencia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 567 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

*En relación con los documentos remitidos con ocasión del Memorando de Entendimiento debe señalarse que como se estipuló en el mismo expresamente “(...) Los borradores de trabajo, documentos compartidos y las declaraciones de las partes y sus agentes, indistintamente del medio que se utilice para su envío o comunicación, no configuran reconocimiento de las reclamaciones de la otra parte, ni allanamiento a sus pretensiones en el marco de un proceso judicial, ni prueba del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones en el marco del Arbitraje número de radicado ICDR 01-20-0015-3123, ni de un proceso administrativo y/o judicial. Las discusiones, posturas, borradores de trabajo y demás documentos de la negociación no tendrán efecto vinculante ni interpretativo en el marco de la relación contractual (...); ahora, como ha sido de conocimiento del Concesionario para revisar los documentos remitidos se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la Agencia en las cuales se presentaron diferentes observaciones.*

*Respecto a su afirmación en la que indica: “la ANI le manifestó al Concesionario que, como condición precedente para seguir negociando un acuerdo, debía terminar el Arbitraje”, debe señalarse que, NO es cierto, inclusive en reunión desarrollada el pasado 24 de junio de 2022, por parte del Concesionario se planteó dando continuidad al Arbitraje paralelamente desarrollar un Acuerdo Conciliatorio que posteriormente fuera sometido a aprobación de la Procuraduría General de la Nación y luego al Tribunal. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible avanzar en un proyecto de documento de Acuerdo teniendo en cuenta que las observaciones que se presentan por parte de la Agencia frente a los documentos no han sido subsanadas por el Concesionario.*

*Así las cosas, se reitera al Concesionario el requerimiento relacionado con dar cumplimiento a los compromisos que asumió en el marco de la reunión del 17 de mayo de 2022 y en tal virtud, no condicionar dichas actuaciones a unos pronunciamientos expresos, pues como fue indicado por Corporinoquía, por el Viceministro de Ambiente y por la Procuraduría no pueden pronunciarse “si el consorcio no presenta la solicitud, lo cual es reiterado por el Viceministro de Ambiente y por la Procuraduría, **ya que las actuaciones ambientales son a solicitud de parte**”. (Se resalta).”*

**En conclusión,** dado que las anteriores actividades no fueron recibidas por el Concesionario y la primera actividad no generó efecto; el Acta de declaratoria de EER el día 01 de agosto de 2018 cuenta como segunda actividad la elaboración de Otro sí. La cual no fue desarrollada por las Partes. El Concesionario de forma unilateral inicia un proceso de arbitramento internacional para resolver las diferencias entre la entidad contratante y este, el cual aún está en desarrollo. Por tal motivo, esta Interventoría se encuentra atento a la notificación del resultado del proceso de arbitramento.

### **16.3 HALLAZGO 1495: ESTUDIOS DE DETALLE PARA LOS PUENTES DE LA UF3**

La ANI suscribió el 8/09/2014 el Contrato de Concesión 002 de 2014, dentro de las actividades a desarrollar por el concesionario se encontraba la UF3, la cual comprende el

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 568 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

Mejoramiento y rehabilitación del sector La Calera – Patios y Limite Bogotá - Choachí con una longitud 32.62 km y debía instalar tres (3) puentes peatonales con especificaciones que garantizaran el cruce adecuado de peatones. Para efectos, el Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando las necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las autoridades locales, la cual hará parte de los Estudios de Detalle.

A 8 de abril de 2022, se había generado el reconocimiento total de la retribución de la UF3 por \$158.189.648.160,2.

Del análisis a la información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y visita efectuada por el auditor de la CGR al sitio donde se encuentran ubicados los puentes de la UF3, se identificó que el peatonal referenciado en k9+645 sector Patios, no conecta de forma adecuada o no garantiza el cruce adecuado de peatones ya que la ubicación limita la salida a una zona segura y la utilización del puente, toda vez que el costado norte llega sobre un talud construido con anclajes y concreto lanzado.

### **Causa del hallazgo**

La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Debilidades en los estudios de detalle, no se evidencia los estudios de detalle; de transitabilidad, de necesidades que dieron lugar a la ubicación de los puentes peatonales relacionados con la localización de estos, desde la fase de estructuración del proyecto, incluido el referenciado como k9+645, ni actas o registros de concertación con las comunidades aledañas en la interacción con las autoridades locales ni pronunciamiento de la interventoría y de la ANI y falencias en la ejecución del contrato de concesión respecto a la construcción de los puentes peatonales (referencia K9+645) que hicieron parte de la Unidad Funcional 3. De igual forma, debilidades en el desarrollo de la labor de interventoría (Contrato 169 de 2014) respecto a la UF3 y de la supervisión."

### **Gestiones efectuadas**

- Mediante comunicación D-202-2023 de febrero de 2023, el Concesionario remite a la ANI el Concepto técnico sobre la ubicación del Puente Pevalonal denominado "Carulla", en la Unidad Funcional 3A.
- Mediante correo electrónico del 2 de junio de 2023 y de acuerdo con lo informado en el comité de seguimiento del proyecto, el día 2 de junio de 2023, la Supervisión del Contrato solicitó iniciar gestiones para realizar seguimiento a la comunicación de la Contraloría, sobre el hallazgo resultante de la atención de la Denuncia 2022- 244771-82111-D, con Radicado 2022ER0114042 del 21/07/2022, Contrato de Concesión 002 de 2014, referente al Puente Pevalonal de Carulla.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 569 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

- El día el día 8 de junio de 2023, se realiza mesa de trabajo, ANI, Concesionario e Interventoría, con el fin de establecer los mecanismos para atender el hallazgo de la Contraloría General de la Nación, resultante de la atención de la Denuncia 2022-244771-82111-D, con Radicado 2022ER0114042 del 21/07/2022, Contrato de Concesión 002 de 2014.
- Mediante comunicación CERS-OP-1585-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090643282) del 9 de junio de 2023, la Interventoría solicitó a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. la trazabilidad de los puentes Peatonales en PR3+489, PR0+779, PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”).
- Con comunicación D-894-2023 del 20 de junio de 2023, la concesionaria envía la trazabilidad de los puentes peatonales solicitados en la comunicación CERS-OP-1585-2023.
- Con el oficio 20233060238011 del 6 de julio de 2023, la ANI estableció propuesta de las acciones correctivas, responsables y plazo para el cumplimiento hacia la atención del hallazgo resultante de la atención de la Denuncia 2022-244771-82111-D. En el mismo oficio, la ANI solicita al Concesionario presentar mensualmente un informe de avance sobre las diferentes actividades a realizar hasta el momento en que se reciba a satisfacción por parte de la interventoría la solución integral implementada.
- El día 14 de julio de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá-socializó el análisis de funcionalidad y accesibilidad de los Puentes Peatonales realizado por la firma consultora especializada Cal y Mayor.
- Mediante correo electrónico de fecha 18 de julio de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá hace entrega a la Interventoría de los documentos del Análisis de funcionalidad y accesibilidad del puente peatonal Carulla, en cumplimiento de los acuerdos de la reunión realizada el día 14 de julio de 2023.
- Mediante comunicación CERS-OP-2103-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090854512) del 1 de agosto de 2023, la Interventoría realiza observaciones al Análisis de funcionalidad y accesibilidad del puente peatonal Carulla entregado el día 18 de julio de 2023 vía correo electrónico por la Concesionaria.
- Mediante la comunicación D-1176-2023 del 16 de agosto de 2023, el Concesionario da respuesta a las observaciones presentadas por la Interventoría en la comunicación CERS-

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 570 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

OP-2103-2023, referentes la revisión de Análisis de funcionalidad y accesibilidad del puente peatonal Carulla como respuesta al comunicado ANI 20235000000234 del 25 de mayo de 2023.

- Mediante comunicación CERS-OP-2342-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090942842) del 22 de agosto de 2023, la Interventoría da respuesta comunicación D-1176-2023 generando observaciones y genera la **No Objeción** preliminar a los documentos presentados para el Análisis de funcionalidad y accesibilidad de puentes peatonales e invita a actualizar los documentos con un link de descarga. Acciones enmarcadas en pro del cumplimiento del plazo requeridos por la Entidad.
- Mediante comunicación D-1313-2023 del 8 de septiembre de 2023, el Concesionario da respuesta al comunicado CERS-OP-2342-2023 entregando los planos e informe corregido, sin anexar la programación correspondiente a las actividades a realizar.
- Mediante la comunicación CERS-OP-2604-2023 (ANI Numero de Radicado 20234091049662) del 19 de septiembre de 2023, la Interventoría reitera la necesidad de establecer un enlace de descarga válido, mediante el uso de correo electrónico, debido a que en la comunicación D-1313-2023 establece un link de descarga en imagen que es inaccesible.
- Mediante la comunicación D-1344-2023 (Rad ANI 2023-409-105688-2) del 15 de septiembre de 2023, el Concesionario responde el oficio ANI No. 20233060238011 y hace entrega a la Agencia Nacional de infraestructura del Informe evaluación de los flujos peatonales actuales y proyectados del área de influencia del puente peatonal ubicado en el K9+645 de la unidad funcional 3A, con la solución integral que mejore la conectividad, con su respectivo Plan de Obra.
- Mediante la comunicación CERS-OP-2654-2023 (ANI Numero de Radicado 20234091068372) del 19 de septiembre de 2023, Interventoría emite **No Objeción** final al análisis de funcionalidad y accesibilidad de puentes peatonales remitidos en la comunicación D-1313-2023, que incluye el Plan de obra denominado Programación medidas puente peatonal Carulla.
- Sin embargo, mediante comunicación CERS-OP-3481-2023, radicado ANI 20234091388572 del 4 de diciembre de 2023, en relación con las intervenciones del puente peatonal Carulla esta Interventoría recomendó al concesionario:




|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 571 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

... ( ) se verifique por el Concesionario la posibilidad de conectar directamente la pasarela peatonal del puente peatonal con los sectores poblados e instituciones educativas localizadas en el margen izq del puente peatonal y la vía. (sentido Patios - La Calera) buscando mayor facilidad y efectividad en la accesibilidad de la población local al paso seguro, así mismo anticipar para el primer trimestre de 2024 el inicio de las actividades correspondientes a fin de mejorar las condiciones de conectividad de la infraestructura vial y social del sector circundante al Puente peatonal Carulla K9+645 de la UF3A, buscando con estas recomendaciones fortalecer la seguridad vial del sector concesionando. ( ) ...

- El 14 de marzo de 2024, esta interventoría realiza acompañamiento a la ANI y POB a la visita de la Contraloría al Puente peatonal Carulla en la UF3A.
- Mediante la comunicación CERS-OP-730-2024 (ANI Numero de Radicado 20244090330042) del 14 de marzo de 2024, la Interventoría solicita al concesionario la entrega de los informes de avance solicitados por la entidad requeridos por la entidad en oficio ANI 20233060238011 de fecha 6 de julio de 2023.
- Con el oficio 20243060086461 recibido en Interventoría el 14 de marzo de 2024, la ANI hace solicitud a la interventoría presentar un informe de aprobación sobre la solución a implementar y programación medidas puente peatonal Carulla (plan de obras) del hallazgo Denuncia 2022- 244771-82111-D, con Radicado 2022ER0114042 del 21/07/2022 “Puente Carulla”. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca.
- De acuerdo con la información suministrada y no objetada por la interventoría en la comunicación CERS-OP-2654-2023, es de resaltar que realizado el seguimiento al Cronograma presentado por el concesionario, se evidencio según recorridos realizados por este consorcio interventor entre el 15 de diciembre de 2023 y 15 de febrero de 2024 que el concesionario adelantó la ejecución de las intervenciones planteadas en el puente peatonal Carulla, en cumplimiento adelantado del Plan de obras presentado con radicado D-1344-2023 (Rad ANI 2023-409-105688-2) del 15 de septiembre de 2023 (imagen adjunta), las intervenciones físicas fueron concluidas el 15 de febrero de 2024 en forma anticipada, como se evidencia adelante en registro fotográfico.


#### **Programación medidas puente peatonal Carulla.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 572 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

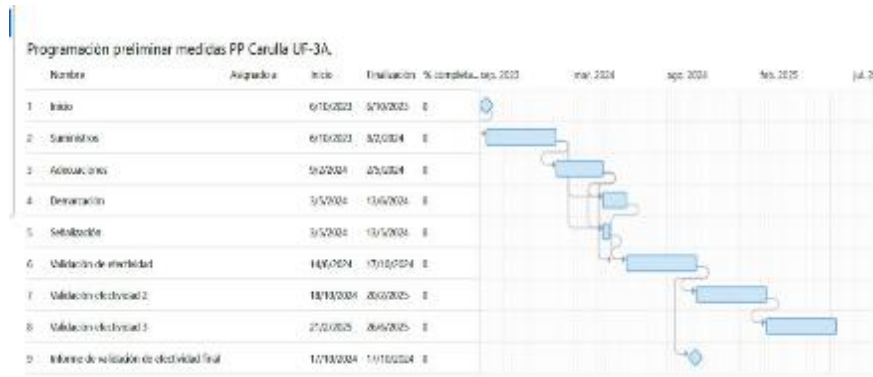

Fuente: Anexo comunicación D-1344-2023 de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá.

**Ilustración 4 Diagrama de señalización y obras complementarias de paraderos en el Puente Carulla.**

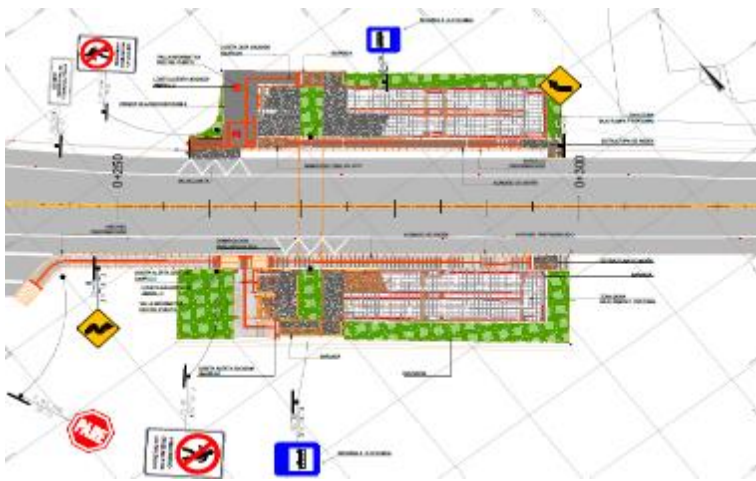

Fuente: Anexo a comunicación D-1344-2023 de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada y no objetada por la interventoría en la comunicación CERS-OP-2654-2023, el anterior es el diagrama de implantación de obras planteadas por el Concesionario en el Puente Peatonal ubicado en el PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”).

- El diagrama antes señalado corresponde, conforme a las intervenciones desarrolladas por el POB y verificadas por esta Interventoría en recorridos del 15 de diciembre de 2023 al 15 de febrero de 2024 como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 573 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |



Foto 1: diciembre 15 de 2023, inicio ejecución de rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado izquierdo.



Foto 2: diciembre 15 de 2023, terminación ejecución de rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado izquierdo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 574 de 591</b></p>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b></p>             |



Foto 3: diciembre 15 de 2023, ejecución de rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado derecho.



Foto 4: diciembre 15 de 2023, ejecución demarcación de rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado derecho.



Foto 5: diciembre 15 de 2023, ejecución demarcación de rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado izquierdo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 575 de 591</b></p>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |



Foto 6: febrero 15 de 2024, instalación señalización en rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado izquierdo.



Foto 7: febrero 15 de 2024, instalación señalización en rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado derecho.



Foto 8: febrero 15 de 2024, instalación señalización en rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado izquierdo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br/> <b>01 al 31 de Marzo de 2025</b></p>                                                                       | <p align="center"><b>CONSORCIO</b><br/> <b>INTERVENTOR ERS</b></p> |
| <p><b>Contrato VEJ-542 de 2022</b></p>                                            | <p>Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”.</p> | <p align="center"><b>VERSIÓN: 1</b></p>                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>Página 576 de 591</b></p>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <p align="center">Fecha: 30 de mayo de 2025</p>                    |



Foto 9: febrero 15 de 2024, instalación señalización en rampa de acceso a paradero en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”), costado derecho.



Foto 10: marzo 14 de 2024, panorámica del estado actual de señalización, demarcación y accesibilidad en PR0+289 (K9+645 Puente “Carulla”).



Foto 11: marzo 14 de 2024, Profesional de la Contraloría con Líder de Supervisión ANI en compañía de representantes de Concesionario e Interventoría en visita de CGR inspección funcionalidad puente peatonal Carulla K9+645. PR0+289



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 577 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

**Acciones correctivas**

Teniendo en cuenta lo indicado por la ANI en el comunicado ANI 20233060238011 de fecha 6 de julio de 2023, el Concesionario informo que las medidas propuestas allegadas bajo el comunicado D1344-2023 en el Informe de Análisis de Funcionalidad y Accesibilidad del puente peatonal Carulla – Los Patios, a la fecha se encuentran totalmente implementadas.

A continuación se presenta la evidencia de las acciones implementadas:

| Actividad                                                | Registro fotográfico                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampliación de placa de concreto, para paradero de buses. |   |
| Pintura de demarcación horizontal de paradero            |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 578 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

| Actividad                                                                     | Registro fotográfico                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación de delineadores verticales en eje de la vía.                      |    |
| Instalación de señalización vertical SI-27 (Restricción de cruce por calzada) |   |
| Instalación de señalización vertical SI-08 (Paradero)                         |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 579 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Actividad                                                                | Registro fotográfico                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación valla informativa para incentivar el uso del puente peatonal |  |

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo indicado en el plan de actividades antes de las fechas indicadas en el mismo.

Ahora bien, con respecto a lo indicado en el comunicado CERS-OP-730-2024 donde solicita que **“Se analice la posibilidad de iniciar las demás actividades propuestas en la mencionada programación de plan de obras, procediendo a realizar la validación de efectividad en sus 3 etapas, evidenciando y sustentando sí se generó el cumplimiento de los objetivos quedan cuenta de la efectividad de las medidas implementadas y definidas por el Consultor Cal y Mayor”**, vale la pena mencionar que El Concesionario aplicará los pilares de la seguridad vial según lo indicado en las recomendaciones del informe de análisis de funcionalidad y accesibilidad del Puente Peatonal Carulla – Los Patios, tabla 9-2, mediante el Fortalecimiento institucional, para lo cual se realizará Control y seguimiento al paso peatonal utilizando el puente.Sin perjuicio de lo anterior, con las actividades finalizadas por el Concesionario se da cumplimiento a lo indicado en las acciones correctivas del comunicado ANI 20233060238011 del 06 de Julio de 2023.

Ahora bien, con respecto a la solicitud de conectividad de la pasarela del puente con los sectores poblados e institucionales educativas localizadas en el margen izquierdo del



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 580 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

puente, buscando mayor facilidad y efectividad en la accesibilidad de la población local al paso seguro, no es factible dicha proposición, puesto que:

1. La ausencia de un área de aproximación para acceder al puente desde la vía veredal, en contraste con la presencia de tal área en la ruta 5009 a la que se pretende conectar, es evidente en el análisis fotográfico adjunto. Este examen visual destaca la carencia de espacio disponible para la construcción de la infraestructura necesaria que facilite el acceso a la superestructura del puente.



2. El límite máximo de pendiente permitido para el diseño de rampas de acceso a puentes peatonales se establece en un 10%. Actualmente, la pendiente a lo largo de la pasarela del puente entre la vía peatonal y la pasarela misma es del 54%, lo cual excede significativamente dicho límite. Para cumplir con las normativas de seguridad y accesibilidad, es necesario realizar modificaciones adicionales. Esto incluye la excavación de un corte adicional en el talud transversalmente a la pasarela, con el fin de ajustar la pendiente de la rampa para que se encuentre dentro de los parámetros permitidos. Además de cumplir con las regulaciones de pendiente, esta intervención también es crucial para garantizar la estabilidad estructural. Colocar la superestructura directamente sobre el talud representaría un riesgo de desestabilización, ya que el suelo no tiene la capacidad de soportar dicha carga de manera segura. Por lo tanto, se requiere una solución que permita tanto cumplir con los estándares de accesibilidad como garantizar la integridad estructural del puente y su entorno, por lo cual realizar dicho corte al talud, cortaría de forma significativa la vía veredal.

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pendiente actual de la zona a realizar | Corte actual para la construcción de la super |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 581 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| conectividad                                                                      | estructura para las escaleras y rampas de acceso.                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



**Seguimiento a efectividad de acciones correctivas**

para el presente mes se realizó seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y como se puede observar en el siguiente registro fotográfico el puente peatonal es usado frecuénteme por los usuarios del sector donde fue construido.

Registro fotográfico uso puente peatonal

|                                           |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542</b><br><b>de 2022</b> | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                           |                                                                                                                                                                            | <b>Página 582 de 591</b>                   |
|                                           |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |



Fuente: elaboración propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 583 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## 17 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

### 17.1 INFORMACIÓN GENERAL

#### 17.1.1 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

**Tabla 292 Personal del Proyecto**

| Radicado ANI Aprobación | Fecha      | Cargo                                            | Nombre                          | Dedicación |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 20233060160101          | 11/05/2023 | Director de Interventoría                        | Wilson Fabian Pérez Gómez       | 50%        |
| 20223060350041          | 01/11/2022 | Subdirector Técnico - Operativo                  | Marco Vinicio Charria           | 50%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Subdirector Financiero                           | Cesar Alba Quintana             | 25%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Especialista ambiental                           | Myriam Estella Sánchez Sánchez  | 20%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Ingeniero Residente Ambiental                    | Jaime Toloza Rey                | 25%        |
| 20223060427081          | 27/12/2022 | Ingeniero Residente Operativo                    | Edgar Iván Rojas                | 100%       |
| 20223060397351          | 06/12/2022 | Ingeniero Residente Técnico                      | Darío Martínez Sánchez          | 100%       |
| 20223060427081          | 27/12/2022 | Ingeniero Residente de Redes                     | Jefferson Bonilla Rodríguez     | 25%        |
| 20233060161281          | 12/05/2023 | Especialista en Estructuras                      | Michell David Ruiz Melo         | 10%        |
| 20223060427081          | 27/12/2022 | Especialista en Pavimentos                       | Luis Francisco Montes           | 20%        |
| 20223060427081          | 27/12/2022 | Especialista en Geotecnia y Suelos               | Luis Francisco Montes           | 20%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Especialista en Hidráulica e Hidrología          | Juan Carlos Bonilla             | 10%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Especialista en Vías                             | Fabian Tafur Sánchez            | 10%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Especialista en Tránsito y Transporte            | Deisy Angelica Guzmán           | 10%        |
| 20223060427081          | 27/12/2022 | Subdirector Jurídico                             | María Paula Caballero Duque     | 25%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Abogado Especialista en Derecho Administrativo L | Juliana Fajury Patarroyo        | 50%        |
| 20233060016551          | 19/01/2023 | Abogado Gestión Predial                          | Luis Alejandro Serrano Peñalosa | 25%        |
| 20223060397351          | 06/12/2022 | Auditor de Sistemas de peajes y/o pesaje         | Sandra Del Socorro Lugo         | 25%        |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 584 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

| Radicado ANI Aprobación | Fecha      | Cargo                                       | Nombre                           | Dedicación |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 20233060318911          | 07/09/2023 | Profesional Aseguramiento y Gestión Calidad | Lizbeth Catalina Triana Jiménez  | 25%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Profesional Auditor Interno de Calidad      | Adriana Patricia Diaz            | 25%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Profesional Auditor Seguridad Vial          | Henry Álvaro Vergara Barreto     | 25%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Profesional en Área Socioambiental          | Jaime Toloza Rey                 | 50%        |
| 20233060016551          | 19/01/2023 | Profesional en Área Social                  | Claudia Merchán Rivera           | 50%        |
| 20233060016551          | 19/01/2023 | Profesional Predial                         | José Mauricio Gómez Pachón       | 50%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Profesional Financiero                      | Viviana Marulanda                | 25%        |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Profesional Contable Financiera             | Deysi Adriana Triana Ballesteros | 25%        |
| 20233060227131          | 28/06/2023 | Profesional riesgos                         | Erika Lucia Prado Ojeda          | 25%        |
| 20223060397351          | 06/12/2022 | Auxiliar de Ingeniería Peajes y Operativo   | William Hernán Rodríguez Prieto  | 100%       |
| 20243060168011          | 22/05/2024 | Auxiliar de Ingeniería ANI                  | Cindy Paola Victorino Vargas     | 100%       |
| 20233060254631          | 19/07/2023 | Topógrafo                                   | Juan Pablo Bohórquez Pinto       | 25%        |
| 20233060227131          | 28/06/2023 | Cadenero I                                  | Danny Daniel                     | 25%        |
|                         |            | Cadenero II                                 | Vergara Barros                   | 25%        |
| 20223060397351          | 06/12/2022 | Inspector de Obra                           | Juan David Sánchez Junco         | 100%       |
| 20233060010771          | 13/01/2023 | Inspector SISOMA                            | Miguel Jandry Romero Navarro     | 100%       |
| 20223060397351          | 06/12/2022 | Especialista SISO                           | Mario Gil Ramírez                | 10%        |
| 20243060378381          | 21/10/2024 | Asistente Administrativa                    | Yedizareth Guerrero Cuadros      | 100%       |
| 20223060397351          | 06/12/2022 | Conductor                                   | Omar Pirazán Sánchez             | 100%       |
| 20243060071571          | 28/02/2024 | Conductor                                   | Víctor Alfonso Martínez Sánchez  | 100%       |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 585 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

### 17.1.2 Equipo

**Tabla 293 Equipos de Cómputo de Interventoría**

| COMPUTADORES |       |          |
|--------------|-------|----------|
| TIPO         | MARCA | CANTIDAD |
| PORTÁTIL     | HP    | 8        |

Fuente: Elaboración Propia

**Tabla 294 Equipos de Comunicación de Interventoría**

| CELULARES |             |       |          |
|-----------|-------------|-------|----------|
| MARCA     | REFERENCIA  | GIGAS | CANTIDAD |
| XIAOMI    | REDMIC 10 C | 64    | 12       |
| SAMSUNG   | A33 128     | 128   | 2        |
| IPHONE    | 12          | 128   | 1        |

Fuente: Elaboración Propia

### 17.1.3 Vehículos

**Tabla 295 Vehículos**

| CAMIONETAS        |       |        |        |          |
|-------------------|-------|--------|--------|----------|
| TIPO DEL VEHÍCULO | MARCA | MODELO | PLACAS | CANTIDAD |
| RANGER XL         | FORD  | 2023   | LNN069 | 1        |
| RANGER XL         | FORD  | 2023   | LNN942 | 1        |

Fuente: Elaboración Propia

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 586 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

## 18 CONCLUSIONES

### Gestión técnica

El avance ejecutado estimado a 20 de diciembre de 2024, fecha de inicio de la Etapa de Reversión por Terminación Anticipada del Contrato, es del 43,23% del proyecto en general.

En Tilatá, talud de la UF3A, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la comunicación D-1380-2024 presentó una reprogramación con fecha de finalización el 30 de enero de 2025. El avance en las obras de estabilización con esta nueva programación se estima, a 31 de marzo de 2025, en una ejecución del 99,94% del 100% programado, quedando pendientes de terminación paisajística.

El Concesionario mediante comunicación D-77-2025 del 23 de enero de 2025, entregó los diseños fase III corregidos para las obras de estabilización del talud Arrayanes en el PR1+080 de la RN5009, los cuales fueron revisados por la Interventoría, emitiendo la comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0193-2025 (ANI Numero de Radicado 20254090151742) del 6 de febrero de 2025, con observaciones y concepto de NO OBJECCIÓN Técnico, presentando OBJECIONES ambientales que aún no han sido subsanadas.

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe validar las coordenadas de los Postes de Referencia ante el INVIAS, especialmente en la Unidad Funcional 1A donde fueron removidos; los restantes corresponden a Postes pertenecientes a Rutas a cargo de la Gobernación de Cundinamarca (UF1A, UF4 desde el PR0+000 al PR0+700, PR14+000 hasta Choachí en la RN40CN06 y UF5 del PR32+000 al PR51+000 de la RN 4006A) y la Alcaldía de La Calera (UF4 desde el PR0+700 hasta el PR14+000 RN40CN06) cuyas coordenadas deben ser validadas con estas entidades del estado.

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hizo entrega de 51 formatos de Reversión a la Interventoría mediante comunicación D-289-2025 del 18 de marzo de 2025, la cual fue respondida con observaciones por esta Interventoría mediante comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0509-2025 (ANI número de Radicado 20254090379412) el 26 de marzo de 2025.

### Auditoria de Peajes

Durante el mes de marzo de 2025, el Concesionario opero las estaciones de peaje y pesaje de manera eficiente y sin interrupciones, durante la auditoria no se presentan hallazgos ni observaciones, de acuerdo con lo anterior el resultado de la auditoria fue satisfactorio.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 587 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

## Gestión de Redes

Con el fin de evitar el mayor número de reprocesos en la elaboración de los productos de carácter contractual, exigidos en el Apéndice Técnico Interferencia Redes, a cargo de la Concesión Perimetral de Oriente; esta Interventoría realizara la solicitud para que paralelamente a la elaboración de dichos productos, se realicen mesas de trabajo, en las que se pueda ir realizando observaciones y acompañamiento.

## Gestión Ambiental

- La interventoría ejerció un seguimiento riguroso a las obligaciones ambientales del concesionario, destacándose la revisión del Informe Trimestral Ambiental, la atención a PQRS, y la verificación de actividades relacionadas con compensaciones ambientales, asegurando el cumplimiento normativo y contractual del proyecto.
- La interventoría impulsó el cumplimiento del Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con énfasis en la recuperación de áreas verdes impactadas, especialmente en sectores sensibles como Teusacá y Curvas del Guarapo, reafirmando su rol como garante del componente ambiental en el desarrollo del proyecto.
- Frente al incumplimiento en la entrega de los registros de calidad asociados a los en los Informes Trimestrales #35 al #40, la interventoría ha mantenido una labor constante de requerimiento al concesionario. En este sentido, de cara a la etapa de reversión del proyecto, se solicitará el cumplimiento contractual de esta obligación como parte de la liquidación, asegurando que no se trasladen pasivos o vacíos de información que comprometan la trazabilidad y evaluación del desempeño ambiental del proyecto.
- El Laudo el 19 de diciembre de 2024, declaró la terminación anticipada del Contrato de Concesión, fundamentada en no haber detectado oportunamente los manantiales, lo que imposibilitó alcanzar la ejecución del proyecto en las UF4 Y 5 y posteriormente obtener un acuerdos para superar el Evento eximente de Responsabilidad (EER) de las Unidades Funcionales 4 y 5. Ante este escenario, el Área Ambiental de la Interventoría se encuentra atenta a las disposiciones contractuales para garantizar el adecuado cierre del proyecto.

## SHE

- El Concesionario ejecuta las exigencias y recomendaciones emitidas por esta Interventoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y siempre que se realicen las correcciones necesarias de manera oportuna
- Se concluye, que la concesión no ha remitido la totalidad de documentos hasta el momento del presente informe, no se tiene los datos exactos de los eventos por lo

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 “Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado “Perimetral del Oriente de Cundinamarca”. | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 588 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

que no fue suministrada la información por la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogota. pese a que se radico comunicado con el consecutivo (CERS-OP-0216-2024 Pendiente entrega informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N°116 - periodo 25 Diciembre 2024 al 25 de Enero de 2025)., radicado el día 10 de febrero de 2025. Y (CERS-OP-0396-2025 Pendiente entrega informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo N°116 y N°117 – Concesionaria Perimetral Oriental de Bogota., periodo enero y febrero de 2025). Con fecha de radicado 07 marzo de 2025.

- Los tiempos de respuesta del Concesionario para cerrar los hallazgos son excesivamente largos. Por lo tanto, se les ha informado que, como medida correctiva inmediata, deben revisar y controlar de manera urgente las observaciones realizadas por esta Interventoría en campo, y responder oportunamente a los comunicados para evitar incidentes en las operaciones.
- Durante el período objeto de este informe, se han enviado reportes y comunicaciones a la Concesión mediante cartas y correo electrónico, solicitando el cumplimiento obligatorio de las acciones correctivas relacionadas con los hallazgos evidenciados durante los recorridos realizados por esta Interventoría en las unidades funcionales. Sin embargo, hasta la fecha de este informe, algunos de estos comunicados siguen pendientes de respuesta, como se detalla en el Anexo 6 (Hallazgos POB) que se adjunta.
- En relación con las actividades realizadas por la Concesión, esta Interventoría se encarga de verificar su cumplimiento en campo. Los hallazgos y observaciones realizados por el contratista o los trabajadores de la Concesión son corregidos de inmediato por el profesional de seguridad a cargo de cada frente, quien prioriza la salud y seguridad de los trabajadores, así como el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.

## Gestión Social

Como parte de las conclusiones se menciona:

Se valida la atención a las PQRS y Derechos de petición por parte del Concesionario, evidenciando el cumplimiento de los tiempos de atención al corte 19 de diciembre de 2024. Para el corte de etapa de revisión no se han generado mesas de trabajo en torno a dicha etapa, por consiguiente no se conoce el estado de las pqrs y los tramites que se adelantan.

Se remite por parte del Concesionario los formatos sociales que corresponden a la etapa de revisión y el informe social y de arqueología para revisión de esta interventoría. Dicha documentación será objeto de primera revisión. Para el caso se relaciona:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 589 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

5143.051ANI CERS-OP-0509-2025 26 de marzo de 2025 Respuesta a sus comunicaciones D-289-2025. Respuesta a sus comunicados 5143.051ANI CERS-OP-0151-2025 (R-326-2025) Solicitud de diligenciamiento y envió de los formatos de inventarios dispuestos en el Manual de Reversiones GCSP-M-001, comunicado 5143.051ANI CERS-OP0152-2025 (R-328-2025) Solicitud del inventario para revisión, comparación y Vo. Bo. con el inventario inicial anexo al contrato, en cumplimiento al procedimiento GCSP-P-018 Definición Estrategia De Reversiones, Manejo Operativo De Reversiones y Terminación De Los Contratos De Concesión, comunicado 5143.051ANI CERS-OP-0186-2025 (R-402-2025) Solicitud de presentación Programación de Recorridos para dar cumplimiento a lo descrito en el Parte General del Contrato, numeral 9.7, Etapa de Reversión, parte d, romanito (ii), comunicado 5143.051ANI CERS-OP-0371-2025 (R705-2025) Reiteración de nuestra solicitud con oficio 5143.051ANI CERSOP 0151-20025 del 31 de enero de 2025, Solicitud de diligenciamiento y envió de los formatos de inventarios dispuestos en el Manual de Reversiones GCSP-M-001 y el comunicado 5143.051ANI CERS-OP-0186-2025 (R-715-2025) Solicitud de presentación Programación de Recorridos para dar cumplimiento a lo descrito en el Parte General del Contrato, numeral 9.7, Etapa de Reversión, parte d, romanito (ii).

Se validan las actividades que fueron ejecutadas por el Concesionario en relación con lo concerniente a la gestión social y los lineamientos de la etapa de revisión. Para lo cual, el concesionario remite informes mensuales a partir del mes de enero de 2025 a la fecha del presente informe. Es de aclarar que los informes correspondientes a enero de 2025 y febrero de 2025 cuentan con las debidas revisiones al área social, las cuales deberán ser ajustas por el Concesionario.

### Gestión financiera

La Interventoría ha venido realizando las verificaciones del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato. En este sentido, se ha determinado que, el Concesionario ha presentado incumplimientos en pagos de los fondeos e intereses de mora por desplazamientos en las subcuentas de Soporte Contractual, Interventoría y Compensaciones Ambientales, por lo cual la Interventoría ha remitido los informes y ha solicitado el inicio de los procesos correspondientes para subsanar las obligaciones pendientes. Adicionalmente, no ha presentado documentos financieros en los términos que establece el contrato de concesión, por lo que se han adelantado las solicitudes y procesos para el cumplimiento de las obligaciones.

Respecto a las demás obligaciones, el Concesionario ha dado cumplimiento como se presenta en este informe.

### Gestión de Calidad

- Durante el mes de marzo de 2025 se da cumplimiento a la meta establecida del Indicador de oportunidad de respuesta a requerimientos de correspondencia recibida.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 590 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

- Durante el mes de marzo de 2025 se da cumplimiento a la meta establecida para el indicador Oportunidad en la entrega informes al cliente.
- El sistema de Gestión de Calidad del Consorcio ERS se encuentra implementado y mantenido, dando cumplimiento a lo definido en el plan de calidad de la interventoría, lo que permitió mantener la certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2015.
- Los equipos utilizados en el periodo cuentan con la calibración vigente y cumplen con los estándares requeridos para el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por el POB
- Se realizo la capacitación correspondiente al periodo y se da cumplimiento al PIC del contrato.
- El reporte mensual del estatus del sistema de gestión de calidad del proyecto al área de calidad transversal de SGS, con el fin de realizar seguimiento y determinar las acciones necesarias para contar con un sistema que se adapte a las políticas organizacionales y a los requerimientos del cliente
- Se reportaron las lecciones aprendidas, indicadores de gestión, actividades realizadas de gestión y aseguramiento de calidad, costos de no calidad, estado de acciones correctivas y preventivas del proyecto.

### Gestión de Riesgo

- Para la gestión predial en el mes de Marzo 2025, se realiza el seguimiento por unidad funcional obteniendo los siguientes datos, en la Unidad funcional 1 se reportan 38 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales uno (1) está pendiente por clarificarse su naturaleza jurídica (posible baldío) y cuatros (4) predios que fueron cedidos por sus propietarios a título gratuito, Para el mes de Marzo 2025, en la Unidad funcional 2 se reportan 225 predios requeridos conforme el diseño no objetado, de los cuales se cuenta con doscientos catorce (214) predios con folio ANI, de los cuales 9 predios se encuentran en proceso de expropiación y 2 predios en adjudicación de baldíos, para un total de once (11) predios pendientes por adquirir a favor de la ANI, para el mes en mención., de 228 Predios requeridos para la UF-3, se cuenta con 219 predios a favor de la ANI, 8 Predios en proceso de expropiación con demanda admitida, 1 predio con Resolución de Expropiación radicada ante la ANI.
- El Riesgo predial por sobre costos, Los valores tomados en tabla 284, son los reportados según sabana predial versión 112 e incluyen gastos de Escrituración,

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 591 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Fecha: 30 de mayo de 2025</b>           |

registro, beneficencia, lucro cesante, daño emergente y compensaciones sociales, el porcentaje de ejecución es del 98.13 % en pesos constantes.

- El riesgo por sobrecostos por interferencia de redes, con respecto a la Subcuenta de Redes ha avalado un valor total en precios constantes de \$11.550.936.808 por concepto de diseños y cortes de obra con ocasión de ejecución de traslados de redes secas y húmedas en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3A, quedando pendiente pagos por redes secas y por redes húmedas. Por otra parte, llevado el valor avalado a precios constantes se da el valor de \$8.703.190.756 pesos constantes. El valor anteriormente indicado aún está por debajo del valor estimado inicial, por lo que a la fecha no se ha materializado el riesgo. Es de aclarar que los traslados de redes húmedas y secas de las Unidades Funcionales 4 y 5 requieren del estudio que corresponda de acuerdo con la decisión que tomen las Partes para viabilizar el corredor existente o un nuevo corredor por el que transcurran las obras.
- Con respecto al riesgo por Menores Ingresos Por Disminución Del Recaudo De Peajes, en el periodo de Marzo 2025, el tráfico vehicular aumentó con respecto al mes anterior.
- Dado el conocimiento del laudo arbitral se puede resaltar las conclusiones y examinar con detenimiento las implicaciones en el proyecto y en los riesgos en particular.

De este Laudo se resaltan:

- Jurisdicción: el arbitraje se considera con acción internacional dado que se cumplen los criterios de internacionalidad previstos en el literal c) del artículo 62 de la Ley 1536 de 2012.
- Falta de competencia por inexistencia de relación con el EPC y accionistas: Se acepta la excepción de la ANI sobre la falta de competencia del Tribunal para abordar las reclamaciones del Contratista EPC, ya que se refieren a daños sufridos por un tercero. Igualmente, desestimó la solicitud de indemnización de la accionista Shikun & Binui VT AG (S&B), al no existir obligaciones contractuales que la vinculen con la ANI.
- Terminación anticipada solicitada por la ANI: Se acoge la pretensión de la ANI sobre la Terminación Anticipada del Contrato, declarando su finalización a partir de la fecha de notificación del Laudo e iniciando el periodo de cierre del contrato.
- Incumplimiento por identificación de los manantiales en las UF 4 y 5: Señala que es atribuible a la ANI por no haberse identificado en la fase de estructuración de la iniciativa pública con lo cual se viola el deber de planeación que le asisten a las entidades públicas. Por lo anterior, falla a favor de las Demandantes en su reclamación de indemnización, asignando

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 124</b><br><b>01 al 31 de Marzo de 2025</b>                                                                                        | <b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTOR ERS</b> |
| <b>Contrato VEJ-542 de 2022</b>                                                   | Contrato VEJ-542 de 2022 "Interventoría Integral al Contrato de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor Denominado "Perimetral del Oriente de Cundinamarca". | <b>VERSIÓN: 1</b>                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <b>Página 592 de 591</b>                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Fecha: 30 de mayo de 2025                  |

la suma de \$413.605'900.000 por costos incurridos en las UFs 4 y 5 o por Intervenciones Prioritarias y en general mantenimiento.

- Cumplimiento del Acta de Evento de Eximente de Responsabilidad (EER) para las UFs 4 y 5 reconocido por la ANI sobre los manantiales: dijo que la ANI cumplió con los términos del EER para las UFs 4 y 5, ya que su obligación era "determinar y revisar", no "suscribir" un acuerdo superador del EER como un Otrosí, sin embargo, dijo que en la superación del EER respecto a las UFs 4 y 5, incumpliendo su deber de buena fe tanto en la evaluación de la viabilidad de un acuerdo como en la revisión de las actividades necesarias para que se pudieran llevar a cabo las intervenciones.
  - Imposición de la ANI al fondear subcuenta de interventoría: POB fue obligada a fondear la subcuenta de interventoría, la cual no estaba activa al 100% debido a problemas ambientales, lo que resultó en mayores aportes a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría. Por lo tanto, el Tribunal asignó \$119.500.000.000, al no haber una reducción proporcional de dicha subcuenta en relación con los costos incurridos en las UFs 4 y 5.
- Consecuencias de la terminación anticipada pedida por la ANI: al haber accedido a la petición de la ANI de terminar el contrato, el Tribunal ha otorgado por perdida de utilidad derivada de las unidades funcionales ya terminadas por POB y en operación y mantenimiento (UF1, 2 y 3) la suma de \$803.300.000.000.
  - En resumen, la ANI deberá pagar a POB, \$413.605.900.000, por los costos incurridos respecto a las UFs 4 y 5; \$119.500.000.000, por la no reducción proporcional a la Subcuenta de Supervisión e Interventoría; y \$803.300.000.000 por pérdida de utilidad respecto de las UFs 1, 2 y 3, por un total de COP \$1.336.405.900.000.
  - Sobre la implicación y por menores que incluyen en cada caso se deberá examinar jurídica y técnicamente en cada área y tipo de riesgo asociado.
